## 經濟部水利署南區水資源局 曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

## 半月進度報告

(112年08月16日至112年08月31日)

主辦機關:經濟部水利署南區水資源局

執行機關:經濟部水利署南區水資源局

監造單位:經濟部水利署南區水資源局工務課

曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程工務所

統包商:中華工程股份有限公司

設計分包廠商:巨廷工程顧問股份有限公司

備查日期:

備查文號:

## 目 錄

1.	計畫	彙總摘要	1
	1.1	工程概述	1
	1.2	本期重要記事	2
	1.3	本期施工概要說明	7
	1.4	下期主要施工項目	11
	1.5	遭遇困難及請求協助事項	12
2.	計畫	進度分析及工作現況報告	13
	2.1	計畫時程網狀圖	13
	2.2	計畫時程桿狀圖	13
	2.3	進度表與S進度曲線	13
	2.4	工程現況說明	13
	2.5	要徑分析	15
	2.6	里程碑追蹤	15
	2.7	各項申辦作業狀況	16
	2.8	前後一個月作業項目時程表	16
	2.9	差異分析、修正措施與建議	16
3.	工作	數量報告	17
	3.1	工作數量累計完成表	17
	3.2	本期施工作業工班統計	17
4.	圖說	/文件送審管制表	19
	4.1	圖說送審管制總表	19
	4.2	文件送審管制總表	20
5.	本期	施工照片	23

### 1. 計畫彙總摘要

#### 1.1 工程概述

台灣南部區域降雨豐枯達9:1,枯水季長(10月至隔年5月),近年極端氣候旱澇兩極及用水成長等情境下,既有供水設施及調度系統已無法滿足跨區調度支援需求,相較台灣其他區域,南部區域整體缺水風險較高,而完備彈性的水源調度與管理機制,為降低缺水風險必要方法之一。

經濟部水利署南區水資源局(以下簡稱南水局)依據99年05月12日奉總統令公布實施之「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部供水特別條例」陸續進行曾文水庫防淤隧道等排砂設施及更新改善工作,達初步應急效果。為增加庫容以維持南部地區供水穩定,南水局歷年來已持續進行水庫更新改善及清淤工作,惟現因受限於水庫基礎設施不足,淤泥暫置區容量有限、供電限制需增加特高壓配電,以及抽泥船與抽泥管設施不足等,尚難達成恢復庫容的目標,爰辦理「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」(以下簡稱本計畫)。

本計畫奉行政院110年03月03日院臺經字第1100004878號函核定,計畫期程自111年起至114年底止。本計畫考量增設相關基礎設施,進而擴大庫區清淤範圍,每年可增加約306萬m3的清淤量,藉由放水渠道及擴大抽泥工程實施完成,不僅可增加淤泥暫置區容量且能減少滲漏損失,亦可增加水資源的利用效率,以提升供水穩定,更進一步以淤積零成長為目標,逐年恢復庫容。

本計畫工作項目包括放水渠道工程、特高壓配電工程、壩前碼頭改善工程、 擴大抽泥管工程、其他配合工程等諸項,皆由南水局主辦。復經南水局檢討採統 包方式有助於提升採購效率、品質、及早發揮本計畫效益,爰依政府採購法第24 條第1項規定,以統包方式辦理本工程。

#### 1.2 本期重要記事

#### 1. 112年08月16日

- (1) 箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元鋼模組立。
- (2) 業主同意結案112年8月10日之工地職安檢查稽核(第50次)缺失改善事項。[112.08.16 擴大抽泥工字第112154號備忘錄]
- (3) 於本日112年08月16日上午10時,查核缺失改善對策及成果檢討會議。(地點:曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工務所會議室)[112.08.09 水工南字第11206041700號開會通知單]

#### 2. 112年08月17日

- (1) 放水渠道2K+350~2K+380邊坡噴凝土;箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元鋼模組立。
- (2) 業主函文檢送112年8月17日職業安全、環境衛生稽(複)核表1份,請於112年8月24日前改善完成並檢送至本所憑辦。[112.08.17 擴大抽泥工字第112156號備忘錄]
- (3) 業主函文檢送112年8月17日第51次職業安全、環境衛生稽(複)核表及第4次鄰水及水上作業安全稽(複)核表1份,請於112年8月24日前將改善結果提送至本所憑辦。 [112.08.17 擴大抽泥工字第112155號備忘錄]
- (4) 業主函文檢送112年8月29日辦理第14次施工及進度檢討會議之開會通知單(開會地點: 曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工務所會議室,主持人:徐主任工程司立政)。 [112.08.18 水南工字第11206044340號開會通知單]
- (5) 南水局品管課第12次職安抽查。
- (6) 於本日112年08月17日上午9時10分,前往燕巢南水局實驗室送驗08月12日(3組)取樣之280kgf/cm2混凝土,本日共3組(每組7日2顆、28日3顆)。[監造:江彥佑,統包商:楊惟勝]

#### 3. 112年08月18日

- (1) 箱涵 2K+260~2K+290(第四工作面)第十六單元頂版抗磨層混凝土澆置;箱涵 2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元底版鋼筋綁紮、木模組立、混凝土澆置;放水 渠道2K+380~2K+410邊坡噴凝土;進水口段0K+120~0K+150開挖面降挖破碎。
- (2) 業主函文檢送經濟部水利署修訂施工規範第03310章結構用混凝土,請於112年8月21日 起適用,並請貴處納入後續契約變更內辦理。[112.08.18 擴大抽泥工字第112157號備
- (3) 函送半月進度報告(112年08月01日至112年08月15日)乙式5份。[112.08.18 中工工程工務字第1120818002號函]
- (4) 南水局品管課第12次職安抽查缺失改善。
- (5) 於本日112年08月18日上午11時,箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元底版280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組7日2顆、28日3顆)QC-05-04-168, 坍度:16cm, 氣離子: 0.010kg/m3、0.011kg/m3、0.012kg/m3。[監造:江彦佑,統包商:曹君睿]
- (6) 於本日112年08月18日下午13時,箱涵2K+260~2K+290(第四工作面)第十六單元頂版抗磨層280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組7日2顆、28日3顆)QC-05-04-169,坍度:16cm,氣離子:0.011kg/m3、0.011kg/m3、0.008kg/m3。[監造:江彥佑,統包商:曹君睿]。

#### 4. 112年08月19日

- (1) 放水渠道2K+380~2K+410邊坡噴凝土;進水口段0K+120~0K+150開挖面降挖破碎;箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元牆身及頂版混凝土澆置;箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元底版及牆身鋼筋綁紮。
- (2) 於本日112年08月19日上午11時30分,箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元牆身及頂版280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組7日2顆、28日3顆)QC-05-04-170,坍度:15cm,氣離子:0.015kg/m3、0.013kg/m3、0.010kg/m3。[監造:江彦佑,統包商:曹君睿]
- (3) 於本日112年08月19日上午10時,箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元頂版鋼筋 查驗QC-05-02-124。[監造:江彥佑,統包商:曹君睿]
- (4) 於本日112年08月19日上午10時30分, 箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元鋼模查驗QC-05-09-123
- (5) 於本日112年08月19日上午11時30分,箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元牆身及頂版280kgf/cm2混凝土澆置查驗QC-05-04-170。[監造:江彥佑,統包商:曹君睿]

#### 5. 112年08月20日

(1) 放水渠道進水口段OK+120~OK+150開挖面降挖破碎;鋼模整理吊運;鋼筋吊運。

#### 6. 112年08月21日

- (1) 放水渠道進水口段0K+120~0K+150開挖面降挖破碎;箱涵 2K+380~2K+410(第四工作面) 第二十單元鋼模組立。
- (2) 函文檢陳壩前碼頭改善工程(∮400、∮500 HDPE抽泥管固定工程)分項施工計畫(含分項品質計畫)(第二版/第2次)乙式6份。[112.08.21 中工水利字第112A8E0448號備忘錄]
- (3) 業主函文檢送行政院公共工程委員會工程施工查核小組112年7月24日不預先通知查核本局「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」缺失改善結果檢討會議紀錄1份。[112,08,21水南工字第11206043930號函]
- (4) 南水局品管課第12次職安抽查缺失改善。
- (5) 於本日112年08月21日上午09時30分,至養護池進行08月18日(2組)、08月19日(1組)取樣之280kgf/cm2混凝土試體拆模簽名,本日共3組。[監造:江彦佑,統包商:楊惟

#### 7. 112 年 08 月 22 日

- (1) 放水渠道進水口段0K+120~0K+150開挖面降挖破碎;箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元頂版鋼筋綁紮。
- (2) 南水局品管課第12次職安抽查缺失改善。
- (3) 於本日112年08月22日下午15時, 箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元頂版鋼筋查驗QC-05-02-125。[監造: 林冠傑,統包商: 曹君睿]

#### 8. 112年08月23日

- (1) 放水渠道進水口段0K+120~0K+150開挖面降挖破碎;箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元牆身及頂版混凝土澆置;箱涵2K+290~2K+320(第四工作面)第十七單元頂版抗磨層混凝土澆置。
- (2) ∮500sp抽泥管5K+228~6K+117(支座鑽孔)
- (3) 業主檢退擴大抽泥管工程(5K+100~10K+750)分項施工計畫(含分項品質計畫)(第一版/第 1次),檢送審查意見1份,請貴處於112年8月31日前依審查意見修正。[112.08.23 擴大抽泥工字第112158號備忘錄]
- (4) 南水局品管課第12次職安抽查缺失改善。
- (5) 於本日112年08月23日上午09時,至泰祥興企業有限公司廠驗500mm橡膠製可撓管,本日 廠驗數量共一只。[監造:江彥佑,統包商:楊惟勝]
- (6) 於本日112年08月23日上午10時,箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元牆身及頂版280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組28日3顆)。QC-05-04-171,坍度:16cm, 氯離子:0.018kg/m3、0.014kg/m3、0.014kg/m3[監造:林恩如,統包商:曹君睿]
- (7) 於本日112年08月23日下午15時,箱涵2K+290~2K+320(第四工作面)第十七單元頂版抗磨層280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組28日3顆)QC-05-04-172,坍度:16.5cm, 氯離子:0.021kg/m3、0.021kg/m3、0.020kg/m3。[監造:林恩如,統包商:曹君睿]
- (8) 於本日112年08月23日上午10時,箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元牆身及頂版280kgf/cm2混凝土澆置查驗QC-05-04-171。[監造:林恩如,統包商:曹君睿]
- (9) 於本日112年08月23日下午15時,箱涵2K+290~2K+320(第四工作面)第十七單元頂版抗磨層280kgf/cm2混凝土澆置查驗QC-05-04-172。[監造:林恩如,統包商:曹君睿]
- (10) 專任工程人員督察。

#### 9. 112年08月24日

- (1) 放水渠道進水口段OK+150~OK+200開挖面降挖破碎;物料整理吊運。
- (2) 函文檢陳「職業安全、環境衛生抽查(第51次缺失改善結果」及第4次鄰水及水上作業安全稽(複)核表1份。[112.08.24 中工水利字第112A8E0455號備忘錄]
- (3) 業主函文檢送112年7月21日辦理工程變更設計會勘紀錄1份。[112,08,24 水南工字第 11206042750號函]
- (4) 南水局品管課第12次職安抽查缺失改善。
- (5) 於本日112年08月24日上午10時,至東口堰SP鋼管第二暫置區進行擴大抽泥管工程 6K+288~7K+776之 ∮ 500mm SP鋼管取樣,本日共取3組(每組2件)。[監造:林恩如,統包商:楊惟勝]
- (6) 於本日112年08月24日下午15時40分,至養護池進行08月23日取樣之280gf/cm2混凝土試體拆模簽名,共2組。[監造:江彥佑,統包商:楊惟勝]

#### 10. 112年08月25日

- (1) 放水渠道進水口段 0K+150~0K+200 開挖面降挖破碎;物料整理吊運;箱涵 2K+320~3K+350(第四工作面)第十八單元頂版抗磨層混凝土澆置。
- (2) ∮500sp抽泥管5K+228~6K+117(支座鑽孔)。
- (3)函文檢陳品管課「職業安全、環境衛生稽核(第13次)缺失改善結果」。[112.08.25 中工水利字第112A8E0456號備忘錄]

- (4) 業主函文同意備查統包商提送之112年8月1日至112年8月15日半月進度報告。 [112,08,25 水南工字第11206045740號函]
- (5) 函文提送品管人員異動乙案,原核備在案之品管人員陳廷原,因組織異動更由楊惟勝君接任,隨函檢附工程契約、異動之楊惟勝君身分證影本、勞保投保證明文件、廠商品管人員登錄表、品管人員相關學經歷一覽表、學歷證明、品管證照等資料各乙份。 [112.08.25 中工工程工務字第1120825045號函]
- (6)業主函文本局機關名稱自112年9月26日變更為「經濟部水利署南區水資源分署」,機關聯絡地址、電話不變。[112,08,25 水南秘字第11210026290號書函]
- (7) 生態保育自主檢查。
- (8) 於本日112年08月25日上午9時,前往燕巢南水局實驗室送驗08月18日(2組)、08月19日 (1組)取樣之280kgf/cm2混凝土本日共3組(每組7日2顆、28日3顆)、08月23日(2組)取樣之280kgf/cm2混凝土2組(28天3顆)。[監造:江彥佑,統包商:楊惟勝]
- (9) 於本日112年08月25日下午14時,箱涵2K+320~3K+350(第四工作面)第十八單元頂版抗磨層280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組28日3顆)。QC-05-04-173,坍度:17cm, 氯離子:0.013kg/m3、0.012kg/m3、0.014kg/m3。[監造:林冠傑,統包商:曹君睿]
- (10 於本日112年08月25日下午14時, 箱涵2K+320~3K+350(第四工作面)第十八單元頂版抗磨層280kgf/cm2混凝土澆置查驗QC-05-04-173。[監造:林冠傑,統包商:曹君睿]

#### 11. 112年08月26日

(1) 放水渠道進水口段OK+150~0K+200開挖面降挖破碎;物料整理吊運。

#### 12. 112年08月27日

(1) 放水渠道進水口段OK+150~OK+200開挖面降挖破碎;物料整理吊運。

#### 13. 112 年 08 月 28 日

- (1) 放水渠道進水口段0K+150~0K+200開挖面降挖破碎;箱涵2K+380~2K+410填縫劑施作;物料整理吊運防颱整備。
- (2) ∮500sp抽泥管4K+576~4K+642、4K+871~5K+087、5K+228~6K+117化學毛栓植筋。
- (3) 業主檢送112年8月25日第52次職業安全、環境衛生稽(複)核表及第5次鄰水及水上作業安全稽(複)核表1份。[112.08.28 擴大抽泥工字第112162號備忘錄]
- (4) 業主同意結案112年8月17日工地職安稽核(第51次)缺失改善事項及第4次鄰水及水上作業安全稽核缺失改善結果。[112.08.28 擴大抽泥工字第112160號備忘錄]
- (5) 於本日112年08月29日上午09時35分,至養護池進行08月25日取樣之280kgf/cm2混凝土 試體拆模簽名,共1組。[監造:江彥佑,統包商:楊惟勝]
- (6) 於本日112年08月28日下午23時30分,發布海上颱風警報(蘇拉颱風)。

#### 14. 112年08月29日

- (1) 放水渠道進水口段0K+150~0K+200開挖面降挖破碎;箱涵2K+290~2K+350填縫劑施作;物料整理吊運防颱整備。
- (2) 放水渠道:維修便道-0K+000~0K+040中心位置放樣。
- (3) 業主檢送112年8月29日第53次職業安全、環境衛生稽(複)核表及第6次鄰水及水上作業安全稽(複)核表1份。[112.08.29 擴大抽泥工字第112163號備忘錄]

- (4) 函文檢陳擴大抽泥管工程(5K+100~10K+750)分項施工計畫(含分項品質計畫)(第一版/第 2次)乙式6份。[112.08.29 中工水利字第112A8E0461號備忘錄]
- (5) 防颱自主檢查。
- (6) 於本日112年08月29日上午10時,「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」第14次施工及進度檢討會議。(開會地點:曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工務所會議室,主持人:徐主任工程司立政)。[112.08.18 水南工字第11206044340號開會通知單]
- (7) 於本日112年08月29日下午17時30分,發布陸上颱風警報(蘇拉颱風)。

#### 15. 112年08月30日

- (1) 箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元頂版抗磨層混凝土澆置;進水口段 0K+150~0K+200開挖面降挖破碎;箱涵2K+290~2K+350填縫劑施作;物料整理吊運防颱整 備。
- (2) 業主函文同意辦理有關申請更換施工總負責人為傅賜榮君,本次施工總負責人異動為陳國峰更換為傅賜榮,施工總負責人為統包商工地之全權代表人,代表統包商駐在工地,督率施工,管理其員工及器材,並負責一切統包商應辦理事項,非經機關同意,不得擅離工地。[112.08.30 水南工字第11206045730號函]
- (3) 業主函文有關申請工地主任異動一案,所提陳國峰君營造業工地主任執業證有效期限已過期,請盡速補正回訓證明。[112.08.30 水南工字第11206045810號函]
- (4) 業主函文同意備查統包商提送之施工日誌(112年7月份)。[112.08.30 擴大抽泥工字第 1120164號備忘錄]
- (5) 於本日112年08月30日上午08時30分,箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元頂版 抗磨層280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組28日3顆)。QC-05-04-174,坍度: 14.5cm,氯離子:0.012kg/m3、0.015kg/m3、0.017kg/m3[監造:江彥佑,統包商:曹
- (6) 於本日112年08月30日上午08時30分,箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元頂版 抗磨層280kgf/cm2混凝土澆置查驗QC-05-04-174。[監造:江彥佑,統包商:曹君睿]
- (7) 於本日112年08月30日下午23時30分,解除陸上颱風警報(蘇拉颱風)。
- (8) 專任工程人員督察。

#### 16. 112年08月31日

- (1) 工區因下雨導致路面泥濘, 暫停施工乙日。
- (2) 函文為配合申請新設用電計畫,本案於111年4月11日經台電公司業務處「業字第 1118039635號函」核定在案,惟核定函已逾一年有效期,故再次提報用電計畫書以周全 行政程序,本次申請用電計畫書用印一式二份,隨文檢附用電計畫書(附件)一式二份。 [112.08.31 中工水利字第112A8E0468號備忘錄]
- (3) 業主檢送水利署112年9月11日辦理行政督導通知表。[112.08.30 擴大抽泥工字第 1120165號備忘錄]
- (4) 於本日112年08月31日下午14時,至放水渠道箱涵1K+377進行 280kgf/cm2混凝土現場鑽心試體取樣,本日共取1組(每組3顆)。[監造:江彦佑,統包商:曹君睿,政風室:呂純寧]
- (5) 於本日下午下午15時05分至養護池進行8月30日取樣之280kgf/cm2混凝土試體拆模簽名。[監造:江彥佑,統包商:楊惟勝]
- (6) 於本日112年08月31日下午15時10分,至燕巢南水局實驗室送驗本日取樣之混凝土鑽心試體(共1組);08月25日(1組)取樣之280kgf/cm2混凝土,共1組(每組28日3顆)。[監造:江彥佑,統包商:楊惟勝,政風室:呂純寧]
- (7) 於本日112年08月31日,水利署現地施工品質抽查(試驗)。

#### 1.3 本期施工概要說明

#### 1. 資料編撰及送審

#### (1) 函送文件:

- A. 函送半月進度報告(112年08月01日至112年08月15日)乙式5份。[112.08.18 中工工程工務字第1120818002號函]
- B. 函文檢陳壩前碼頭改善工程(\$400、\$500 HDPE抽泥管固定工程)分項施工計畫 (含分項品質計畫)(第二版/第2次)乙式6份。[112.08.21 中工水利字第 112A8E0448號備忘錄]
- C. 函文提送品管人員異動乙案,原核備在案之品管人員陳廷原,因組織異動更由 楊惟勝君接任,隨函檢附工程契約、異動之楊惟勝君身分證影本、勞保投保證 明文件、廠商品管人員登錄表、品管人員相關學經歷一覽表、學歷證明、品管 證照等資料各乙份。[112.08.25 中工工程工務字第1120825045號函]
- D. 函文檢陳擴大抽泥管工程(5K+100~10K+750)分項施工計畫(含分項品質計畫)(第 一版/第2次)乙式6份。[112.08.29 中工水利字第112A8E0461號備忘錄]
- E. 函文為配合申請新設用電計畫,本案於111年4月11日經台電公司業務處「業字第1118039635號函」核定在案,惟核定函已逾一年有效期,故再次提報用電計畫書以周全行政程序,本次申請用電計畫書用印一式二份,隨文檢附用電計畫書(附件)一式二份。[112.08.31 中工水利字第112A8E0468號備忘錄]

#### (2) 核定/備查文件:

- A. 業主函文同意備查統包商提送之112年8月1日至112年8月15日半月進度報告。「112.08.25 水南工字第11206045740號函〕
- B. 業主函文同意辦理有關申請更換施工總負責人為傳賜榮君,本次施工總負責人 異動為陳國峰更換為傳賜榮,施工總負責人為統包商工地之全權代表人,代表 統包商駐在工地,督率施工,管理其員工及器材,並負責一切統包商應辦理事 項,非經機關同意,不得擅離工地。[112,08,30 水南工字第11206045730號函]
- C. 業主函文同意備查統包商提送之施工日誌(112年7月份)。[112.08.30 擴大抽泥工字第1120164號備忘錄]

#### (3) 審退文件:

A. 業主檢退擴大抽泥管工程(5K+100~10K+750)分項施工計畫(含分項品質計畫)(第 一版/第1次),檢送審查意見1份,請貴處於112年8月31日前依審查意見修正。 [112.08.23 擴大抽泥工字第112158號備忘錄]

#### 2. 品質管制作業

- (1)於112年08月17日上午9時10分,前往燕巢南水局實驗室送驗08月12日(3組)取樣之 280kgf/cm2混凝土,本日共3組(每組7日2顆、28日3顆)。[監造:江彦佑,統包商: 楊惟勝]
- (2) 於112年08月18日上午11時,箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元底版 280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組7日2顆、28日3顆)QC-05-04-168,坍度:16cm,氣離子:0.010kg/m3、0.011kg/m3、0.012kg/m3。[監造:江彥佑,統包商:曹君睿]

- (3) 於112年08月18日下午13時,箱涵2K+260~2K+290(第四工作面)第十六單元項版抗磨層280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組7日2顆、28日3顆)QC-05-04-169,坍度:16cm,氯離子:0.011kg/m3、0.011kg/m3、0.008kg/m3。[監造:江彥佑,統包商:曹君睿]。
- (4) 於112年08月19日上午11時30分,箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元牆身及頂版280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組7日2顆、28日3顆)QC-05-04-170,坍度:15cm,氣離子:0.015kg/m3、0.013kg/m3、0.010kg/m3。[監造:江彥佑,統包商:曹君睿]
- (5)於112年08月23日上午09時,至泰祥興企業有限公司廠驗500mm橡膠製可撓管,本日 廠驗數量共一只。「監造:江彦佑,統包商:楊惟勝]
- (6) 於112年08月23日上午10時,箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元牆身及頂版280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組28日3顆)。QC-05-04-171, 坍度:16cm,氣離子:0.018kg/m3、0.014kg/m3、0.014kg/m3[監造:林恩如,統包商:曹君睿]
- (7) 於112年08月23日下午15時,箱涵2K+290~2K+320(第四工作面)第十七單元頂版抗磨層280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組28日3顆)QC-05-04-172, 坍度:16.5cm, 氣離子: 0.021kg/m3、0.021kg/m3、0.020kg/m3。[監造:林恩如,統包商:曹君睿]
- (8) 於112年08月24日上午10時,至東口堰SP鋼管第二暫置區進行擴大抽泥管工程 6K+288~7K+776之 ∮500mm SP鋼管取樣,本日共取3組(每組2件)。[監造:林恩如, 統包商:楊惟勝]
- (9) 於112年08月25日上午9時,前往燕巢南水局實驗室送驗08月18日(2組)、08月19日(1組)取樣之280kgf/cm2混凝土本日共3組(每組7日2顆、28日3顆)、08月23日(2組)取樣之280kgf/cm2混凝土2組(28天3顆)。[監造:江彦佑,統包商:楊惟勝]
- (10) 於112年08月25日下午14時,箱涵2K+320~3K+350(第四工作面)第十八單元頂版抗磨層280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組28日3顆)。QC-05-04-173,坍度:17cm,氯離子:0.013kg/m3、0.012kg/m3、0.014kg/m3。[監造:林冠傑,統包商:曹君睿]
- (11) 於112年08月30日上午08時30分,箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元頂版 抗磨層280kgf/cm2混凝土取樣,本日共取1組(每組28日3顆)。QC-05-04-174,坍 度:14.5cm,氣離子:0.012kg/m3、0.015kg/m3、0.017kg/m3[監造:江彥佑,統包商:曹君睿]
- (12)於112年08月31日下午14時,至放水渠道箱涵1K+377進行 280kgf/cm2混凝土現場鑽心試體取樣,本日共取1組(每組3顆)。[監造:江彥佑,統包商:曹君睿,政風室: 呂純寧]
- (13)於112年08月31日下午15時10分,至燕巢南水局實驗室送驗本日取樣之混凝土鑽心試體(共1組);08月25日(1組)取樣之280kgf/cm2混凝土,共1組(每組28日3顆)。[監造:江彥佑,統包商:楊惟勝,政風室:呂純寧]

#### 3. 細部設計服務費

- (1) 函送文件:本期無
- (2) 核定/備查文件: 本期無

(3) 審退文件: 本期無

#### 4. 工程會議/會勘、工程督導/查核

- (1)於112年08月16日上午10時,查核缺失改善對策及成果檢討會議。(地點:曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工務所會議室)[112.08.09 水工南字第11206041700號開會通知單]
- (2) 業主函文檢送112年8月29日辦理第14次施工及進度檢討會議之開會通知單(開會地點:曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工務所會議室,主持人:徐主任工程司立政)。 [112.08.18 水南工字第11206044340號開會通知單]
- (3)於112年08月29日上午10時,「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」第14次施工及進度檢討會議。(開會地點:曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工務所會議室,主持人:徐主任工程司立政)。[112.08.18 水南工字第11206044340號開會通知單]
- (4)業主檢送水利署112年9月11日辦理行政督導通知表。[112.08.30 擴大抽泥工字第 1120165號備忘錄]

#### 5. 重要紀事

- (1) 業主同意結案112年8月10日之工地職安檢查稽核(第50次)缺失改善事項。 [112.08.16 擴大抽泥工字第112154號備忘錄]
- (2) 業主函文檢送112年8月17日職業安全、環境衛生稽(複)核表1份,請於112年8月24日 前改善完成並檢送至本所憑辦。[112.08.17 擴大抽泥工字第112156號備忘錄]
- (3) 業主函文檢送112年8月17日第51次職業安全、環境衛生稽(複)核表及第4次鄰水及水上作業安全稽(複)核表1份,請於112年8月24日前將改善結果提送至本所憑辦。 [112,08.17 擴大抽泥工字第112155號備忘錄]
- (4)於112年08月18日,南水局品管課第12次職安抽查。
- (5) 業主函文檢送經濟部水利署修訂施工規範第03310章結構用混凝土,請於112年8月21日起適用,並請貴處納入後續契約變更內辦理。[112.08.18 擴大抽泥工字第112157號備忘錄]
- (6)於112年08月19日,南水局品管課第12次職安抽查缺失改善。
- (7) 於112年08月19日上午10時, 箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元頂版鋼筋查驗QC-05-02-124。[監造:江彥佑,統包商:曹君睿]
- (8) 於112年08月19日上午10時30分,箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元鋼模查驗QC-05-09-123。[監造:江彥佑,統包商:曹君睿]
- (9) 於112年08月19日上午11時30分,箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元牆身及頂版280kgf/cm2混凝土澆置查驗QC-05-04-170。[監造:江彦佑,統包商:曹君睿]
- (10) 業主函文檢送行政院公共工程委員會工程施工查核小組112年7月24日不預先通知查核本局「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」缺失改善結果檢討會議紀錄1份。 [112,08,21 水南工字第11206043930號函]
- (11)於112年08月21日,南水局品管課第12次職安抽查缺失改善。
- (12)於112年08月22日,南水局品管課第12次職安抽查缺失改善。
- (13) 於112年08月22日下午15時,箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元頂版鋼筋查驗QC-05-02-125。[監造:林冠傑,統包商:曹君睿]
- (14) 南水局品管課第12次職安抽查缺失改善。

- (15) 於112年08月23日上午10時,箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元牆身及頂版280kgf/cm2混凝土澆置查驗QC-05-04-171。[監造:林恩如,統包商:曹君睿]
- (16) 於112年08月23日下午15時,箱涵2K+290~2K+320(第四工作面)第十七單元頂版抗磨層280kgf/cm2混凝土澆置查驗QC-05-04-172。[監造:林恩如,統包商:曹君睿]
- (17) 於112年08月23日,專任工程人員督察。
- (18) 函文檢陳「職業安全、環境衛生抽查(第51次缺失改善結果」及第4次鄰水及水上作業安全稽(複)核表1份。[112,08,24 中工水利字第112A8E0455號備忘錄]
- (19) 業主函文檢送112年7月21日辦理工程變更設計會勘紀錄1份。[112.08.24 水南工字第11206042750號函]
- (20)於112年08月24日,南水局品管課第12次職安抽查缺失改善。
- (21) 函文檢陳品管課「職業安全、環境衛生稽核(第13次)缺失改善結果」。[112.08.25 中工水利字第112A8E0456號備忘錄]
- (22) 業主函文本局機關名稱自112年9月26日變更為「經濟部水利署南區水資源分署」, 機關聯絡地址、電話不變。[112.08.25 水南秘字第11210026290號書函]
- (23) 於112年08月25日,生態保育自主檢查。
- (24) 於112年08月25日下午14時, 箱涵2K+320~3K+350(第四工作面)第十八單元頂版抗磨層280kgf/cm2混凝土澆置查驗QC-05-04-173。[監造:林冠傑,統包商:曹君睿]
- (25) 業主檢送112年8月25日第52次職業安全、環境衛生稽(複)核表及第5次鄰水及水上作業安全稽(複)核表1份。[112.08.28 擴大抽泥工字第112162號備忘錄]
- (26) 業主同意結案112年8月17日工地職安稽核(第51次)缺失改善事項及第4次鄰水及水上作業安全稽核缺失改善結果。[112,08,28 擴大抽泥工字第112160號備忘錄]
- (27) 於112年08月28日下午23時30分,發布海上颱風警報(蘇拉颱風)。
- (28) 業主檢送112年8月29日第53次職業安全、環境衛生稽(複)核表及第6次鄰水及水上作業安全稽(複)核表1份。[112.08.29 擴大抽泥工字第112163號備忘錄]
- (29) 於112年08月29日, 防颱自主檢查。
- (30) 於112年08月29日下午17時30分,發布陸上颱風警報(蘇拉颱風)。
- (31) 業主函文有關申請工地主任異動一案,所提陳國峰君營造業工地主任執業證有效期限已過期,請盡速補正回訓證明。[112.08.30 水南工字第11206045810號函]
- (32) 業主函文同意備查統包商提送之施工日誌(112年7月份)。[112.08.30 擴大抽泥工字第1120164號備忘錄]
- (33) 於112年08月30日上午08時30分,箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元頂版 抗磨層280kgf/cm2混凝土澆置查驗QC-05-04-174。[監造:江彥佑,統包商:曹君
- (34) 於112年08月30日下午23時30分,解除陸上颱風警報(蘇拉颱風)。
- (35) 於112年08月30日,專任工程人員督察。
- (36)於112年08月31日,水利署現地施工品質抽查(試驗)。

#### 1.4 下期主要施工項目

- 1. 資料編撰及送審
  - (1) 各類分項計畫書撰寫。
  - (2) 各類材料送審。
- 2. 品質管制作業
  - (1) 材料進場取樣。
- 3. 細部設計服務費
  - (1) 第一階段細部設計修訂。
  - (2) 第二階段細部設計修訂。

#### 4. 預計施作項目

- (1) 測量作業。
- (2) 放水渠道工程進水口閘門墩柱施作 EL:100.28~103.28(含預埋件、清理邊坡落石)。
- (3) 放水渠道工程進水口段OK+120~0K+200降挖破碎。
- (4) 放水渠道工程梧棲溝導水箱涵施作填縫劑。
- (5) 放水渠道工程1K+360~1K+480抗磨層混凝土澆置完成。
- (6) 擴大抽泥管工程5K+228~6K+117 § 500mm固定座鑽孔。

#### 1.5 遭遇困難及請求協助事項 (本期無)

### 2. 計畫進度分析及工作現況報告

#### 2.1 計畫時程網狀圖

詳於附件一。

#### 2.2 計畫時程桿狀圖

詳於附件二。

#### 2.3 進度表與S進度曲線

詳於附件三。

#### 2.4 工程現況說明

#### 1. 設計作業現況

- (1) 函文檢陳概估整治預算及新設管陸併入本工程附掛之施工預算資料,經評估「一號 導水隧道上方邊坡崩塌改善工程」之施工費用約422.4萬元,「原水管新設工程」之 施工費用約1,377.6萬元,總工程費合計約2,441.88萬元,相關預算資料詳附件,尚 在審查中。[111.09.08 中工工務字第1110908054號函]
  - A. 一號導水隧道上方邊坡崩塌改善工程依據第14次施工及進度檢討會議結論辦理: 放水渠道工程進水口段一號導水隧道上方邊坡有落石崩落疑慮,為避免造成施工 危險,請統包商儘速辦理邊坡保護作業;另放水渠道工程量水堰閘室施工便道位 置與既有原水管位置重疊,請統包商自行辦理既有管線遷移下地作業,整體經費 以不逾契約金額18.1億為原則。[112.09.05水南工字第11206047430號函]
  - B. 原水管新設工程依據擴大抽泥管工程(5K+100~10K+750)細部設計圖說審查意見辦理:經費概算書已增加既有原水管改善工項費用。[112.01.19水南工字第1120206003440號函]

#### (2) 第一階段提送:

- A. 擴大抽泥管工程 \$ 300mm HDPE抽泥管及擴大抽泥工程(0K+000~5K+100)已於111年 12月02日核定。[111.12.02 水南曾字第11106056110號函]
- B. 放水渠道工程(0K+000~2K+400)已於111年12月27日核定。[111.12.27 水南曾字第11106064270號函]
- C. 壩前碼頭改善工程(§400、§500 HDPE抽泥管固定工程)已於112年05月02日核定細部設計圖A1原圖,其施工預算書已於已於112年05月16日提送。[112.05.02水南工字第11206021760號函、112.05.16中工水利字第112A8E0268號備忘錄]

#### (3) 第二階段提送:

- A. 擴大抽泥管工程( $5K+100\sim10K+750$ )已於112年06月05日核定細部設計圖A1原圖,其施工預算書已於112年06月17日提送。[112. 06. 05水南工字第11206026870號、<math>112. 06. 17中工工程工務字第1120617001號函]
- B. 放水渠道工程(2K+400~4K+530),已於112年08月10日提送細部設計單元A1設計原圖(修正版)1套,審查中。「112.08.10 中工水利字第112A8E0432號備忘錄]
- C. 霸前碼頭道路改善工程(霸前碼頭改善工程)細部設計圖說,已於112年07月10日核定細部設計圖A1原圖,其施工預算書已於112年07月25日提送。[112.07.10 水南工字第112060342800號函、112.07.25中工工程工務字第1120725052號函]
- D. 特高壓配電工程已於112年07月12日提送細部設計單元(第一版/第5次),審查中。[112.07.12 中工水利字第112A8E0373號備忘錄]
- E. 溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善細部設計單元應於111年12月15日前完成細部設計圖說送機關審核,惟溪畔公園材料堆置場將由曾文南化聯通管統包工程AI標辦理溪畔公園護岸整治工程,且目前為南水局轄下工程土方及材料堆置場地使用中,其地形將大幅變化,故建請機關同意本工程申請展延,待AI標工程完成溪畔公園護岸整治工程後視機關指示及需求再行辦理細部設計。[111.12.14 中工工務字第1111214028號]
- F. 溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善細部設計單元(第一版/第2次)已於112年01 月18日提送,審查中。[112.01.18 中工工務字第1120118082號函]

#### 2. 施工作業現況

(1) 測量作業

A. 放水渠道;維修便道-0K+000~0K+040中心位置放樣。

- (2) 放水渠道工程
  - A. 鋼模整理吊運
  - B. 放水渠道進水口段OK+120~0K+200開挖面降挖破碎。
  - C. 箱涵2K+290~2K+350、2K+380~2K+410填縫劑施作。
  - D. 放水渠道2K+350~2K+410邊坡噴凝土。
  - E. 箱涵2K+260~2K+290(第四工作面)第十六單元頂版抗磨層混凝土澆置。
  - F. 箱涵2K+290~2K+320(第四工作面)第十七單元頂版抗磨層混凝土澆置。
  - G. 箱涵2K+320~3K+350(第四工作面)第十八單元頂版抗磨層混凝土澆置。
  - H. 箱涵2K+350~2K+380(第四工作面)第十九單元頂版抗磨層混凝土澆置。
  - I. 箱涵2K+380~2K+410(第四工作面)第二十單元結構體完成。
- (3) 擴大抽泥管工程
  - A. ∮500sp抽泥管5K+228~6K+117(支座鑽孔)。
  - B. \$500sp抽泥管4K+576~4K+642、4K+871~5K+087、5K+228~6K+117化學毛栓植筋。

#### 2.5 要徑分析

- (1) 本期預定累計進度為 32.030%,實際累計進度為 35.3982%,目前超前 3.3682%。
- (2) 本期各項工程進度情況詳於附件五。
- (3) 依據預定進度,現階段及下期要徑皆為導水箱涵(0k+270~2k+270),現階段其他預計施作工項為 \$ 400mm及 \$ 500mm HDPE抽泥管上架,其 \$ 400及 \$ 500抽泥管上架材料正在製造中及壩前碼頭道路改善陸域段,原預計施作跨河段之抽泥工程,配合材料時程調整為先行施作明管段,詳參附件一。

#### 2.6 里程碑追蹤

- (1) 細部設計(第一階段):
  - A. 擴大抽泥管工程(0k+000~5k+100):於111年09月06日核定細部設計圖,其施工預算書於111年12月02日核定。
  - B. 擴大抽泥管工程(∮300mm管線部分):於111年06月07日核定細部設計圖,其施工預算書於111年12月02日核定。
  - C. 進水口固床工及導水箱涵(0k+000~2k+400,不含水工機械及截流溝):(箱涵部分)細部設計圖已於111年06月20日核定,其餘部分第二次細設成果,已於111年09月06核定,其施工預算書另案提送,並已於111年12月27日核定。
  - D. 壩前碼頭改善工程(§400、§500 HDPE抽泥管固定工程)已於112年05月02日核定細部設計圖A1原圖,其施工預算書已於112年05月16日提送。

#### (2) 細部設計(第二階段):

- A. 擴大抽泥管工程( $5K+100\sim10K+750$ )已於112年06月05日核定細部設計圖A1原圖,其施工預算書已於112年06月14日提送。
- B. 放水渠道工程(2K+400~4K+530)已於112年08月10日提送細部設計單元A1設計原圖 (修正版)1套,審查中。
- C. 霸前碼頭道路改善工程(霸前碼頭改善工程)已於112年07月10日同意辦理細部設計圖說,其施工預算書已於112年07月25日提送。
- D. 特高壓配電工程已於112年07月12日提送細部設計單元(第一版/第5次),審查中。
- E. 溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善細部設計單元應於111年12月15日前完成細部設計圖說送機關審核,惟溪畔公園材料堆置場將由曾文南化聯通管統包工程AI標辦理溪畔公園護岸整治工程,且目前為南水局轄下工程土方及材料堆置場地使用中,其地形將大幅變化,故建請機關同意本工程申請展延,待AI標工程完成溪畔公園護岸整治工程後視機關指示及需求再行辦理細部設計。
- F. 溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善細部設計單元(第一版/第2次)已於112年01 月18日提送,審查中。

#### (2) 施工:

A. 放水渠道需於年底前完成2000m契約里程碑,截止至112年08月31日已完成  $0K+245\sim 2K+410$ 共2165m。

#### 2.7 各項申辦作業狀況

(1)於111年07月12日函文惠請貴局協助函轉台南市政府同意認定為重大建設計畫所需之臨時性設施使用,檢陳本公司承攬政府重大建設計畫「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」,租用臺南市楠西區楠西段共1筆地號作為業主、監造及本公司臨時辦公房舍使用之相關申辦文件,業主於111年12月05日函文依據臺南市政府農業局111年11月24日南市農工字第1111529794號函辦理,請本所於111年12月20日函文惠請貴局協助函轉各目的事業主管機關查詢本地號(楠西區楠西段378地號)是否為不得設置之地區,業主於112年01月03日函復,請本公司配合逕洽相關單位查明,並配合修正農業用地臨時使用說明書,修正完妥後由貴處逕辦後續事宜,並於112年01月19日函轉各相關單位確認本地號是否為不得設置之地區。[111.07.12 中工工務字第1110712001號函;112.01.03 擴大抽泥工字第112001號備忘錄;112.01.19 中工工程工務字第1120119041號、中工工程工務字第1120119042號、中工工程工務字第1120119043號、中工工程工務字第1120119044號]

#### 2.8 前後一個月作業項目時程表

詳於附件二。

#### 2.9 差異分析、修正措施與建議

本期無。

## 3. 工作數量報告

#### 3.1 工作數量累積完成表

詳於附件四。

#### 3.2 本期施工作業工班統計

#### 1. 施工作業人員統計

工別	單位	前期累計人數	本期使用人數	累計使用人數	備註
施工總負責人	人	343	12	355	
專任工程人員	人	343	12	355	
工地主任	人	343	12	355	
品管人員	人	1, 175	40	1, 215	
職安人員	人	838	28	866	
工程師	人	1, 629	56	1, 685	
測量人員	人	239	1	240	
一般工	人	1, 653	62	1, 715	
水電工	人	18	~	18	
鋼筋工	人	2, 006	12	2, 018	
模板工	人	774	11	785	
泥水工	人	11	<u>~</u>	11	
機械操作工	人	1, 943	40	1, 983	
混凝土澆置工	人	565	17	582	
其他工	人	1, 290	8	1, 298	
熔接工	人	13	-	13	

#### 2. 施工作業機具統計

工別	單位	前期累計人數	本期使用人數	累計使用人數	備註
挖土機	台	1, 081	14	1, 095	
破碎機	台	238	8	246	
溼式噴漿機	台	4	_	4	
噴漿設備	套	55	3	58	
移動式起重機	台	301	12	313	
車載式起重機	台	262	7	269	
傾卸卡車	台	213	_	213	
壓路機	台	1	-	1	
手持鑽孔機	台	82	2	84	

工別	單位	累計使用人數	本期使用人數	累計使用人數	備註
空壓機設備	套	19	=	19	
推土機	台	93	-	93	
拖板車	台	44	_	44	
灌漿設備	套	24		24	
發電機	台	910	3	913	
鏟裝機	套	51	-	51	
熔接設備	台	8	-	8	
泵浦車	台	99	4	103	
鑚掘機	台	2	_	2	

#### 3. 晴雨表

詳於附件五。

#### 4. 圖說/文件送審管制表

#### 4.1 圖說送審管制總表

12 QF-04-02 抽泥管闹定工程 (管征400mm及管征500mm)

水工製領工程

14 QF-05-01 佛電監控工程
15 QF-07-01 概率安全衛生及環境保護

17 QF-09-01 系群公园材料堆置場複雜及環境 改善

16 QF-08-01 工程告示牌

111.08.17

111,09.22 水南工宇第

1130044840號 6、水南工字第

第一版 111.12.14 112.01.07 估音畫書 第一版 112.01.18 第1次 中工水料空籍 北海口空灣 見修正 第2次 112015082號後

11106044860號 112.04.13 水南工字朔 111.10.31

中工工務字第 1111031086號面

放鱼罐記 第一版 译修正 第3次

佐宙直覚 見修正 111.11.21

水南工字節

111.12.02

中工工務学館

111.12.23

水南工宇第

111.07.01

中工工符字第 1110701050號南

111.06.02

水南曾宇第 153037170號语 依審直意 第一版 見等正 第2次

112.02.10 依音直章 第一版 112.02.23 水雨碧字第 見修正 第2次 112.02.23 中工工程工符字第 113.02.23 113.02.23 中工工程工符字第 113.02.23 113.02 11

- 依書宣章 第一版 112.02.23 中工工程工程字第 112022204052

111.05.10

中工工符字簿 1110510008號函

111.05.31 第一版 111.05.27 111.06.06 守工工筑字第 水南曾宇第

111.05.10 第一版 第1次

111.12.15

111.12.15

111.12.15 第一版 111.12.14 中工工院学第 1111.12.14 1111.12.14 1111.14 111.14 1111.14 111.14 111.14 111.14 111.14 111.14 11.1

111.12.15 第一版 111.12.14 中工工均字第

孫定提述 原文 提述日間 回電日間 回電 原文 提述日間 回電日間 回電 医次 提述日間 回電日間 回電 医次 提述日間 回電日間 回電 医次 提述文献 回源文献 情况 原文教 超述文献 回源文献 項次 文件編號 
 回接 情况
 床衣
 提近日期
 回源日期
 回源 情况
 后次 提近日期
 回源日期
 回源 情况
 回源日期
 回源 情况
 原次 情况
 提近日期
 回源日期
 回源 情况
 原次 情况
 提近日期
 回源日期
 回源 情况
 原次 情况
 提近文號
 回源文號
 情况
 原次
 提起日期
 回源日期
 日源 情况
 原次
 提起文號
 回源文號
 QF-01 放水泵链工程 第一版 111.08.12 111.09.06 第3次 中工工程学第 水南工学第 111.08.12032號面 1110504214078F-7-第一版 111.07.15 (組計算 中工工程字符 出) 111071500158-5 95-版 111.12.12 第3次 中工工作学第 111.09.08 111.12.06 中工工物字第 水南工字類 111.09.06 水南工字類 111.12.27 水南工学第 111.12.27 水南工字第 QF-01-01 進水口 · 固床工 11106064270% 111.12.27 水南曾宇麻 第一版 111.12.12 (四月百日 中工工務学院 2 OF-01-02 導水箱酒(OK+000~2K+400) 垣水宿河(2K+400-4K+530) 112.06.324號 112.06036060號 112.06.36 112.06.16 112.08.03 依審直包 15日本 中工水刊字第 水南工字簿 見続正 截流工設施 QF-02 揭大抽泥管工程 第一版 111.06.09 第3次 中工13字第 (A1面) 11106099 第一版 11.11.09 中工工程字符 11.11.09 中工工程字符 11.11.09.08 中工工程字符 11.10.90.08 中工工程字符 (AIB) 11.09.08.7转语 1 12.06.17 111.06.17 水南曾学籍 111.12.02 水南工字箱 111.12.02 水南工学箱 QF-02-01 擴大抽泥管工程(∮300mm HDPE 抽泥管固定工程) 111.06.07 水南曾字第 | 第一版 | 1110624030號画 | 11106056110號画 | 第一版 | 111.11.09 | 111.12.02 | 11111 | 中工将学館 水市工学館 | 1111109505號画 | 111106056110計画 | 111106056110計画 | 11106056110計画 | 111.12.02 水南工学第 6 QF-02-02 擴大抽泥管工程 (0K+000~5K+100) 7 QF-02-03 [孫大郎管軍工程 (5K+100-10K+750) 開大服治軍工程 (0K+000-5K+100) T6 支継 (第工即小原軍部) 9 QF-02-05 [第六號記章工程(300m HDPF維 記音)起,領點施工回 112.05.08 水南工宇第 11111090505 111.12.29 損大抽泥工宇第 1173號備忘錄 第一版 第1次 第1次 第1次 第1次 112.05.08 水南工字籍 見修正 第4次 112.01.05 水南工学等 11206000060號面 現象正 第一版 中工工程工務学第 112.01.1883號面 第一版 第二版 中工水利学馆 第5次 第112A8E0373號備第 10 QF-03-01 特高壓配電工程 中工水刊字語 1250256財福忘錄 中工工務宇宙 1111214032號函 中工工程工稿字第 1120331011號函 水南工字第 水南工字籍 水南工字第 QF-04 傾前碼頭改體工程 111.12.14 112.01.05 112.01.18 112.02.17 112.03.01 112.04.10 112.04.17 112.05.25 112.06.05 112.06.17 112.06.27 112.07.10 第一版 (施工預 舞書) 11 QF-04-01 場前碼頭改善(場前碼頭道路改善 工程) 111 12 15 中工工務宇第 1111214031666 水南工宇第 1206000060號雨 中工工程工符字第 112011808159页 水南工字第 1206007710866 中工工程工程字符 水南工字節 中工工務宇第 水南工字箱 中工水利字簿 水南工字第 中工水利字箱 水南工字箱 中工水利学第 120725052號6

112.01.06

中工工務学符

112.02.16

水南工学館

112.03.17

水南工学箱

112.02.23

中工工程工稿字符 1120223041號函 112.04.14

**水南工字第** 見修正

112.04.20

中工水利学館

112.05.02

水南工宇節

112.05.15

111.06.06 水南曾字第

中工工程工程字簿

112.03.25

第1次 (A1回) 中工工程工符字箱

#### 4.2 文件送審管制總表

未提送,本月屆期提送之文件。 已提送,尚待審閱/核定之文件。 起提送未提送,已逾期預定提送日期。

			預定提送	1	提送日期	回覆日期	回覆	1	提送日期	回覆日期	निक	_	提送日期	同悪口物			19光口地	同要口地	E-1205	1+c+ (7 +0
項次	文件編號	文件名稱	(送審)日期	版次	提送文號	回覆文號	情況	版次	提送文號	回覆文號	回覆情況	版次	提送文號	回覆日期回覆文號	回覆情況	版次	提送日期 提送文號	回覆日期回覆文號	回覆情況	核定日期 核定文號
	20174020X 20040X 20040X	entities and the contract of t		第一版	111.04.22	111.05.13	依審查意	第一版	111.05.20	111.06.06		第一版	111.06.07	口投入加	依核定公		1. 是这类别	日復又號	17370	111.06.06
1	QP-01-01	整體施工計畫	111.04.24	第1次	中工工務字第	水南曾字第	見修正		中工工務字第	水南曾字第	核定	第一版 (核定版)	中工工務字第		文要求檢					水南曾字第
_					1110422019號函 111.10.06	11130025480號函 111.10.14			1110519041號函	11153036400號函		(50210)	1110607057號函		附核定版	_			-	11153036400號函
1	QP-01-02	整體施工計畫	111.10.06	第二版第1次	中工水利字第	水南工字第	核定												-	111.10.14 水南工字第
					111A8E0332號備忘錄	11106049510號函		-	111.05.20	111.00.01			111.00.07		A letto (					11106049510號函
2	QP-02-01	整體品質計畫	111.04.24	第一版	111.04.22 中工工務字第	111.05.13 水南曾字第		第一版	111.05.20 中工工務字第	111.06.01 水南曾字第	核定	第一版	由于工数中等		依核定公文要求檢				-	111.06.01 水南曾字第
				第1次	1110422014號函	11130025480號函	見修正	第2次	1110519040號函	11153036410號函	IN/C	(核定版)	1110607056號函		附核定版	2				11153036410號函
2	OP-02-02	整體品質計畫	111.10.06	第二版	111.10.06 中工水利字第	111.10.14	林中													111.10.14
	Q1-02-02	走规则吴川鱼	111.10.00	第1次	111A8E0332號備忘錄	水南工字第 11106049490號函	核定													水南工字第 11106049490號函
		THE NICOLAR DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE		第一版	111.04.15	111.05.10	依審查言	第一版	111.05.17	111.06.02	<b>佐宝杏</b> 章	第一版	111.06.09	111.06.20		第一版	111.06.23		依核定公	111.06.20
3	QP-03-01	職業安全衛生管理計畫	111.04.24	第1次	中工工務字第 1110415063號函	水南曾字第 11130024090號函	見修正	第2次	中工工務字第 1110517047號函	水南曾字第	見修正	第3次	中工工務字第	水南曾字第	核定	(核定版)	中工工務字第		文要求檢	水南曾字第
		設計工作執行計畫書暨設計品管		第一版	111.03.28	111.04.15	<b>法</b> 帝本辛	第一版	111.04.22	11130029420號函 111.05.10	(+ ch + ch	第一版	1110609001號函 111.05.13	11130031200號函 111.06.20			1110623007號函		附核定版	11130031200號函 111.06.20
4	QP-04-01	計書書	111.03.30	第1次	中工工務字第	水南曾字第	依審查意 見修正		中工工務字第	水南曾字第	一 依審查意 見修正	第3次	中工工務字第	水南曾字第	核定					水南曾字第
				100/2010	1110328042號函 112.01.12	11153025750號函 112.02.01	70.0 11	JUL X	1110422006號函	11153031880號函	) DISTL	735 X	1110513047號函	11130030370號函						11130030370號函
4	QP-04-02	設計工作執行計畫書暨設計品管計畫書		第二版 第1次	中工工務字第	水南曾字第	核定		-		-				-				-	112.02.01 水南曾字第
		川里音		第1六	1120112037號函	11206003160號函														11206003160號函
5	OP-05-01	實施簽證執行計畫書	111.04.24	第一版	111.04.07 中工工務字第	111.04.12 水南曾字第	核定				4									111.04.12
	Q1 05 01	SCHOOL HE THE I	111.01.21	第1次	111040724號函	111300188000號函	12AE													水南曾字第 111300188000號函
6	OD 00 01	5. 4. 14. 6. 4. 7. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	111.00.20	第一版	111.06.30	111.07.27	原則認可 -	第一版	111.08.25	111.09.16										111.09.16
0	QP-06-01	設計階段施工風險評估報告	111.06.30	第1次	中工工務字第 1110630011號函	水南曾字第 11130040300號函	依審查意見 修正	第2次	中工工務字第 1110825002號函	水南工字第 11106042260號函	核定									水南工字第
		Section 10 to 10 carbon below 10 to 10		第一版	111.04.07	111.04.13			1110823002%超	11100042200%因	_									11106042260號函 111.04.13
7	QP-07-01	補充地質調查計畫書	111.04.07	第1次	中工工務字第	水南曾字第	核定				7									水南曾字第
					1110407025號函 111.05.05	11153025130號函 111.05.20			111.05.26	111.06.06	+									11153025130號函]
8	QP-08-01	補充地形測量計畫書	111.04.24	第一版第1次	中工工務字第	水南曾字第	依審查意	第一版	中工工務字第	水南曾字第	核定								-	111.06.06 水南曾字第
				およべ	1110505038號函	11130027290號函	見修正	第2次	1110526012號函	11130029650號函										11130029650號函
9	OP-09-01	既有管線調查計畫	111.04.07	第一版	111.04.07 中工工務字第	111.04.22 水南曾字第	依審查意	第一版	111.04.28 中工工務字第	111.05.05 水南曾字第	核定								4	111.05.05
	N 55 30.			第1次	111040726號函	11153027850號函	見修正	第2次	1110428052號函	11130023220號函	IX.C									水南曾字第 11130023220號函
10	OR 10 01	防汛及緊急應變計畫	111 05 21	第一版	111.05.16	111.06.02	依審查意	第一版	111.06.09	111.06.16	la de	第一版	111.06.20		依核定公					111.06.16
10	QP-10-01	初	111.05.31	第1次	中工工務字第 1110516004號函	水南曾字第 11130029550號函	見修正	第2次	中工工務字第 1110609002號函	水南曾字第 11130032230號函	核定	(核定版)	中工工務字第 1110620006號函		文要求檢 附核定版					水南曾字第 11130033330866
1972			100000000000000000000000000000000000000	第一版	111.05.06	111.06.13	98 S		1110003002 362	11130032230 31(2)			11100200003#25		PISTONALIA					11130032230號函 111.06.13
11	QP-11-01	營建工地逕流廢水汙染削減計畫	111.05.06	第1次	中工工務字第 1110506044號函	水南曾字第	核定												1 1	水南曾字第
				44 UF	111.07.04	11130031260號函 111.07.18	//	65 UE	111.07.21	111.07.27	-	Andre Her	111.08.01		依核定公					11130031260號函 111.07.27
12	QP-12-01	補充地質調查成果報告	111.07.15	第一版第1次	中工工務字第	水南曾字第	依審宣息 見修正	第一版第2次	中工工務字第	水南曾字第	核定	第一版 (核定版)	中工工務字第		文要求檢	1			1 1	水南曾字第
				NI X	1110630012號函	11130038350號函	)UISIL	7027X	1110721029號函	11130040850號函	-	(12XE/IX)	1110801001號函		附核定版					11130040850號函
13	QP-13-01	補充地形測量成果報告	111.09.15	第一版	111.09.08 中工工務字第	111.09.27 水南工字第	核定				+					-			- I	111.09.27 水南工字第
				第1次	1110908058號函	11106046200號函	(MeMasaa													11106046200號函
14	OP-14-01	施工規劃階段施工風險評估報告	111.05.31	第一版	111.05.16 中工工務字第	111.06.09 水南曾字第	原則認可	第一版	111.07.01	111.07.20	林中	第一版	111.07.22		依核定公					111.07.20
14	Q1-14-01	心。工术画的14大小。工术的双杆 10 和 0	111.03.31	第1次	1110516005號函		· 依審查 意見修正	第2次	中工工務字第 1110701001號函	水南曾字第 11130039130號函	核定	(核定版)	中工工務字第 1110722038號函		文要求檢 附核定版					水南曾字第 11130039130號函
1.5	OD 15 01	10 At 9/21 32	444.05.34	第一版	111.05.10	111.05.26	依審查意	第一版	111.05.31	111.06.13										111.06.13
15	QP-15-01	描録影計畫	111.05.31	第1次	中工工務字第 1110511024號函	水南曾字第 11153037140號函	見修正	第2次	中工工務字第	水南曾字第	核定									水南曾字第
				第一版	111.05.16	111.05.26	佐宗本寺	第一版	1110531008號函 111.05.31	11153039190號函 111.06.20										11153039190號函 111.06.20
16	QP-16-01	剩餘土石方處理計畫	111.05.31	第1次	中工工務字第	水南曾字第	依審查意 見修正	第2次	中工工務字第	水南曾字第	核定					Ī				水南曾字第
					1110516001號函 111.05.16	11153037160號函 111.06.09	原則認可		1110531009號函 111.06.30	11153039170號函 111.07.20			111.07.22		依核定公					11153039170號函
17	QP-17-01	交通維持計畫	111.05.31	第一版第1次	中工工務字第	水南曾字第	・依審査	第一版	中工工務字第	水南曾字第	核定	第一版	中工工務字第		文要求檢	-				111.07.20 水南曾字第
				第1次	1110516002號函		意見修正	第2次	1110630048號函	11130039110號函		(核定版)	1110722037號函		附核定版					11130039110號函
18	OP-18-01	墜落災害防止計畫	111.05.31	第一版		111.06.06 水南曾字第	依審查意	第一版	111.06.10 中工工務字第	111.06.16	核定	第一版	111.06.20		依核定公				1 1	111.06.16
	7. 20 01	manager S Int 172 date [81] 305	111.00,01	第1次	1110516003號函	11130029540號函	見修正	第2次	1110610013號函	水南曾字第 11130032270號函	IXAE	(核定版)	中工工務字第 1110620005號函		文要求檢 附核定版					水南曾字第 11130032270號函
10	OR 10 01	柳后用辺弥中計劃	111 07 21	第一版	111.07.21	111.08.03	依審查意	第一版	111.08.08	111.08.12		第一版	111.08.16		依核定公					111.08.12
19	Ób-13-01	鄰房現況鑑定計畫	111.07.31	第1次	中工工務字第 1110721026號函	水南曾字第 11153056170號函		第2次	中工工務字第 1110808002號函	水南曾字第 11153058060號函	核定	(核定版)	中工工務字第 1110816001號函		文要求檢 附核定版					水南曾字第
		84 65 L S S S S			111.10.20	111.10.27			111.11.08	11175070000%四	依備查公		11100100015於图		HITIX ALTIX					11153058060號函 111.10.27
19	QP-19-02	施工前鄰房現況鑑定報告書	111.10.20	初稿	中工工務字第	水南工字第	核定	定稿版	中工工務字第		文要求檢									水南工字第
				66 UC	1111020018號函 112.07.21	11153076880號函 112.08.03		44 11-	1111108009號函 112.08.10		附定稿版									11153076880號函
19	QP-19-03	鄰房監測計劃書		第一版 第1次	中工水利字第	恒士抽识工内给		第一版 第2次	中工水利字第			-				+			-	
				WIV.	112A8E0388號備忘錄	112147號備忘錄	元沙正	年4八	112A8E0431號					4				2		

未提送,本月屆期提送之文件。 已提送,尚待審閱/核定之文件。 未提送,下月預定提送之文件。 應提送未提送,已逾期預定提送日期。

					1			_				_			1			W. Company		
項次	文件編號	文件名稱	預定提送	版次	提送日期	回覆日期	回覆	版次	提送日期	回覆日期	回覆	版次	提送日期	回覆日期	回覆	版次	提送日期	回覆日期	回覆	核定日期
1200000		1	(送審)日期		提送文號	回覆文號	情況		提送文號	回覆文號	情況		提送文號	回覆文號	情況		提送文號	回覆文號	情況	核定文號
20	OP-20-01	管線透地雷達調查成果報告	111.09.05	第一版	111.09.05 中工工務字第	111.09.27 水南工字第	核定				-	1			-					111.09.27 水南工字第
1 20	Q1 20 01	日林及心田是明旦/从小刊日	111.05.05	第1次	1110905044號函	11106046180號函	NAC.													11106046180號函
			222 2222	第一版	112.03.09	112.04.07	依審查意	第一版	112.04.17	112.05.01										112.05.01
21	QP-21-01	閘門安裝分項施工計畫	112.03.15	第1次	中工工程工務字第 1120309027號函	水南工字第 11206018280號函	見修正		中工水利字第	水南工字第	核定	1								水南工字第
		塘土地沿笠工和笠///200 <b>工</b> 和八万	5	AA UE	111.05.20	111.06.02	(A. c.)	- A UE	112A8E0213號備忘錄   111.06.07	11206022360號函	(A) eta eta eta	- AA 110	111.07.01	111.07.11		-				11206022360號函
22	QP-22-01	擴大抽泥管工程管徑300工程分項 施工暨品質計畫	111.06.30	第一版第1次	中工工務字第	水南曾字第	- 依審查意 見修正		由工工教学等	水南曾字第	一 依審查意 見修正	第一版第3次	中工工務字第	水南曾字第	核定					水南曾字第
		振大抽泥管工程		ALV.	1110520024號函	11153038420號函	)UISIL	-	1110607010號图	11153046150號函	)UBIL	3537X	1110701054號函	11130036950號						11130036950號
23	QP-23-01		111.09.15	第一版	111.07.15 中工工務字第	111.08.03 水南曾字第	依審查意		111.08.09 中工工務字第	111.09.05 水南曾字第	核定				-					111.09.05 水南曾字第
	Q, 25 52	(含分項品質計畫)	111,05,115	第1次	1110715004號函	11153054530號函	見修正	第2次	1110809003號函	11130047490號函	L.L.									11130047490號函
22	00 00 00	擴大抽泥管工程	440.07.00	第一版	112.07.20	112.08.23	依審查意	第一版	112.08.29											
23	QP-23-02	(5K+100~10K+750)分項施工計畫(含分項品質計畫)	112.07.20	第1次	中工水利字第	擴大抽泥工字第	見修正	1000	中工水利字第											
			-	A	112A8E0385號備忘錄 111.05.20	112158號備忘錄 111.06.06	44 charte de	- AA- UE	112A8E0461號備忘錄 111.06.10	111.07.21	0	- Arr III	111.07.26	111.09.15	原則同意・		111.09.22	111.10.11		111.10.11
24	QP-24-01	放水渠道工程分項施工暨分項品質計畫	111.09.30	第一版第1次	中工工務字第	水南曾字第	依審宣息   見修正	第一版第2次	中工工務字第	水南曾字第	一依審查意 見修正	第一版第3次	中工工務字第	水南工字第	依審查意見	第一版	中工工務字第	水南工字第	核定	水南工字第
		58-355MG 3-355		91X	1110518009號函	11153038780號函	元沙丘	₩Z-X	1110610041號函	11153052340號函	光修正	第3六	1110726024號函	11106042660號	修正		1110922019號函	11106048010號函		11106048010號函
24	QP-24-02	放水渠道工程分項施工計畫 (2K+400~4K+530)(含分項品質	112.07.20	第一版	112.07.20 中工水利字第		-				-				-					
	Q. 2.1 02	計畫)	112.07.20	第1次	112A8E0387號備忘錄															
25		壩前碼頭道路改善工程分項施工		組設圖說及	112.01.14			第一版	112.07.25			1								
25	QP-25-01	暨分項品質計畫	112.01.15	核定後提送	中工水利字第		1	第1次	中上水利学第											=
		<b>康前唯商等收上加工和八百代工</b>		SA NC	112A8E0032號備忘錄 111.07.15	111.08.03	(+ = + -	-	112A8E0400號備忘錄 111.08.09	111.09.05	+	+		1						111.09.05
26	QP-26-01	壩前碼頭管路上架工程分項施工 暨分項品質計畫	111.07.15	第一版第1次	中工工務字第	水南曾字第	依審查意 見修正	第一版第2次	中工工務字第	水南曾字第	核定				1					水南曾字第
		壩前碼頭改善工程(∮400、∮		2017	1110715003號函	11153053760號函	JUINT	7027	1110809001號函	11153061440號函										11153061440號函
26	OP-26-02	500HDPE抽泥管固定工程)分項施	112.07.20	第二版	112.07.20 中工水利字第	112.08.09 擴大抽泥工字第	依審查意	第一版	中工业利ウ密		-	1								
1922		工計畫(含分項品質計畫)		第1次	112A8E0386號備忘錄	112151號備忘錄	見修正	第2次	112A8E0448號備忘錄											
27	00.07.01	特高壓工程分項施工暨分項品質	4424420																	
27	QP-27-01	計畫	112.11.30																	
				第一版	111.09.30	111.10.18	<b>分</b> 索木等	第一版	111.11.02	111.11.25										111.11.25
28	QP-28-01	地下管線保護與復舊計畫	111.09.30	第1次	中工工務字第	水南曾字第	依審查意 見修正	第2次	中 上 水 村 字 第	水南工字第	核定				1					水南工字第
-					1111110930002號函 112.01.14	11106050950號函 112.02.08	100000000000000000000000000000000000000		111A8E0373號函 112.02.24	11106058280號函 112.03.30	-	-	112.04.14	112.05.05	-				_	11106058280號函 112.05.05
29	QP-29-01	SP500抽泥管管路試壓計畫	112.01.15	第一版	中工水利字第	擴大抽泥工字第	依審查意	第一版	中工水利字第	擴大抽泥工字第	依審查意	第一版	中工水利字第	水南工字	核定				}	水南工字第
	<u> </u>			第1次	112A8E0033號備忘錄	112025號備忘錄	見修正	第2次	112A8E0114號備忘錄	112064號備忘錄	見修正	第3次	112A8E0209號備忘錄	第11206022980號函						11206022980號函
30	OP_30_01	現地填方固化處理試拌計畫	111.04.04	第一版	111.03.28 中工工務字第	111.04.12 水南曾字第	核定				-				-					111.04.12 水南曾字第
] 30	Q1-30-01	坑地块// 国 I / 题 / 即 / 时 回	111.04.04	第1次	1110328021號函	小角音子第 11153025120號函	1XXE										l			小州首子第 11153025120號函
		21 - 5029 2 2		第一版	112.03.15	112.05.03	<b>雄列・依害</b>	第一版	112.05.12	112.06.05										112.06.05
31	QP-31-01	水工機械安裝分項施工計畫	112.03.15	第1次	中工水利字第	擴大抽泥工字第	查意見修正	第2次	中上水利学第	水南工字第	核定									水南工字第
	3				112A8E0148號備忘錄 111.06,21	112090號備忘錄 111.06.30	同音处理		112A8E0261號 111.07.21	11206028810號函									-	11206028810號函
32	QP-32-01	渠道箱涵鋼模支撐計畫(含計算書)	111.09.30	第一版	中工工務字第	水南曾字第	同意辦理 · 依審查意見	第一版第2次	中工工務字第		1								Ì	
				第1六	1110621007號函	11153046790號函	修正	第2六	1110721001號函											
33	QP-33-01	放水渠道試運轉計畫	113.09.30	-							-				-				-	
24	OD 24 01	惊 土地沿垒 500垒 须针湿 拖土 争	112.00.20					<u> </u>												
34	Qr-34-UI	擴大抽泥管500管徑試運轉計畫	113.09.30																	H. W. Carlotte, and the second
35	OD. 25 01	擴大抽泥管300管徑試水計畫	111.12.31	第一版	111.12.30	112.01.19	依審查意		112.02.08	112.03.15	依審查意		112.03.22	112.04.18	核定				1	112.04.18
33	QP-35-01	横入畑ル官300官徑與水計畫	111.12.51	第1次	中工水利字第 111A8E0493號備忘錄	擴大抽泥工字 第112013號備忘錄	見修正	第2次	中工水利字第 112A8E0078號備忘錄	擴大抽泥工字第 112054號備忘錄	見修正	第3次	中工水利字第 112A8E0162號函	水南工字第 11206019110號函	校上					水南工字 第11206019110號函
36	OP-36-01	特高壓輸變電測試計畫	113.12.31		1111 (OLO 190 )(() () () ()	JULIEU I S JAN DATE OF			TILI IOCOOT O SHEREICH SA	11203 13/00/10/3/			111/10101012/011	11200013110302						))JIII20001JII0))(E)
	Δι 20-0T	的印生物文电灯时间里	113,12,31		111.05.00	111.0000			111.07.01	444.0015			444.00.00	111.4044						444.42.43
37	OP-37-01	現地填方固化處理拌合成果報告	111.06.08	第一版	111.06.08 中工工務字第	111.06.28 水南曾字第	依審查意	第一版	111.07.01 中工工務字第	111.09.15 水南工字第	原則同意 · 依審查意見	第一版	111.09.20 中工工務字第	111.10.11 水南工字第	核定				-	111.10.11 水南工字第
0,	Q1 37 01	7070-X71 I TOME PET LINGS THE LINGS	111.00.00	第1次	1110608049號函	11153044060號函	見修正	第2次	1110701052號函	11106042720號函	修正	第3次	1110701052號函	11106048000號函						11106048000號函
20		an Art Complete State of the St		第一版	111.09.30	111,10.13	依審查意	第一版	111.10.18	111.11.11										111.11.11
38	QP-38-01	SP鋼管製作計畫	111.09.30	第1次	中工水利字第 111A8E0321號函	水南工字第 11153075140號函			中工水利字第 111A8E0347號函	水南工字第 11106056230號函	核定									水南工字第 11106056230號函
				第一版	112.04.12	112.05.04	<b>法宗本</b> 李	第一版	112.05.12	112.05.30										112.05.30
38	QP-38-02	SP鋼管製作計畫/第二料源		第1次	中工水利字第	擴大抽泥工字第	依審查意 見修正		中工水利字第	水南工字第	核定									水南工字第
					112A8E0205號備忘錄	112092號備忘錄			112A8E0264號	11206027880號函			:							11206027880號函
39	QP-39-01	閥類製作計畫	112.01.15	第一版	111.09.29 中工水利字第	111.10.13 水南工字第	依審查意		111.10.20 中工水利字第	111.11.11 水南工字第	核定								-	111.11.11 水南工字第
522		10000000000000000000000000000000000000	- 04-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14	第1次	111A8E0316號備忘錄	11153075150號	見修正	第2次	111A8E0351號函	11106055650號函	E. (1) EE									11106055650號函
40	OD 40 01	混凝土澆置工程分項施工計畫	111.06.20	第一版	111.06.17	111.06.28	依審查意	第一版	111.07.01	111.07.06	拉中									111.07.06
40	Qr-40-01	/	111.06.30	第1次	中工工務字第 1110617023號函	水南曾字第 11153044060號函	見修正	第2次	中工工務字第 1110701026號函	水南曾字第 11153047900號函	核定									水南曾字第 11153047900號函
7875	Marie Wall		COMES COMM	第一版	111.06.07		退件・納入「各		22201020203022											
41	QP-41-01	鋼筋工程分項施工計畫	111.09.15	第1次	中工工務字第	水南曾字第	分項工程施工計 商(含分項品資計 商)。将官													不再各案提送
					1110607038號函	11153040930號函	市)」撰寫													

未提送,本月屆期提送之文件。 已提送,尚待審閱/核定之文件。 未提送,下月预定提送之文件。 應提送未提送,已逾期預定提送日期。

項次	文件編號	文件名稱	預定提送	16-4	提送日期	回覆日期		版次	提送日期	回覆日期	回覆	把一切	提送日期	回覆日期	回覆	地方	提送日期	回覆日期	回覆	核定日期
块火	人口細切	人什有的	(送審)日期	NX-X	提送文號	回覆文號	情況	AX-X	提送文號	回覆文號	情況	放火	提送文號	回覆文號	情況	/UX-7	提送文號	回覆文號	情況	核定文號
				第一版	111.06.07	111.06.10	退件・納入「放 水頭道工程分項									1				
42	QP-42-01	噴凝土工程分項施工計畫	111.06.30	第1次	中工工務字第 1110607044號函	水南曾字第 11153040960號函	工程施工計畫(含 分項品質計畫)」 撰寫													不再各案提送
				第一版	112.04.14	112.05.02	依審查意	第一版	112.05.12	112.06.05 水南工字第										112.06.05 水南工字第
43	QP-43-01	植栽分項施工計畫	112.04.14	第1次	中工水利字第 112A8E0207號備忘錄	擴大抽泥工字第 112089號備忘錄	見修正		中工水利字第 112A8E0262號	水南工字第 11206028780號函	核定									水南工字第 11206028780號函

項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 16
		編	號	1
		地		點
	2023-18	2:		水渠道 50~2K+380
	第四工作面)第十九單元鋼模組立。		-	0000 00 10
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 16
		編地	號	2 點
説明:查	直核缺失改善及成果檢討會議。			<b>有水局</b> 告會議室
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 17
1		編	號	3
3/32		地		點
説明:邊	<b>坡</b> 噴凝土。	2		水渠道 50~2K+380

項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 17
		編	號	4
		地		點
		2]		水渠道 50~2K+380
説明:(	第四工作面)第十九單元鋼模組立。			
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 18
		編	號	5
<b>*</b>	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	地		點
説明:逡	坡噴凝土。	2K		水渠道 0~2K+410
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 18
		編	號	6
<u></u>		地	* #E	點
說明:(3	第四工作面)第十九單元頂版鋼筋綁紮。	2]		水渠道 50~2K+380

説明:(第四工作面)第二十單元底版混凝土澆置。 項 目 放水渠道工程 説明:(第四工作面)第十六單元項版抗磨層混凝土澆置。 項 目 放水渠道工程	E		7 水渠道 80~2K+410 2023.08.18 8		
說明:(第四工作面)第二十單元底版混凝土澆置。 項 目 放水渠道工程 說明:(第四工作面)第十六單元項版抗磨層混凝土澆置。	2K 日 編	<b>期</b>	水渠道 80~2K+410 2023.08.18		
說明:(第四工作面)第二十單元底版混凝土澆置。 項 目 放水渠道工程 說明:(第四工作面)第十六單元頂版抗磨層混凝土澆置。	日編	<b>期</b>	80~2K+410 2023. 08. 18		
説明:(第四工作面)第十六單元頂版抗磨層混凝土澆置。	編	30 10030			
		號	8		
	地		1767		
			點		
	放水渠道 2K+260~2K+290				
項 目 放水朱迪工程	-	ılın İ	2022 00 10		
		期號	9		
		J)/L			
説明:開挖整地。	地 進水口段 0K120~0K150				

項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 19
		編	號	10
		地		點
	2028, 08, 19	2		水渠道 80~2K+410
	<b>造坡噴凝土。</b>	-	Дm	2022 00 10
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 19
		編	號	11
		地		黑上
説明:(	第四工作面)第十九單元頂版混凝土澆置。	21		水渠道 50~2K+380
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 19
		編	號	12
		地		點
説明:(3	第四工作面)第二十單元底版及牆身鋼筋綁紮。	2		水渠道 80~2K+410

項目	女业海洋工和		Hn	2023. 08. 21
-	放水渠道工程	日	期	
		編	號	13
		地		點
說明:(	第四工作面)第二十單元鋼模組立。	2		水渠道 880~2K+410
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 21
10.50 A		編	號	14
		地		黑上
AN III . BE		01		水口段 20~0K+150
	挖整地。			0000 00 00
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 22
	ACDINUTE OF	編	號	15
		地		點
說明:(5	第四工作面)第二十單元頂版鋼筋綁紮。	2.		水渠道 80~2K+410

項目	放水渠道工程	日	期	2023, 08, 23
		編	號	16
		地		點
		,,	计	水渠道
	2023. 08. 23	21		80~2K+410
說明:(	第四工作面)第二十單元頂版混凝土澆置。			
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 23
		編	號	17
		地		點
		21		水渠道 90~2K+320
說明:(	第四工作面)第十七單元抗磨層澆置。			
項目	擴大抽泥工程	日	期	2023. 08. 23
		編	號	18
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	地		黑占
説明:支	2023.08.23 E座鑽孔。			0sp抽泥管 228~6K+117

項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 24
		編	號	19
	Was a superficient	地		點
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	引挖整地。	0		水口段 50~0K+200
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 25
		編	號	20
		地		點
説明: 片	把整地。	0		水口段 50~0K+200
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 25
a		編	號	21
		地		點
說明:物	料整理吊運。	方	文水	渠道工區

項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 25
		編	號	22
		地		點
	2023 08. 25	2		水渠道  20~2K+350
說明:(	第四工作面)第十八單元抗磨層混凝土澆置。			
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 26
		編	號	23
		地		黑占
説明: 阝	据控整地。	0		水口段 50~0K+200
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 26
	The Thirty Co.	編	號	24
		地		點
説明:物	2023.08.26	方	<b>效水</b>	渠道工區

項目	放水渠道工程	日日	期	2023, 08, 28
		編	號	25
: 2		地		點
説明: [	用挖整地。	0		水口段 50~0K+200
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 28
100		編	號	26
		地		點
	THE PARTY OF A	方	<b>文水</b>	渠道工區
說明:物	<b>为料整理吊運。</b>			
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 28
		編	號	27
		地		點
説明:(	第四工作面)第二十單元箱涵填縫劑施作。	2		水渠道 80~2K+410

項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 29
		編	號	28
		地		點
20 no - B	Live at 11.	0		水口段 50~0K+200
項目	月挖整地。 放水渠道工程	日	期	2023. 08. 29
块 口	从小示坦一柱	編	號	29
		地	3/10	
台·田· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2023.08.29—2023.08.200.08.29—2023.08.200.08.200.08.200.08.200.00.200.00.200.00.200.00.200.00.200.00.	方	<b>文水</b>	渠道工區
項目	放水渠道工程	日日	期	2023. 08. 29
7 日	从小来追上在 (1) (1) (1) (2) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	編	號	30
		地	<b>3</b> // <b>0</b>	點
説明:(3	第四工作面)第十七單元及第十八單元箱涵填縫劑施作。	V		水渠道 90~2K+350

項目	放水渠道及擴大抽泥工程	日	期	2023. 08. 29
		編	號	31
	4	地		黑占
	2023, 08.29			南水局 告會議室
	第14次施工及進度檢討會議。	п	Ho	2023. 08. 30
項目	放水渠道工程	日始	期	32
		編	號	
		地		
	2028. 08° 50 v	0		水口段 50~0K+200
説明: 脖	<b>見挖整地。</b>			
項目	放水渠道工程	日	期	2023. 08. 30
		編	號	33
VET W		地		點
説明:(	第四工作面)第十九單元抗磨層混凝土澆置。	2		水渠道 80~2K+410

## 6. 附件


附件一 計畫時程網狀圖

附件二 計畫時程桿狀圖 (含前後一個月作業項目時程圖)

附件三 進度表與S進度曲線


附件四 工作數量累計完成表

附件五 晴雨表(含逐時降水量月報表)

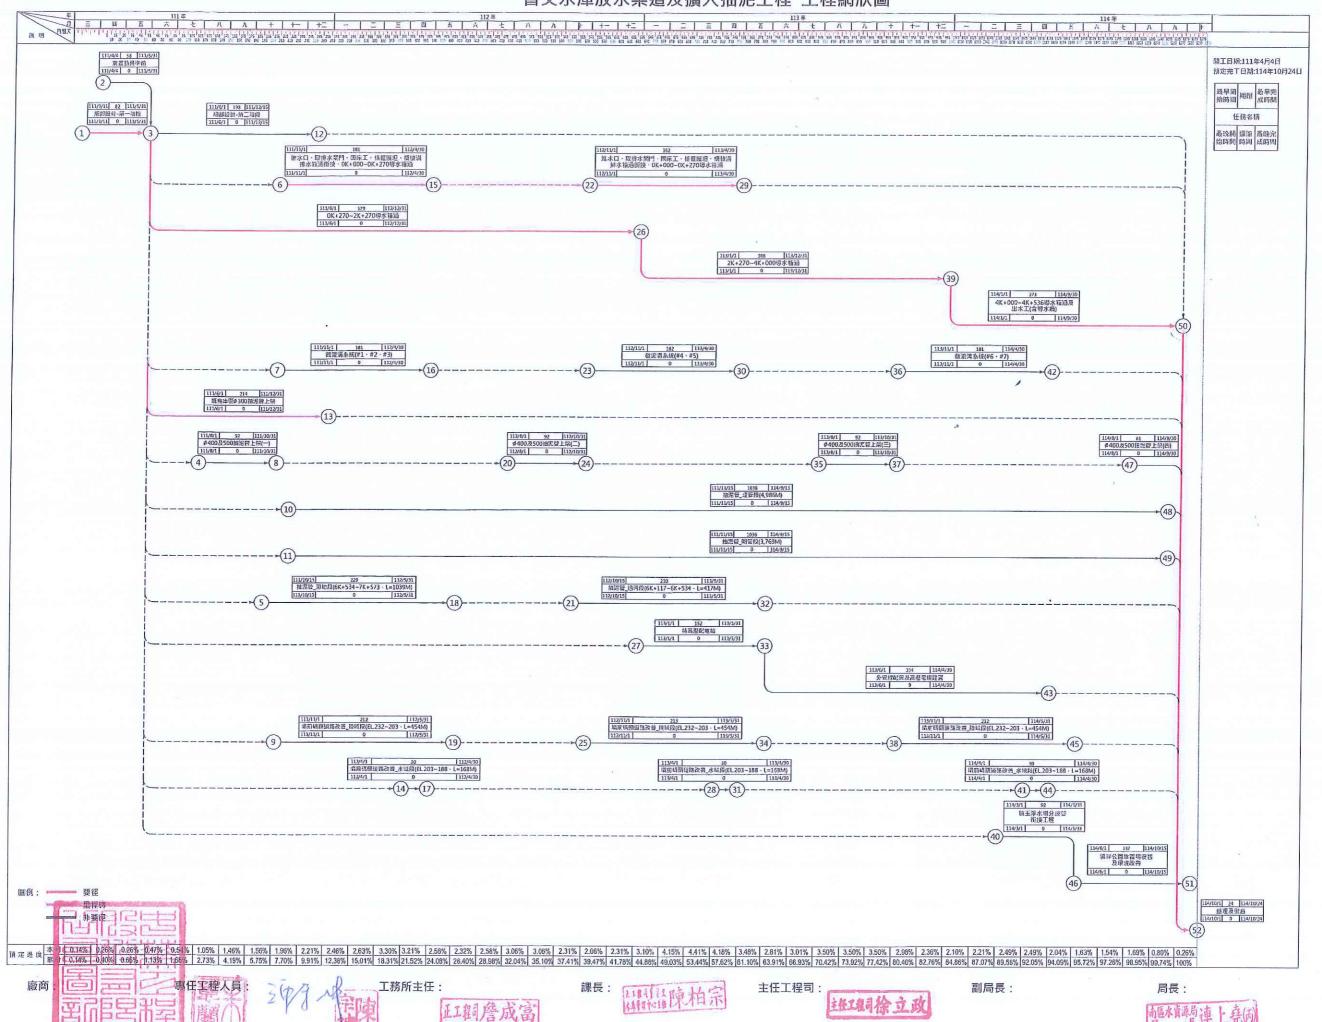

#### 曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程-施工桿狀圖

(至 112年08月31日 )

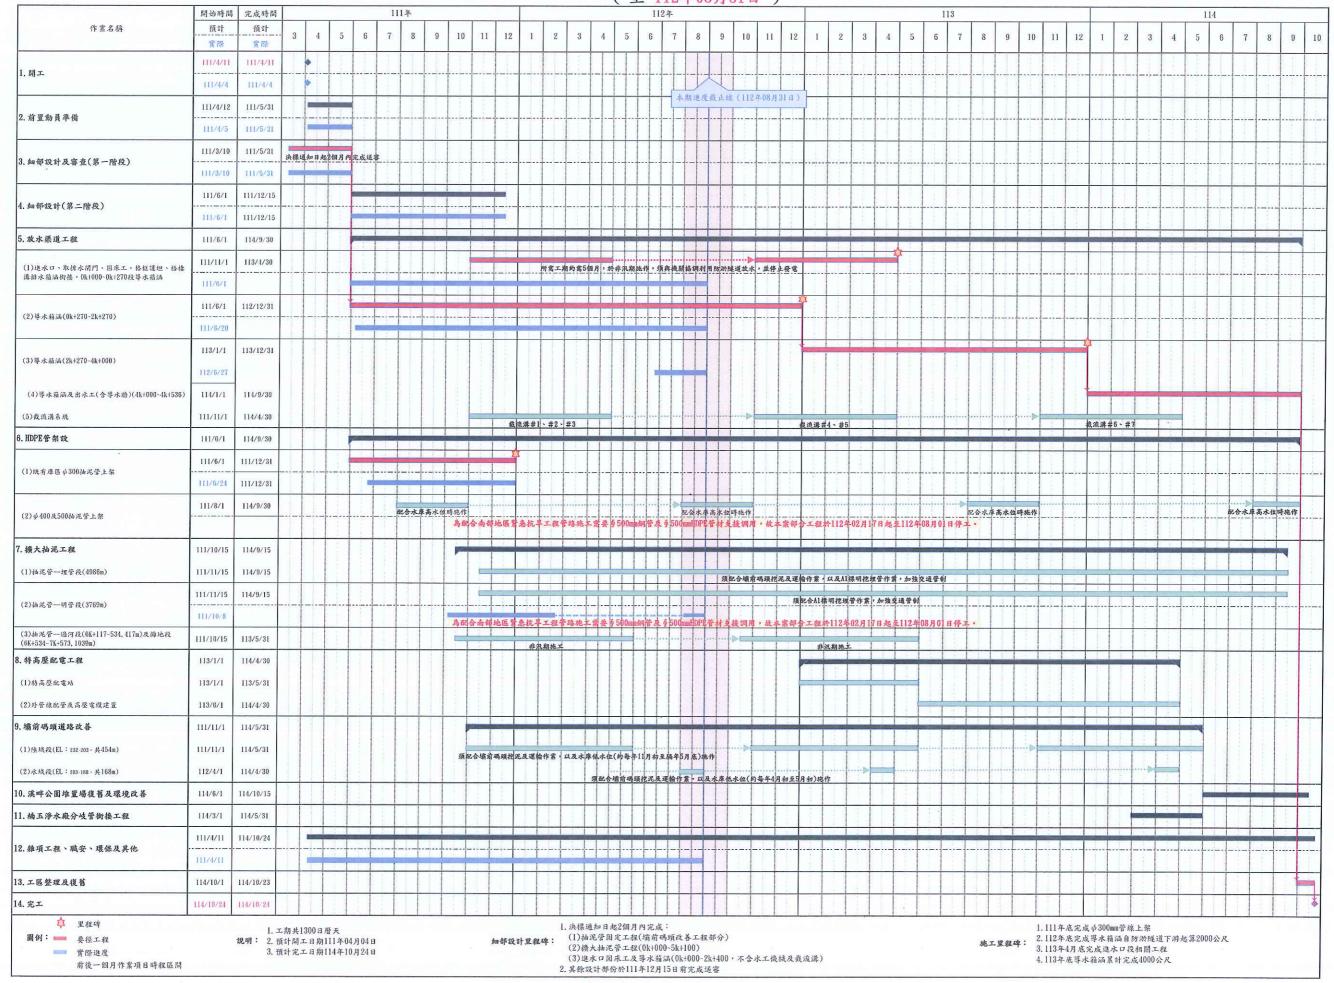

### 曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程 預定/實際進度表與S進度曲線

( 111年04月04日 至 112年08月31日 )

<b>引工日期:111年 04</b> 月	1 04 F																																																				定進度曲 緊進度曲
上 1 朔 · 111 十 04 /	1 04 11						1	11年													112年															113年										_	-		114年			A DV	Legen
工程項目	工程全部	推重 (%)	4月	5月	6月			8月	9月	10月	11	月 1	2月	1月	2月	3)	1 4	月	5月	6月		月	8月	9月	10月	11	1月	12月	1月	2月	3	月	4月	5月	6月	1	8	月	9月	10月	11月	12,	月 1	А	2月	3月	4月	5月	-	月	7月	8月	9月
		1.42	4-15 16-	0 1-15 16-	31 1-15 1	6-30 1-1	16-31 1-1	5 16-31 1	-15 18-30	1-15 16-3	31 1-15	16-30 1-15	16-31 1	-15 16-31	1-15 16-	28 1-15	16-31 1-15	16-30 1	1-15 16-3	1 1-15 16	-30 1-15	16-31 1-	15 18-31	1-15 16-3	0 1-15 16	6-31 1-15	16-30 1-	15 10-31	1-15 16-31	31 1-15 1	6-29 1-15	16-31 1-	15 16-30	1-15 16-3	1-15 16-	30 1-15 1	6-31 1-15	15-31 1-	15 16-30	1-15 16-31	1-15 16-3	20 1-15 1	16-31 1-15	16-31 1-	-15 16-29	1-15 16-31	1-15 16-	10 1-15 16	-31 1-15	16-30 1-1	i 16-31 1	-15 16-31	1-15 15-30
水渠道工程																																																				-	-
水口、取排水閘門、圖床工、格框 播樓溝排水箱溫街樓。 )-0k+270段等水箱涵	116, 173, 08	0 6, 4184%									1,50%	1,50% 2,500	2.50% 4.	00% 4, 09%	5. 80% 5. 0	25 5,00 k	. 00% 4. 00%	4.00%								2.59%	2.50% 5.0	5, 00%	. 00% 6. 00Y	0x 6,60x 6.	. eax   6, 80 t	6,00% 2,3	595 2, 59%																	NA			
水箱汤(0k+270-2k+270)	302, 440, 000	0 16 7094%			0, 50% 0,	,50% 0,50	0.50% 1.00	5 1.005 1.	50% 1,50%	1,505 1,50	2,50%	2,50% 2,50%	2,50% 2.	503 2,593	2,50% 2,5	X 4,50%	1,50% 4,50%	4,50% 4,	36% 4,56%	4,565 4.	50% 4,50%	4.50% 4.5	9% 4,59%	1, 59% 4, 59	2.00% 2.0	06% 1,06%	1,005 0.5	01 0,565																				N S					
ray man (unit to an a tu)	2027 1107 00																																							004 5 004							0						
水箱涌(2k+270~4k+000)	261, 610, 600	0 14, 4536%																	+				11					1	. 50% 1, 50%	4,005 4.	.005 4.005	4,00% 5,0	05 5,005	5, 984 5, 00	5,001 5,0	05 5,005 5	5, 50%	5, 90 ( 5, 6	05 5,005 3	. 00% 5, 00%	4,005 4,01	05 1,505 1	.50%		1	N							
水箱涌及出水工(含導水 lk+000-4k+536)	86, 528, 100	0 4,7806%																																									1,00%	1.00% 2.5	501 2.50%	B, 00% 6, 00%	18,60% 18,0	10,094 10.0	66% T, 50% T	7, 30% 7, 50	7, 50% 4.	003 4, 005 1	1, 30% 1, 56
											1.50%	1.30% 3.00%	3,691 3.	00% 3, 00%	3,00% 3,0	X 3.00%	.00% 1.50%	1.50%								1.50%	1.50% 3.0	01 3,001	. 99% 3, 99%	x 3,00% 3.	00% 3,00%	3.00% 1.5	60% 1,50%								1,50% 1,50	05 3,005 3	1.00% 4.00%	4,00% 5.0	00% 5, 00%	5, 00% 5, 00%	1.50% 1.50	<u> </u>					
<b>支流溝系統</b>	67, 071, 200	3, 7056%																																							5												
楠玉淨水廠分岐管銜接工程	4, 100, 000	0, 2431%																																						100						15.00%	20.00% 20.0	15,005 15,0	001			-	
资大抽泥工程											H		Н										$\Box$																														
<b>山泥管─埋管投(4986m)</b>	144, 419, 490	7. 9790%										1.00% 0.56%	0.50% 0.	15% 0, 75%	0.75% 0.7	N 0.73% (	75% 1,00%	1.00% 1.	005 1,005	1,00% 1.0	00% 1, 50%	1,595 1,50	1,59%	.50% 1.50%	1.50% 1.5	50% 1.50%	1.504 1.5	05 1,56%	59% 1.59%	x 1,59% 1.	50% 2.00%	2.00% 2.0	0% 2.00% 2	.00% 2.00%	2.90% 2.0	9X 2,00X 2	00% 2,00%	2,061 2,0	55 2.00% 2.	0B\$ 2.60%	2,00% 2,00	05 2.805 2.	. 90% 2, 00%	2,005 1.50	50% 1,50%	1, 50% 1, 50%	1.50% 1.50	\$ 1,50% 1.5	50% 1,50% 1	1, 50% 1, 60%	1.005 1.0	005 1,005 0	0, 50%
												1.00% 0,55%	0.50% 0.	15% 0.75%	0.75% 0.7	\$ 0.755 6	. 75% 1, 00%	1.00% 1.	00% 1,00%	1.00% 1.0	1, 50%	1.50% 1.50	N 1.56N I	.50% 1.50%	1.50% 1.5	50% 1.56%	1,50% 1,5	01 1.501	.50V 1.50V	N 1.50% 1.	50% 2.00%	2,00% 2,0	0% 2,00% 2	. 80% 2. 00%	2,00% 2,0	2.00%	001 2,551	2.00% 2.0	03 2.003 2.	00% 2,00%	2,00% 2,00	93 2,00% 2,	. 00% 2, 00%	2,00% 1,56	50% 1.50% 1	1, 50% 1, 50%	1.50% 1.50	1,50% 1.5	50V 1.50V 1	1.50% 1.00%	1.00% 1.	1.00% 0	0.50%
抽泥管明管投(3769m)	111, 285, 763	6, 1484%																																		1	0																
ы泥管──過河段(6K+117-534,417m) 地段(6K+534-7K+573,1039m)	36, 824, 595	i 2, 0345%								2,003	5 1,50N I	1.30% 2.50%	2.501 2.	2,50%	2, 50% 2, 50	2.50% 2	50% 2,50%	2,50% 2,	50% 2.50%						5,0	00% 4,00%	1.90% 4.9	0% 4.06% 5	00% 5,00%	5.00% 5.	00% 5, 00%	5, 90% 4, 0	0% 4,00% 3	. 00% 3, 00%	JI JI																		
1.HDPE管架設																												$\Box$						ø	N. C.																		
· 有庫區 ψ 300 抽泥管上架	9, 840, 600	0,5437%	12		0.50% 0,	50% 0.50%	0,50% 1.00	1,66% 1.	50% 1.50%	2, 50% 2, 50%	2,50% 2	2, 50% 3, 00%	3, 60% 3,	6% 3, 06%	3, 66% 3, 66	3,50% 3	50% 3,50%	3,50% 4,6	00% 4,90%	4.50% 4.5	03 4,50%	4,59% 4,00	4 1.00%	, 00% 4, 00%	2,50% 2,5	56% 1,56%	1,50% 0,50	0,50%						8																			
100 V 70031 V 87 1 F	97 015 000	1 95792					2. 50	2.50% 5.0	00X 5.00X	5.00% 5.00%												5, 00	5.001 5	. 88% 5. 88%	5.00% 5.0	00%						A					5, 001	5, 00% 5, 0	n 5,00% 5.	00A 3,00A											5.1	10% 5. 00% 2.	2.50% 2.50
400及500抽泥管上架	87, 915, 000	4. 8512%														H		-	-													1																					
特高壓配電工程																												5	995 5, 005	18, 00% 10,	12,50%	12,50% 12,5	65 12,565 10	10,005																			
<b>等高壓配電站</b>	54, 476, 500	3,0098%																												1																							
外管线配管及高壁電纜建置	72, 180, 000	3, 9878%															8												1					1	2, 50% 2, 50	3,00% 5.	00% 5, 00%	5, 983, 5, 96	5, 00% 5.	00% 5, 00% 5	5, 00% 5, 00	5.00% 5.	. 60% 3. 00%	5, 00% 5, 00	0% 5,00% 5	, 00% 5, 00%	2,50% 2,50						
續前碼頭道路改善													Ţ															1																									
生城段(EL:232-203・共454m)	51, 278, 392	2, 8331%									1,58% 1	1.30% 1.50%	1.50% 2.5	03 2,505 2	2, 30% 2, 50	2,50% 2	50% 2,50%	2,50% 2,5	50% 2,50%							1.50%	1.504 1.50	1.50% 2	50% 2.50%	3,00% 3.	90% 2.50%	2.50% 2.50	os 2.50% 2.	504 2,50%							2,50% 2,50%	s, 2,50% 2.	50% 2,50%	2,50% 3,00	0% 3,00% 3	.00% 3,00%	2,50% 2,50	2.50% 2.50	(1,				
水域段(EL: 203-188,共168m)	4, 195, 180	0.93185															16,56%	16, 50%							N. M.							15, 59	95 18,505														17,00% 17,00						
小风仪(比, 200-100, 共100世)	4, 135, 169	0.20103																				_		1																									No management				12:56N 12:56N
<b>实畔公園堆置場復舊及環境改善</b>	10, 600, 000	0. 5525%																			M	d	1	1																									1,504 1,	. 30% 12.50%	12.304 12.30	V 12, 50% 12.	2.564 12.564
由項工程	67, 641, 000	3, 7371%			0.25% 0.2	25% 0, 25%	0.25% 0.50%	0,50% 0.5	0.50%	0, 75% 0, 75%	0.75% 0.	1,75% 1,00%	1,00% 1.6	03 1.003 1	, 25% 1, 25	1, 25% 1.	25% 1,25%	1,25% 1.5	1.50%	1.50	1.50%	1,50% 1.50	1.50% 1.			1124-08	8月份預定	速度 3.	600 %	1,59% 1,3	50% 1.50%	1.50% 1.50	N 1,56% 1.	56\ 1.50\	1.50% 1.50	1.56% 1.	50% 1,50%	1.50% 1.50	1,50% 1.	50% 1,50% 1	.50% 1.50%	1,505 1.	50% 1.50%	1,50% 1,50	0% 1.50% 1.	.50% 1.50%	1.50% 1.50%	1, 25% 1, 25	1, 00% 1.	.00% 1.00%	1.00% 1.00	1,00% 0.	. 50% 0. 50%
			8,50% 11,50	5, 60% 5, 00%	5,00% 5,6	00% 7,50%	7, 50% 5, 00%	5,00% 5.0	0% 5, 00% 5	5, 00% 5, 00%	5, 00% 5,	. 00% 5, 00%			+					N		-		(	112, 08, 10	6-112.08	8, 31) 預定	速度 1. 速度 2.				+		+	+		+			++		H	+								+	+	
申都設計	25, 400, 000	1. 4033%															- A	, a	100							П																										11	
或案安全衛生管理費	28, 168, 739	1,5563%			0,25% 0,2	25% 0, 23%	0,25X 0,50X	0, 30% 0, 5	0x 0.50% 0	0. 75% 0. 75%	0,75% 0,	, 75% 1, 00%	1.00% 1.0	X 1,00% 1	.25% 1.25	1,25x 1.	25% 1, 25%	1,05% 1.3	0% 1.50%	1,50% 1,50	1,59%	1.50% 1.50°	1,50% 1.	50% 1.50%	1,50% 1,36	0% 1,50% 1	1,50% 1,50	1,50x 1.	58% 1.50%	1.50% 1.5	50% 1,50%	1,50% 1,50	x 1,50x 1.	50% 1.50%	1,50% 1,59	1, 50% 1.	50% 1,50%	1.56% 1,50	1,30% 1.1	50X 1.50% 1	.50V 1,50V	1, 30% 1,3	30X 1.50X	1,50% 1,50	0% 1,50% 1.	.50% 1,30%	1,50% 1,50%	1, 25% 1, 25	X 1, 80% 1.	.00X 1.00X	1.00% 1.00	1,00% 0,	0.50%
<b>環境保護措施費</b>	27, 190, 000	1, 50223			0. 25% 0. 2	25% 0.25%	0.253 0.505	0.50% 0.5	9% 0.50% 0	0.75% 0.75%	0.755 0.	. 75% 1.00%	1.00% La	1.005 1	. 25% 1. 25	1. 25% 7.	251 1.251	1.25N 1.5	0% 1, 59%	1,50% 1,50	1. 50%	1,50% 1,50%	1.56% L	50% 1.50%	1.505 1.50	0% 1.58% I	1.50% 1.50	1,505 1.	59% 1.50%	1.50% 1.5	ios 1.505	1.50% 1.50	X 1.50% 1.	50% 1.50%	1.50% 1.50	1.30% 1.	50% 1.50% I	1.59% 1.50	1.505 1.5	50% 1.50% 1	.50% 1.50%	1.50% 1.5	50% 1.50%	1.591 1.501	1.50% 1.	50% 1.30%	1.50%   1.50%	1. 25% 1. 25	X 1.00% 1.	.00% 1,00%	1.00% 1.00	1.00% 0.3	, 50% 0, 50%
<b>永况亦设信</b>	21, 120, 000	1.00224	-													0																																				N 1.00% 9.3	
品質管制作業費	24, 442, 564	1.3504%			0, 25% 0, 2	0.201	0, 255 0, 505	0.58% 0.5	95 0.505 0	1,155 0,155	0, 154 0.	1.005	1.00% 1.0	1.005	April 1. 25°	1.254 1.	25% 1.25%	1.25% 1.5	0. 1.50.	1.50% 1.50	1.50%	1.50% 1.500	1.50. 1.	59% 1,59%	1,50% 1,50	05 1.505 1	1,505 1,50	1,504 1,	1,505	1.50% 1.5	05 1.505	1.509 1.50	5 1.395 I.	30% 1.30%	1.50% 1.50	1,30% 1.	1,50%	1.305 1.30	1 1. 50% 1, 3	95 1, 295 1	. 201 1, 501	1, 299 1, 3	304 1,304	1.003 1.00	1.204 1.	205 1.205	1.595 1.595	1.191 1.19	n 1. 995 1.	.00% 1.00%	1.005	1.00% 0.3	504 0.504
廠商管理什費	98, 459, 114	5, 43975	.50% 0,50%	0,50% 0,50%	0,50% 0,5	0, 50%	0.50% 1.00%	1.00% 1.00	0% 1,60% 1	. 00% 1, 00%	1.00% 1	001 101	1.90% 1.0	1,00% 1.	.00% 1.00%	1,60% 1.	30% 1,00%	1.00% 1.00	0% 1,00%	1,00% 1,00	1.50%	1, 59% 1, 56%	1,50% 1,	50% 1,50%	1,50% 1,50	05 1,505 1	1,50% 1,50	1,505 1.	1,505	1,50% 1.5	01 1,505	1.50% 1.50	1,56% 1.	50% 1,50%	1.50% 1.50	1,50% 1.	50% 1,50% 1	1,50% 1,50	1, 50% 1, 5	0% 1,50% 1	.50\ 1.50\	1,50% 1,5	50% 1,50%	1,50% 1,50%	1,50% 1,	90% 1,00%	1,00% 1,00%	1.00% 1.03	S 1.00% 1.	00% 1.00%	1,00% 1,00	1.00% 0.	50% 0,50%
19 (1988) (1994)		0	.50% 0.50%	0.50% 0.50%	0.50% 0.5	0.50%	0, 50% 1, 00%	1,005 1,0	PA 1, 90% I	001 1.00	1,60% 1.	.00% 1.00%	1.00% 1.00	1,00% 1.	.00% 1.00%	1.60% 1.	00% 1,06%	1.66% 1.00	0% 1.00%	1, 90% 1, 60	1.50	1,50% 1,50%	1.50% 1.	50% 1.56%	1.50% 1.50	0% 1.50% I	1.50% 1.50	1.50% 1.	ion 1.50%	1.50% 1.5	ot 1,56%	1,504, 1,50	1,50% 1.	50% 1,50%	1,50% 1,50	1,50% 1.3	1,59%	1,50% 1,50%	1.50% 1.5	0% 1,50% 1,	50% 1.50%	1,50% 1.5	50% 1,50%	1,50% 1.50%	P. 1.50% 1.	00% I.00%	I. 60% I. 60%	1.00% 1.00%	s, 1,005 1.0	00% 1,00%	1.00% 1.00	5 1,005 0.	. 50% 0, 50%
工程保险費	31, 869, 616	1. 7608%					4		8	8																																								ranjenji lida (1846)			Many Control
營業稅(5%)	86, 190, 476	4. 7619%	.50% 0.50%	0.50% 0.50%	0, 50% 0, 5	0.501	0.505 1.00%	1,005 1.0	x 1.90x 1	.00% 1,00%	1.00% 1.	.00% 1.00%	1.00% 1.00	1.005 1.	.00% 1.00%	1.00% 1.	1,005	1.00% 1.00	0x 1,00x	1,00% 1,00	1,50%	1,50%	1.50x 1.	50% 1.50%	1.50% 1.50	0% 1,50% 1	1,50% 1,50	1.50% 1.	68 1. 50X	1.50% 1.5	0t 1,50%	1, 59% 1, 50	1,58% 1.	59% 1.50%	1.50% 1.50	1,50% 1,5	0X 1.50V 1	1,501 1,50	1.30% 1.5	0x 1.50x 1.	.50% 1.50%	1.50% 1.5	50% 1.50%	1.50% 1.50%	1,50% 1.	00% 1.00%	1,00%	1.00% 1.00%	X 1,00% 1.6	00% 1.00%	1.00% 1.00	1,00% 0,5	50% 0.50%
\$†	1, 810, 600, 000	100.00%	5	-																																																	
本 朔	預定	0.	. 18% 0, 22%	0, 138 0, 138	0, 24% 0, 2	4% 0. 26%	0.51%	0. 54% 0. 73	0. 73% 0.	. 75% 0, 81%	0.98% 0.	98% 1.07%	1. 14% 1. 19	N 1.27N 1.	415 1.223	1. 60% 1.	0- 1.51%	1.61% 1.24	13 1. 32%	1. 16% 1. 16	1. 25% 1	. 335 1. 485	1.58% 1.	53% 1, 53%	1. 12% 1. 19	9% 1. 03% 1	1. 03% 1. 129	1. 19% 1.	0% 1.60%	2.15% 2.0	0% 2, 13%	2. 28% 2. 69	2.59% 1.6	1.80%	1.41% 1.40%	1.46% 1.5	5% 1.69% 1	. 81% 1. 75%	1.75% 1.6	9% 1.81% 1.	49\ 1.49\	1.14% 1.2	22% 1. 02% 1	1. 08%	\$ 1.035 1.1	20% 1. 29% 1	. 25% 1. 25%	0.99% 1.05%	0,815 0.8	82% 0.75%	1, 793 0, 82	0,87% 0.4	40% 0, 40%
完成百分比(%)	實際		_	0, 29% 0, 07%		-	-	_	400			-	_	-	_	1. 56% 1.	7% 1, 05% 1	, 56% 1.76	0. 75%	0, 38% 1. 38	1.68%	. 59% 0. 35%	2.02%																														
累 計	預定		_	0, 53% 0, 66%								-	_		15, 604	16,60% 18.	19, 91% 2	21, 513, 22, 77	5A 24.07A	25, 234, 26, 39	27,64%	8, 971 30, 451	32,034 33,	35, 094	36, 231, 37, 40	0), 38, 435, 31	39, 494, 49, 381	41, 77% 43,	44, 875	47, 623, 49, 6	SA 51, 15% (	53, 433, 55, 529	57, 614 39.	29% 61,06%	(2, 50% ) 63, 50%	65, 361, (6, 5	11, 68, 604 7	0, 415, 72, 169	73, 911, 75, 6	(N. 77, 415 78	.904, 80, 294	81, 53% 82, 7	75A 83, 77h 8	84, 854, 86, 839,	K 87, 66A, 88.	26% 89, 53% 9	0, 80% 92, 04%	93, 03%, 91, 085	5 91 894 95.	715, 96, 485	7, 25% 98, 07	98, 944, 59, 3	K. S4K 99, T4K 9
完成百分比 (%)	資際	0.	301 0.681	0, 97% 1, 04%	1.11% 1.2	1% 3, 30%	1. 31% 4. 39%	4, 66% 4, 76	4, 90% 6,	13v 6, 81x	8, 95% 10.	00% 10,00%	16, 28% 17, 57	18, 431 19	315 20, 115	21.71% 23.	24, 535 2	6,09% 27,85	5\ 28, 64%	29, 82% 39, 40	33, 485, 3	33, 84% 33, 38%	35, 40%																														

# 工作數量累計完成表

	項次	單位報	報的數學	款的單個	今智		用奶品酒完成	東元成			<b>小地元成</b>	C AR			本期系積完成	光凝		4 2
	K 1	_	-	KI HOSK	Ž e	預定達度(第)	實際進度(%)	實際完成數量	育際完成全額(元)	刑定達度(%)	素除造成(%)		育熙完成金額(元)	祖先追成(%)	實際達成(%)	實際完成數學	智醇完成金額(元)	本本
	安包工程费					STATE OF THE STATE		The state of the s										
Column   C	放水渠道工程									an account of the second								
	1. 无水井近工程(UN+UD) -2K+4UU)						The state of the s	1							The second second	The same of the sa		11.12.27 核灰地工預算
	はそれは	W2	00 30	000	2002 37	0000 001	0000 001	1 20	000 00							,		111.12.27核交拖工預算
Marked-street-	土方工作、創發土方益理(遊距≤5/四)	N3	85.00	250	21, 250	100.0000	100.0000	85 0000	91 950					100,0000	100,0000	85,0000		11.12.27核定施工预算
	结特用洗菜土·预拌·140kgf/cm2	M3	5.00	2,300	11,500	100,0000	180,0000	5,0000	11.500	,	-			100,0000	100,0000	6000 E	-	11.12.2/核光格工机并
	建構用洗液土,預拌,280kgf/cm2	M3	820.00	2,750	2, 255, 000	37,3171	37,3171	306, 0000	841, 500			1		37 3171	37 3171	305 0000		11.12.21版列稿上版中11.10.07等かれて出口
	產品。納筋, SD280,工地交貨	1	38, 25	23, 500	898, 875	87,0588	87, 0588	33, 3000	782, 550			1	,	87 0588	87 0588	33 3000	+	11.12.61数人的十五年
	產品,網筋,SD420所,工地交貨	T	93, 83	24,600	2, 308, 218	89, 7368	89, 7368	84, 2000	2,071,320				,	80 7368	80 7368	84 2000	_	1.12.21放木的十层中
	H型线路・(H300xB300mm・10x15mm)	KG	9, 207, 00	115	1, 058, 805	100.0000	180,0000	9, 207, 0000	1, 058, 805	,	1	3.	1	100,0000	100,0000	0.207, 2000	-	11.12.21程火焰十世年11.12.27省份将十进位
	H型纯格维(洗)孔章	M	66.00	5,000	330, 000	100,0000	100,0000	66, 0000	330,000	1		1	-	100.0000	100 0000	0000 0000		11.10.21版代的十四年
	逐指銅結構、剪力的、连工帶料	454	352,00	20	7,040	100,0000	100,0000	352, 0000	7,040		ı	1	1	100,0000	100,000	352,0000	_	11.12.21版人的人民中
	學水精通				ī			ı								34	-	111.12.27首定允工语库
	土方工作、挖方、挖土方		15, 264, 00	45	686, 880	74, 1509	74, 1509	11, 318, 4000	509, 328		1		1	74, 1509	74, 1509	11,318,4000	_	111.12.27核定花工預算
	エガエ作・花方・花巻方・ナーナー バーナー バーディー・	+	28, 869, 00	400	51, 547, 600	87, 7784	87, 7784	113, 119, 2000	45, 247, 680	1	1	1	1	87.7784	87,7784	113, 119, 2000		111.12.27核定施工預算
	エクーキ・祖母母の(中宮本田学紀四母)	1	17, 046, 00	35	2.696.610	81, 5907	81, 5907	62, 862, 4000	2, 200, 184			1	1	81.5907	81,5907	62, 862, 4000		111.12.27核定施工预算
48 - 1892 - 1	エクーな・密察エク条件(場所に5MB)		22, 234, 00	052	5, 558, 500	82, 1768	82, 1768	18, 271, 2000	4, 567, 800		1	1	1	82.1768	82, 1768	18, 271, 2000		111.12.27核定施工预算
	16 35 H 35 82 L . Heth. 140 Kg1/Ch2	+	1,818.00	2,300	4. 181. 400	88.4048	88. 4048	1, 607, 2000	3, 696, 560	ī	L	1.	1	88, 4048	88, 4048	1,607,2000	100	111.12.27株定施工預算
45. 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815	4 P - 40 样 - CD980 - 上 44 存	-	23, 855, 00	2, (50	65, 601, 250	100 000	100 000	20, 298, 1000	55, 819, 775	2, 5240	2, 5240	602, 1000	1, 655, 775	87, 6135	87,6135	20, 900, 2000		111.12.27核定施工预算
## 5.5 mm 5.5	信仰・SDSD - 合理部合	- 1	010.02	11 900	0 000 000	0.000,0000	100,0000	201 9000	20, 570, 020	1 0	1	-		100,0000	100,0000	875, 3200		111.12.27核定施工预算
26.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	本品・名称・Ch450版・十年中の	- 1-	0 007 99	007 11	Ep 074 919	00.0000	00,0000	0 107 0 100	8, 190, 418	2, 4094	2, 4094	21. 0900	236, 208	86, 0157	86.0157	752, 9130		111.12.27核定施工預算
	が SD450個・ 各数 な 当立	- 1-	9 307 33	11 300	97 080 890	94 0007	91, 0516	9 019 0196	99 757 900	0 4010	0107.0	1	1 000	91, 6578	91, 6578	2, 197, 3400		11.12.27核定施工预算
## 1	望如城市	W9	51 195 00	830	49 491 850	86 7440	86 7440	44 400 0600	96 950 590	2, 4210	2, 4210	38, 0380	655, 830	86.4277	86. 4277	2, 071, 9586	_	11.12.27核定施工预算
444 1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2	清水模板。條体	M2	3, 148, 00	790	9. 486. 920	21, 1639	21 1639	666 9400	596 330	0 6000	0 6000	10 3000	1. 052, 234	89, 2448	89, 2448	45, 688, 8600	_	
1995   1995	伸縮縫,(合止水帶,保履龍,填縫劃),進		0 049 00	Cuc	020	00 5400	00 5400	1 000 4000	E G G G E	0 0200	00000	2000	10,100	21.1100	21. (100	000, 4400	_	11.12.2/核ス池工技斗
19   19   19   19   19   19   19   19	***		20.010	000	110, 000	001.0 000	07. 0400	1, 000, 1200	390, 241	2,3/88	2. 3188	48. 6000	17,010	84. 9251	84, 9251	1, 735, 0200		111.12.27核定花工预算
19	中次學	N .	5, 092, 00	270	1.374.840	81,7753	81, 7753	4, 164, 0000	1, 124, 280	2,3567	2, 3567	120, 0000	32, 400	84, 1320	84, 1320	4, 284, 0000	_	111.12.27核定施工預算
(2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	第二種加減治・強数支撑排除 オトゴロのカー ストーコロのカー・ストーティ		44, 466, 00	150	6. 669. 900	84, 2801	84, 2801	37, 476, 0000	5, 621, 400	2, 4288	2, 4288	1,080,0000	162,000	86, 7080	86, 7089	38, 556, 0000	5, 783, 400 1	11.12.27核定施工预算
19   19   19   19   19   19   19   19	出し進石以名・語も14年 イナ・ フロギャンに、 0 m から	-	44, 644, 00	300	13, 393, 200	83.0114	83,0114	37, 059, 6000	11, 117, 880	2, 3922	2.3922	1,068,0000	320, 400	85,4036	85, 4036	38, 127, 6000		111.12.27核定施工预算
## 30.00	電視士・抗學級及1/DKg1/cm2・早度8cm		20, 057, 00	1,500	30, 085, 500	80, 4616	80, 4616	16, 138, 1840	24, 207, 276	-			1	80,4616	80, 4616	16, 138, 1840		111.12.27核定施工预算
### 300 00	がお・海洋山東=20回・L=0回	+	300,00	6,000	1,800,000	12, 3333	12, 3333	37, 0000	222, 000	1	1		•	12, 3333	12, 3333	37,0000		111.12.27核定施工預算
19   19   19   19   19   19   19   19	25.X.25.30(3)(四) 在一人人体现	Til.	300, 00	06)	225, 000	12, 3333	12, 3333	37,0000	27,750	-	_	1	1	12, 3333	12. 3333	37,0000		111.12.27核定施工預算
接換機能を記する 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	4. 在 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	- Op	91 00	301 000	000 100 3			I										111.12.27核定的工预算
- 1,090,000	表表母进	46	1.00	414, 861, 300	414, 861, 300		SIL SILICOTOR	0, 00.42	1, 740, 175					Of the last of the		F WINDER		11.12.27故矣先工孩算
3.60																	12 (10)	
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	) 線大岩光於工程(全300mHDPB指光序)									THE REAL PROPERTY.						100		11.12.02首定地工所算
接続者を発き 35 5cm では文化	局面是從乙烯會、標稿學與315圖、學材數(材料及運費)		1,090.00	3,800	4, 142, 000	100,0000	100,0000	1, 090, 0000	4, 142, 000	i.	L	1	1	100,0000	100, 0000	1,090,0000		111.12.02核定施工預算
(元)         (五)         (五) <td>為密度及乙烯管,操術管理315mm,解收費(安克,法蘭梅與及螺栓掌件等)</td> <td></td> <td>1, 090, 00</td> <td>2, 700</td> <td>2, 943, 000</td> <td>100,0000</td> <td>100.0000</td> <td>1, 090, 0000</td> <td>2, 943, 000</td> <td></td> <td>t</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100,0000</td> <td>100,0000</td> <td>1,090,0000</td> <td></td> <td>111.12.02核定格工预算</td>	為密度及乙烯管,操術管理315mm,解收費(安克,法蘭梅與及螺栓掌件等)		1, 090, 00	2, 700	2, 943, 000	100,0000	100.0000	1, 090, 0000	2, 943, 000		t	1	1	100,0000	100,0000	1,090,0000		111.12.02核定格工预算
接近 (	§ 300mmDIP45* 軟骨	400	10.00	25,000	250,000	100.0000	100,0000	10,0000	250,000	1	,		,	100 0000	100 0000	nnnn nt	1 000 056	11 19 00 to the come of 11
20,00 18,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5	§300mmDIP 直登	M	5.50	8,000	44,000	100,0000	100,0000	5, 5000	44, 000	1	,			100.0000	100 0000	5 5000	_	11.12.02版水池十四年
A. O. O. O. D. S. S. S. S. O.	§ 315mmIIDPE45" 零 管	464	20,00	18,000	360,000	100,0000	100.0000	20,0000	360,000	10			1	100,0000	100 0000	20 0000	_	11 19 0930 分析 十进位
12.5   1.	◆315mmHDPE決值式接頭	404	40.00	17,300	692,000	100,0000	100,0000	40,0000	692, 000	1	,	1	1	100,0000	100,0000	40,0000	_	111 19 (9)資价格上法律
12. T-24 - WJRE-1.5m         支         778.00         1.384.840         82.0651	PE法蘭式楼頭	464	4.00	26,500	106.000	100,0000	100,0000	-t. 0000	106, 000	1			,	100,0000	100, 0000	4, 0000	_	11.12.02核分析工術算
12.5   12.5	图文结筋 · D22 · L=3m · 問距≤1.5m	**	778.00	1, 780	1.384,840	82, 0051	82, 0051	638, 0000	1, 135, 640	1		-		82, 0051	82, 0051	638, 0000	-	111 19 09被你接上推算
18.130 - 2.24.20	结构用混凝土,预拌、210kgf/cm2	M3	19.20	2,500	48,000	111, 1979	111.1979	21,3500	53, 375	1		1	1	111, 1979	111.1979	21,3500	-	11 19 09萬年接工指與
100 : 建工等件         T         0.27         34.70         9.376         100,000         10.000         0.000	在學植筋·D22mm·L=0.7m	455	242.00	370	89, 540	20.2479	20,2479	49, 0000	18, 130		,	1	1	20, 2479	20,2479	49,0000	-	111.12.02核容标工档算
銀件         12.924         10.000         10.0000         0.3600         12.924         -         -         -         -         -         10.0000         10.0000         0.3600         12.924         -         <	到结。SD280、连工毕幸		0.27	34, 700	9,369	100,0000	100,0000	0.2700	9,369	•	31	-		100,0000	100,0000	0,2700	-	11.12.02核定施工預算
指: 6256 45.6250 45.6250 45.6250 45.6250 5.757 45.6250 45.6250 7.3000 5.767 45.6250 45.6250 7.3000 5.767 45.6250 45.6250 7.3000 5.767 45.6250 45.6250 7.3000 5.767 100,0000 1.05,0000 5.767 100,0000 1.05,0000 5.787 100,0000 1.05,000 5.785 0.78	型格·SD420W·建工参车	<b>(-</b>	0.36	35, 900	12, 924	100,0000	100.0000	0.3600	12, 924			1	1	100,0000	100,0000	0.3600	-	111.12.02核定施工預算
3.218.00 1.950 6.307.280 6.307.280 100.0000 100.0000 8.218.0000 6.307.280 6.307.280	清水模板・網体	M2	16.00	790	12,640	45, 6250	45, 6250	7,3000	5,767	ı		ı	1	45, 8250	45, 6250	7,3000	-	111.12.02核定施工预算
	目由型格崇延成	MZ	3, 218, 00	1,960	6.307.280	100.0000	100,0000	3,218,0000	000 200 0						The second secon			

# 工作數量累計完成表

が見れ	一位特別	中學	哲老教師	拉他臨海	今年		713 584 Y	かがれたしんんな			3/0/1/2					2000		
		1	A STATE	N-1-C-K	No. ii	五元年度(第)	新原湯板(写)	實際完成數量	實際完成金額(元)	班定達度(場)	(別)衛馬遊擊	申報任於監督	会際な点を指(元)	報を確廃(別)	中野谷田(年) 中野田	特有光色技術	中国かる本体の「多)	金石
(=)-	導大体医療工程(0K+000-5K+100)		The second second	SINCE STATE OF STATE		The second second		10							N. Company	H III VANGAGE	HILL TO SEE SE WILL THE	the state of the state of the
	至500mm(厚度t=6,4mm)網材鋼管(含材料費及 26.4%。	M	10, 488, 00	9,000	94, 392, 000	100,0000	100,0000	10, 488, 0000	94, 392, 000	-1	,	-1		100 000	100 000	10 488 0000	000 000 00	111.12.02数美元一位中111.13.03等分并为约4
60	及X7 多200mm地沉烟管馬管疫幣效數(合宜联、切	И	00 000 0	000			2067 4905	OUGL FLO 1	1 992 010					0000	0000 1001	111, 500, 100U	94, 692, 000	111.12.02版人他工提井
	部、群接及安裝) 在EDAmatar 知為近日報為人人以知	N	7, 699, 00	30			4(, 4205	1, 3/4, /200	1, 237, 248	E	r.	í	ı	47.4205	47, 4205	1,374,7200	1, 237, 248	111.12.02核定施工預算
4	9.200mm/49.52mm/4.5 写在(含粒件、证表、七方割、焊接、安果及通像)	414	45, 00	28,000	0 1,260,000	8, 1587	8, 1587	3.6714	102, 799	1	•	1	3	8, 1587	8, 1587	3,6714	102, 799	111.12.02核交拖工預算
23	身500mm抽死鉤管22.5°增管(合材料、塗裝、切割、焊接、安裝及運費)	**	15.00	30, 350	0 455, 250	36, 9687	36, 9687	5, 5453	168,300	1	í	.1		36, 9687	36, 9687	5,5453	168,300	111.12.02核定花工預算
∞	控約問:稿心集閱(排泥圖)。使用原力 10.0kg1/cm2、鐵稀口径200mm。凸線式	Dζ	8, 00	330,000	0 2,640,000	100,0000	100,0000	8, 0000	2, 640, 000	<b>1</b>	·	1	t	100, 0000	100,0000	8,0000	2, 640, 000	111.12.02核定施工预算
6	初水精,穿出左封刷锅,使用瓷力 10.0kg/cm2,撬筛口径20mm,凸缘式	o(	24.00	120,000	2, 880, 000	0 66, 6667	56, 6667	16, 0000	1, 920, 000		1	1	1	66. 6667	66, 6667	16,0000	1, 920, 000	111, 12, 02核定施工預算
10	排氣間,複合式,使用壓力10 kgf/cm2,標稿口源50mm	DC.	28.00	24,000	0 672,000	0000 0000	100,0000	28,0000	672, 000	1		7	31	190, 0000	100, 0000	28, 0000	672.000	111 19 09 4 4 4 五 4 4 五 4 4 4
11	耐水間,穿过左封陽陽,使用整力10 0kg//m3,收益口部20mm,几条子	n;	28.00	5, 500	0 154,000	0000.0000	100,0000	28.0000	154, 000	1	,		3.1	100,0000	100,0000	28.0000		111 19 02 特定都工程官
12	(4) 的 (4) 0 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	D.	28.00	7.000	196.000	100.000	100 000	28 0000		1	1			0000 001	0000 001	20 0000		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T	50mm T6rd & str	45	987 00	33 000	0		76 3066	20.000	7 297 000				1	100.0000	100.0000	28, 0000	196, 000	111.12.02核定施工預算
0	養大品完全工並(DK+100 相思音多點)	N XX	1, 00	158, 942, 824	123		111	S S	18, 787, 042	16,8500	16,8500	0, 1885	26 781 866	76,3066	76, 3066	219, 0000	7, 227, 000	111.12.02核定施工預算
11	特高歷配電工程						TOTAL TOTAL STREET									Victoria de la constitución de l	10, 100, 100	
20	会に極める	W	1,00	54, 476, 500	0 54, 476, 500	- 0	-		1	-	+	1		1	7	A SECTION OF THE PERSON NAMED IN		
4-1	字字編記在《古典》與新期 回价算程。1959。11-3日。記舊八名	+1	194 00	020	169 700	0202 03	630 2 000	0000 531	010 011					0.00.00	0.00			
8	道方表 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	*	124. 00	d										83, 5052	83, 5052	162, 0000	140, 940	111.12.02核定施工預算
P	高密度聚乙烯管、標務管徑2500mm、管材、配件及分类	И	5,000.00	7, 600	38, 000, 000	30, 2632	30, 2632	1,513,1579	11,500,000	E		i	)E	30, 2632	30, 2632	1,513,1579	11, 500, 000	112.03.17核定等告担任金
五	溪畔公園材料妆置場復有及環境改善	क्त	1.00	10,000,000	0 10,000,000	-	,	ì	1	а	ī	1	20	1	1	1	i	
T	韓項工術							1								2		
T	施工園服績等排水費	4K S	1.00	8, 200, 000	8.200.	002	62		2, 732, 240	2,0000	2,0000	0.0200	164,000	35, 3200	35, 3200	0,3532	2, 896, 240	
٠,-	的计似的误的人对话他一	2W 4	8, 000, 00	16 000 000	0 6, 400, 000	0 68 6400	8.4373	675,0000	10 009 400	0000	0000	- 0	1 000 01	8, 4375	8, 4375	675, 0000	540,000	
ba	<b>连工测量,工地效集</b>	14	1.00	2, 500, 000			33.		833, 000	2, 0000	2,0000	0.0200	50,000	35,3200	35 3200	0.3532	883 000	
ч	工程告示課及工地構結,工程告示解,紹覧,工5000以前930000	母	2, 00	20, 500		-			41,000	335	1		1	100, 0000	100.0000	2.0000	41.000	
	工地學時間故意統	44	1.00	3, 600, 000	3, 600, 000	0 47.4000	47. 4000	0.4740	1, 706, 400	0 4800	0 4800	0 0048	17 980	47 8800	47 9900	0 4700	1 799 690	
_	資料為採及巡查(各資鑑、交換計畫書、水係 計畫、河川公地中據和關文件製作及審查費及 縣項費用)	**	1.00	2, 800, 000			67			2, 0000	2, 0000	0.0200	56,000	35, 3200	35, 3200	0,3532	988, 960	
П	開花許可控照取得、改造費及維項等費用	松	1.00	1, 200, 000	1	33,	33.	0, 3332	399, 840	2,0000		0.0200	24,000	35, 3200	35, 3200	0,3532	423,840	
	地下管线調查具模拉費(含路面修復)	松	1.00	1, 500, 000	_				499,800			0.0200	30, 000	35, 3200	35, 3200	0.3532	520, 800	
	群拉提系物現光加重成點到 數	12 4	1.00	600,000			65 63		199, 920	ci e	23	0.0200	12,000	35, 3200	35, 3200	0,3532	211,920	
2 23	2. これをはなる。 はなななななる。	£ 45	1 00	400,000	0 400 000	33 3200	33, 3200	0,3332	133 980	2,0000		0.0200	12,000	35, 3200	35, 3200	0,3532	211,920	
	工地李坊費	i ti	1.00	1,500,000	1		33				i ci		30,000	35, 3200	35, 3200	0,3532	529, 800	
1	非他隸項工程費	4	1.00	3, 500, 000	0 3, 500, 000	33,3200	33, 3200	0,3332	1,166,200	2,0000		0,0200	70,000	35, 3200	35, 3200	0.3532	1,236,200	
	智學如作條節	4	00 .	00.000					000 000							1		
g _z	ばかはの 成分を 湯か等が直形(今都計・な等の合人が子)	χ=	000 000	11 000	0 22,000,000	100 0000	100,000	000 000	22, 000, 000	,	1	1	1	100.0000	100,0000	1.0000	22, 000, 000	
	浦充地形態聲	公顷	100.00	12,000	1,200.	75.	75,	75.		C L	ī		1	75, 5000	75, 5000	75, 5000	2, 200, 000	
	職業安全衛生管理費															. 1		
	· 斯尔安全衛生, 帝理人員	人用	96.00	50,000	1					1.0750	1.0750	1.0320	21,600	35, 4167	35,4167	34, 0000	1, 700, 000	
0 0	職需安全情先,教育訓察,安全衛生教育訓練 部,許益自	44 4	16.00	25,000	0 400.000	18, 7500	18.						1	18, 7500	18.7500	3,0000	75,000	
T	所なのは、	1 10	00:1	194 730			33 3900	0, 2632	41.560	2,0000	2,0000	0.0200	74,000	35, 3200	35, 3200	25532	1,306,840	
	安全防護網	兴	1.00	270,000					89, 964	2,0000		0,0200		35, 3200	35, 3200	0.3532	95, 364	
	工地臨時建築技術,臨時痼所	扩	1,00	300,000					99, 960	2,0000		0.0200		35, 3200	35, 3200	0.3532	105,960	
tra .	施工安全維接收備	*	1.00	3, 700, 000		33, 3200	33, 3200	0,3332	1, 232, 840	2,0000	2,0000	0.0200	74.000	35, 3200	35, 3200	0.3532	1 308 840	
	しを報道の	- H	00 90	49 000	000									1	1	2000.0	11,000,010	

# 工作數量累計完成表

垣次	工練項目	四位	計艺歌中	似光原布	今個		用机机板无规	Z W			本期完成	乙族			本期累積完成	<b>美光</b> 说		
-1			4	K	50.01	预定速度(%)	實際進度(%)	實際完成數量	實際完成金額(元)	預定達度(%)	實際進度(第)	實際完成數量	實際完成金額(光)	預先達度(%)	實際遊戲(%)	實際完成數量	曾歷完成全額(元)	金位
1	開挖臨時覆蓋板及其支撑(及止滑網板)	귂	1.00	2, 500, 000	2, 500, 000	33, 3200	33, 3200	0.3332	833,000	2,0000	2,0000	0.0200	50,000	35, 3200	35 3900	0.3530	883 000	
其余	<b>城寨安全衛生,保護器材,上下收備與防墜等</b> 安全防護收備	*	1.00	200,000	200,000	33, 3200	33, 3200	0.3332	66, 640	2,0000	2,0000	0.0200	4,000	35, 3200	35, 3200	0, 3532	70,640	
完 8	汛期工地防災城災作業費	71	1.00	3,000,000	3,000,000	33, 3200	33, 3200	0.3339	009 600	9 0000	00000 6	0.090.0	80 000	0000 30	0000 36	0 0500	1 070 000	
t 共	其它安衛致施費(各防汎深線、指見推除、抱 題推等故生器材)	析	1.00		4, 600, 000	33, 3200		0. 3332	1, 532, 720	2,0000	2,0000	0.0200	92, 000	35, 3200	35, 3200	0, 3532	1, 624, 720	
九環	環境保護措施費																	
8 標	環境保護・環保金導	44	1.00	200,000	200,000	33, 3200	33, 3200	0.3332	68.640	9 0000	0 0000	0.000	4 000	96 9900	0000 30	0 0200	20 040	
b 環	環境保護・廃棄物清理	भर्त	1.00	2.	2, 500, 000	33, 3200		0.3339	833,000	2 0000	9 0000	0 0000	50 000	0070 20	95 9900	0.0000	000 000	
こ 環	環境保護,施工便道流水	Я	48,00		8, 640, 000	30, 2083	30, 2083	14,5000	2,610,000	1.0417	1.0417	0.200	90° 000	31 9500	31 9500	15 0000	9 700 000	
P 电电子	環境保護,臨時性額砂及導排水設施,洗車沖 洗費	acc	48.00	150,000	7, 200, 000	30, 2083	30, 2083	14,5000	2, 175, 000	1.0417	1.0417	0,5000	75,000	31,2500	31,2500	15, 0000	2, 250, 000	
e 源	環境保護,水污染防治	47	1.00	2, 500, 000	2, 500, 000	33, 3200	33, 3200	0, 3332	833,000	2,0000	2.0000	0.090 0	20 000	35, 9900	95 9900	0 95.00	000 000	
野	環境保護,水污染防治,防治計劃	**	1.00	150,000	150,000	100,0000		1.0000	150,000		1	1		100 0000	100 0000	1 0000	150 000	
の	環境保護,其他環境係護措施費	44	1.00	3, 500, 000	3, 500, 000	33, 3200	33, 3200	0.3332	1, 166, 200	2,0000	2.0000	0.0200	70.000	35, 3200	35 3900	0.0000	1 998 908	
h #	<b>花工階段生態檢拔價</b>	417	1.00	2, 500, 000	2, 500, 000	33, 3200	33, 3200	0,3332	833,000	2,0000	2,0000	0.0200	50.000	35 3900	35 3900	0.3539	983 000	
中	品質管制作業費							-							00000000	***************************************	000,000	
a 167	检验费	- FE	1.00	8, 658, 820	8, 658, 820	33,3200	33, 3200	0.3332	2,885,119	2,0000	2,0000	0.0200	173, 176	35, 3900	35 3900	0.3589	3 058 905	
b d	品管費(含品管人員新管及行政管理費)		Total Inches			-	ALC: MILES I								200000000	1 - 1	0,000,000	
	品带人员挤背	Я	48.00		8, 640, 000	34,3400	34,3400	16, 4832	2, 966, 976	1,0767	1.0767	0, 5168	93.024	35.4167	35 4167	17 0000	3 060 000	
	行政管理费	H	48.00		7, 143, 744	34, 3400	34, 3400	16, 4832	2, 453, 162	1.0767	1,0767	0,5168	76, 914	35, 4167	35, 4167	17, 5500	9 530 076	
十一版	最高管理件費	岩	1.00	98, 459, 114	98, 459, 114	35, 1200	35, 1200	0.3512	34, 578, 841	2,1100	2,1100	0,0211	2, 077, 487	37, 2300	37, 2300	0.3723	36, 656, 328	
H	十二 工程保险费																	
H	十二 工程保险费	¥	1.00	31, 869, 616	31, 869, 616	٠	1.		ı	•	1							31.404.46日
H	十二 工程保险费	北	1.00	3, 100, 000	3, 100, 000	100.0000	100.0000	1.0000	3, 100, 000				,	100 000	100 000	1 0000		
十三 普案親	*案积									TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE	Control of the control		STREET, STREET	200,000	100.000	0000-1		111.12.02% 无他上班.
十三 整紫乾	7. 常我	元	1.00	86, 190, 476	86, 190, 476		-		ì			1		,		1	,	II. m. vic. in
如川十	營業稅	74	1.00	85, 985, 413	85, 985, 413	33, 4612	33 4619	0 3340	98 771 786	N160 6	N160 6	00000	1 750 071	2007 36	0007 30	0.000		
所外	<b>水值冰堆水值</b> ®		THE REAL PROPERTY.						201111111111111111111111111111111111111	6: 00:13	F. 0013	7070.0	1,100,011	93,4020	99.4970	0.0001	00, 009, 607	111.12.21概定超工資本
順一	量者落凝土地(包)除料	M3	1	-100	1	,			1	,						Nonline .		
李 其	其他調整費		The state of the s						Sales division	The state of the s	Choch Carlotte		The second second	STATE OF STREET				
#	主體工程留用費	भर	1.00	4, 101, 265	4, 101, 265	1	,	,	1	,				,		,		
*	<b>泰套款(5%)</b>	41	1.00	205, 063	205, 063													

	酮		ı		Ü		F		Ē		j.		1		2.0		1	1		9		1		1	-1	2.0	2.0
数(天	極	-	J		1.0		0.5		2.5	1	L. 5		ф. О	1	.; .c		ი.	1		ä	Ī	1	Ì	i	21.5	18.5	40.0
华	通				Ď		í.		1.0		9.0		0.0		o		11.5	1		1	T	3	T	1	38.5	24.0	62.5
劣	誓	0 00	00.00	t	27.0		30.5		26. 5		c .07		zu. 5		53. 5 23. 5		14.0	,	T	a	t	1		9	212.0	198.5	410.5
	31	晴	晴	\	\	略	審		\	晴	華		/	時	纱	业	恒					1	T	Г	40	+0	
	30	晴	暗	/	/	福	曜	晴	中	書	書	唱	继	響	僵	雪	極	Ì							年度累	本年度累:	總工期累計
	59	睹	暗		/	幣	曜	帮	響	書	審	報	偃	暗	暗	雷	屉								歷	*	ᢀ
	28	贈	略	響	暗	她	晴	審	中	響	審	雷	雷	酮	醫	書	順										
	27	畴	晴	毒	語	響	器	幣	***	審	创	幣	幣	200	體	審	鱼										
	26	晴	晴	辈	曜	雪	晴	報	報	睛	晴	幣	電	鉪	極	書	画										
	25	晴	晴	中	響	暫	晴	暗	雪	審	事	報	平	疆	曜	審	他										
	24	晴	曜	略	華	聯	曜	中	響	舉	曜	幣	個	雪	響	審	頭										
	23	睹	晴	睛	中	墨	畴	曜	審	個	画	曜	畴	審	睹	響	串										
	22	聯	醋	審	聯	雷	暗	晴	報	聯	晴	晴	誓	雪	晴	雅	略										
	21	晴	暗	峥	畴	雪	船	슌	쉞	審	睹	中	中	帮	審	曜	鲍								ļ		
на	20	晴	晴	晴	畴	曜	畴	香	電	晴	前	暗	暗	報	印	晴	晴										
ET#	19	晴	晴	晴	畴	審	晴	啃	晴	宇	爾	晴	略	聖	盤	晴	遊										
大街》	18	晴	雷	晴	暗	小小	暗	晴	醋	晴	晴	晴	略	平	雨	畴	晴										
112.08.31	17	曜	暗	畴	曜	密	畴	晴	晴	晴	晴	暗	쉞	雪	畴	營	晴										
曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程 晴雨表 (至 112.08.31)	16	睹	醋	晴	中	磐	晴	瞻	晴	畴	晴	叠	晴	曜	. 嗓	中	師										
水、	15	晴	醋	晴	畴	畴	晴	晴	晴	晴	中	继	曜	晴	晴	逾	鱼										
C水庫放 晴雨表	14	曜	曜	極	香	晴	卟	略	瞎	曜	晴	쉞	明	晴	晴	番	舉										
文は	13	曜	曜	晴	晴	畴	華	中	睹	睹	畴	睹	暗	晴	暗	極	晴										
, Em	12	晴	雷	華	晴	晴	曜	曜	瞎	晴	绘	釶	曜	晴	画	晴	碧										
_	11	晴	華	晴	畴	暗	響	曜	韓	睹	睹	審	遊	暗	電	鹽	⑩										
	10	止	뺨	曜	畴	止	中	曜	晴	晴	晴	髻	鲍	睹	個	釶	極										
*	6	平	審	唯	中	聯	中	曜	止	晴	串	略	丽	晴	曜	⑱	垂				L				神		
	∞	審	審	晴	盤	暗	誓	曜	曜	验	中	睹	曜	雪	曜	個	個								日降雨量超過5公厘者		
	7	曜	誓	雪	引	略	曜	平	塘	憩	画	平	極	曜	曜	晴	曜								同量地		
	9	輯	誓	幣	華	暗	審	響	坐	畴	丰	中	中	響	中	艦	砸										
	വ	書	雅	誓	響	軸	暫	響	中	矔	審	唯	儃	響	審	⑩	偃								代表面天,	Ī	颱風
	4	雷	雅	雪	雷	暗	督	部	華	中	書	船	靊	奉	中	個	佢								朱表	4	代表颱風
	က	曜	書	中	雷	中	曜	中	曜	中	幣	堰	画	暗	平	止	曜								屉	1	腦
	2	釶	쉞	晴	暗	盤	曜	響	晴	曜	響	中	僵	中	磐	业	晴		_						晴天	1	代表陰天
						- 哈		釶	個			審	中	曜	響	審	쉞				Ļ		Ļ		代表晴天	4	代表
23年	日期 月份 時段	1 4	7	中十		2 上午		1上午	- 下午	5 上午	T	A 4	" 下午	7 上午	下午	2年	T	9 上午	$\top$	10 74	1.1	11 下午	10 上午	16 下午	誓	備註	

逐時日	崖水!	量月幸	最表 (	Hourl	y Pro	ecipi	tation	/ 測)	站:C0	0810	曾		2810			· v (	翻	測時	間:20	23-			<u>, nd</u>	入購集	物車	
												R	水量(	(mm)							de .				4	
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	總和	日/時
1	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	4)	-	-	-	2.5	-	-	-	-	(4)	-	*	2.5	1
2			*	**	-		-	0.5	*	-	+	-	-	٠	+	*	-			+	-		+	1.00	0.5	2
3	(5)	1.0	0.5		-	-	-	-	-	-	. =	-	-		-	F.	-	((=)	1-1	=	15	-		19-1	1.5	3
4	a 50	0.5	7.5	1.0	-	1.5		7				*	1.5	=	. 7:	=	=	100	1.71	70	-	8,70	10.00	170	10.5	4
5	-	1.5	16.5	9.0	3.5	3.0	3.5	0.5	E	=	H	7.	·-	2.0	(.5)		ē		1.72	=	0.5	1.7		0.5	40.5	5
6	1.5	2.0	-	3	5.0	0.5	3,5	0,5	2	3	8	100	1.0	-	2.0	0.5	-	3.5	-	0.5		-	0.5		21.0	6
7	-	4	-	4	-	2	2	2	2		2	2	72	- 2	7/2	12	- 2	120	14	12	141	6.5	141	-2	6.5	7
8	-	-	-	0.5	-	-	-	12.0	36.0	1.5	3.5	-	12-	-	-	12	-	-	-	-	(A)		-	-	53.5	8
9	-	-	17.5	31.0	-	0.5	-	-	2.0	9.0	1.5	1.0	-	-	5=	-	-	-		-	-	149		141	62,5	9
10	-	-	*	*	-	*	-	0.5	1.0	-	-	(e)	-	( <del>+</del> )	0,5	0,5	9 <b>H</b> 3		*		-	(( <del>#</del> ))	*	-	2,5	10
11	-	-		=	0.5	3.5	3.5	3.0	2.5	0.5	0.5	0.00	-	8*		-	7 <del>-</del> 1			OF.	-	(#)		1 <del>1.</del> 1	14.0	11
12	-	5	-	-	5.	=	-:	ae:	=	7	15	150	( = )	-	-	-	85.	(3)	1879		0.5	-	13=3	-50	0.5	12
13	-	-	-	-	5.	-	ě	0.5	-	-	1.5	1.51	1.5	151	450	450	-	(7)	(70	0.5		150	-	-	2.0	13
14	-	2	#	-	2	-	3.0	-	7/2		14	0.5		-	-	=	-	-	-			-	-	. •	3.5	14
15	2	2	2	-	ы	-	-	186	3.5	0.5	14	2.0	6.0	-	-	120	(27	120	- 2	11 1101	-	-		-	12.0	15
16	2	-	2	-	12	- 2	×2	8.5	5.0	0.5	-	121	1.5	*	==	-	-	-	-	1943	121	-	-	-	15.5	16
17	-		-	-	-	200	2.0	1.0	-	1141	-	(4)	140	14:	-	141	7=1		-	141	243	-	20.5	0.5	24.0	17
18		((#)	&	-	0=				1)=1	-	-	-	-	188	-	-	-	1-1	-	-		-	-	-	-	18
19	+:	( <del></del>		-	-			-	-		- 1	( <del>=</del> )	(#/)	-		1.0	1 <del>-</del> 11	-	-	( <del>4</del> )	(*)			*	1.0	19
20	- 5		85	-	100	10.00	1000	150		1.5	100	-	-	-	:=:	-	1-1	-	-	-	-		12.0	1.0	13.0	20
21	-	&	y <del></del>	-		470				-	2.70	150	-		-	-		-	5.0	14.5	2.0		-	-	21.5	21
22	(0)			10	•	•	•		•	-		•	-	-	-	-	-		-	-	-	•	-	9	-	22
23	7/27	120	-	39		-	-	-	- 2	120	7	- 10	-	-	-	-	-	-	2.0	-	3	-	120	7	-	23
24	(2)	-	72	-	-	-	-	2		822	-	1	-	5.5	14.5	1.5	-	- 4	1.0	0.5	4	-	-	4	23.0	24
25	-		-	-	-	-		-	141	-	-	-	-	25	20	-	-	1.0	6.0	0,5	-	-		-	7.5	25
26	( <b>*</b> :	-			14.0	-	:-:	1-1	3#1	4		(4.0	-	-	3.0	45.5	22.0	2.0	2.0	0.5	0.5	-	-	-	75.5	26
27	100	-	i#:	*	(+0)						**		-	5.5	1.0	-	-	-	*	*	-	-	-	-	6.5	27
28	NEX.		-		181				*	17.1	.m.:	-	-	-		-		1.0	43.0	2.0	0.5	&			46.5	28
29				( <del>, ,</del> )	-		-	-	&				-	-		1.5	2.5	-	-	8	-	&	1.5		5.5	29
30		-	-	-	-	1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0.5	-	-	-	5		Ξ	0.5	30
31	- 2	-	-	-		0.5	2.0	-	-	-	-	9	3	8	5.0	6.5	0.5	-	-	- 1	75	8	-	0.5	15.0	31
總和	1.5	5.0	42.0	41.5	9.0	9,5	17.5	26.5	50.0	12.0	7.0	3.5	8.5	13.0	26.0	57.0	27.5	8.0	57.0	19.0	4.0	6.5	34.5	2.5		總和
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		日/時

基款 计图片

[124] TE WEST STEEL 
