

經濟部水利署南區水資源局

曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

半月進度報告

(112 年 01 月 16 日至 112 年 01 月 31 日)

主辦機關：經濟部水利署南區水資源局

執行機關：經濟部水利署南區水資源局

監造單位：經濟部水利署南區水資源局工務課

曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程工務所

統包商：中華工程股份有限公司

設計分包廠商：巨廷工程顧問股份有限公司

備查日期：

備查文號：

中 華 民 國 1 1 2 年 0 2 月

目 錄

1. 計畫彙總摘要-----	1
1.1 工程概述-----	1
1.2 本期重要記事-----	2
1.3 本期施工概要說明-----	7
1.4 下期主要施工項目-----	11
1.5 遭遇困難及請求協助事項-----	12
2. 計畫進度分析及工作現況報告-----	13
2.1 計畫時程網狀圖-----	13
2.2 計畫時程桿狀圖-----	13
2.3 進度表與S進度曲線-----	13
2.4 工程現況說明-----	13
2.5 要徑分析-----	14
2.6 里程碑追蹤-----	14
2.7 各項申辦作業狀況-----	15
2.8 前後一個月作業項目時程表-----	15
2.9 差異分析、修正措施與建議-----	16
3. 工作數量報告-----	17
3.1 工作數量累計完成表-----	17
3.2 本期施工作業工班統計-----	17
4. 圖說/文件送審管制表-----	19
4.1 圖說送審管制總表-----	19
4.2 文件送審管制總表-----	20
5. 本期施工照片-----	22

1. 計畫彙總摘要

1.1 工程概述

台灣南部區域降雨豐枯達9：1，枯水季長(10月至隔年5月)，近年極端氣候旱澇兩極及用水成長等情境下，既有供水設施及調度系統已無法滿足跨區調度支援需求，相較台灣其他區域，南部區域整體缺水風險較高，而完備彈性的水源調度與管理機制，為降低缺水風險必要方法之一。

經濟部水利署南區水資源局(以下簡稱南水局)依據99年05月12日奉總統令公布實施之「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部供水特別條例」陸續進行曾文水庫防淤隧道等排砂設施及更新改善工作，達初步應急效果。為增加庫容以維持南部地區供水穩定，南水局歷年來已持續進行水庫更新改善及清淤工作，惟現因受限於水庫基礎設施不足，淤泥暫置區容量有限、供電限制需增加特高壓配電，以及抽泥船與抽泥管設施不足等，尚難達成恢復庫容的目標，爰辦理「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」(以下簡稱本計畫)。

本計畫奉行政院110年03月03日院臺經字第1100004878號函核定，計畫期程自111年起至114年底止。本計畫考量增設相關基礎設施，進而擴大庫區清淤範圍，每年可增加約306萬m³的清淤量，藉由放水渠道及擴大抽泥工程實施完成，不僅可增加淤泥暫置區容量且能減少滲漏損失，亦可增加水資源的利用效率，以提升供水穩定，更進一步以淤積零成長為目標，逐年恢復庫容。

本計畫工作項目包括放水渠道工程、特高壓配電工程、壩前碼頭改善工程、擴大抽泥管工程、其他配合工程等諸項，皆由南水局主辦。復經南水局檢討採統包方式有助於提升採購效率、品質、及早發揮本計畫效益，爰依政府採購法第24條第1項規定，以統包方式辦理本工程。

1.2 本期重要記事

1. 112 年 01 月 16 日

- (1) 放水渠道 1K+300~1K+400 圍堰施作；箱涵 0K+527~0K+580 第十一單元及第十二單元底版混凝土澆置；箱涵 0K+580~0K+790 兩側土方回填；箱涵 0K+880~0K+910（第二工作面）第十一單元頂版鋼筋綁紮。
- (2) ϕ 500SP 抽泥管上架(1K+556~3K+517.1)，今日上架 70m，累計 1701/2917m；上架銲接(1K+556~3K+517.1)，今日銲接 58m，累計 1701/2917m。
- (3) 業主函文檢送 112 年 01 月 05 日「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程施工階段環境監測」111 年年度報告審查會議紀錄 1 份。[112.01.16 水南曾字第 11206002400 號函]
- (4) 業主函文檢送有關 112 年 01 月 16 日職業安全、環境衛生稽(複)核表 1 份，請於 112 年 01 月 20 日前將改善成果報告檢送本所憑辦。[112.01.16 擴大抽泥工字第 112012 號備忘錄]
- (5) 業主同意結案 112 年 01 月 06 日之工地職安檢查稽核(第 20 次)缺失改善事項。[112.01.16 擴大抽泥工字第 112011 號備忘錄]
- (6) 函文檢陳 111 年 12 月 28 日第 1 次外部稽核缺失改善成果表乙份。[112.01.16 中工水利字第 112A8E0035 號備忘錄]
- (7) 函文檢陳「職業安全、環境衛生抽查(第 21 次)缺失改善結果。[112.01.17 中工水利字第 112A8E0042 號備忘錄]
- (8) 監造單位-職安衛設施(第 21 次)抽查改善。
- (9) 南水局品管課-職安衛稽查(第 6 次)。
- (10) 於本日 112 年 01 月 16 日上午 10 時 30 分，放水渠道 0K+527~0K+580 第十一單元及第十二單元底版 280kgf/cm² 混凝土取樣，本日共取 1 組(每組 7 日 2 顆、28 日 3 顆)。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (11) 於本日 112 年 01 月 16 日上午 11 時，至燕巢南水局實驗室送驗 01 月 12 日取樣之 280kgf/cm² 混凝土現場鑽心試體，本日共 7 組(每組 3 顆)；01 月 13 日之 280kgf/cm² 混凝土，本日共 1 組(每組 7 日 2 顆、28 日 3 顆)。[監造：江彥佑，統包商：李佩玲]
- (12) 於本日 112 年 01 月 16 日上午 09 時、10 時，放水渠道 0K+527~0K+580 第十一單元及第十二單元底版鋼筋查驗及木模查驗。[監造：江彥佑，統包商：廖銘祺]
- (13) 於本日 112 年 01 月 16 日上午 10 時 30 分、下午 13 時，放水渠道 0K+527~0K+580 第十一單元及第十二單元底版 280kgf/cm² 混凝土澆置查驗。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (14) 於本日 112 年 01 月 16 日下午 15 時 30 分，放水渠道 1K+060~1K+090（第二工作面）第十七單元底版鋼筋查驗。[監造：江彥佑，統包商：廖銘祺]
- (15) 於本日 112 年 01 月 16 日下午 16 時，放水渠道 0K+880~0K+910（第二工作面）第十一單元鋼模查驗。[監造：江彥佑，統包商：廖銘祺]

2. 112 年 01 月 17 日

- (1) 放水渠道 1K+300~1K+400 圍堰施作；箱涵 1K+060~1K+090（第二工作面）第十七單元底版混凝土澆置；箱涵 0K+580~0K+790 兩側土方回填；箱涵 0K+880~0K+910（第二工作面）第十一單元牆身及頂版混凝土澆置；工區整理。
- (2) 放水渠道 0K+900~1K+200 控制點測設；擴大抽泥管工程 315mmHDPE 抽泥管起訖位置收方。

- (3) 於本日112年01月17日上午10時20分，放水渠道 0K+880~0K+910（第二工作面）第十一單元牆身及頂版 280kgf/cm²混凝土取樣，本日共取1組（每組7日2顆、28日3顆）。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (4) 於本日112年01月17日上午11時45分，至養護池進行01月16日之280kgf/cm²混凝土試體（1組）拆模簽名，[監造：林恩如，統包商：李佩玲]
- (5) 於本日112年01月17日下午15時，至東口堰進行放水渠道1K+250~1K+550之鋼筋取樣，本日共取9組。[監造：林恩如，統包商：張瑋貞、李佩玲]
- (6) 於本日112年01月17日下午15時30分，放水渠道 1K+060~1K+090（第二工作面）第十七單元底版 280kgf/cm²混凝土取樣，本日共取1組（每組7日2顆、28日3顆）。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (7) 專任工程人員督察。
- (8) 於本日112年01月17日上午09時，放水渠道 0K+880~0K+910（第二工作面）第十一單元頂版鋼筋查驗。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (9) 於本日112年01月17日上午09時30分，放水渠道 1K+060~1K+090（第二工作面）第十七單元底版木模查驗。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (10) 於本日112年01月17日上午10時20分、下午13時，放水渠道 0K+880~0K+910（第二工作面）第十一單元牆身及頂版 280kgf/cm²混凝土澆置查驗。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (11) 於本日112年01月17日下午15時30分，放水渠道 1K+060~1K+090（第二工作面）第十七單元底版 280kgf/cm²混凝土澆置查驗。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]

3. 112 年 01 月 18 日

- (1) 放水渠道 0K+580~0K+790 箱涵兩側土方回填；箱涵 0K+880~0K+910（第二工作面）第十一單元頂版混凝土養護；工區整理；圍堰加強。
- (2) 業主函文檢送連局長上堯於112年01月11日走動式督導意見表1份，請於112年01月31日前改善完成，並將改善成果報告陳送本局憑辦。[112.01.18 擴大抽泥工字第112014號備忘錄]
- (3) 函文檢陳施工車輛通行證共計6張。[112.01.18 中工水利字第112A8E0043號備忘錄]
- (4) 函文檢陳「特高壓配電工程」細部設計單元（第一版/第2次），包含細部設計圖、經費概算書及施工技術規範各乙式10份。[112.01.18 中工工務字第1120118083號]
- (5) 函文檢陳「壩前碼頭改善工程（壩前碼頭道路改善工程）」細部設計單元（第一版/第2次），包含細部設計圖、設計計算書、經費概算書及施工技術規範各乙式10份。[112.01.18 中工工務字第1120118081號函]
- (6) 函文檢陳溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善細部設計單元（第一版/第2次），包含細部設計圖、設計計算書、經費概算書及施工技術規範各乙式10份。[112.01.18 中工工務字第1120118082號函]
- (7) 函文檢陳品管課「職業安全、環境衛生稽核（第6次）缺失改善結果」。[112.01.18 中工水利字第112A8E0044號備忘錄]
- (8) 於本日112年01月18日下午14時，至燕巢南水局實驗室送驗01月16日（1組）、01月17日（2組）取樣之280kgf/cm²混凝土，本日共3組（每組7日2顆、28日3顆）。[監造：江彥佑，統包商：李佩玲]
- (9) 於本日112年01月18日下午15時50分，至SP鋼管第一暫置區進行抽泥管H型鋼150×150鋼構支架進場查驗及取樣，本日共取2組。[監造：林恩如，統包商：張瑋貞]

(10) 配合實驗室過年期間不收樣，本日暫停澆置一日。

4. 112 年 01 月 19 日

- (1) 環境整理。
- (2) 業主函文檢送112年01月18日放水渠道工區及東口材料暫置區鋼筋暫置未墊高且鋼筋部分已鏽蝕之不合格報告，請於112年02月15日前將改善結果提送本所憑辦。[112.01.19 擴大抽泥工字第112015號備忘錄]
- (3) 業主函文檢退擴大抽泥管工程(300mm HDPE 抽泥管)試水計畫審查意見各一份，因本案僅為抽泥管從防淤隧道橫坑接既有抽泥管延伸至落水池，無配置相關閥體，非屬契約所規定之水工機械類，故不屬需試運轉範圍，本案請修正為試水計畫，並於112年02月08日前依據審查意見修正後函覆本所憑辦。[112.01.19 擴大抽泥工字第112013號備忘錄]
- (4) 監造單位-職安衛設施（第22次）抽查。
- (5) 業主函文檢退擴大抽泥管工程(5K+100~10K+750)細部設計圖說案，請依審查意見予以修正，並於112年02月13日前提送本局審查。[112.01.19 水南曾字第11206003440號函]
- (6) 函文檢陳本案半月進度報告(112年01月01日至112年01月15日)乙式5份。[112.01.19 中工工務字第1120119005號函]
- (7) 配合實驗室過年期間不收樣，本日暫停澆置一日。

5. 112 年 01 月 20 日

- (1) 農曆春節休假。
- (2) 春節期間工區安全衛生設施巡檢作業。
- (3) 於本日112年01月20日上午07時30分，至養護池進行111年12月23日施作之放水渠道1K+000~1K+200邊坡175kgf/cm²噴凝土格板鑽心取樣，本日共取2組(每組3顆)。[監造：江彥佑，統包商：李佩玲]
- (4) 於本日112年01月20日上午11時，至燕巢南水局實驗室送驗本日鑽心試體，本日共2組(每組3顆)。[監造：江彥佑，統包商：李佩玲] (因應施工規範要求，於年前與實驗室協調本日收樣此鑽心試體)
- (5) 依據人事行政局112年行事曆(112年01月20日至112年01月29日農曆春節)，農曆除夕及春節(1月21日【星期六】至1月24日【星期二】)，112年1月20日(小年夜)適逢星期五，依上開規定，調整為放假日，於前二週之星期六(1月7日)補行上班；因含2日例假日，於1月25日至26日(星期三、四)補假，1月27日(星期五)調整放假，並於2月4日(星期六)補行上班。

6. 112 年 01 月 21 日

- (1) 農曆春節休假(除夕)。
- (2) 春節期間工區安全衛生設施巡檢作業。

7. 112 年 01 月 22 日

- (1) 農曆春節休假(初一)。
- (2) 春節期間工區安全衛生設施巡檢作業。

8. 112 年 01 月 23 日

- (1) 農曆春節休假(初二)。
- (2) 春節期間工區安全衛生設施巡檢作業。

9. 112 年 01 月 24 日

- (1) 農曆春節休假(初三)。
- (2) 春節期間工區安全衛生設施巡檢作業。

10. 112 年 01 月 25 日

- (1) 農曆春節休假(初四補假)。
- (2) 春節期間工區安全衛生設施巡檢作業。

11. 112 年 01 月 26 日

- (1) 農曆春節休假(初五補假)。
- (2) 春節期間工區安全衛生設施巡檢作業。

12. 112 年 01 月 27 日

- (1) 放水渠道工區抽水。
- (2) 春節期間工區安全衛生設施巡檢作業。

13. 112 年 01 月 28 日

- (1) 放水渠道工區抽水。
- (2) 春節期間工區安全衛生設施巡檢作業。

14. 112 年 01 月 29 日

- (1) 放水渠道工區抽水。
- (2) 春節期間工區安全衛生設施巡檢作業。

15. 112 年 01 月 30 日

- (1) 放水渠道施工便道整地；箱涵 0K+527~0K+557 第十一單元鋼模組立。
- (2) § 300 HDPE抽泥管終點地形懸空段支撐施作。
- (3) 業主函文同意辦理H型鋼材料(銘基設計工程有限公司)送審資料。[112.01.30 擴大抽泥工字第112017號備忘錄]
- (4) 業主同意結案112年01月12日之工地職安檢查稽核(第21次)缺失改善事項。[112.01.30 擴大抽泥工字第112018號備忘錄]

16. 112 年 01 月 31 日

- (1) 放水渠道工區抽水；1K+300~1K+400 圍堰施作；箱涵 0K+580~0K+790 土方回填；箱涵 0K+527~0K+557 第十一單元鋼模組立。

- (2) ϕ 300 HDPE抽泥管終點地形懸空段支撐施作。
- (3) 業主函文同意備查統包商提送之112年01月01日至112年01月15日半月進度報告。
[112.01.31 水南曾字第11253005430號函]
- (4) 函文檢送112年01月11日連局長上堯走動式督(視)導記錄改善及辦理結果。[112.01.31 中工水利字第112A8E0054號備忘錄]
- (5) 112年01月協議組織(google線上簽到)。
- (6) 112年01月協議組織資料彙整。
- (7) 於本日112年01月31日上午09時30分， ϕ 500mm鋼管上架銲道檢驗，檢驗里程：
2K+867.60~3K+006.35、3K+011.30~3K+267.70、3K+270.40~3K+520.50。[監造：江彥佑
，統包商：張瑋貞]
- (8) 於本日112年01月31日上午10時，至曾庫公路及曾文電廠交叉路口進行擴大抽泥管工程
(0K+000~5K+100)施工障礙及介面現場之會勘。[112.01.13 水南曾字第11206001910號
會勘通知書]
- (9) 於本日112年01月31日下午14時，徐主工立政走動式督導。[南水局：劉課長、林岳鋒、
蔡怡菁、陳冠穎，監造：林家豐、林恩如，統包商：陳國峰、莊宏仁、洪駿凱，其他單
位：聯大、巨廷、富岳)]【督導意見及建議事項：① 500mm抽泥管過河段之右岸以及左
側至曾文2號橋，以及往大壩道路的埋設段，請統包商盡快安排施作時程。② 500mm抽泥
管沿線的2條原水管，若原水管為靠路側則移設至抽泥管支座上之原則，請統包商配合
施作，並盡快施作綠籬植栽作業。③ 放水渠道進水口P1橋墩基礎作業，因遇堅硬岩盤難
以鑽孔至設計深度，請統包商採預裂方式，並配合曾管停止放水時程盡速施作。】
- (10) 於本日112年01月31日，會同設計單位現勘確認 ϕ 300 HDPE抽泥管終點地形懸空段支撐
(或懸吊)補強施作工法，並將其終點固定座微調至需埋入土裡，轉角埋設至落水池。

1.3 本期施工概要說明

1. 資料編撰及送審

(1) 函送文件：

- A. 函文檢陳本案半月進度報告(112年01月01日至112年01月15日)乙式5份。
[112.01.19 中工工務字第1120119005號函]

(2) 核定/備查文件：

- A. 業主函文同意辦理H型鋼材料(銘基設計工程有限公司)送審資料。[112.01.30 擴大抽泥工字第112017號備忘錄]
B. 業主函文同意備查統包商提送之112年01月01日至112年01月15日半月進度報告。
[112.01.31 水南曾字第11253005430號函]

(3) 審退文件：

- A. 業主函文檢退擴大抽泥管工程(300mm HDPE 抽泥管)試水計畫審查意見各一份，因本案僅為抽泥管從防淤隧道橫坑接既有抽泥管延伸至落水池，無配置相關閘體，非屬契約所規定之水工機械類，故不屬需試運轉範圍，本案請修正為試水計畫，並於112年02月08日前依據審查意見修正後函覆本所憑辦。[112.01.19 擴大抽泥工字第112013號備忘錄]

2. 品質管制作業

- (1) 函文檢陳111年12月28日第1次外部稽核缺失改善成果表乙份。[112.01.16 中工水利字第112A8E0035號備忘錄]
(2) 於112年01月16日上午10時30分，放水渠道 0K+527~0K+580 第十一單元及第十二單元底版 280kgf/cm²混凝土取樣，本日共取1組(每組7日2顆、28日3顆)。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
(3) 於112年01月16日上午11時，至燕巢南水局實驗室送驗01月12日取樣之280kgf/cm²混凝土現場鑽心試體，本日共7組(每組3顆)；01月13日之280kgf/cm²混凝土，本日共1組(每組7日2顆、28日3顆)。[監造：江彥佑，統包商：李佩玲]
(4) 於112年01月17日上午10時20分，放水渠道 0K+880~0K+910 (第二工作面)第十一單元牆身及頂版 280kgf/cm²混凝土取樣，本日共取1組(每組7日2顆、28日3顆)。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
(5) 於112年01月17日下午15時，至東口堰進行放水渠道1K+250~1K+550之鋼筋取樣，本日共取9組。[監造：林恩如，統包商：張瑋貞、李佩玲]
(6) 於112年01月17日下午15時30分，放水渠道 1K+060~1K+090 (第二工作面)第十七單元底版 280kgf/cm²混凝土取樣，本日共取1組(每組7日2顆、28日3顆)。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
(7) 於112年01月18日下午14時，至燕巢南水局實驗室送驗01月16日(1組)、01月17日(2組)取樣之280kgf/cm²混凝土，本日共3組(每組7日2顆、28日3顆)。[監造：江彥佑，統包商：李佩玲]

- (8) 於112年01月18日下午15時50分，至SP鋼管第一暫置區進行抽泥管H型鋼150×150鋼構支架進場查驗及取樣，本日共取2組。[監造：林恩如，統包商：張瑋貞]
- (9) 於112年01月18日起至112年01月19日止，配合實驗室過年期間不收樣，本日暫停澆置。
- (10) 於112年01月20日上午07時30分，至養護池進行111年12月23日施作之放水渠道1K+000~1K+200邊坡175kgf/cm²噴凝土格板鑽心取樣，本日共取2組(每組3顆)。[監造：江彥佑，統包商：李佩玲]
- (11) 於112年01月20日上午11時，至燕巢南水局實驗室送驗本日鑽心試體，本日共2組(每組3顆)。[監造：江彥佑，統包商：李佩玲](因應施工規範要求，於年前與實驗室協調本日收樣此鑽心試體)
- (12) 於112年01月31日上午09時30分，\$ 500mm鋼管上架銲道檢驗，檢驗里程：2K+867.60~3K+006.35、3K+011.30~3K+267.70、3K+270.40~3K+520.50。[監造：江彥佑，統包商：張瑋貞]

3. 細部設計服務費

(1) 函送文件：

- A. 函文檢陳「特高壓配電工程」細部設計單元(第一版/第2次)，包含細部設計圖、經費概算書及施工技術規範各乙式10份。[112.01.18 中工工務字第1120118083號]
- B. 函文檢陳「壩前碼頭改善工程(壩前碼頭道路改善工程)」細部設計單元(第一版/第2次)，包含細部設計圖、設計計算書、經費概算書及施工技術規範各乙式10份。[112.01.18 中工工務字第1120118081號函]
- C. 函文檢陳溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善細部設計單元(第一版/第2次)，包含細部設計圖、設計計算書、經費概算書及施工技術規範各乙式10份。[112.01.18 中工工務字第1120118082號函]

(2) 核定/備查文件：(本期無)

(3) 審退文件：

- A. 業主函文檢退擴大抽泥管工程(5K+100~10K+750)細部設計圖說案，請依審查意見予以修正，並於112年02月13日前提送本局審查。[112.01.19 水南曾字第11206003440號函]

4. 工程會議/會勘、工程督導/查核

- (1) 業主函文檢送112年01月05日「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程施工階段環境監測」111年年度報告審查會議紀錄1份。[112.01.16 水南曾字第11206002400號函]
- (2) 業主函文檢送連局長上堯於112年01月11日走動式督導意見表1份，請於112年01月31日前改善完成，並將改善成果報告陳送本局憑辦。[112.01.18 擴大抽泥工字第112014號備忘錄]
- (3) 函文檢送112年01月11日連局長上堯走動式督(視)導記錄改善及辦理結果。[112.01.31 中工水利字第112A8E0054號備忘錄]

- (4) 於112年01月31日上午10時，至曾庫公路及曾文電廠交叉路口進行擴大抽泥管工程(0K+000~5K+100)施工障礙及介面現場之會勘。[112.01.13 水南曾字第11206001910號 會勘通知書]
- (5) 於112年01月31日下午14時，徐主工立政走動式督導。[南水局：劉課長、林岳鋒、蔡怡菁、陳冠穎，監造：林家豐、林恩如，統包商：陳國峰、莊宏仁、洪駿凱，其他單位：聯大、巨廷、富岳)]【督導意見及建議事項：① 500mm抽泥管過河段之右岸以及左側至曾文2號橋，以及往大壩道路的埋設段，請統包商盡快安排施作時程。② 500mm抽泥管沿線的2條原水管，若原水管為靠路側則移設至抽泥管支座上之原則，請統包商配合施作，並盡快施作綠籬植栽作業。③ 放水渠道進水口P1橋墩基礎作業，因遇堅硬岩盤難以鑽孔至設計深度，請統包商採預裂方式，並配合曾管停止放水時程盡速施作。】
- (6) 於112年01月31日，會同設計單位現勘確認 ϕ 300 HDPE抽泥管終點地形懸空段支撐(或懸吊)補強施作工法，並將其終點固定座微調至需埋入土裡，轉角埋設至落水池。

5. 重要紀事

- (1) 業主函文檢送有關112年01月16日職業安全、環境衛生稽(複)核表1份，請於112年01月20日前將改善成果報告檢送本所憑辦。[112.01.16 擴大抽泥工字第112012號備忘錄]
- (2) 業主同意結案112年01月06日之工地職安檢查稽核(第20次)缺失改善事項。[112.01.16 擴大抽泥工字第112011號備忘錄]
- (3) 函文檢陳「職業安全、環境衛生抽查(第21次)缺失改善結果。[112.01.17 中工水利字第112A8E0042號備忘錄]
- (4) 於112年01月16日，監造單位-職安衛設施(第21次)抽查改善。
- (5) 於112年01月16日，南水局品管課-職安衛稽查(第6次)。
- (6) 於112年01月16日上午09時、10時，放水渠道 0K+527~0K+580 第十一單元及第十二單元底版鋼筋查驗及木模查驗。[監造：江彥佑，統包商：廖銘祺]
- (7) 於112年01月16日上午10時30分、下午13時，放水渠道 0K+527~0K+580 第十一單元及第十二單元底版 280kgf/cm²混凝土澆置查驗。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (8) 於112年01月16日下午15時30分，放水渠道 1K+060~1K+090 (第二工作面)第十七單元底版鋼筋查驗。[監造：江彥佑，統包商：廖銘祺]
- (9) 於112年01月16日下午16時，放水渠道 0K+880~0K+910 (第二工作面)第十一單元鋼模查驗。[監造：江彥佑，統包商：廖銘祺]
- (10) 專任工程人員督察。
- (11) 於112年01月17日上午09時，放水渠道 0K+880~0K+910 (第二工作面)第十一單元頂版鋼筋查驗。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (12) 於112年01月17日上午09時30分，放水渠道 1K+060~1K+090 (第二工作面)第十七單元底版木模查驗。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (13) 於112年01月17日上午10時20分、下午13時，放水渠道 0K+880~0K+910 (第二工作面)第十一單元牆身及頂版 280kgf/cm²混凝土澆置查驗。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]
- (14) 於112年01月17日下午15時30分，放水渠道 1K+060~1K+090 (第二工作面)第十七單元底版 280kgf/cm²混凝土澆置查驗。[監造：林冠傑，統包商：廖銘祺]

- (15) 函文檢陳施工車輛通行證共計6張。[112.01.18 中工水利字第112A8E0043號備忘錄]
- (16) 函文檢陳品管課「職業安全、環境衛生稽核(第6次)缺失改善結果」。[112.01.18 中工水利字第112A8E0044號備忘錄]
- (17) 業主函文檢送112年01月18日放水渠道工區及東口材料暫置區鋼筋暫置未墊高且鋼筋部分已鏽蝕之不合格報告，請於112年02月15日前將改善結果提送本所憑辦。
[112.01.19 擴大抽泥工字第112015號備忘錄]
- (18) 於112年01月19日，監造單位-職安衛設施(第22次)抽查。
- (19) 於112年01月20日起至112年01月29日止，依據人事行政局112年行事曆(112年01月20日至112年01月29日農曆春節)，農曆除夕及春節(1月21日【星期六】至1月24日【星期二】)，112年1月20日(小年夜)適逢星期五，依上開規定，調整為放假日，於前二週之星期六(1月7日)補行上班；因含2日例假日，於1月25日至26日(星期三、四)補假，1月27日(星期五)調整放假，並於2月4日(星期六)補行上班，並於年節期間加強工區安全衛生設施巡檢作業。
- (20) 業主同意結案112年01月12日之工地職安檢查稽核(第21次)缺失改善事項。
[112.01.30 擴大抽泥工字第112018號備忘錄]
- (21) 於112年01月31日，112年01月協議組織(google線上簽到)。
- (22) 於112年01月31日，112年01月協議組織資料彙整。

1.4 下期主要施工項目

1. 資料編撰及送審

- (1) 各類分項計畫書撰寫。
- (2) 各類材料送審。

2. 品質管制作業

- (1) 材料進場取樣。

3. 細部設計服務費

- (1) 第一階段細部設計修訂。
- (2) 第二階段細部設計修訂。

4. 預計施作項目

- (1) 測量作業
- (2) 進水口、取排水閘門、固床工、格框護坦、梧棲溝排水箱涵銜接，導水箱涵(0k+000~0k+270)、截流溝系統施作
- (3) ϕ 300mm抽泥管工程、 ϕ 400及 ϕ 500mm抽泥管工程施作及抽泥管(埋管段、明管段及過河段)
- (4) 壩前碼頭道路改善陸域段

1.5 遭遇困難及請求協助事項（本期無）

2. 計畫進度分析及工作現況報告

2.1 計畫時程網狀圖

詳於附件一。

2.2 計畫時程桿狀圖

詳於附件二。

2.3 進度表與S進度曲線

詳於附件三。

2.4 工程現況說明

1. 設計作業現況

- (1) 函文檢陳概估整治預算及新設管陸併入本工程附掛之施工預算資料，經評估「一號導水隧道上方邊坡崩塌改善工程」之施工費用約422.4萬元，「原水管新設工程」之施工費用約1,377.6萬元，總工程費合計約2,441.88萬元，相關預算資料詳附件，尚在審查中。[111.09.08 中工工務字第1110908054號函]
- (2) 第一階段提送：
 - A. 擴大抽泥管工程 ϕ 300mm HDPE抽泥管及擴大抽泥工程(0K+000~5K+100)已於111年12月02日核定。[111.12.02 水南曾字第11106056110號函]
 - B. 放水渠道工程(0K+000~2K+400)已於111年12月27日核定。[111.12.27 水南曾字第11106064270號函]
 - C. 壩前碼頭改善工程(管徑400mm及管徑500mm抽泥管固定工程)已於111年12月02日提送細部設計單元(第一版/第5次)，審查中。[112.01.06 中工工務字第1120106037號函]
- (3) 第二階段提送：
 - A. 擴大抽泥管工程(5K+100~10K+750)已於112年01月19日審退細部設計單元(第一版/第1次)，依審查意見修正中，預計於112年02月13日前重新提送。[112.01.19 水南曾字第11206003440號函]
 - B. 放水渠道工程(2K+400~4K+530)已於111年12月14日提送細部設計單元(第一版/第1次)，審查中。[111.12.14 中工工務字第1111214029號函]
 - C. 壩前碼頭改善工程(壩前碼頭道路改善工程)已於112年01月18日提送細部設計單元(第一版/第2次)，審查中。[112.01.18 中工工務字第1120118081號函]
 - D. 特高壓配電工程已於112年01月18日提送細部設計單元(第一版/第2次)，審查中。[112.01.18 中工工務字第1120118083號函]

- E. 溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善細部設計單元應於111年12月15日前完成細部設計圖說送機關審核，惟溪畔公園材料堆置場將由曾文南化聯通管統包工程A1標辦理溪畔公園護岸整治工程，且目前為南水局轄下工程土方及材料堆置場地使用中，其地形將大幅變化，故建請機關同意本工程申請展延，待A1標工程完成溪畔公園護岸整治工程後視機關指示及需求再行辦理細部設計。[111.12.14 中工工務字第1111214028號]
- G. 溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善細部設計單元(第一版/第2次)已於112年01月18日提送，審查中。[112.01.18 中工工務字第1120118082號函]

2. 施工作業現況

(1) 測量作業

- A. 放水渠道0K+900~1K+200控制點測設。
- B. 擴大抽泥管工程315mmHDPE抽泥管起訖位置收方。

(2) 放水渠道工程

- A. 導水箱涵工區抽水、施工便道整地。
- B. 導水箱涵1K+300~1K+400 圍堰施作。
- C. 導水箱涵0K+580~0K+790 土方回填。
- D. 導水箱涵0K+527~0K+557 第十一單元鋼模組立。
- E. 導水箱涵0K+557~0K+580 第十二單元底版混凝土澆置。
- F. 導水箱涵0K+880~0K+910 (第二工作面)第十一單元結構體施作完成。
- G. 導水箱涵1K+060~1K+090 (第二工作面)第十七單元底版混凝土澆置。

(3) 擴大抽泥管工程

- A. $\phi 500$ SP抽泥管上架(1K+556~3K+517.1)，累計1701/2917m。
- B. $\phi 500$ SP抽泥管上架銲接(1K+556~3K+517.1)，累計1701/2917m。
- C. $\phi 300$ HDPE抽泥管終點地形懸空段支撐施作。

2.5 要徑分析

- (1) 本期預定累計進度為 12.3700%，實際累計進度為 18.4297%，目前超前 6.0597%。
- (2) 本期各項工程進度情況詳於附件五。
- (3) 依據預定進度，現階段及下期要徑皆為導水箱涵(0k+270~2k+270)，現階段其他預計施作工項為 $\phi 400$ mm及 $\phi 500$ mm HDPE抽泥管上架，其 $\phi 400$ 及 $\phi 500$ 抽泥管上架材料正在製造中及壩前碼頭道路改善陸域段，原預計施作跨河段之抽泥工程，配合材料時程調整為先行施作明管段，詳參附件一。

2.6 里程碑追蹤

(1) 細部設計(第一階段)：

- A. 擴大抽泥管工程(0k+000~5k+100)：於111年09月06日核定細部設計圖，其施工預算書於111年12月02日核定。
- B. 擴大抽泥管工程($\phi 300$ mm管線部分)：於111年06月07日核定細部設計圖，其施工預算書於111年12月02日核定。

C. 進水口固床工及導水箱涵(0k+000~2k+400，不含水工機械及截流溝)：(箱涵部分)細部設計圖已於111年06月20日核定，其餘部分第二次細設成果，已於111年09月06核定，其施工預算書另案提送，並已於111年12月27日核定。

D. 壩前碼頭改善工程(管徑400mm及管徑500mm抽泥管固定工程)：已於112年01月06日提送細部設計單元(第一版/第5次)，審查中。

(2) 細部設計(第二階段)：

A. 擴大抽泥管工程(5K+100~10K+750)：於112年01月19日審退細部設計單元(第一版/第1次)，預計於112年02月13日前依審查意見修正後重新提送。

B. 放水渠道工程(2K+400~4K+530)：於111年12月14日提送細部設計單元(第一版/第1次)，審查中。

C. 壩前碼頭改善工程(壩前碼頭道路改善工程)：已於112年01月18日提送細部設計單元(第一版/第2次)，審查中。

D. 特高壓配電工程：已於112年01月18日提送細部設計單元(第一版/第2次)，審查中。

E. 溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善：應於111年12月15日前完成細部設計圖說送機關審核，惟溪畔公園材料堆置場將由曾文南化聯通管統包工程A1標辦理溪畔公園護岸整治工程，且目前為南水局轄下工程土方及材料堆置場地使用中，其地形將大幅變化，故建請機關同意本工程申請展延，待A1標工程完成溪畔公園護岸整治工程後視機關指示及需求再行辦理細部設計。

F. 溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善：已於112年01月18日提送細部設計單元(第一版/第2次)，審查中。

(2) 施工：

A. 放水渠道需於年底前完成2000m契約里程碑，截止至112年01月31日已完成0K+245~0K+527及0K+580~0K+910，共612m。

2.7 各項申辦作業狀況

(1) 於111年07月12日函文惠請貴局協助函轉台南市政府同意認定為重大建設計畫所需之臨時性設施使用，檢陳本公司承攬政府重大建設計畫「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」，租用臺南市楠西區楠西段共1筆地號作為業主、監造及本公司臨時辦公房舍使用之相關申辦文件，業主於111年12月05日函文依據臺南市政府農業局111年11月24日南市農工字第1111529794號函辦理，請本所於111年12月20日函文惠請貴局協助函轉各目的事業主管機關查詢本地號(楠西區楠西段378地號)是否為不得設置之地區，業主於112年01月03日函復，請本公司配合逕洽相關單位查明，並配合修正農業用地臨時使用說明書，修正完妥後由貴處逕辦後續事宜，並於112年01月19日函轉各相關單位確認本地號是否為不得設置之地區。[111.07.12 中工工務字第1110712001號函；112.01.03 擴大抽泥工字第112001號備忘錄；112.01.19 中工工程工務字第1120119041號、中工工程工務字第1120119042號、中工工程工務字第1120119043

2.8 前後一個月作業項目時程表

詳於附件二。

2.9 差異分析、修正措施與建議

本期無。

3. 工作數量報告

3.1 工作數量累積完成表

詳於附件四。

3.2 本期施工作業工班統計

1. 施工作業人員統計

工別	單位	前期累計人數	本期使用人數	累計使用人數	備註
施工總負責人	人	202	6	208	
專任工程人員	人	202	6	208	
工地主任	人	202	6	208	
品管人員	人	687	28	715	
職安人員	人	487	22	509	
工程師	人	923	44	967	
測量人員	人	148	2	150	
一般工	人	1,063	23	1,086	
水電工	人	18	-	18	
鋼筋工	人	915	7	922	
模板工	人	305	10	315	
泥水工	人	11	-	11	
機械操作工	人	1,121	22	1,143	
混凝土澆置工	人	216	10	226	
其他工	人	1,036	5	1,041	
熔接工	人	13	-	13	

2. 施工作業機具統計

工別	單位	前期累計人數	本期使用人數	累計使用人數	備註
挖土機	台	614	16	630	
破碎機	台	141	-	141	
溼式噴漿機	台	4	-	4	
噴漿設備	套	36	-	36	
移動式起重機	台	130	5	135	
車載式起重機	台	86	5	91	
傾卸卡車	台	164	2	166	
壓路機	台	1	-	1	
手持鑽孔機	台	75	-	75	

工別	單位	前期累計人數	本期使用人數	累計使用人數	備註
空壓機設備	套	18	-	18	
推土機	台	93	-	93	
拖板車	台	44	-	44	
灌漿設備	套	24	-	24	
發電機	台	343	24	367	
鏟裝機	套	32	-	32	
熔接設備	台	8	-	8	
泵浦車	台	25	2	27	

3. 晴雨表

詳於附件五。

4. 圖說/文件送審管制表

4.1 圖說送審管制總表

[illegible]

4.2 文件送審管制總表

未提送，本月屆期提送之文件。

已提送，尚待審閱/核定之文件。

未提送，下月預定提送之文件。

應提送未提送，已逾期預定提送日期。

項次	文件編號	文件名稱	預定提送 (送審)日期	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	核定日期
					提送文號	回覆文號			提送文號	回覆文號			提送文號	回覆文號			提送文號	回覆文號		核定文號
1	QP-01-01	整體施工計畫	111.04.24	第一版 第1次	111.04.22 中工工務字第 1110422019號函	111.05.13 水南曾字第 11130025480號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.05.20 中工工務字第 1110519041號函	111.06.06 水南曾字第 11153036400號函	核定	第一版 (核定版)	111.06.07 中工工務字第 1110607057號函		依核定公文要求檢 附核定版					111.06.06 水南曾字第 11153036400號函
1	QP-01-02	整體施工計畫	111.10.06	第二版 第1次	111.10.06 中工水利字第 111A8E0332號備忘錄	111.10.14 水南曾字第 11106049510號函	核定													111.10.14 水南曾字第 11106049510號函
2	QP-02-01	整體品質計畫	111.04.24	第一版 第1次	111.04.22 中工工務字第 1110422014號函	111.05.13 水南曾字第 11130025480號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.05.20 中工工務字第 1110519040號函	111.06.01 水南曾字第 11153036410號函	核定	第一版 (核定版)	111.06.07 中工工務字第 1110607056號函		依核定公文要求檢 附核定版					111.06.01 水南曾字第 11153036410號函
2	QP-02-02	整體品質計畫	111.10.06	第二版 第1次	111.10.06 中工水利字第 111A8E0332號備忘錄	111.10.14 水南曾字第 11106049490號函	核定													111.10.14 水南曾字第 11106049490號函
3	QP-03-01	職業安全衛生管理計畫	111.04.24	第一版 第1次	111.04.15 中工工務字第 1110415063號函	111.05.10 水南曾字第 11130024090號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.05.17 中工工務字第 1110517047號函	111.06.02 水南曾字第 11130029420號函	依審查意見修正	第一版 第3次	111.06.09 中工工務字第 1110609001號函	111.06.20 水南曾字第 11130031200號函	核定	第一版 (核定版)	111.06.23 中工工務字第 1110623007號函		依核定公文要求檢 附核定版	111.06.20 水南曾字第 11130031200號函
4	QP-04-01	設計工作執行計畫書暨設計品管計畫書	111.03.30	第一版 第1次	111.03.28 中工工務字第 1110328042號函	111.04.15 水南曾字第 11153025750號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.04.22 中工工務字第 1110422006號函	111.05.10 水南曾字第 11153031880號函	依審查意見修正	第一版 第3次	111.05.13 中工工務字第 1110513047號函	111.06.20 水南曾字第 11130030370號函	核定					111.06.20 水南曾字第 11130030370號函
5	QP-05-01	實施簽證執行計畫書	111.04.24	第一版 第1次	111.04.07 中工工務字第 111040724號函	111.04.12 水南曾字第 111300188000號函	核定													111.04.12 水南曾字第 111300188000號函
6	QP-06-01	設計階段施工風險評估報告	111.06.30	第一版 第1次	111.06.30 中工工務字第 1110630011號函	111.07.27 水南曾字第 11130040300號函	原則認可， 依審查意見修正	第一版 第2次	111.08.25 中工工務字第 1110825002號函	111.09.16 水南曾字第 11106042260號函	核定									111.09.16 水南曾字第 11106042260號函
7	QP-07-01	補充地質調查計畫書	111.04.07	第一版 第1次	111.04.07 中工工務字第 1110407025號函	111.04.13 水南曾字第 11153025130號函	核定													111.04.13 水南曾字第 11153025130號函]
8	QP-08-01	補充地形測量計畫書	111.04.24	第一版 第1次	111.05.05 中工工務字第 1110505038號函	111.05.20 水南曾字第 11130027290號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.05.26 中工工務字第 1110526012號函	111.06.06 水南曾字第 11130029650號函	核定									111.06.06 水南曾字第 11130029650號函
9	QP-09-01	既有管線調查計畫	111.04.07	第一版 第1次	111.04.07 中工工務字第 111040726號函	111.04.22 水南曾字第 11153027850號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.04.28 中工工務字第 1110428052號函	111.05.05 水南曾字第 11130023220號函	核定									111.05.05 水南曾字第 11130023220號函
10	QP-10-01	防汛及緊急應變計畫	111.05.31	第一版 第1次	111.05.16 中工工務字第 1110516004號函	111.06.02 水南曾字第 11130029550號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.06.09 中工工務字第 1110609002號函	111.06.16 水南曾字第 11130032230號函	核定	第一版 (核定版)	111.06.20 中工工務字第 1110620006號函		依核定公文要求檢 附核定版					111.06.16 水南曾字第 11130032230號函
11	QP-11-01	營建工地逕流廢水汙染削減計畫	111.05.06	第一版 第1次	111.05.06 中工工務字第 1110506044號函	111.06.13 水南曾字第 11130031260號函	核定													111.06.13 水南曾字第 11130031260號函
12	QP-12-01	補充地質調查成果報告	111.07.15	第一版 第1次	111.07.04 中工工務字第 1110630012號函	111.07.18 水南曾字第 11130038350號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.07.21 中工工務字第 1110721029號函	111.07.27 水南曾字第 11130040850號函	核定	第一版 (核定版)	111.08.01 中工工務字第 1110801001號函		依核定公文要求檢 附核定版					111.07.27 水南曾字第 11130040850號函
13	QP-13-01	補充地形測量成果報告	111.09.15	第一版 第1次	111.09.08 中工工務字第 1110908058號函	111.09.27 水南曾字第 11106046200號函	核定													111.09.27 水南曾字第 11106046200號函
14	QP-14-01	施工規劃階段施工風險評估報告	111.05.31	第一版 第1次	111.05.16 中工工務字第 1110516005號函	111.06.09 水南曾字第 11130030650號函	原則認可， 依審查意見修正	第一版 第2次	111.07.01 中工工務字第 1110701001號函	111.07.20 水南曾字第 11130039130號函	核定	第一版 (核定版)	111.07.22 中工工務字第 1110722038號函		依核定公文要求檢 附核定版					111.07.20 水南曾字第 11130039130號函
15	QP-15-01	攝錄影計畫	111.05.31	第一版 第1次	111.05.10 中工工務字第 1110511024號函	111.05.26 水南曾字第 11153037140號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.05.31 中工工務字第 1110531008號函	111.06.13 水南曾字第 11153039190號函	核定									111.06.13 水南曾字第 11153039190號函
16	QP-16-01	剩餘土石方處理計畫	111.05.31	第一版 第1次	111.05.16 中工工務字第 1110516001號函	111.05.26 水南曾字第 11153037160號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.05.31 中工工務字第 1110531009號函	111.06.20 水南曾字第 11153039170號函	核定									111.06.20 水南曾字第 11153039170號函
17	QP-17-01	交通維持計畫	111.05.31	第一版 第1次	111.05.16 中工工務字第 1110516002號函	111.06.09 水南曾字第 11130030750號函	原則認可， 依審查意見修正	第一版 第2次	111.06.30 中工工務字第 1110630048號函	111.07.20 水南曾字第 11130039110號函	核定	第一版 (核定版)	111.07.22 中工工務字第 1110722037號函		依核定公文要求檢 附核定版					111.07.20 水南曾字第 11130039110號函
18	QP-18-01	墜落災害防止計畫	111.05.31	第一版 第1次	111.05.16 中工工務字第 1110516003號函	111.06.06 水南曾字第 11130029540號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.06.10 中工工務字第 1110610013號函	111.06.16 水南曾字第 11130032270號函	核定	第一版 (核定版)	111.06.20 中工工務字第 1110620005號函		依核定公文要求檢 附核定版					111.06.16 水南曾字第 11130032270號函
19	QP-19-01	鄰房現況鑑定計畫	111.07.31	第一版 第1次	111.07.21 中工工務字第 1110721026號函	111.08.03 水南曾字第 11153056170號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.08.08 中工工務字第 1110808002號函	111.08.12 水南曾字第 11153058060號函	核定	第一版 (核定版)	111.08.16 中工工務字第 1110816001號函		依核定公文要求檢 附核定版					111.08.12 水南曾字第 11153058060號函
19	QP-19-02	施工前鄰房現況鑑定報告書	111.10.20	初稿	111.10.20 中工工務字第 1111020018號函	111.10.27 水南曾字第 11153076880號函	核定	定稿版	111.11.08 中工工務字第 1111108009號函		依備查公文要求檢 附定稿版									111.10.27 水南曾字第 11153076880號函
20	QP-20-01	既有管線調查成果報告	111.09.05	第一版 第1次	111.09.05 中工工務字第 1110905044號函	111.09.27 水南曾字第 11106046180號函	核定													111.09.27 水南曾字第 11106046180號函
21	QP-21-01	水土保持計畫	112.01.15																	
22	QP-22-01	擴大抽泥管工程管徑300工程分項 施工暨品質計畫	111.06.30	第一版 第1次	111.05.20 中工工務字第 1110520024號函	111.06.02 水南曾字第 11153038420號函	依審查意見修正	第一版 第2次	111.06.07 中工工務字第 1110607010號函	111.06.30 水南曾字第 11153046150號函	依審查意見修正	第一版 第3次	111.07.01 中工工務字第 1110701054號函	111.07.11 水南曾字第 11130036950號	核定					111.07.11 水南曾字第 11130036950號

	未提送，本月屆期提送之文件。		未提送，下月預定提送之文件。
	已提送，尚待審閱/核定之文件。		應提送未提送，已逾期預定提送日期。

項次	文件編號	文件名稱	預定提送 (送審)日期	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	核定日期
					提送文號	回覆文號			提送文號	回覆文號			提送文號	回覆文號			提送文號	回覆文號		核定文號
23	QP-23-01	擴大抽泥管工程管徑500工程分項 施工暨品質計畫	111.09.15	第一版 第1次	111.07.15	111.08.03	依審查意 見修正	第一版 第2次	111.08.09	111.09.05	核定									111.09.05
					中工工務字第 1110715004號函	水南曾字第 11153054530號函			中工工務字第 1110809003號函	水南曾字第 11130047490號函										水南曾字第 11130047490號函
24	QP-24-01	放水渠道工程分項施工暨分項品 質計畫	111.09.30	第一版 第1次	111.05.20	111.06.06	依審查意 見修正	第一版 第2次	111.06.10	111.07.21	依審查意 見修正	第一版 第3次	111.07.26	111.09.15	原則同意， 依審查意見 修正	第一版	111.09.22	111.10.11	核定	111.10.11
					中工工務字第 1110518009號函	水南曾字第 11153038780號函			中工工務字第 1110610041號函	水南曾字第 11153052340號函			中工工務字第 1110726024號函	水南曾字第 11106042660號			中工工務字第 1110922019號函	水南曾字第 11106048010號函		水南曾字第 11106048010號函
25	QP-25-01	壩前碼頭道路改善工程分項施工 暨分項品質計畫	112.01.15	第一版 第1次	112.01.14															
					中工水利字第 112A8E0032號備忘錄															
26	QP-26-01	壩前碼頭管路上架工程分項施工 暨分項品質計畫	111.07.15	第一版 第1次	111.07.15	111.08.03	依審查意 見修正	第一版 第2次	111.08.09	111.09.05	核定									111.09.05
					中工工務字第 1110715003號函	水南曾字第 11153053760號函			中工工務字第 1110809001號函	水南曾字第 11153061440號函										水南曾字第 11153061440號函
27	QP-27-01	特高壓工程分項施工暨分項品質 計畫	112.11.30																	
28	QP-28-01	地下管線保護與復舊計畫	111.09.30	第一版 第1次	111.09.30	111.10.18	依審查意 見修正	第一版 第2次	111.11.02	111.11.25	核定									111.11.25
					中工工務字第 1111110930002號函	水南曾字第 11106050950號函			中工水利字第 111A8E0373號函	水南曾字第 11106058280號函										水南曾字第 11106058280號函
29	QP-29-01	管路試壓計畫	112.01.15	第一版 第1次	112.01.14															
					中工水利字第 112A8E0033號備忘錄															
30	QP-30-01	現地填方固化處理試拌計畫	111.04.04	第一版 第1次	111.03.28	111.04.12	核定													111.04.12
					中工工務字第 1110328021號函	水南曾字第 11153025120號函														水南曾字第 11153025120號函
31	QP-31-01	水工機械及閘門安裝分項施工計 畫	112.03.15																	
32	QP-32-01	渠道箱涵鋼模支撐計畫(含計算書)	111.09.30	第一版 第1次	111.06.21	111.06.30	同意辦理， 依審查意見 修正	第一版 第2次	111.07.21											
					中工工務字第 1110621007號函	水南曾字第 11153046790號函			中工工務字第 1110721001號函											
33	QP-33-01	放水渠道試運轉計畫	113.09.30																	
34	QP-34-01	擴大抽泥管500管徑試運轉計畫	113.09.30																	
35	QP-35-01	擴大抽泥管300管徑試水計畫	111.12.31	第一版 第1次	111.12.30	112.01.19	依審查意 見修正後 重新提送	第一版 第2次	112.02.08											
					中工水利字第 111A8E0493號備忘錄	擴大抽泥工字第 112013號備忘錄														
36	QP-36-01	特高壓輸變電測試計畫	113.12.31																	
37	QP-37-01	現地填方固化處理拌合成果報告	111.06.08	第一版 第1次	111.06.08	111.06.28	依審查意 見修正	第一版 第2次	111.07.01	111.09.15	原則同意， 依審查意見 修正	第一版 第3次	111.09.20	111.10.11	核定					111.10.11
					中工工務字第 1110608049號函	水南曾字第 11153044060號函			中工工務字第 1110701052號函	水南曾字第 11106042720號函			中工工務字第 1110701052號函	水南曾字第 11106048000號函						水南曾字第 11106048000號函
38	QP-38-01	SP鋼管製作計畫	111.09.30	第一版 第1次	111.09.30	111.10.13	依審查意 見修正	第一版 第2次	111.10.18	111.11.11	核定									111.11.11
					中工水利字第 111A8E0321號函	水南曾字第 11153075140號函			中工水利字第 111A8E0347號函	水南曾字第 11106056230號函										水南曾字第 11106056230號函
39	QP-39-01	閘類製作計畫	112.01.15	第一版 第1次	111.09.29	111.10.13	依審查意 見修正	第一版 第2次	111.10.20	111.11.11	核定									111.11.11
					中工水利字第 111A8E0316號備忘錄	水南工字第 11153075150號			中工水利字第 111A8E0351號函	111.11.11 水南曾字第 11106055650號函										111.11.11 水南曾字第 11106055650號函
40	QP-40-01	混凝土澆置工程分項施工計畫	111.06.30	第一版 第1次	111.06.17	111.06.28	依審查意 見修正	第一版 第2次	111.07.01	111.07.06	核定									111.07.06
					中工工務字第 1110617023號函	水南曾字第 11153044060號函			中工工務字第 1110701026號函	水南曾字第 11153047900號函										水南曾字第 11153047900號函
41	QP-41-01	鋼筋工程分項施工計畫	111.09.15	第一版 第1次	111.06.07	111.06.10	附件：納入「各 分項工程估工料 單(含分項品質計 劃)」，同頁													不再各案提送
					中工工務字第 1110607038號函	水南曾字第 11153040930號函														
42	QP-42-01	噴凝土工程分項施工計畫	111.06.30	第一版 第1次	111.06.07	111.06.10	附件：納入「噴 凝土工程分項 工程估工料單(含 分項品質計畫)」， 同頁													不再各案提送
					中工工務字第 1110607044號函	水南曾字第 11153040960號函														

5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

項 目	放水渠道工程	日 期	2023.01.16
	說明：φ 500SP抽泥管吊運至施作處旁及暫置場整理。	編 號	1
		地 點	
		放水渠道 1K+300~1K+400	
項 目	放水渠道工程	日 期	2023.01.16
	說明：第十一單元及第十二單元底版混凝土澆置。	編 號	2
		地 點	
		放水渠道 0K+527~0K+580	
項 目	放水渠道工程	日 期	2023.01.16
	說明：兩側土方回填。	編 號	3
		地 點	
		放水渠道 0K+580~0K+790	

5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

項 目	放水渠道工程	日 期	2023.01.16
	說明：(第二工作面)第十一單元頂版鋼筋綁紮。	編 號	4
		地	點
		放水渠道 0K+880~0K+910	
項 目	擴大抽泥管工程	日 期	2023.01.16
	說明：500mm鋼管上架銲接。	編 號	5
		地	點
		500mm鋼管 1K+556~ 3K+517.1	
項 目	放水渠道工程	日 期	2023.01.17
	說明：圍堰施作。	編 號	6
		地	點
		放水渠道 1K+300~1K+400	

5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

項 目	放水渠道工程	日 期	2023.01.17
		編 號	7
		地	點
		放水渠道 1K+060~1K+090	
說明：(第二工作面)第十七單元底版混凝土澆置。			
項 目	放水渠道工程	日 期	2023.01.17
		編 號	8
		地	點
		放水渠道 0K+580~0K+790	
說明：兩側土方回填。			
項 目	放水渠道工程	日 期	2023.01.17
		編 號	9
		地	點
		放水渠道 0K+880~0K+910	
說明：(第二工作面)第十一單元牆身及頂版混凝土澆置。			

5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

項 目		測量作業	日 期	2023.01.17
		編 號	10	
		地 點		
		放水渠道 1K+300~1K+400		
說明：圍堰及施工便道施作、河川改道。				
項 目		放水渠道工程	日 期	2023.01.18
		編 號	11	
		地 點		
		放水渠道 0K+580~0K+790		
說明：箱涵兩側土方回填。				
項 目		擴大抽泥管工程	日 期	2023.01.30
		編 號	12	
		地 點		
		放水渠道工區		
說明：施工便道整地。				


5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

項 目		放水渠道工程		日 期	2023.01.30
				編 號	13
				地 點	
				放水渠道 0K+527~0K+557	
說明：第十一單元鋼模組立。					
項 目		擴大抽泥管工程		日 期	2023.01.30
				編 號	14
				地 點	
				φ 300 HDPE抽泥 管終點	
說明：地形懸空段支撐施作。					
項 目		放水渠道工程		日 期	2023.01.31
				編 號	15
				地 點	
				放水渠道工區	
說明：抽水。					


5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

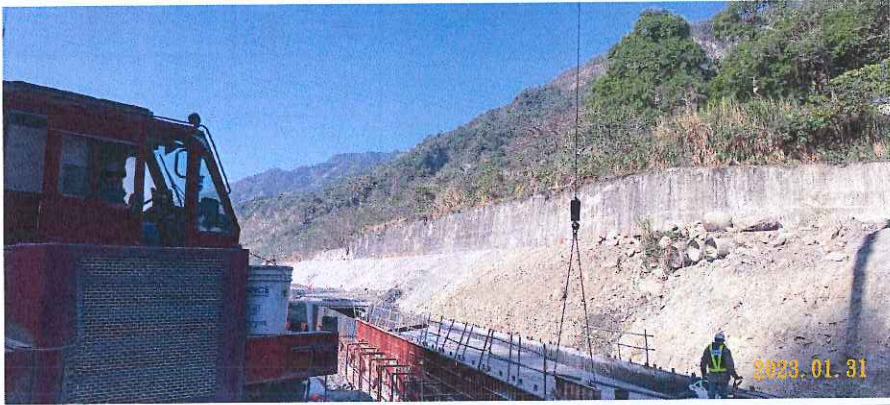項 目		放水渠道工程		日 期	2023. 01. 31
				編 號	16
				地 點	
				放水渠道 0K+527~0K+557	
說明：第十一單元鋼模組立。					
項 目		放水渠道工程		日 期	2023. 01. 31
				編 號	17
				地 點	
				放水渠道 0K+580~0K+790	
說明：土方回填。					
項 目		擴大抽泥管工程		日 期	2023. 01. 31
				編 號	18
				地 點	
				φ 300 HDPE抽泥 管終點	
說明：地形懸空段支撐施作。					

5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

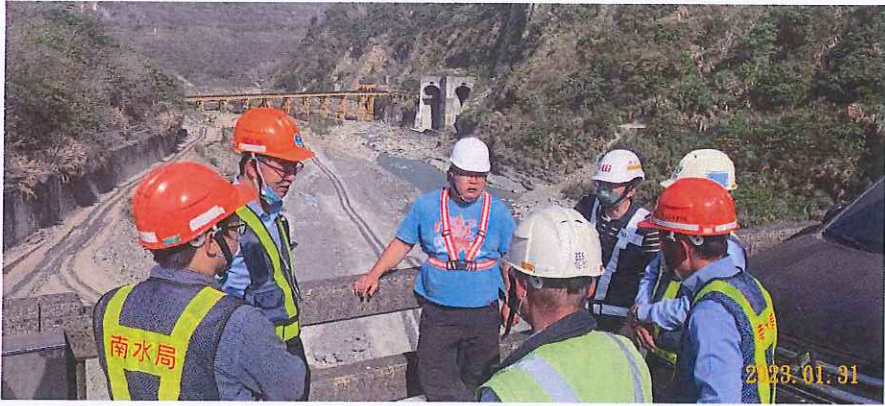項 目	走動式督導	日 期	2023.01.31
		編 號	19
		地 點	曾文五號橋
		說明：徐主工立政走動式督導。	
項 目	走動式督導	日 期	2023.01.31
		編 號	20
		地 點	曾文五號橋
		說明：徐主工立政走動式督導。	
項 目	走動式督導	日 期	2023.01.31
		編 號	21
		地 點	擴大抽泥工區
		說明：徐主工立政走動式督導。	

5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

項 目	擴大抽泥管工程(0K+000~5K+100)現場會勘	日 期	2023.01.31
		編 號	22
		地	點
		曾庫公路及曾文電廠交叉路口	
說明：施工障礙及介面現場之會勘。			
項 目	擴大抽泥管工程(0K+000~5K+100)現場會勘	日 期	2023.01.31
		編 號	23
		地	點
		曾庫公路及曾文電廠交叉路口	
說明：施工障礙及介面現場之會勘。			
項 目	φ 300 HDPE抽泥管終點地形現場會勘	日 期	2023.01.31
		編 號	24
		地	點
		φ 300 HDPE抽泥管終點	
說明：懸空段支撐(或懸吊)補強施作工法。			

6. 附件

附件一 計畫時程網狀圖


附件二 計畫時程桿狀圖（含前後一個月作業項目時程圖）

附件三 進度表與S進度曲線

附件四 工作數量累計完成表

附件五 晴雨表(含逐時降水量月報表)

曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程 工程網狀圖

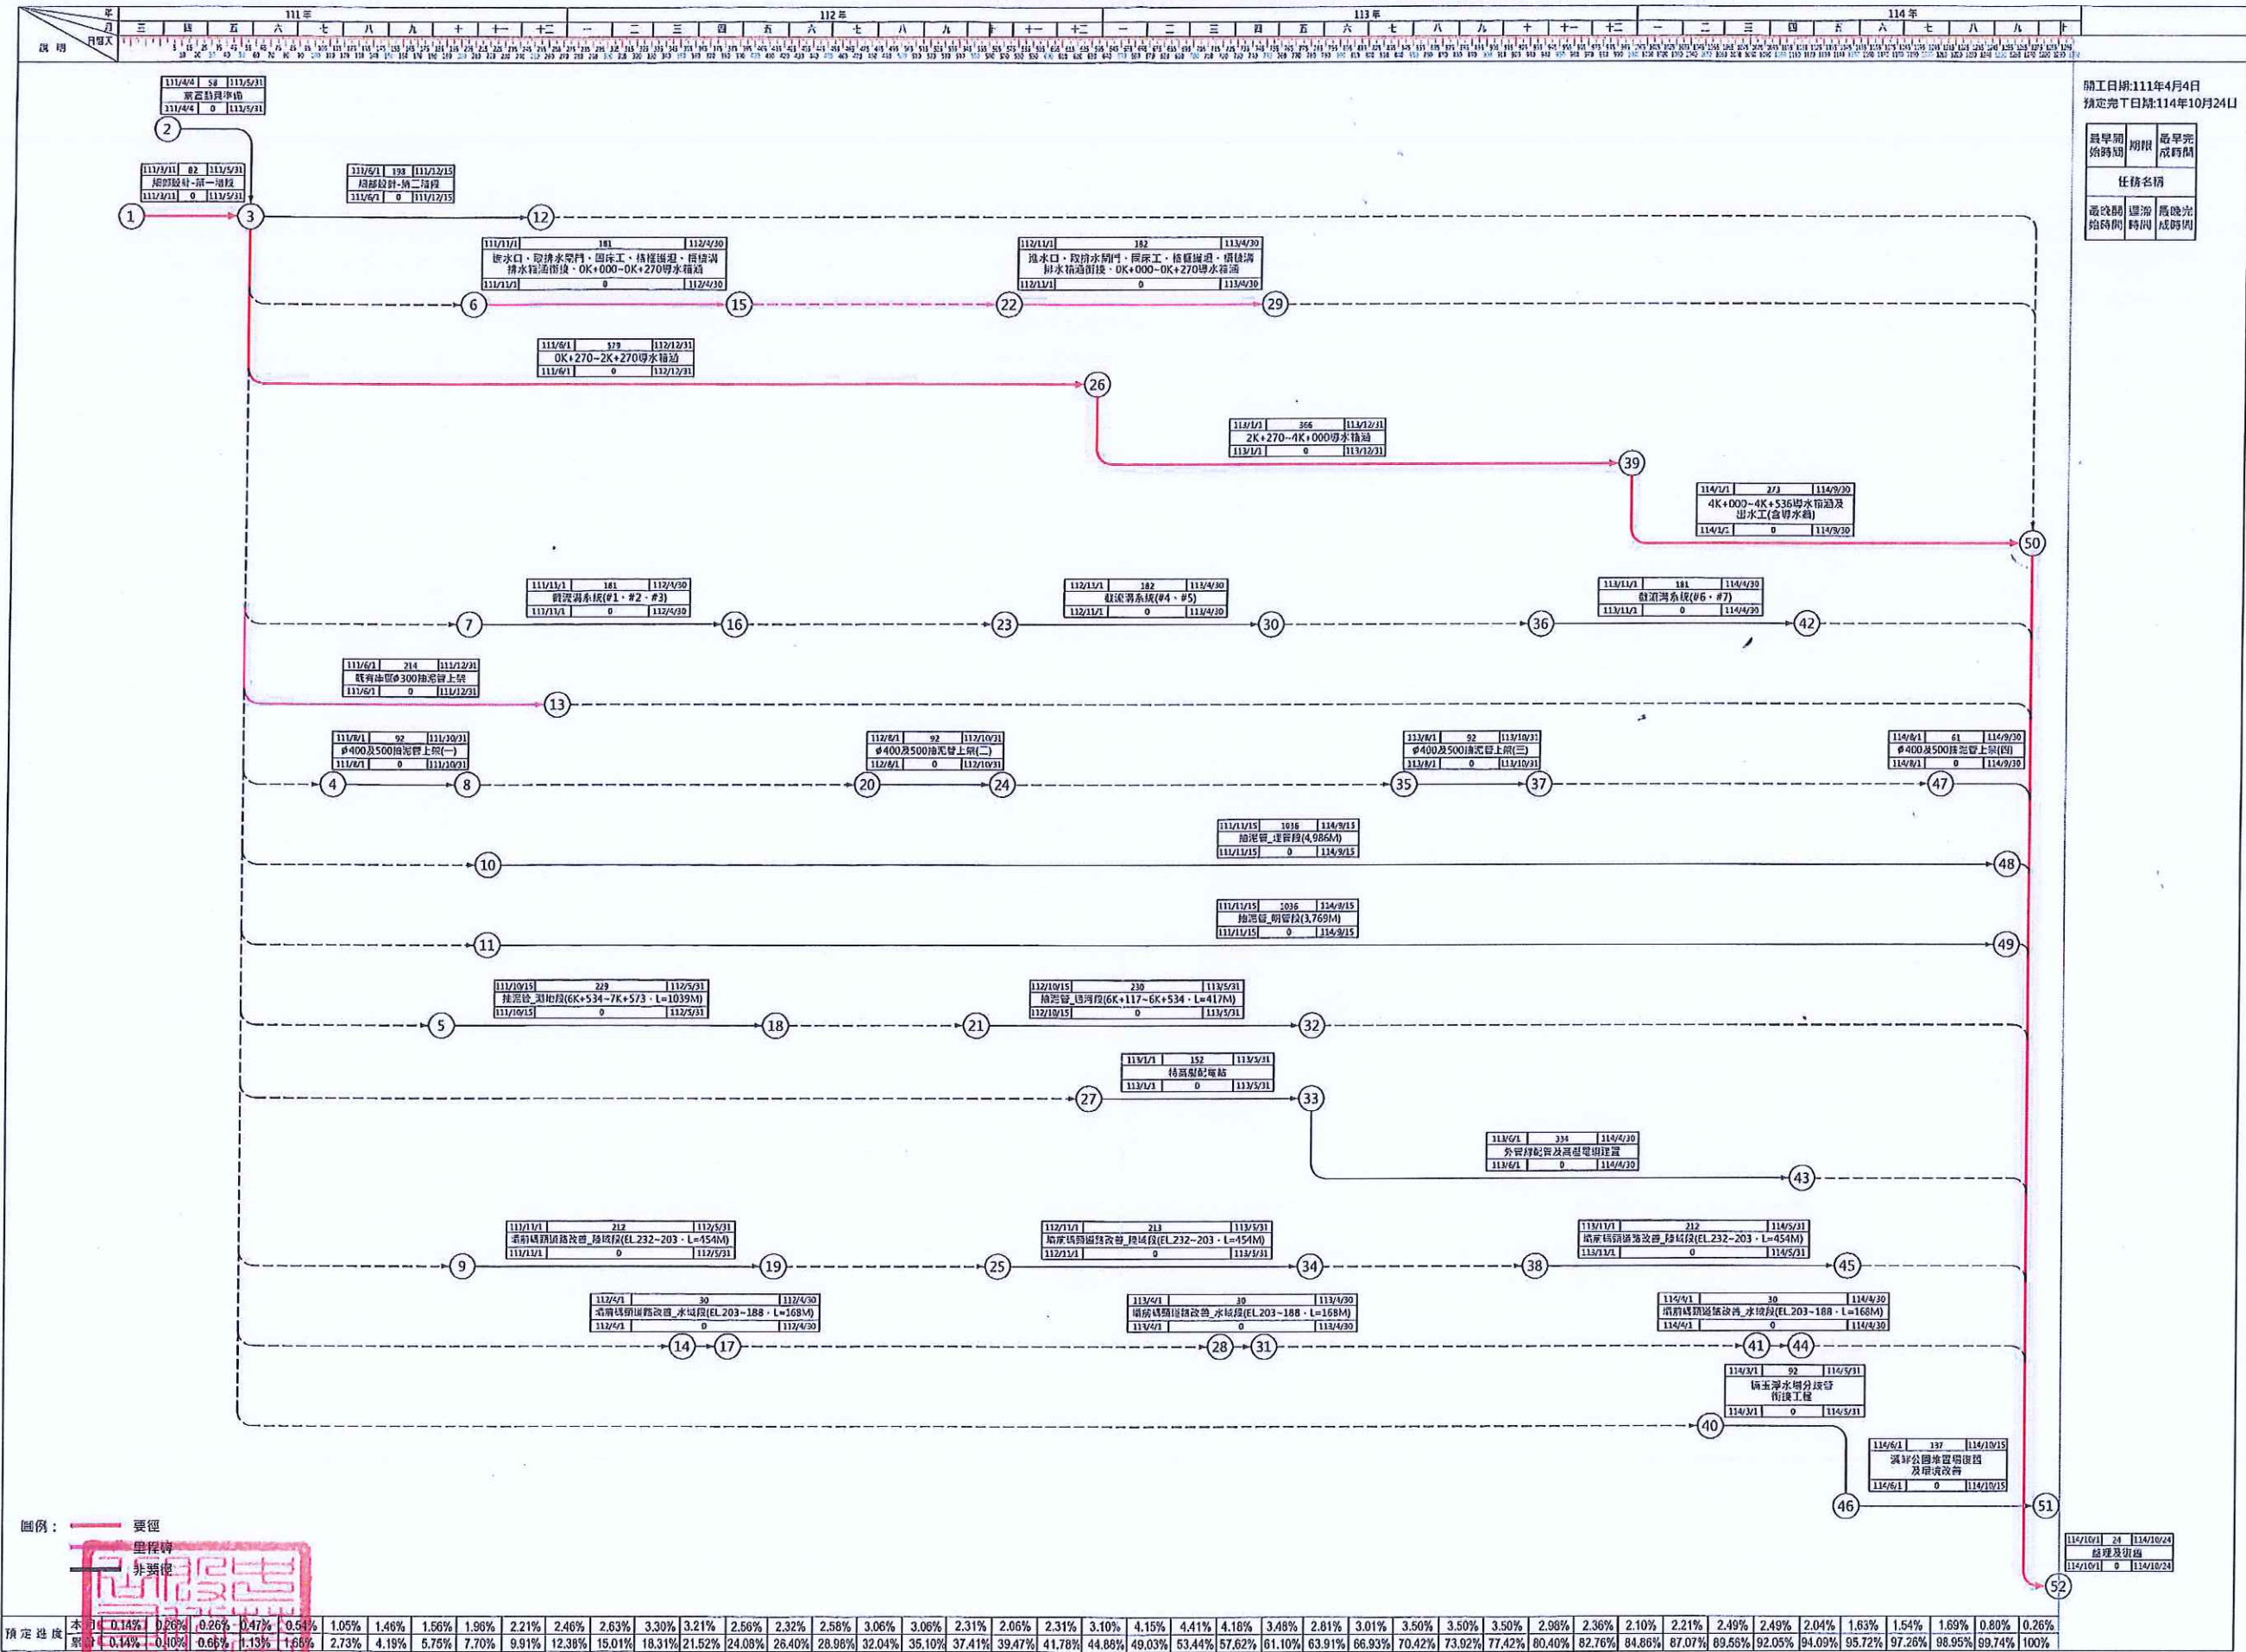

開工日期:111年4月4日
預定完工日期:114年10月24日


最早開始時間	最遲開始時間	最早完成時間	最遲完成時間
111/4/4	111/4/4	111/4/4	111/4/4

任務名稱

最早開始時間	最遲開始時間	最早完成時間	最遲完成時間
111/4/4	111/4/4	111/4/4	111/4/4


廠商: 圖圖工程
專任工程人員: 陳柏宗
工務所主任: 正工劉成富
課長: 陳柏宗
主任工程師: 徐立政
副局長: 局長: 南區水資源局連上堯

曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程-施工桿狀圖
(至 112年01月31日)

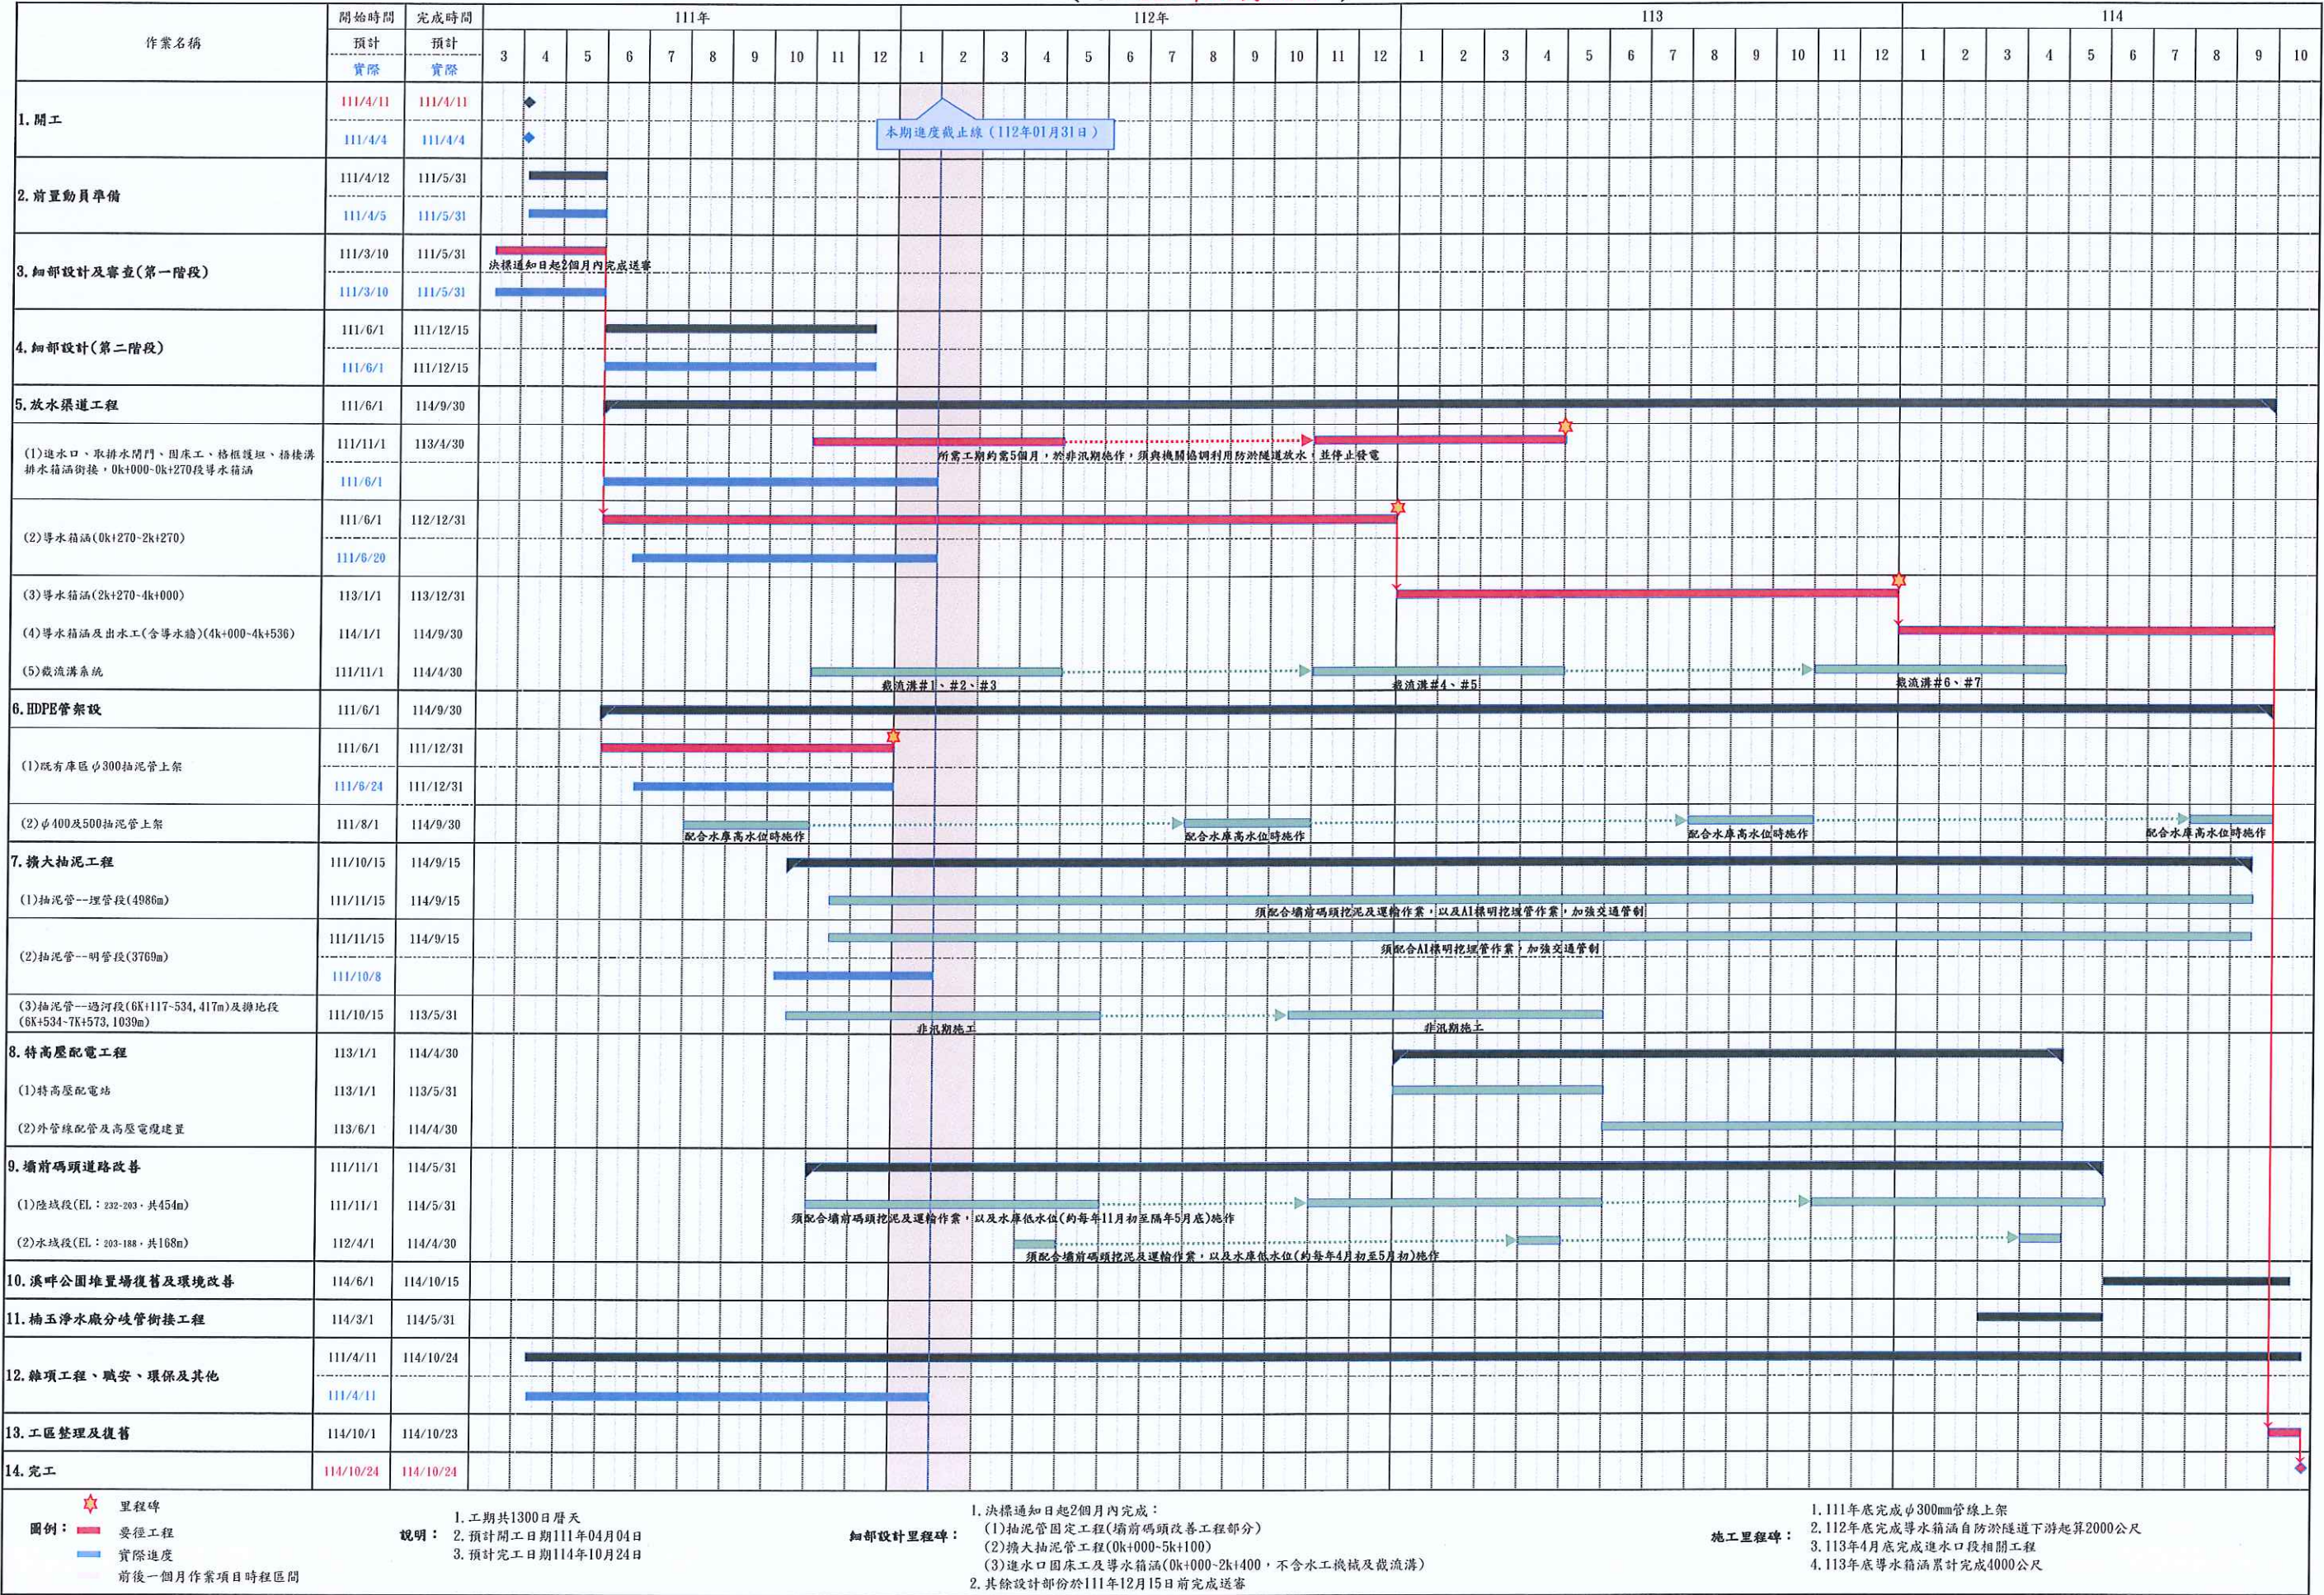

曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程 預定／實際進度表與S進度曲線
(111年04月04日 至 112年01月31日)

開工日期：111年 04 月 04 日

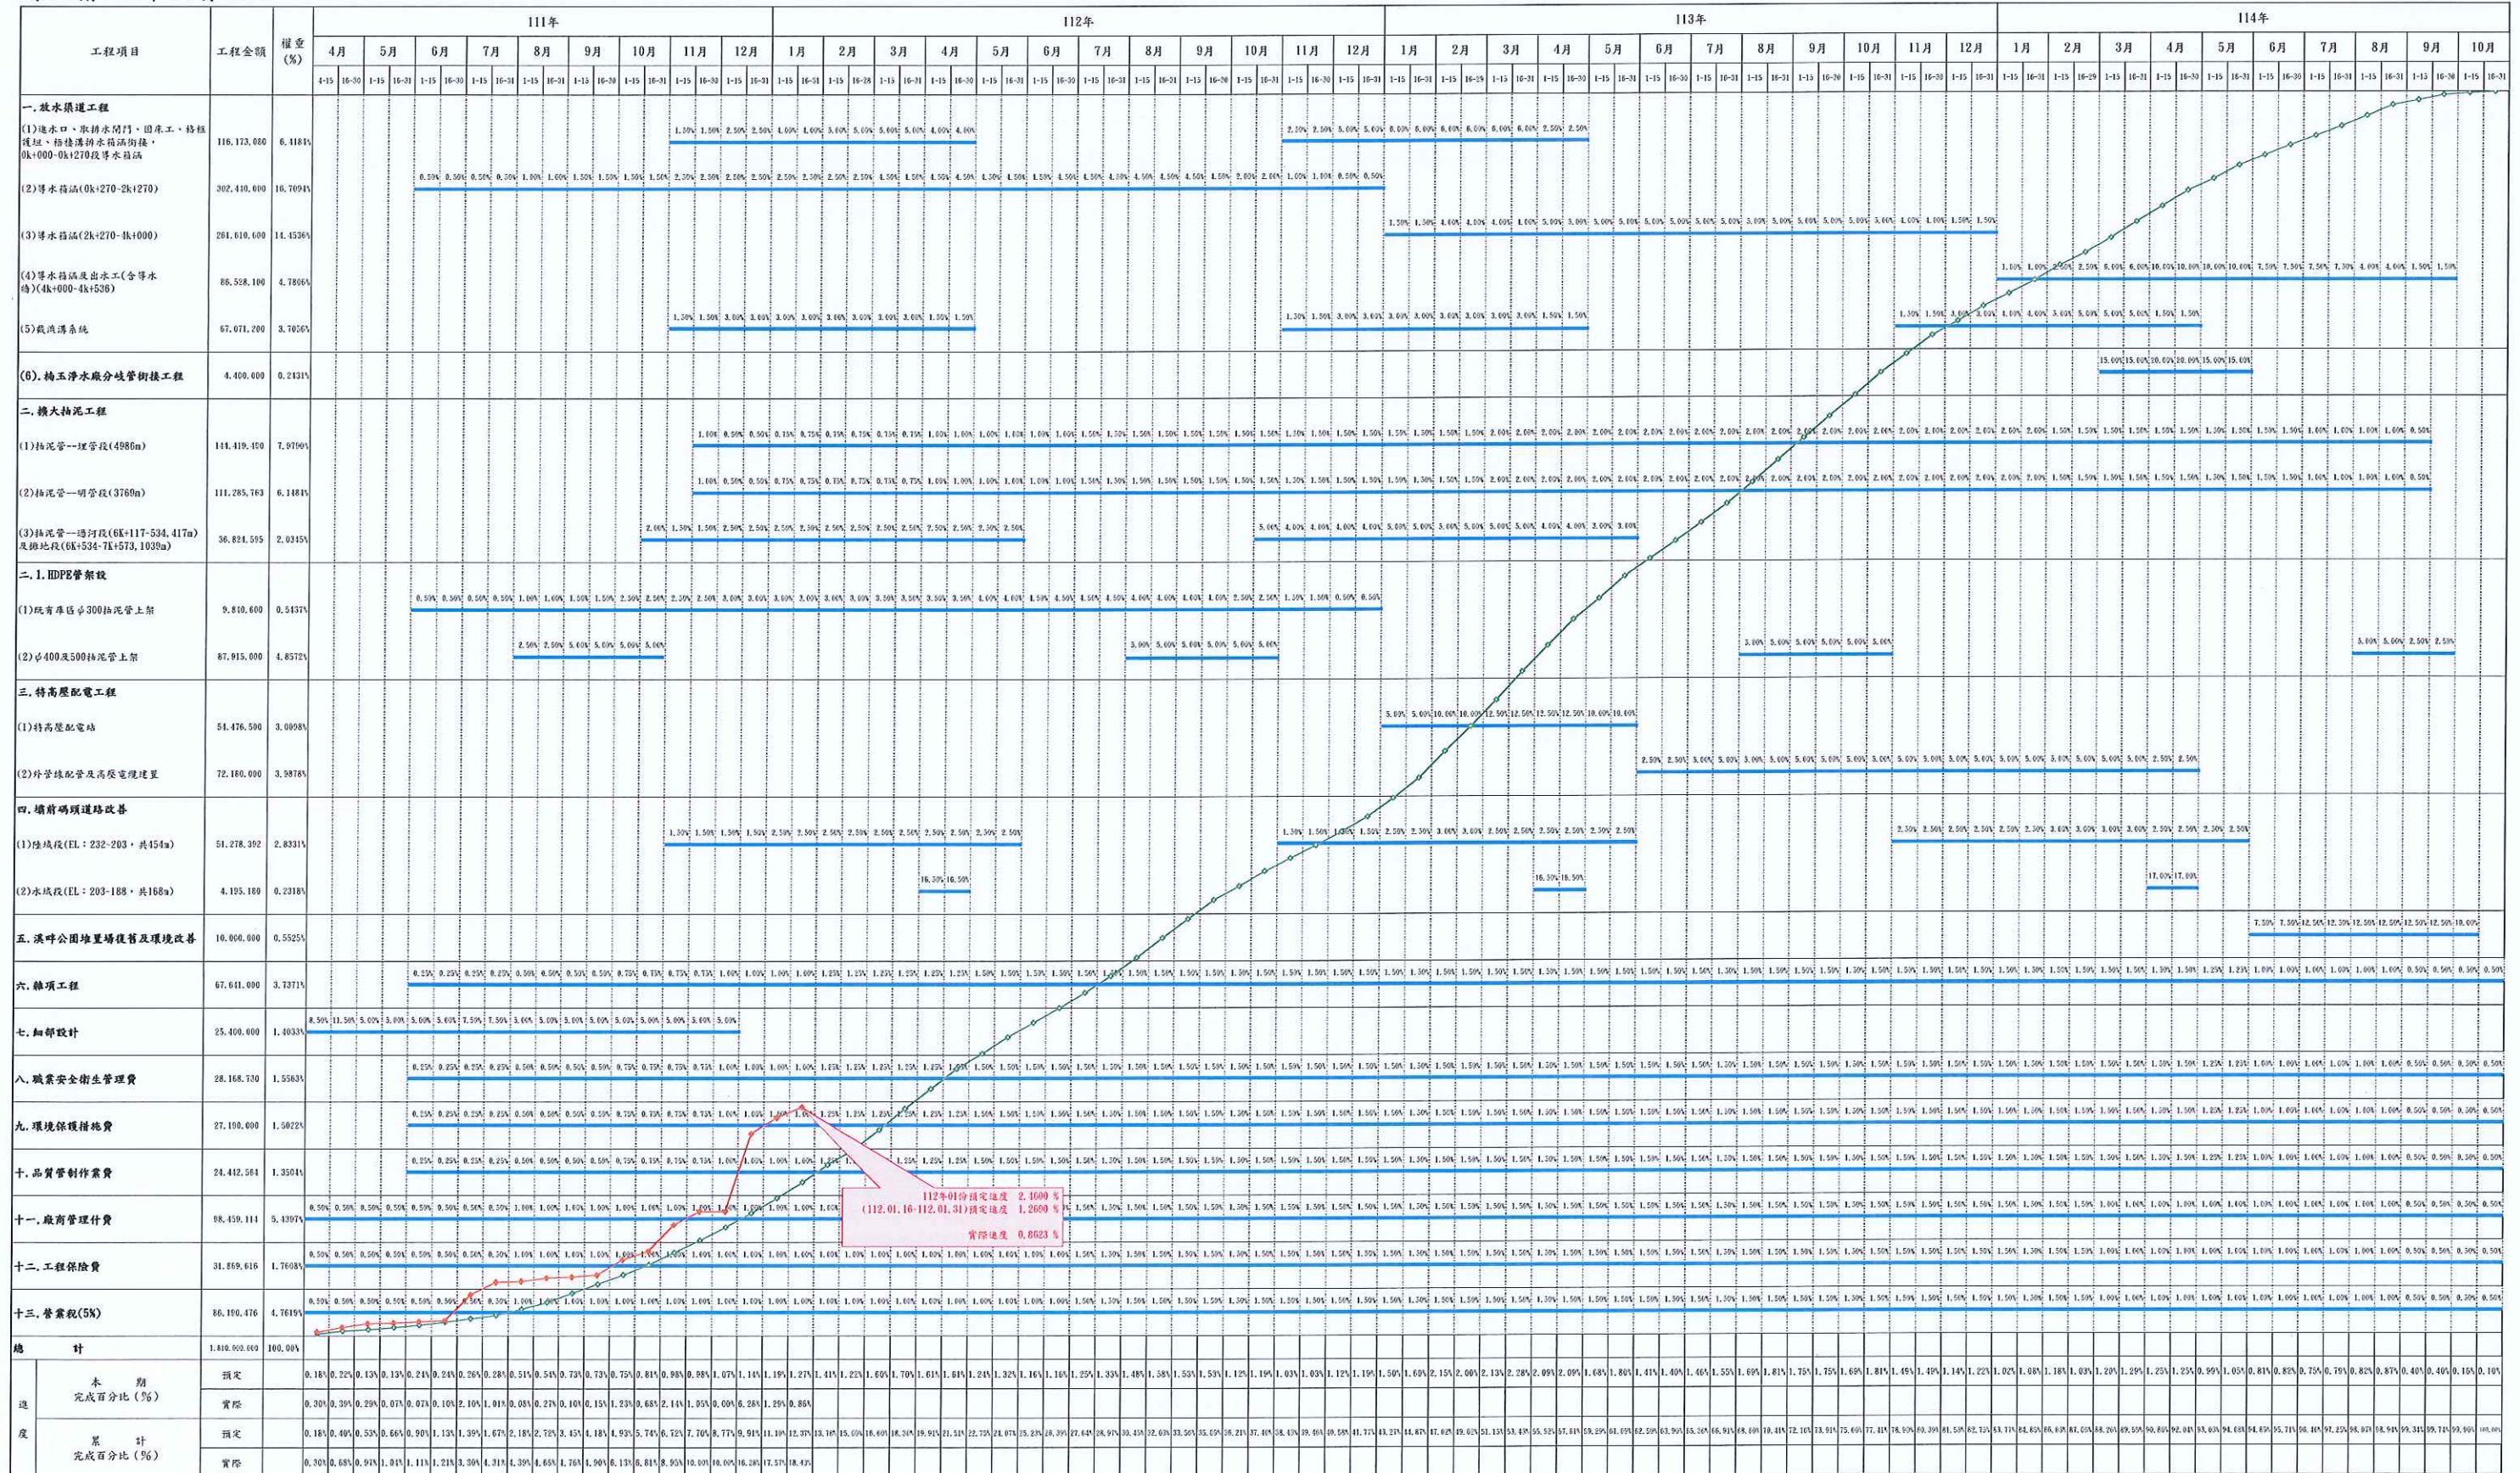

工作数量累计完成表

项次	工程内容	单位	数量	单价	金额	规定进度(%)	实际完成数量	实际进度(%)	规定进度(%)	实际完成数量	实际进度(%)	规定进度(%)	实际完成数量	实际进度(%)	备注
一、(一) 基本建设安装工程															
1	土方工程	M3	15,264.00	45	686,880	30.8892	30.8892	30.8892	30.8892	30.8892	30.8892	30.8892	30.8892	30.8892	111.12.27结束施工预算
2	土方工程	M3	128,869.00	400	51,547,600	36.5744	36.5744	36.5744	36.5744	36.5744	36.5744	36.5744	36.5744	36.5744	111.12.27结束施工预算
3	土方工程	M3	77,046.00	35	2,696,610	21.5287	21.5287	21.5287	21.5287	21.5287	21.5287	21.5287	21.5287	21.5287	111.12.27结束施工预算
4	土方工程	M3	22,234.00	250	5,558,500	82.1768	82.1768	82.1768	82.1768	82.1768	82.1768	82.1768	82.1768	82.1768	111.12.27结束施工预算
5	土方工程	M3	1,818.00	2,300	4,181,400	37.4177	37.4177	37.4177	37.4177	37.4177	37.4177	37.4177	37.4177	37.4177	111.12.27结束施工预算
6	土方工程	M3	23,855.00	2,750	65,606,250	25.7879	25.7879	25.7879	25.7879	25.7879	25.7879	25.7879	25.7879	25.7879	111.12.27结束施工预算
7	土方工程	M3	875.32	23,500	20,570,020	44.8453	44.8453	44.8453	44.8453	44.8453	44.8453	44.8453	44.8453	44.8453	111.12.27结束施工预算
8	土方工程	M3	875.32	23,500	20,570,020	23.3712	23.3712	23.3712	23.3712	23.3712	23.3712	23.3712	23.3712	23.3712	111.12.27结束施工预算
9	土方工程	M3	2,397.33	24,600	58,974,318	39.2044	39.2044	39.2044	39.2044	39.2044	39.2044	39.2044	39.2044	39.2044	111.12.27结束施工预算
10	土方工程	M3	2,397.33	24,600	58,974,318	23.4331	23.4331	23.4331	23.4331	23.4331	23.4331	23.4331	23.4331	23.4331	111.12.27结束施工预算
11	土方工程	M3	51,195.00	830	42,491,850	24.2686	24.2686	24.2686	24.2686	24.2686	24.2686	24.2686	24.2686	24.2686	111.12.27结束施工预算
12	土方工程	M3	3,148.00	700	2,166,920	5.9162	5.9162	5.9162	5.9162	5.9162	5.9162	5.9162	5.9162	5.9162	111.12.27结束施工预算
13	土方工程	M3	2,043.00	350	715,050	23.0749	23.0749	23.0749	23.0749	23.0749	23.0749	23.0749	23.0749	23.0749	111.12.27结束施工预算
14	土方工程	M3	5,092.00	270	1,374,840	22.8594	22.8594	22.8594	22.8594	22.8594	22.8594	22.8594	22.8594	22.8594	111.12.27结束施工预算
15	土方工程	M3	44,466.00	150	6,669,900	23.5596	23.5596	23.5596	23.5596	23.5596	23.5596	23.5596	23.5596	23.5596	111.12.27结束施工预算
16	土方工程	M3	44,466.00	300	13,339,800	23.2649	23.2649	23.2649	23.2649	23.2649	23.2649	23.2649	23.2649	23.2649	111.12.27结束施工预算
17	土方工程	M3	20,057.00	1,500	30,085,500	36.9930	36.9930	36.9930	36.9930	36.9930	36.9930	36.9930	36.9930	36.9930	111.12.27结束施工预算
18	土方工程	M3	21.00	301,000	6,321,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.27结束施工预算
19	土方工程	M3	1.00	414,801,300	414,801,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.27结束施工预算
二、(二) 基本建设安装工程															
1	土方工程	M3	1,090.00	3,800	4,142,000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	111.12.02结束施工预算
2	土方工程	M3	1,090.00	2,700	2,943,000	92.8644	92.8644	92.8644	92.8644	92.8644	92.8644	92.8644	92.8644	92.8644	111.12.02结束施工预算
3	土方工程	M3	10.00	25,000	250,000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	111.12.02结束施工预算
4	土方工程	M3	5.50	8,000	44,000	54.5455	54.5455	54.5455	54.5455	54.5455	54.5455	54.5455	54.5455	54.5455	111.12.02结束施工预算
5	土方工程	M3	20.00	18,000	360,000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	111.12.02结束施工预算
6	土方工程	M3	40.00	17,300	692,000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	111.12.02结束施工预算
7	土方工程	M3	778.00	1,780	1,384,840	82.0051	82.0051	82.0051	82.0051	82.0051	82.0051	82.0051	82.0051	82.0051	111.12.02结束施工预算
8	土方工程	M3	0.27	34,700	9,369	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	111.12.02结束施工预算
9	土方工程	M3	0.36	35,900	12,924	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	111.12.02结束施工预算
10	土方工程	M3	3,218.00	1,900	6,114,200	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	111.12.02结束施工预算
11	土方工程	M3	3,218.00	1,840	5,921,120	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	111.12.02结束施工预算
12	土方工程	M3	10,488.00	9,000	94,392,000	97.2540	97.2540	97.2540	97.2540	97.2540	97.2540	97.2540	97.2540	97.2540	111.12.02结束施工预算
13	土方工程	M3	2,899.00	900	2,609,100	36.0069	36.0069	36.0069	36.0069	36.0069	36.0069	36.0069	36.0069	36.0069	111.12.02结束施工预算
14	土方工程	M3	45.00	28,000	1,260,000	8.1587	8.1587	8.1587	8.1587	8.1587	8.1587	8.1587	8.1587	8.1587	111.12.02结束施工预算
15	土方工程	M3	15.00	30,350	455,250	12.3227	12.3227	12.3227	12.3227	12.3227	12.3227	12.3227	12.3227	12.3227	111.12.02结束施工预算
16	土方工程	M3	28.00	24,000	672,000	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	111.12.02结束施工预算
17	土方工程	M3	28.00	5,500	154,000	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	111.12.02结束施工预算
18	土方工程	M3	28.00	7,000	196,000	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	71.4286	111.12.02结束施工预算
19	土方工程	M3	287.00	33,000	9,471,000	54.7038	54.7038	54.7038	54.7038	54.7038	54.7038	54.7038	54.7038	54.7038	111.12.02结束施工预算
20	土方工程	M3	1.00	158,942,824	158,942,824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
三、(三) 基本建设安装工程															
1	土方工程	M3	1.00	54,776,500	54,776,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
2	土方工程	M3	194.00	870	168,780	83.5652	83.5652	83.5652	83.5652	83.5652	83.5652	83.5652	83.5652	83.5652	111.12.02结束施工预算
3	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
4	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
5	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
6	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
7	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
8	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
9	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
10	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
11	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
12	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
13	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
14	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
15	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
16	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
17	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
18	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
19	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
20	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
21	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
22	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
23	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
24	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
25	土方工程	M3	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.12.02结束施工预算
26	土方工程	M3	1.00	10,000											

工作數量累計完成表

項次	工程項目	單位	契約數量	契約單價	金額	前期工程完成			本期完成			本期累積完成			備註
						預定進度(%)	實際進度(%)	實際完成數量	預定進度(%)	實際進度(%)	實際完成數量	預定進度(%)	實際進度(%)	實際完成數量	
六	續前工程														
f	土工布防冲墙材料費	式	1.00	8,200,000	8,200,000	18.5100	18.5100	0.1851	1,517,829	0.0800	0.0800	0.0800	18.5900	18.5900	-
b	土工布防冲墙(含土地租用)	式	1.00	16,000,000	16,000,000	62.2800	62.2800	0.6228	9,964,800	0.4800	0.4800	0.4800	76.8000	76.8000	1,524,380
g	土工布防冲墙、土地租值	式	1.00	2,500,000	2,500,000	17.5200	17.5200	0.1752	438,000	0.5800	0.5800	0.5800	18.1000	18.1000	10,411,600
h	工程告示牌及工地标识、工程告示牌、路旁、 徑300x至320cm	面	2.00	20,500	41,000	100.0000	100.0000	2.0000	41,000	-	-	-	100.0000	100.0000	452,500
i	計畫、測量、交際計畫書、水保 計畫、河川公地中瑞南相關文件製作或委託費 (除管理費)	式	1.00	2,800,000	2,800,000	17.5200	17.5200	0.1752	496,569	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	41,000
m	因應可通組修、改善及鉄線運費用	式	1.00	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	18.3000	18.3000	0.1820	219,600	219,600	512,400
n	地下管设施測量及調查費(含路面修復)	式	1.00	1,500,000	1,500,000	17.5200	17.5200	0.1752	262,800	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	219,600
p	鄰近建築物現況調查及測量費	式	1.00	600,000	600,000	17.5200	17.5200	0.1752	105,120	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	109,800
d	地下管设施測量及調查費	式	1.00	600,000	600,000	17.5200	17.5200	0.1752	105,120	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	109,800
e	工務文件数据化費	式	1.00	400,000	400,000	17.5200	17.5200	0.1752	70,080	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	73,200
v	土地公告費	式	1.00	1,500,000	1,500,000	17.5200	17.5200	0.1752	262,800	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	274,500
w	其他雜項工程費	式	1.00	3,500,000	3,500,000	17.5200	17.5200	0.1752	613,200	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	640,500
七	前期設計準備費														
a	前期設計準備費	式	1.00	22,000,000	22,000,000	100.0000	100.0000	1.0000	22,000,000	-	-	-	100.0000	100.0000	22,000,000
b	補充地質調查(含勘探、地質綜合評估)	M	200.00	2,200,000	2,200,000	100.0000	100.0000	200.0000	2,200,000	-	-	-	100.0000	100.0000	2,200,000
c	補充地質測量	公頃	100.00	12,000	1,200,000	75.5000	75.5000	75.5000	106,010	-	-	-	75.5000	75.5000	906,000
八	地基安全衛生管理費														
a	地基安全衛生、管理人員	人月	96.00	50,000	4,800,000	19.7583	19.7583	18.9680	948,400	1.0750	1.0750	1.0320	51,600	51,600	1,000,000
b	地基安全衛生、教育訓練、安全附屬教育訓練	式	16.00	25,000	400,000	12.5000	12.5000	2.0000	50,000	-	-	-	12.5000	12.5000	50,000
c	個人防護具	式	1.00	3,700,000	3,700,000	17.5200	17.5200	0.1752	638,240	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	677,100
d	消防器具及設備	式	1.00	24,730	124,730	17.5200	17.5200	0.1752	21,853	0.7801	0.7801	0.7801	18.3003	18.3003	22,826
e	安全防護網	式	1.00	270,000	270,000	17.5200	17.5200	0.1752	47,304	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	49,410
f	土地清理暨整理、整地箇所	式	1.00	300,000	300,000	17.5200	17.5200	0.1752	52,560	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	54,900
g	安全通路設置	式	1.00	3,700,000	3,700,000	17.5200	17.5200	0.1752	648,240	0.7800	0.7800	0.7800	18.3000	18.3000	677,100
h	地基安全衛生、根據設計、上下改換與防護等	人月	96.00	42,000	4,032,000	9.3417	9.3417	8.9680	378,655	1.0750	1.0750	1.0320	43,344	43,344	420,000
i	安全防護設備	式	1.00	200,000	200,000	-	-	-	-	18.3000	18.3000	0.1830	36,600	36,600	36,600
s	汎溜第一地防冲墙製作費	式	1.00	3,000,000	3,000,000	17.5200	17.5200	0.1752	525,600	0.2700	0.2700	0.0027	8,100	17,7900	533,700
t	汎溜第二地防冲墙(含防冲深溝、格狀斷板、格 型格狀安全衛生器材)	式	1.00	4,600,000	4,600,000	17.5200	17.5200	0.1752	805,920	0.2700	0.2700	0.0027	12,420	17,7900	818,340
九	環境保護設備費														
a	環境保護、環境影響	式	1.00	200,000	200,000	17.5200	17.5200	0.1752	35,940	0.7800	0.7800	0.0078	1,560	18,3000	36,600
b	環境保護、廢棄物管理	式	1.00	2,500,000	2,500,000	17.5200	17.5200	0.1752	438,000	0.7800	0.7800	0.0078	18,3000	18,3000	457,500
c	環境保護、施工環境保全	月	48.00	180,000	8,640,000	14.5833	14.5833	7.0000	1,200,000	2.0834	2.0834	1.0000	180,000	16,6667	8,0000
d	環境保護、臨時性鋼筋及排水設施、施土沖 洗費	式	48.00	150,000	7,200,000	-	-	-	-	16.6667	16.6667	8.0000	1,800,000	8.0000	1,200,000
e	環境保護、水污染防治	式	1.00	2,500,000	2,500,000	17.5200	17.5200	0.1752	438,000	-	-	-	17.5200	17.5200	438,000
f	環境保護、水污染防治、防污計劃	式	1.00	150,000	150,000	100.0000	100.0000	1.0000	150,000	-	-	-	100.0000	100.0000	150,000
g	環境保護、現地環境保護設備費	式	1.00	3,500,000	3,500,000	17.5200	17.5200	0.1752	613,200	0.7800	0.7800	0.0078	27,300	18,3000	640,500
h	土地防冲浸生設備計畫	式	1.00	2,500,000	2,500,000	17.5200	17.5200	0.1752	438,000	0.7800	0.7800	0.0078	19,500	18,3000	457,500
十	品質管理費														
a	檢驗費	式	1.00	8,658,820	8,658,820	17.5200	17.5200	0.1752	1,517,025	0.7800	0.7800	0.0078	67,539	18,3000	1,584,364
b	品質管理(含品質人員薪資及行政管理費)	式	1.00	8,658,820	8,658,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	品質人員薪資	月	48.00	180,000	8,640,000	19.7567	19.7567	9.4832	1,705,976	1.0766	1.0766	0.5168	93,024	20,8333	1,800,000
2	行政管理費	式	48.00	148,828	7,143,744	19.7567	19.7567	9.4832	1,411,306	1.0766	1.0766	0.5168	76,914	20,8333	1,488,280
十一	廠商管理費	式	1.00	88,459,114	88,459,114	18.0300	18.0300	17,752,178	964,900	0.9800	0.9800	0.0098	19,1000	19,1000	16,777,078
十二	工程保險費	式	1.00	31,869,616	31,869,616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十三	工程保險費	式	1.00	3,100,000	3,100,000	100.0000	100.0000	1.0000	3,100,000	-	-	-	-	-	-
十三	營業稅	式	1.00	86,130,476	86,130,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十三	營業稅	式	1.00	85,985,413	85,985,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
式	資材材料費(包)除料	M3	-	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多	資材材料費	式	1.00	4,101,285	4,101,285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二	主副工費費用	式	1.00	205,063	205,063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二	營業稅(5%)	式	1.00	1,810,000,000	1,810,000,000	11.1010	17.5654	-	317,969,725	1.2690	0.8623	-	15,607,565	12,3700	333,377,020
	合計														

逐時降水量月報表

測站:C00810

觀測時

 加入購物車

降水量(mm)																											
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	總和	日/時	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	2.5	2	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	&	&	&	&	&	&	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	&	-	-	&	&	&	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	&	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	-	-	-	-	&	-	-	-	-	-	-	-	-	-	&	-	&	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
11	-	-	-	-	&	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
12	-	-	-	-	&	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	
總和	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-		總和	
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		日/時	

