


貳、工程標案辦理情形

道路埋設段工程標

工程進度

項目	明挖工程	推進工程	水管橋工程	閘類工程	機電及監控設備工程	其他
占總工程比例(%)	53.77%	12.44%	5.70%	1.98%	0.53%	25.23%
預計進度(%)	24.37%	1.84%	0.79%	1%		11.43%
實際進度(%)	24.11%	1.23%	0.20%	1.27%	0.00%	12.81%

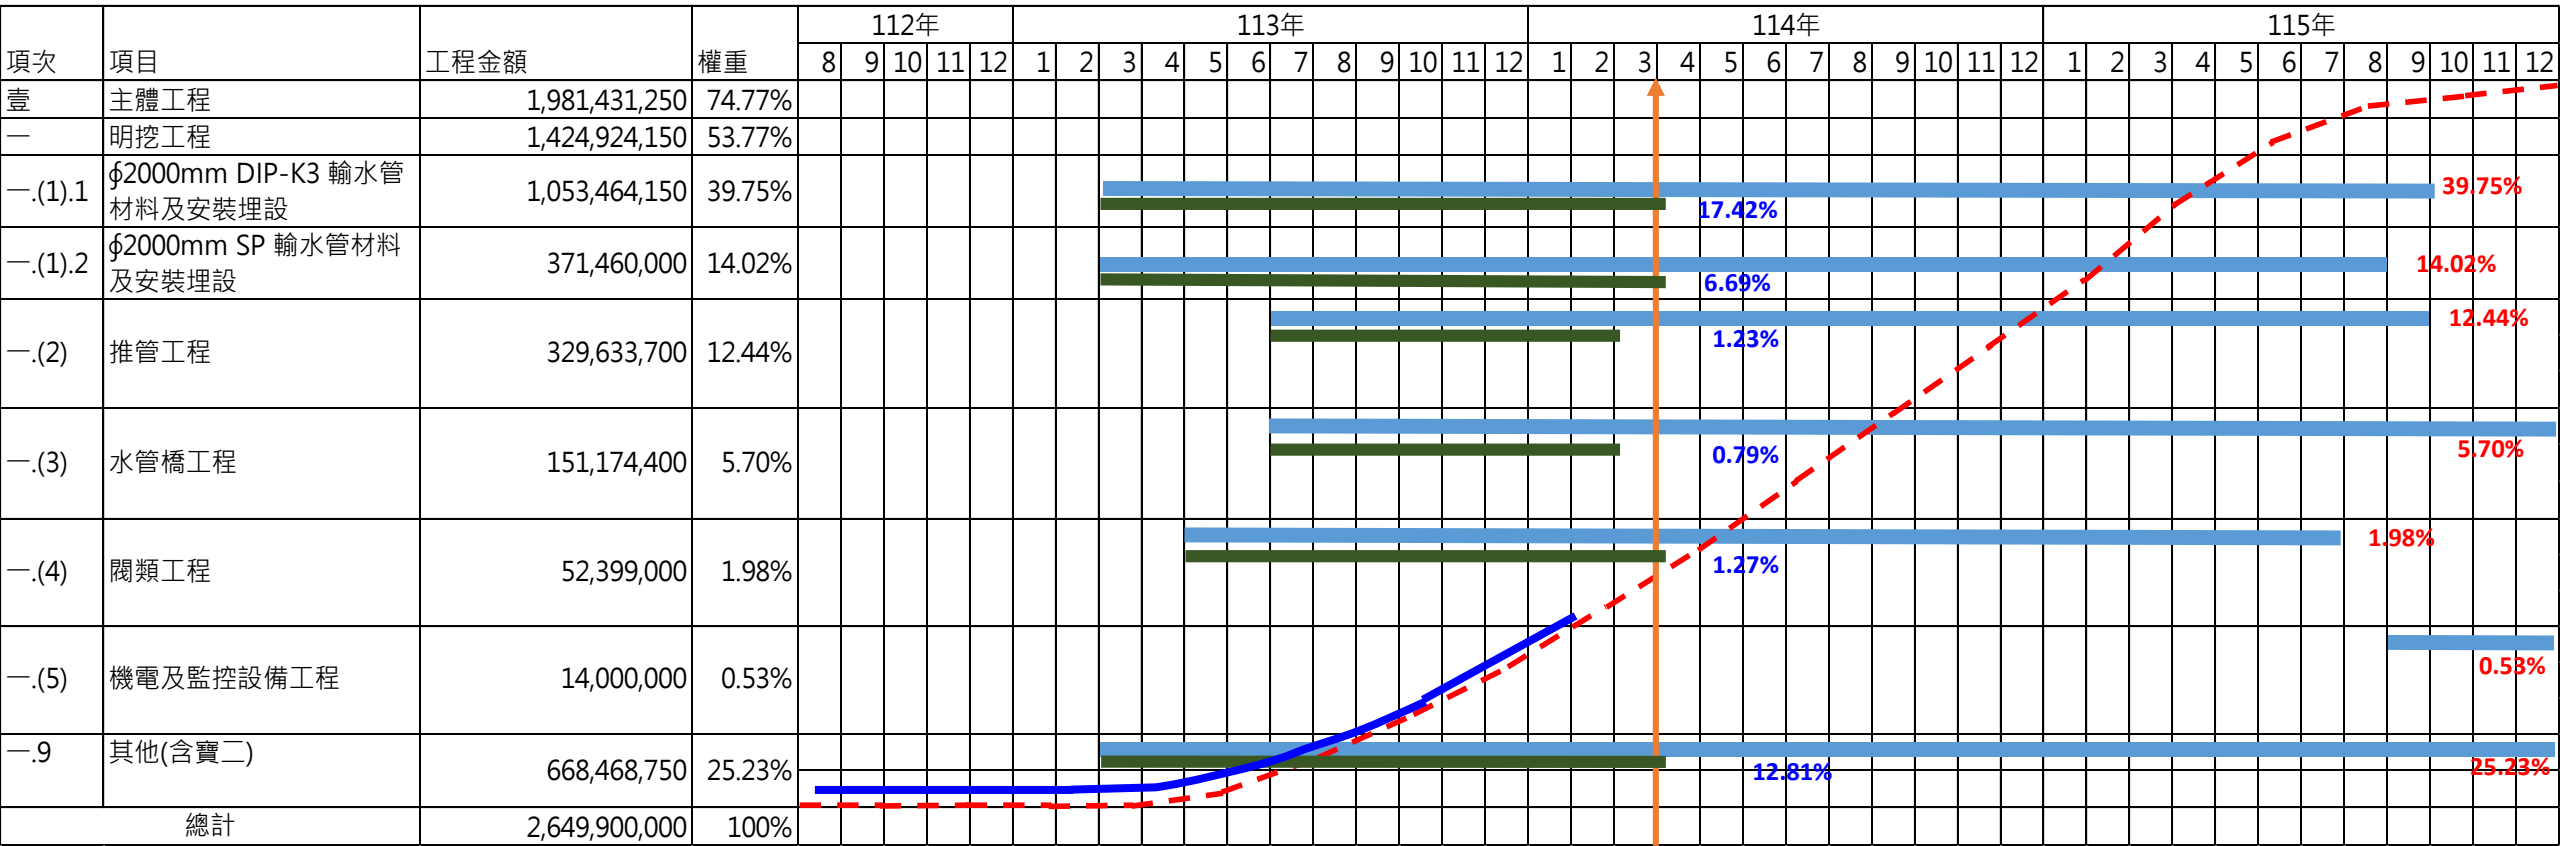

截至114年3月30日： 預定進度： 39.43% 實際進度： 39.62% +0.19%




道路埋設段工程標

工程執行現況



第一工區導溝挖掘

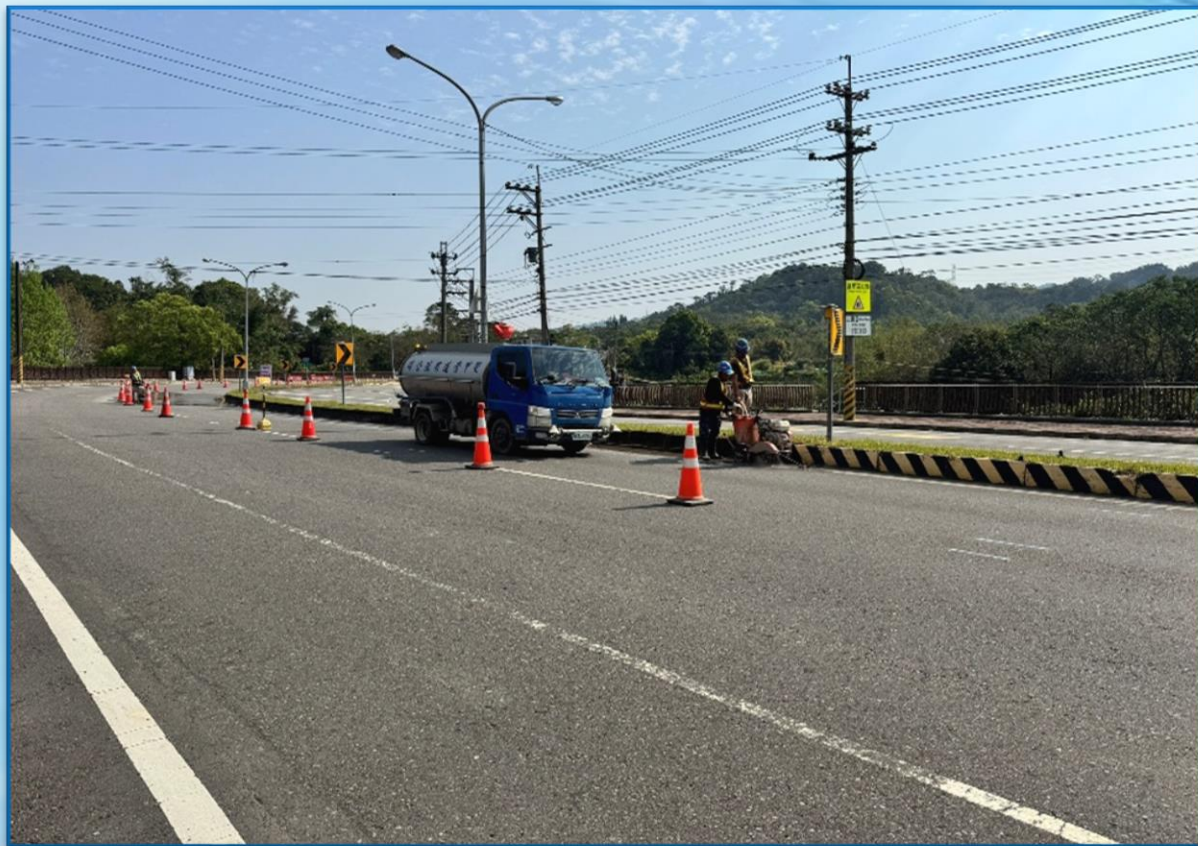


第一工區道路切割



道路埋設段工程標

工程執行現況

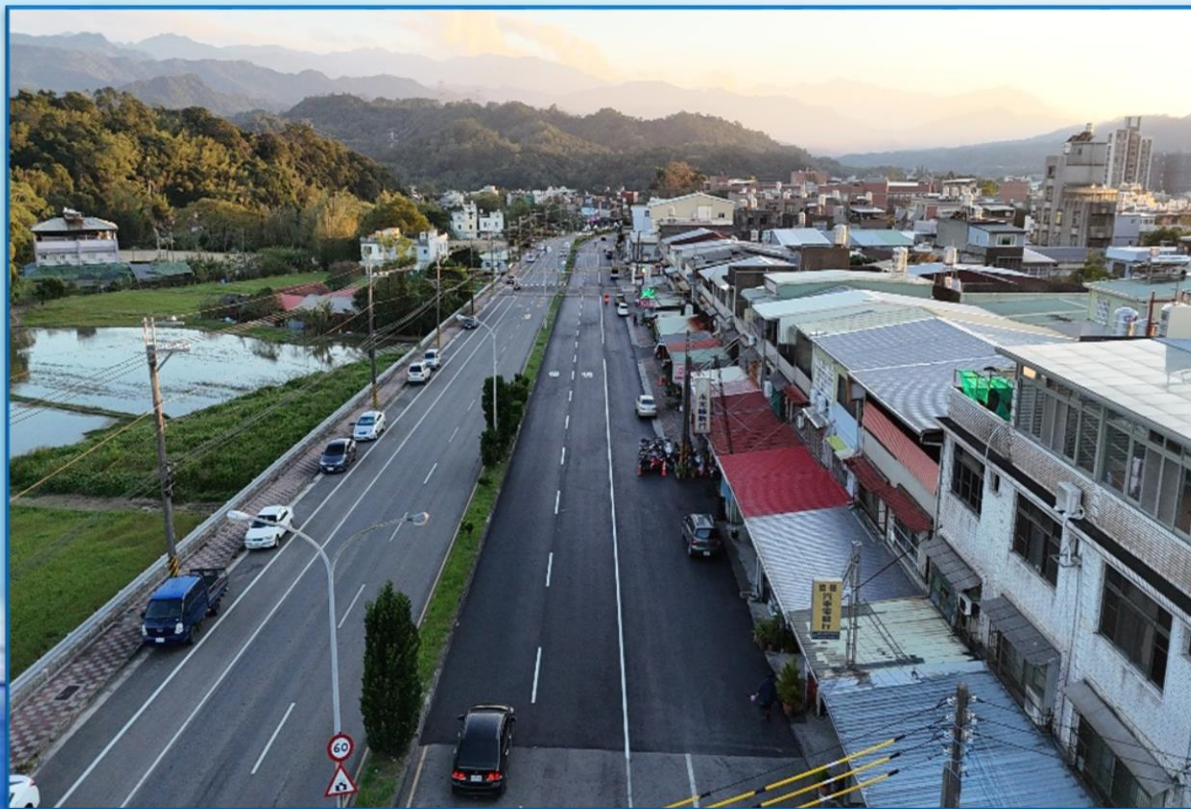

第二工區鋼軌樁拔除



第二工區水壓測試



道路埋設段工程標

工程執行現況



第三工區鋼軌樁拔除



第三工區CLSM回填澆置



道路埋設段工程標

工程執行現況



第四工區氣動錘鑽掘




第四工區管線埋設



道路埋設段工程標

工程執行現況

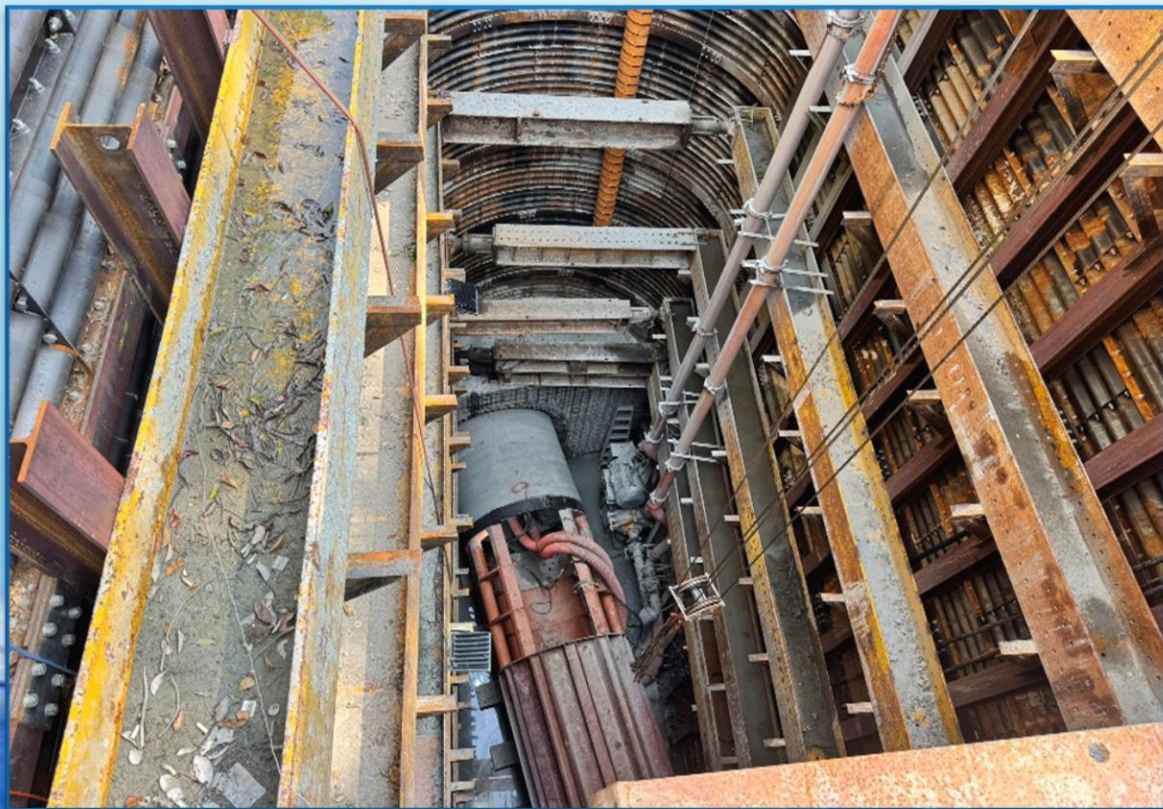

W02→W01推進作業




W03工作井開設



道路埋設段工程標

工程執行現況

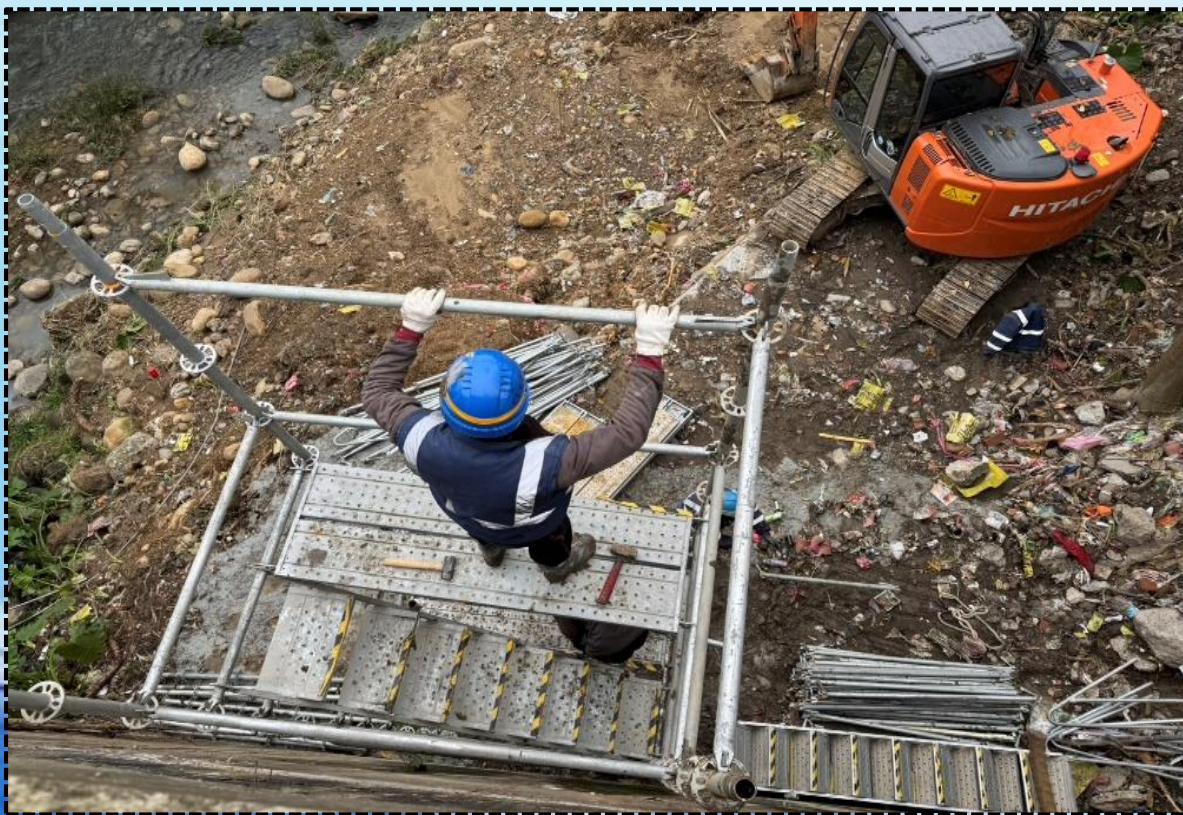

關西二號橋A1橋台上下設備搭設



關西二號橋A2橋台整地
