


工程進度

項目	明挖工程	推進工程	水管橋工程	閘類工程	機電及監控設備工程	其他
占總工程比例(%)	52.37%	14.45%	4.17%	2.06%	0.31%	26.64%
預計進度(%)	36.13%	8.58%	2.36%	1.68%	0.00%	18.31%
實際進度(%)	37.34%	11.82%	2.06%	1.04%	0.00%	15.40%




1

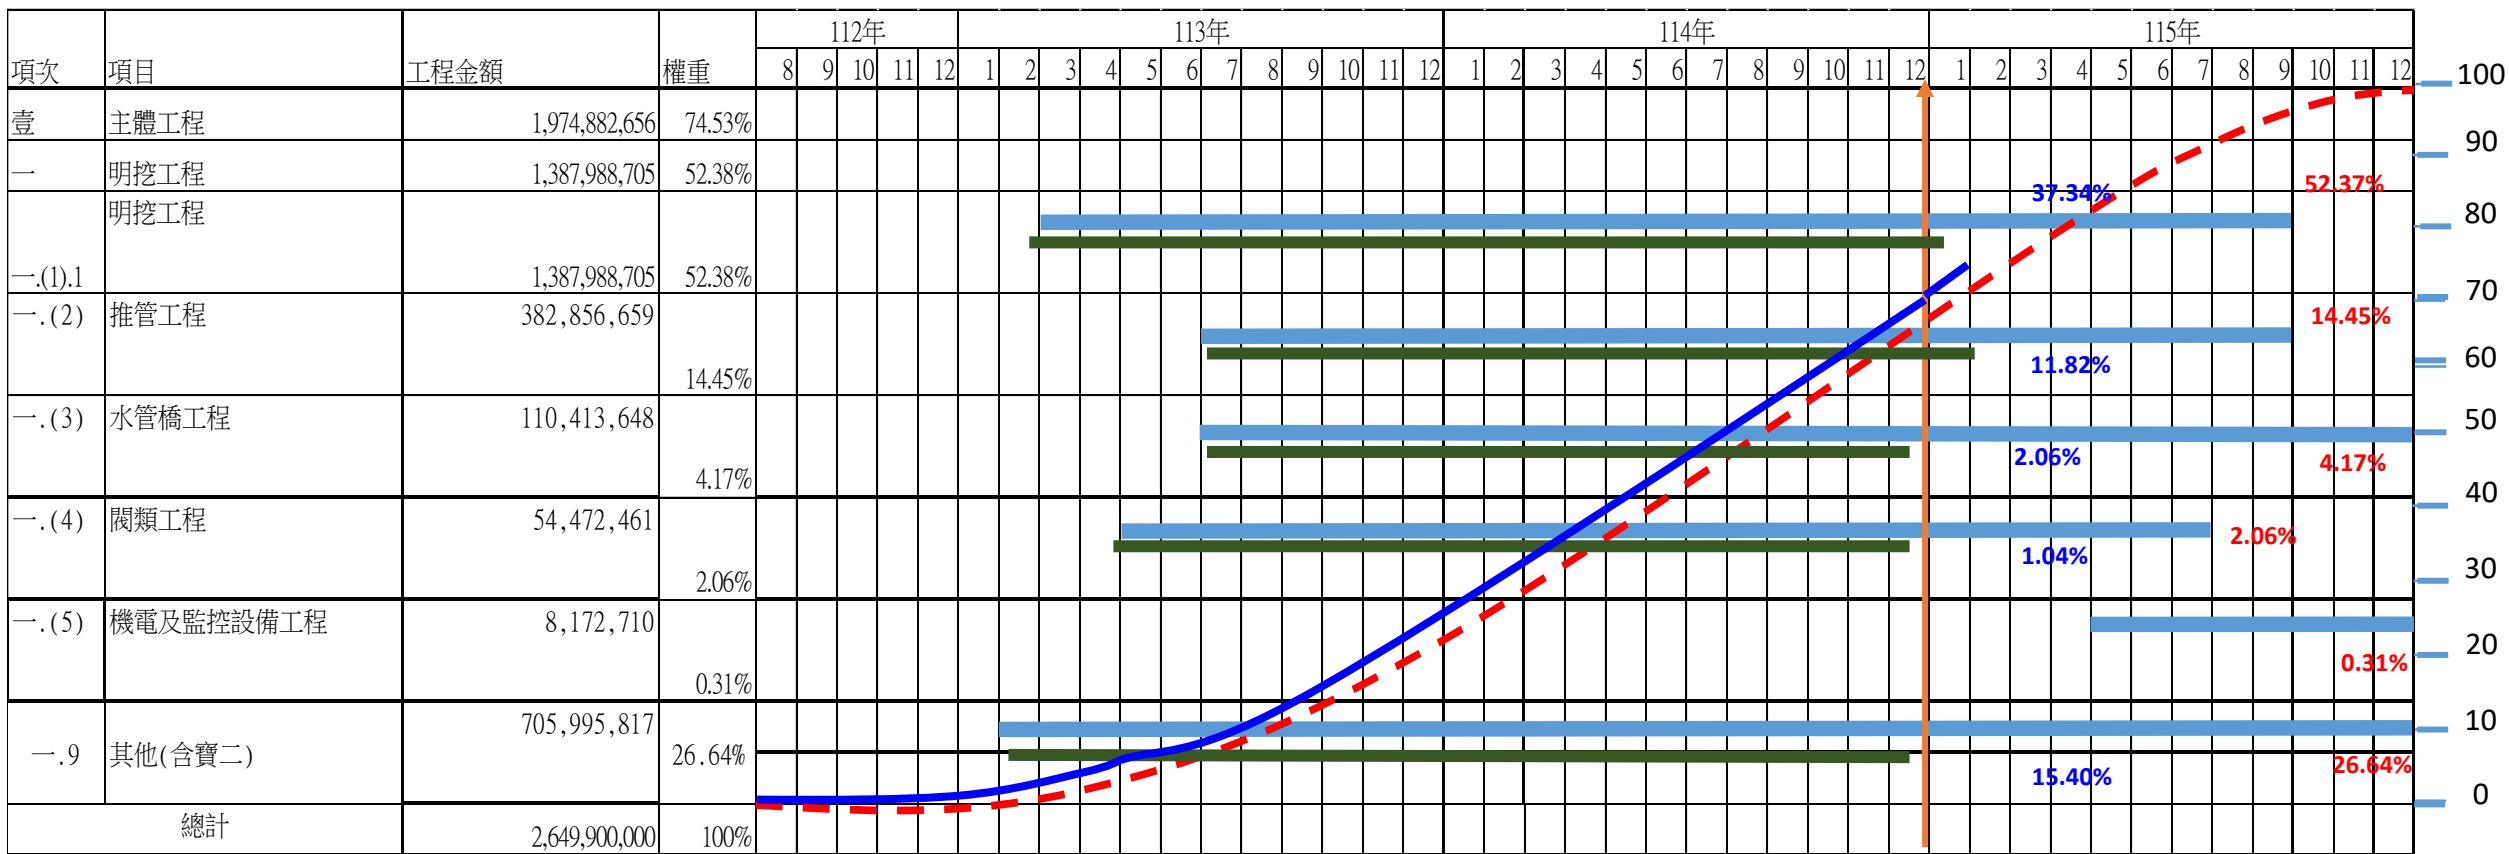

道路埋設段工程標

工程執行現況

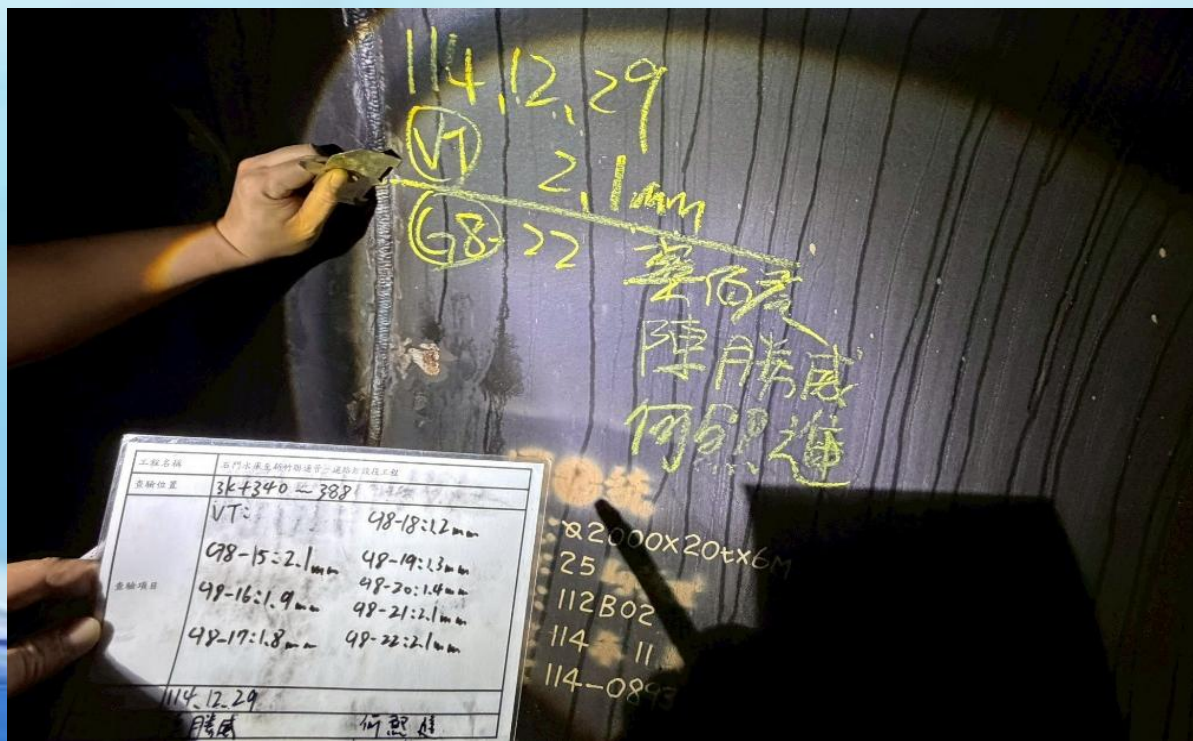

第二工區非破壞檢驗




第二工區焊接作業




道路埋設段工程標

工程執行現況

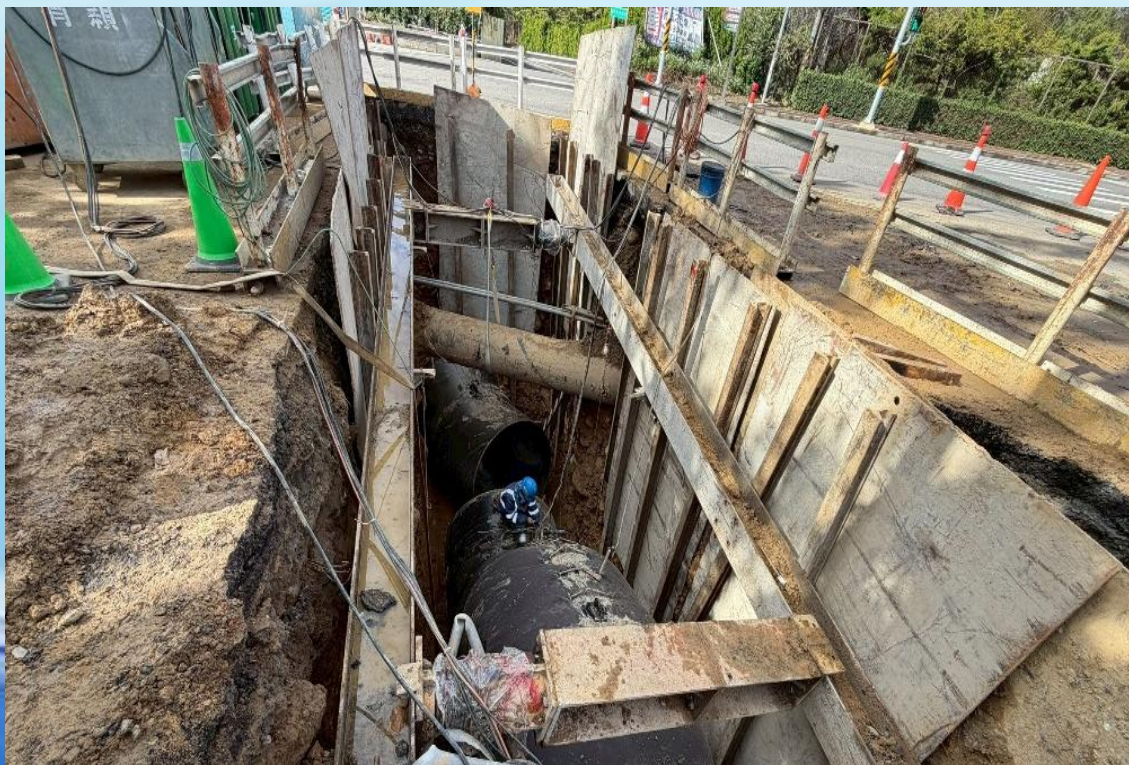

竹28-1銜接段SP鋼管焊接作業

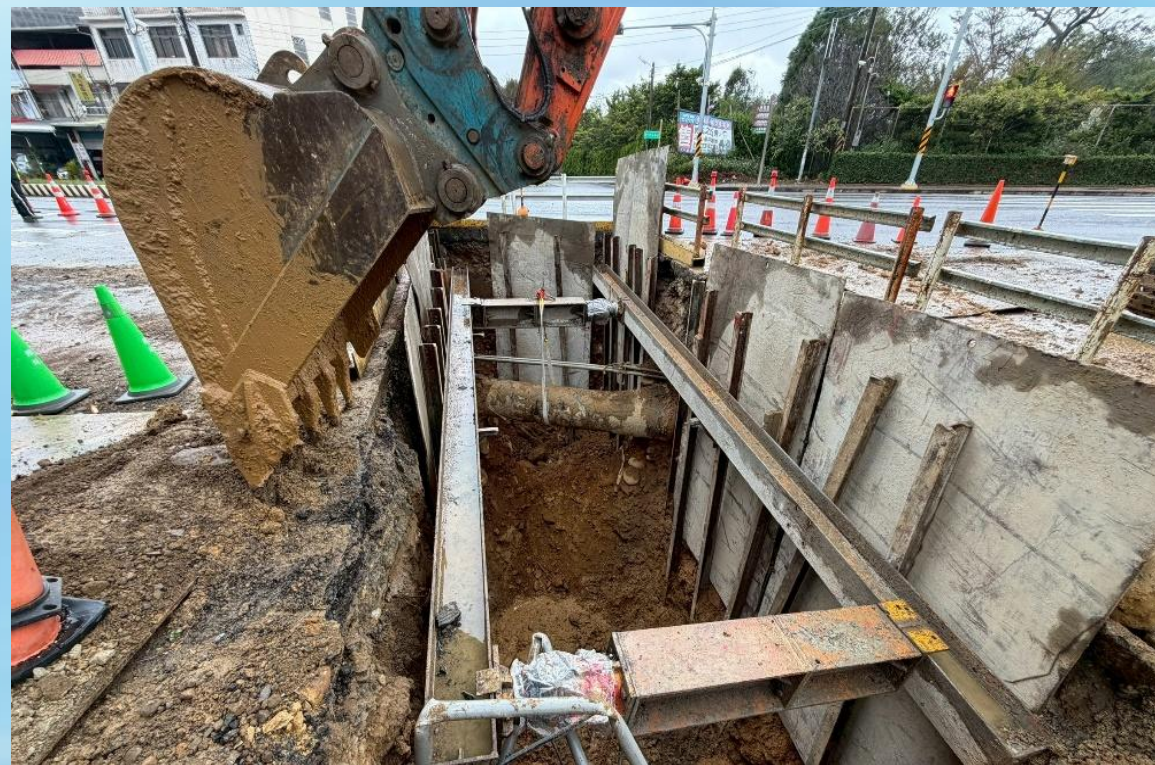

竹28-1銜接段既有管線附掛



道路埋設段工程標

工程執行現況



第三工區AC臨鋪復舊



第三工區CLSM澆置



道路埋設段工程標

工程執行現況



第四工區復舊作業AC刨除



第四工區AC臨鋪作業



道路埋設段工程標

工程執行現況



第五工區警示帶鋪設




第五工區自來水管安裝



道路埋設段工程標

工程執行現況

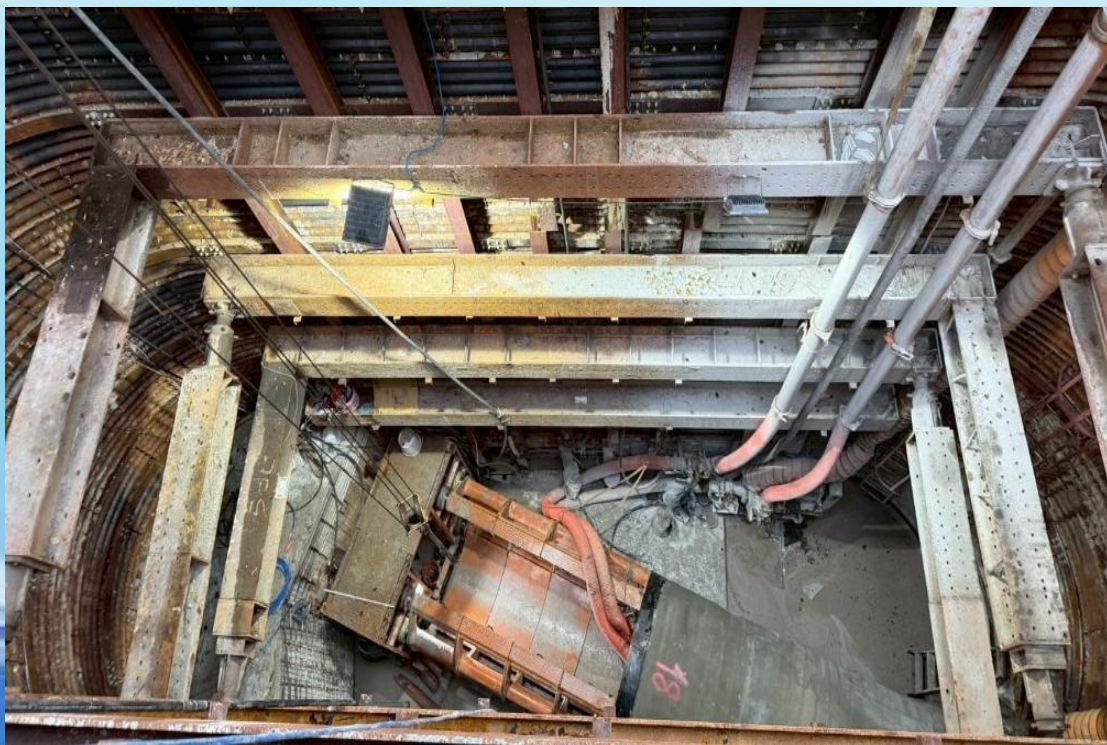

W03→W04推進作業



W03→W04推進作業




道路埋設段工程標

工程執行現況



北沙坑水管橋A1橋台井式基礎澆置

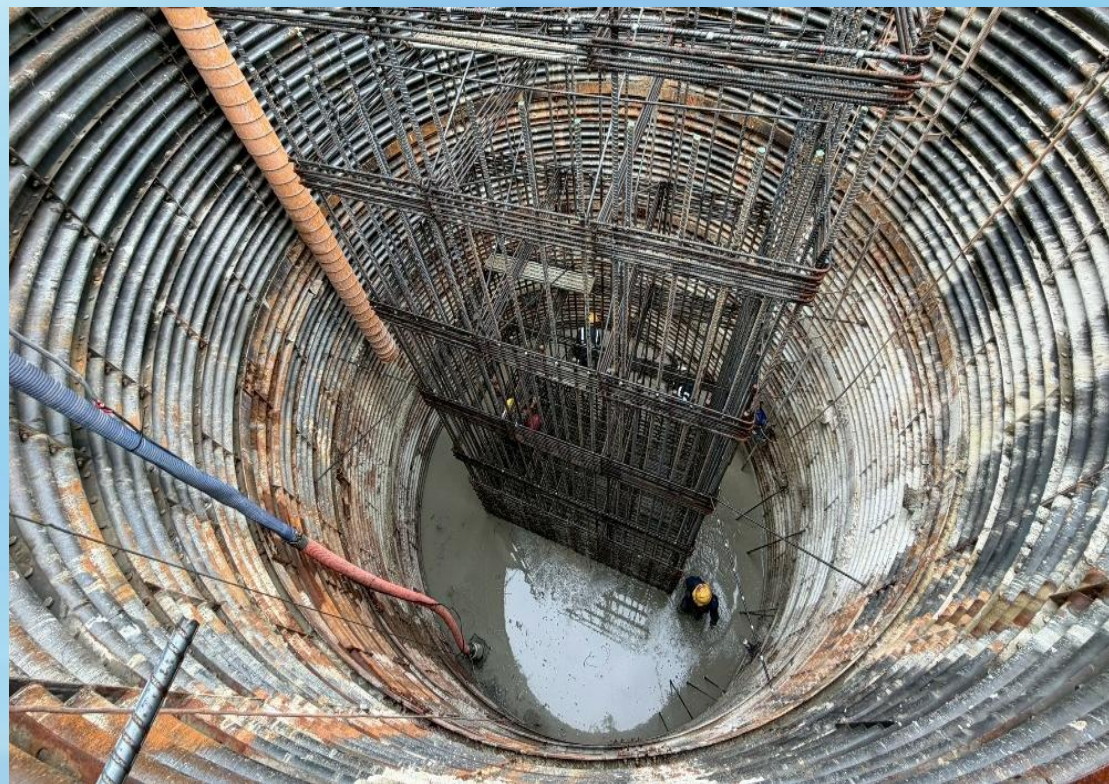

北沙坑橋A1橋台鋼筋綁紮
