


貳、工程標案辦理情形

道路埋設段工程標

工程進度

項目	明挖工程	推進工程	水管橋工程	闊類工程	機電及監控設備工程	其他
占總工程比例(%)	53.77%	12.44%	5.70%	1.98%	0.53%	25.58%
預計進度(%)	40.10%	6.58%	3.02%	1.56%	0.00%	18.58%
實際進度(%)	47.58%	6.59%	0.53%	0.58%	0.00%	14.90%

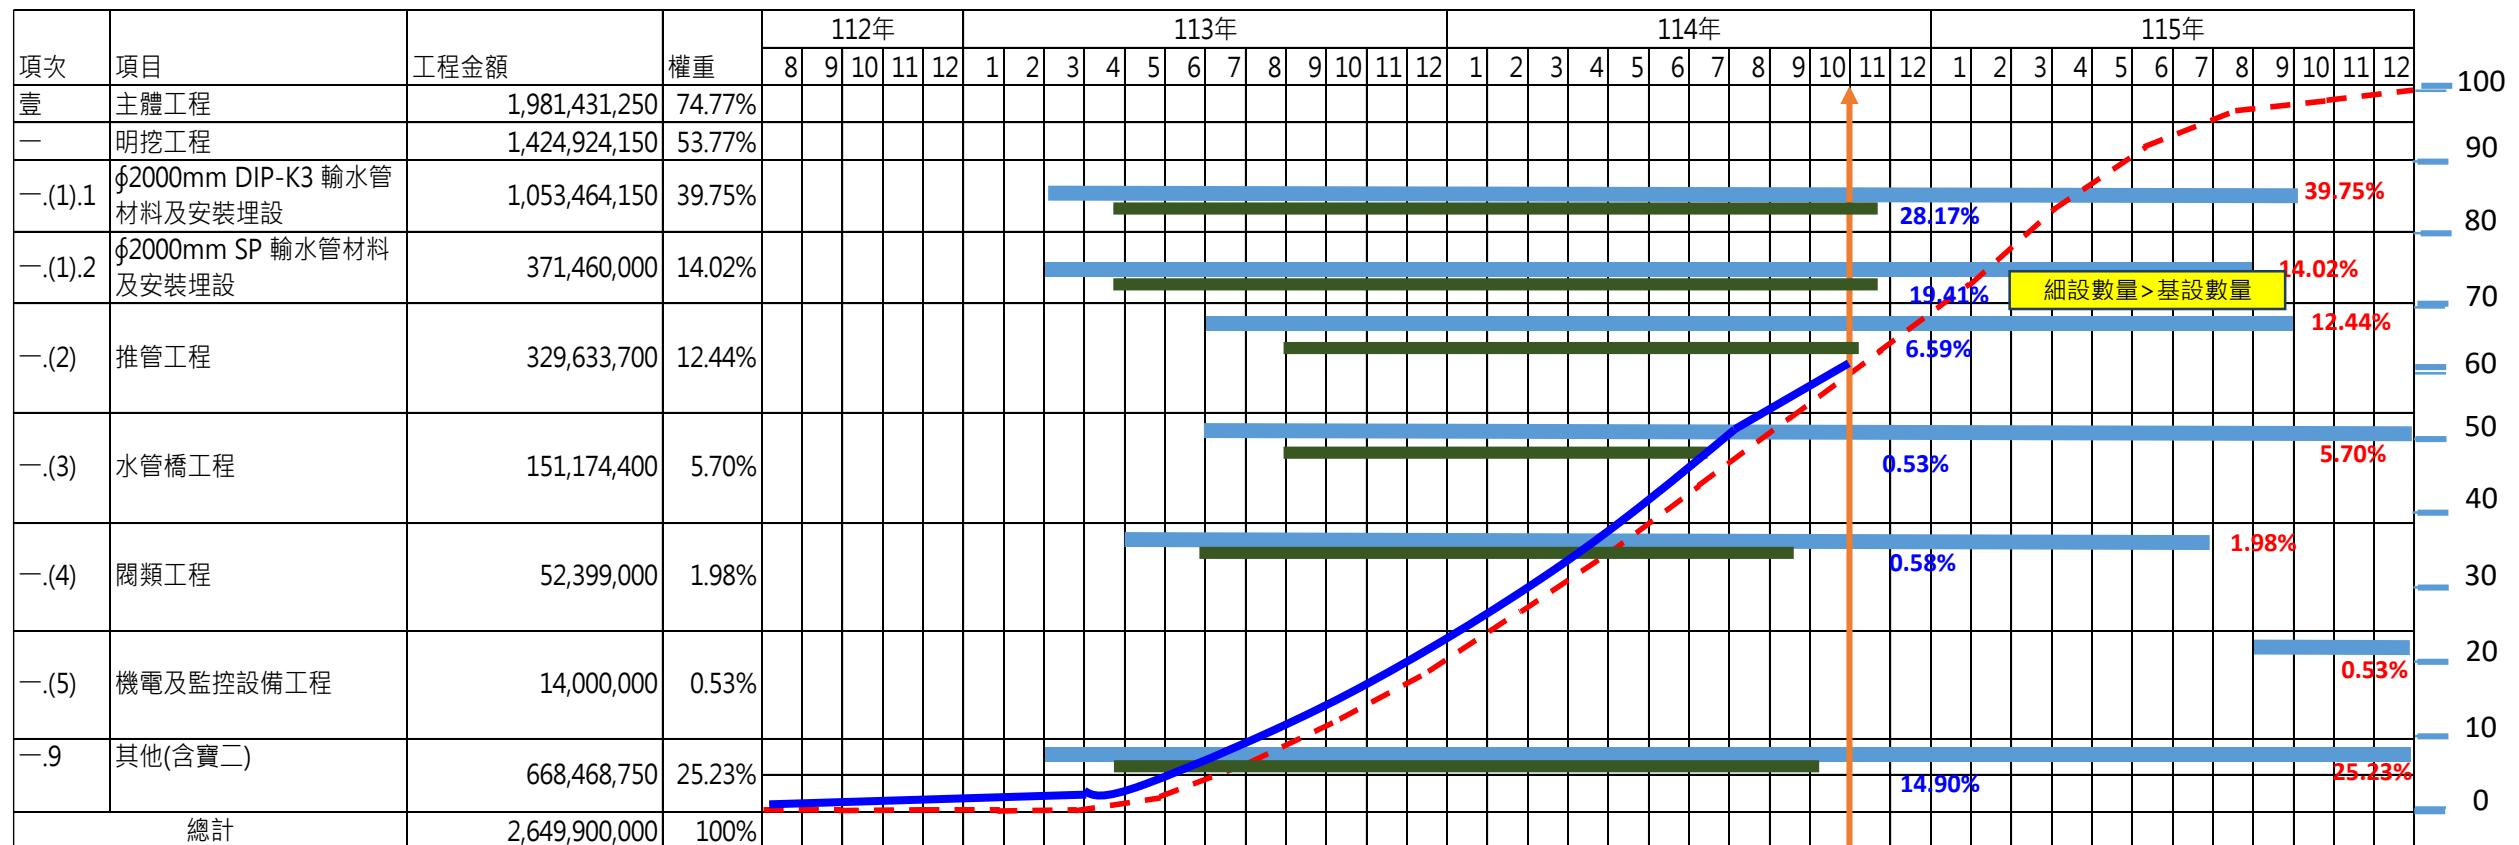

截至114年10月31日： 預定進度：69.84% 實際進度：70.18% +0.34%




經濟部

北區水資源分署




道路埋設段工程標

工程執行現況

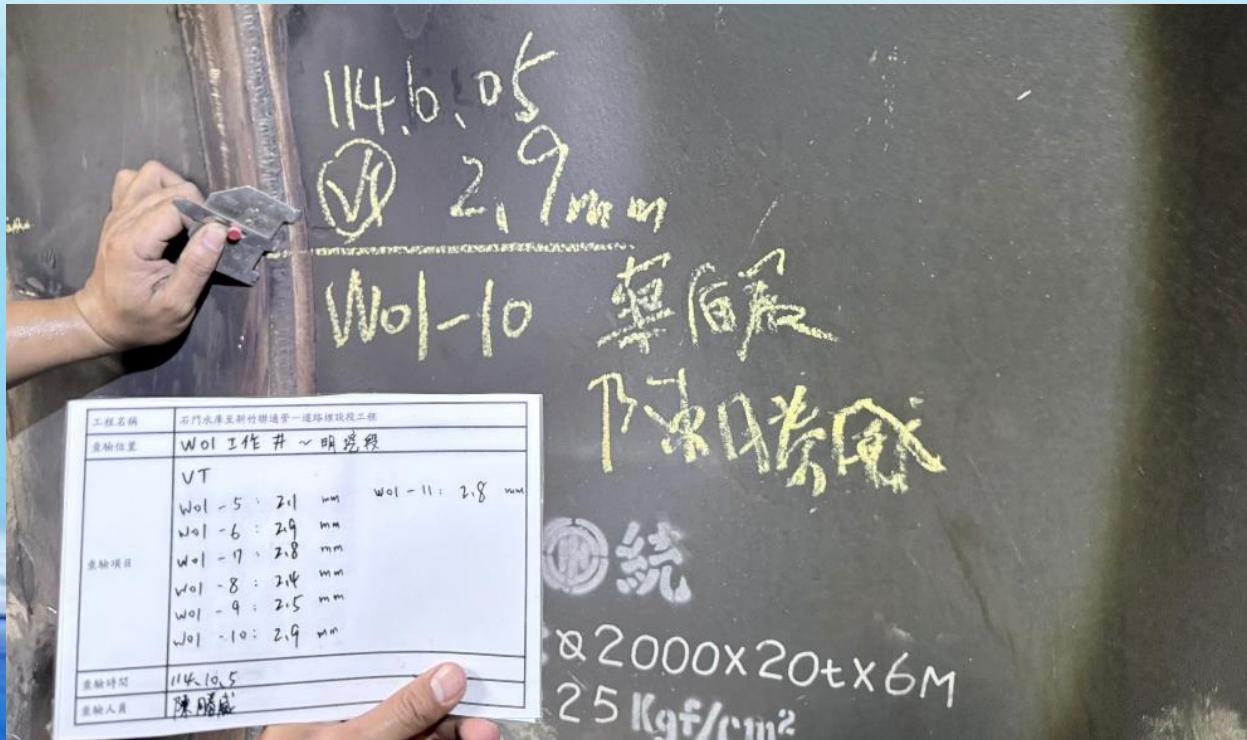

第二工區非破壞檢驗

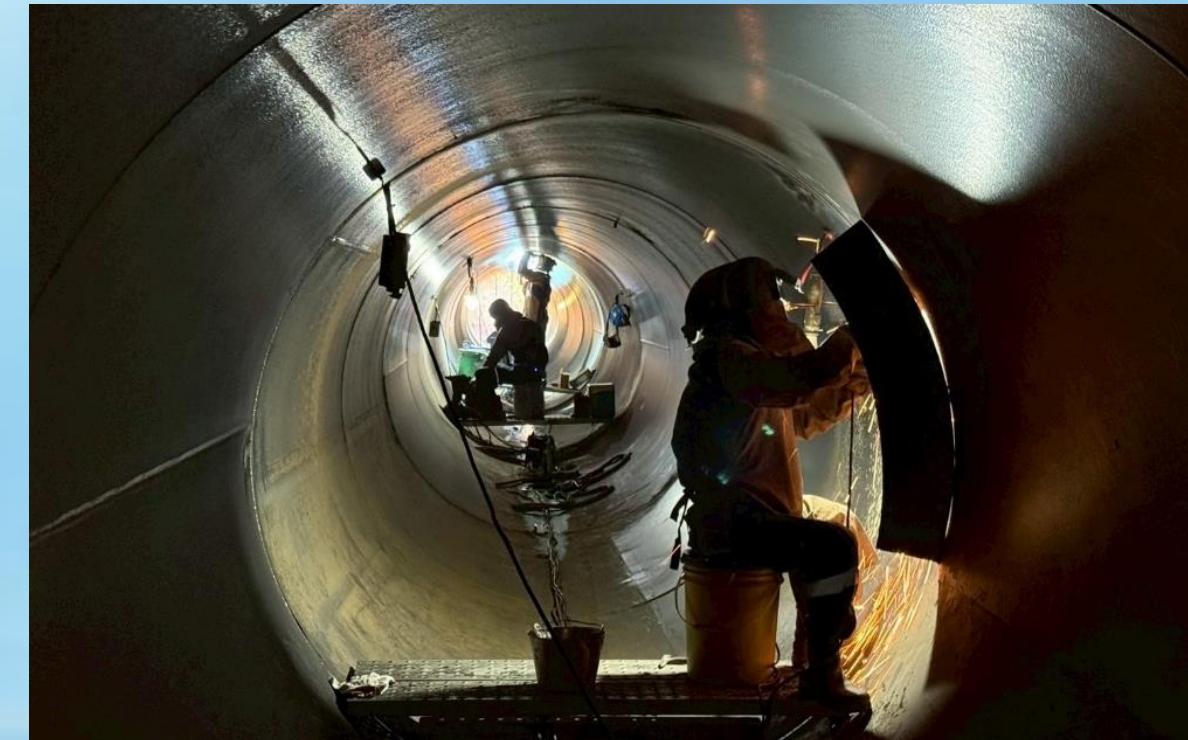

第二工區焊接作業



經濟部

北區水資源分署



道路埋設段工程標

工程執行現況



第三工區標線復舊



第三工區試水作業



經濟部

北區水資源分署



道路埋設段工程標

工程執行現況



第四工區CLSM澆置



第四工區AC復舊




經濟部

北區水資源分署




道路埋設段工程標

工程執行現況

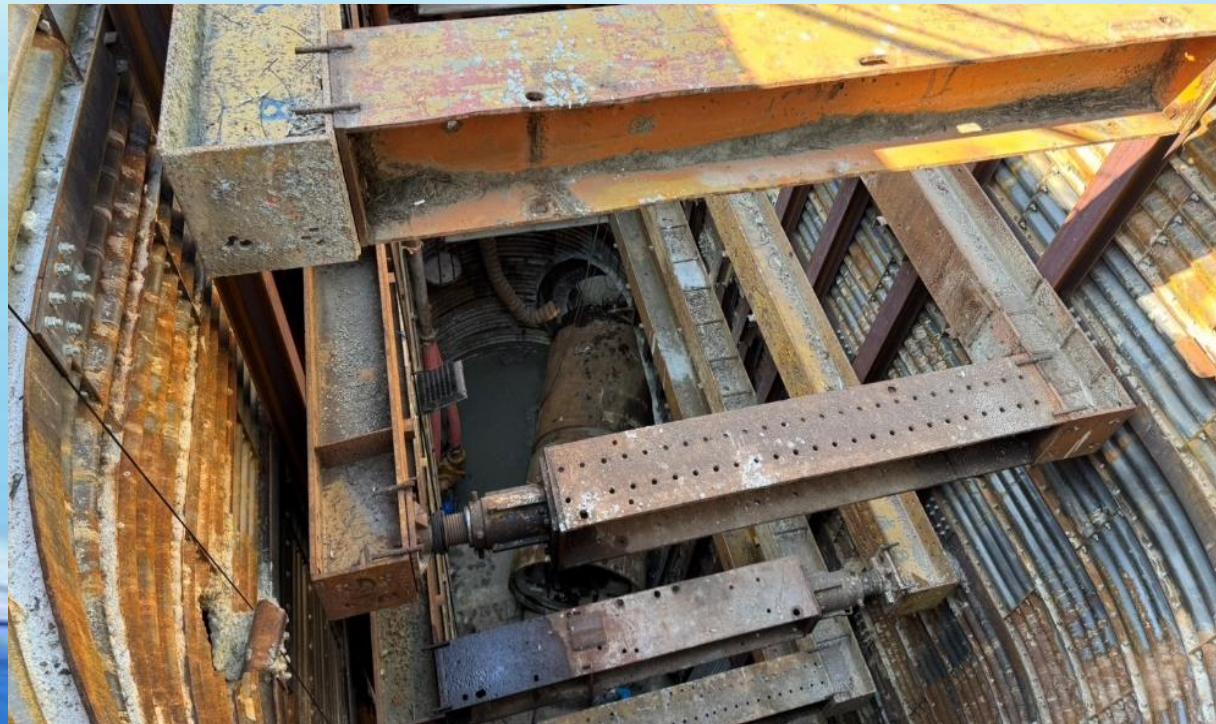

W03→W04推進作業

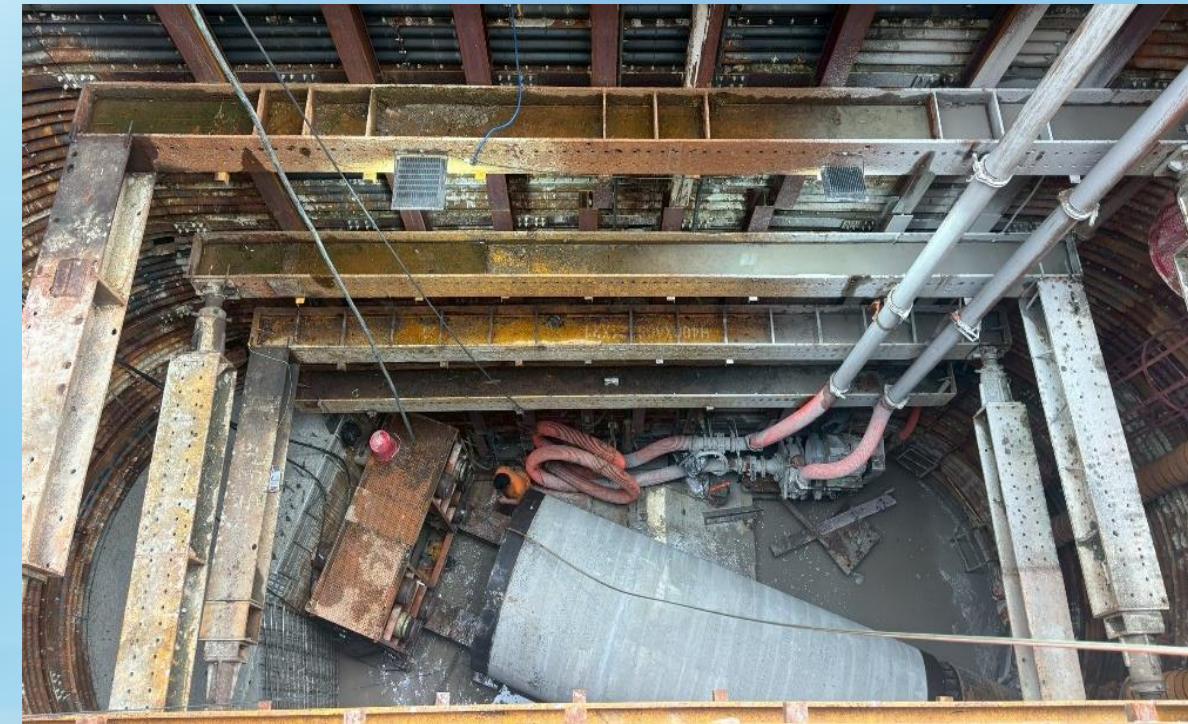

W03→W04推進作業



經濟部

北區水資源分署



道路埋設段工程標

工程執行現況



南華水管橋A1橋台井式基礎開挖



關西二號橋A1橋台鋼筋綁紮
