


貳、工程標案辦理情形

隧道銜接段工程標

工程進度

開工日期112年8月25日、預計117年6月23日完工

項目	隧道開挖及支撐 (含洞口邊坡保護)	隧道襯砌	隧道DIP-K3輸水管 施工安裝	明挖工程	閘類工程	其他
占總工程比例(%)	57.56%	15.13%	2.98%	8.61%	1.83%	13.89%
預計進度(%)	11.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%
實際進度(%)	26.89%	0.00%	0.00%	1.11%	0.00%	1.12%

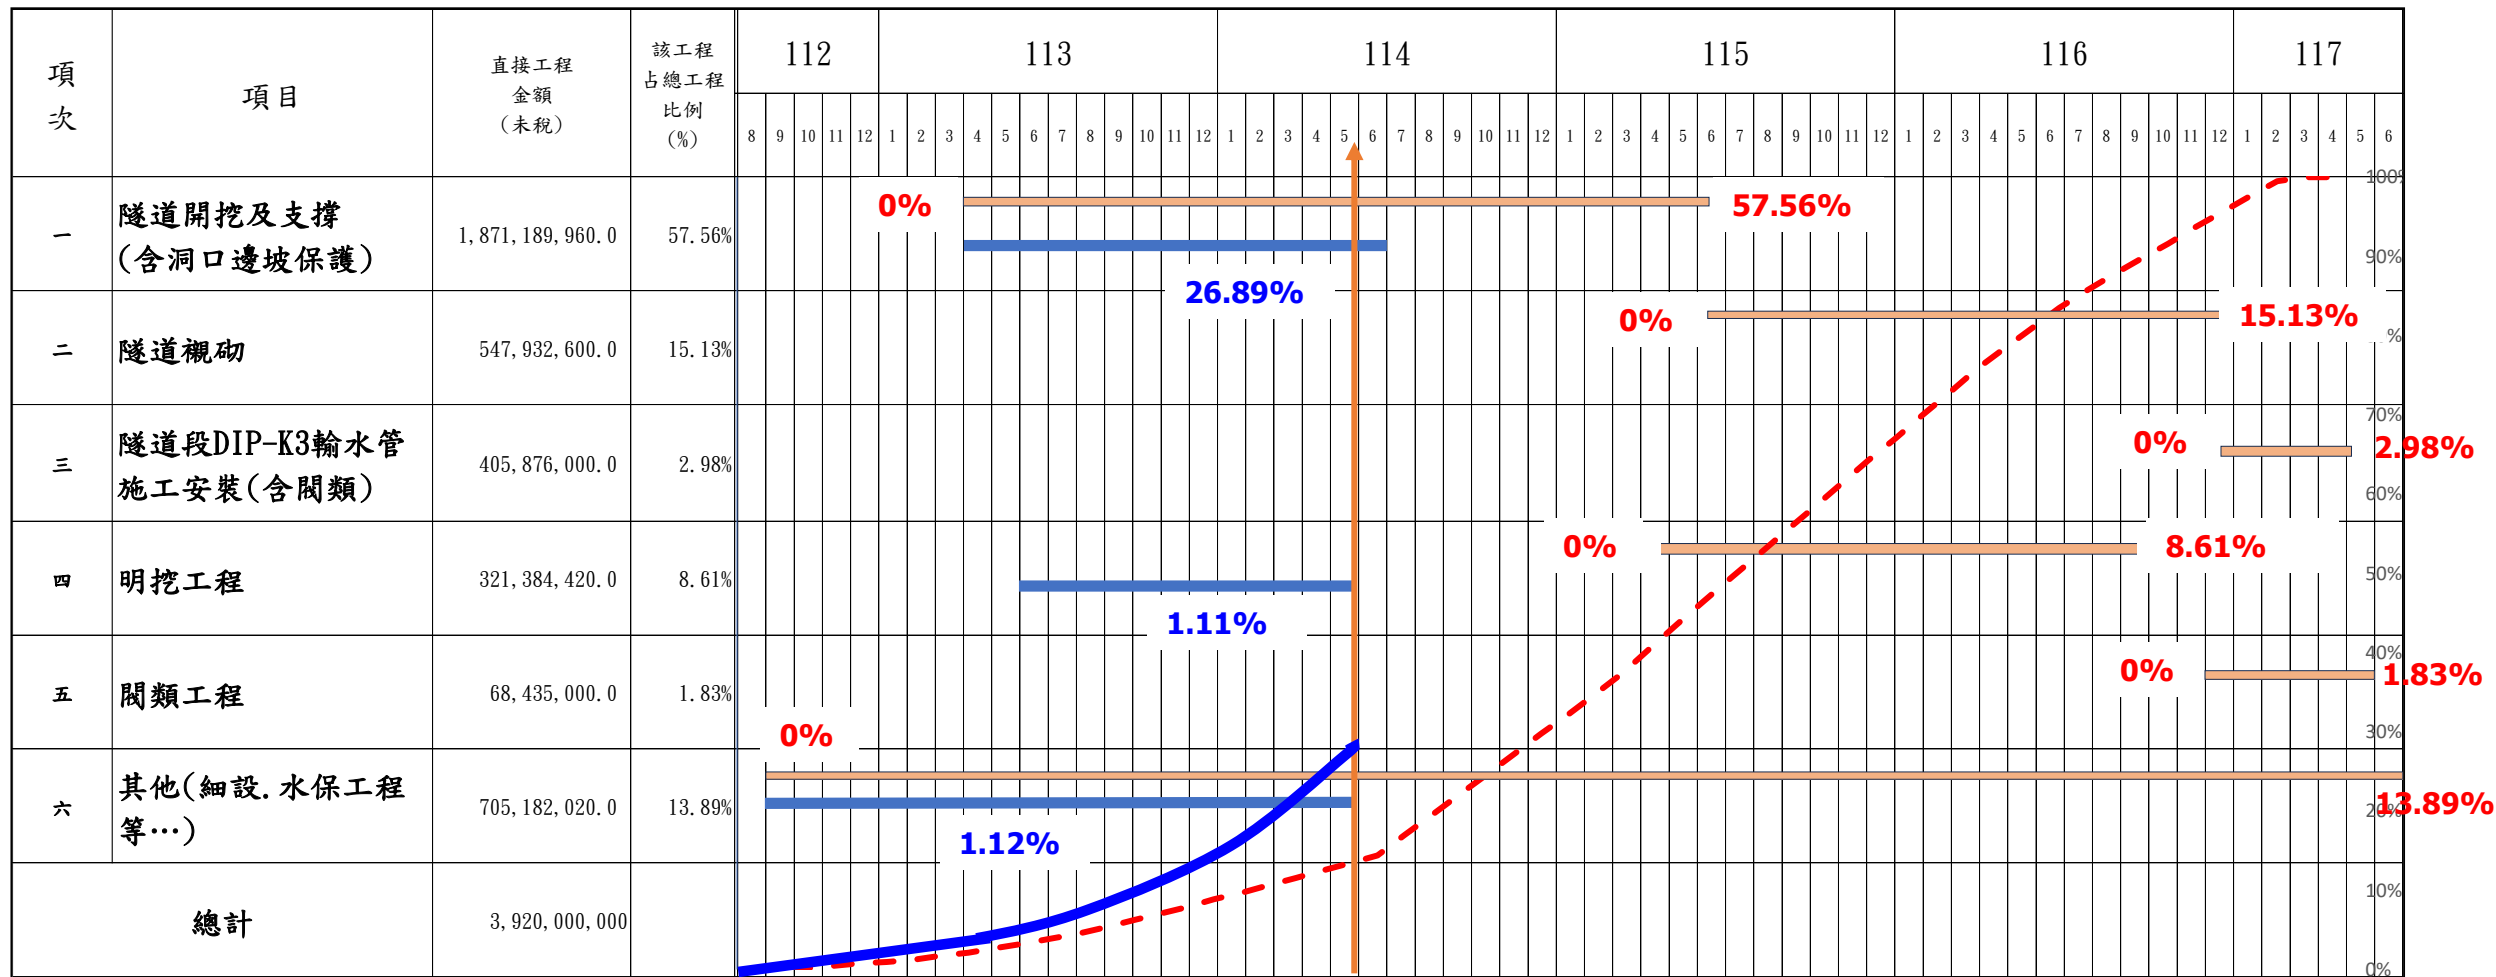


截至114年05月31日： 預定進度：12.50%、 實際進度：29.12%、 +16.62%



隧道銜接段工程標

工程執行現況-進口端

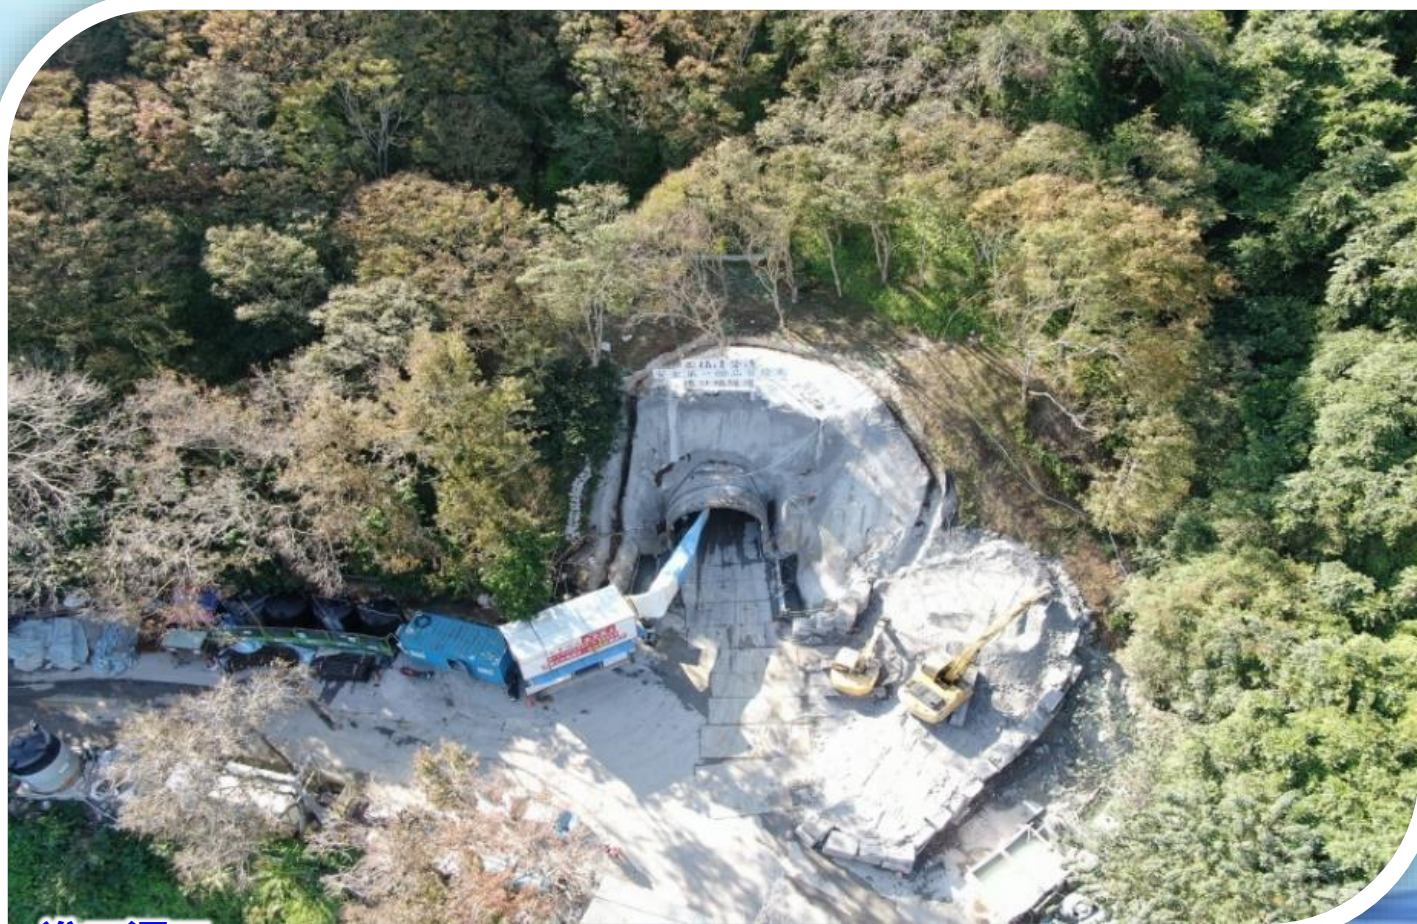

進口洞口：
進口空拍照。



進口一般段：
進口端隧道NT-692開挖面照。 2025/5/28




進口一般段：
進口端隧道開挖作業。 2025/5/28



隧道銜接段工程標

工程執行現況-出口端

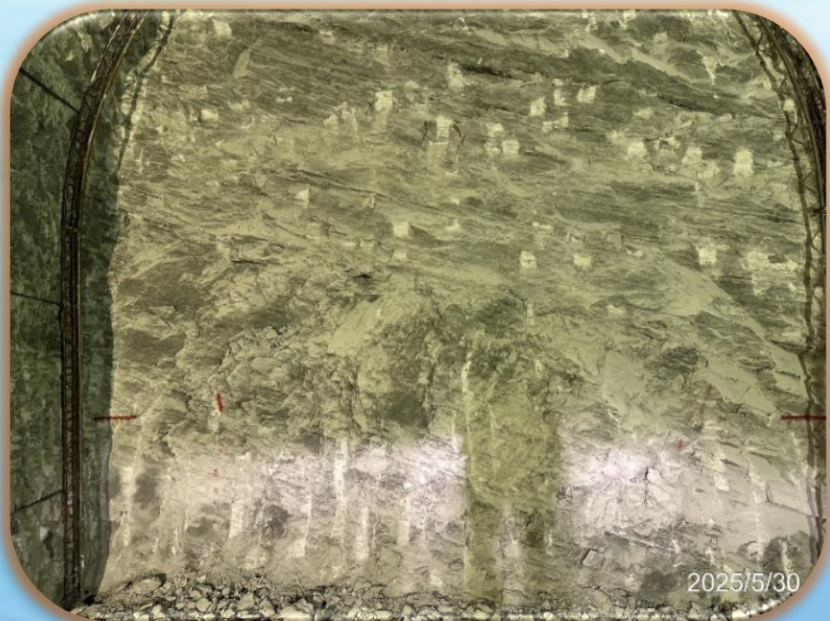

出口一般段:

出口端隧道ST-698開挖面照。



出口一般段:

出口端隧道裝設炸藥結線作業




出口一般段:

出口端隧道開炸後開挖面。



隧道銜接段工程標


工程執行現況-明挖段

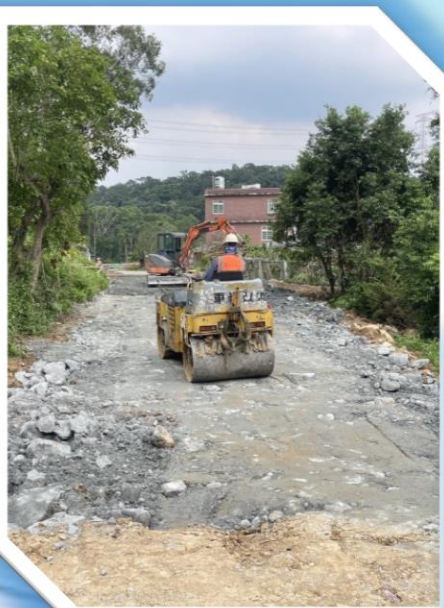

明挖段：
替代道路整地。



明挖段：
替代道路澆置。

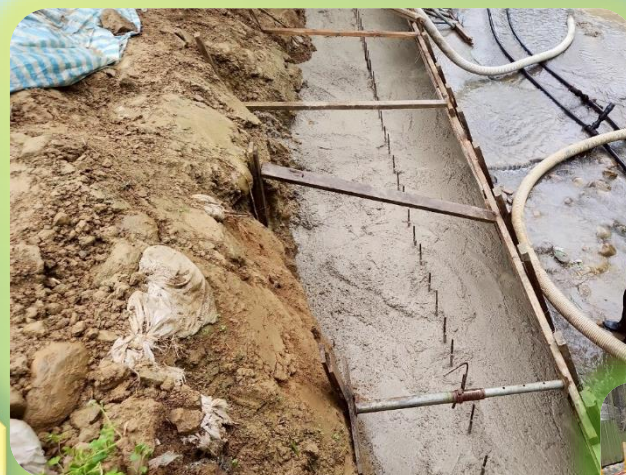

明挖段：
護岸復舊。



明挖段：
標線施作及防撞桿安裝。
