


隧道銜接段工程標

工程進度

開工日期112年8月25日、預計117年6月23日完工

項目	隧道開挖及支撐 (含洞口邊坡保護)	隧道襯砌	隧道DIP-K3輸水管 施工安裝	明挖工程	閘類工程	其他
占總工程比例(%)	47.73%	13.98%	10.35%	8.20%	1.75%	17.99%
預計進度(%)	20.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.74%
實際進度(%)	39.56%	0.00%	0.00%	2.47%	0.00%	6.75%

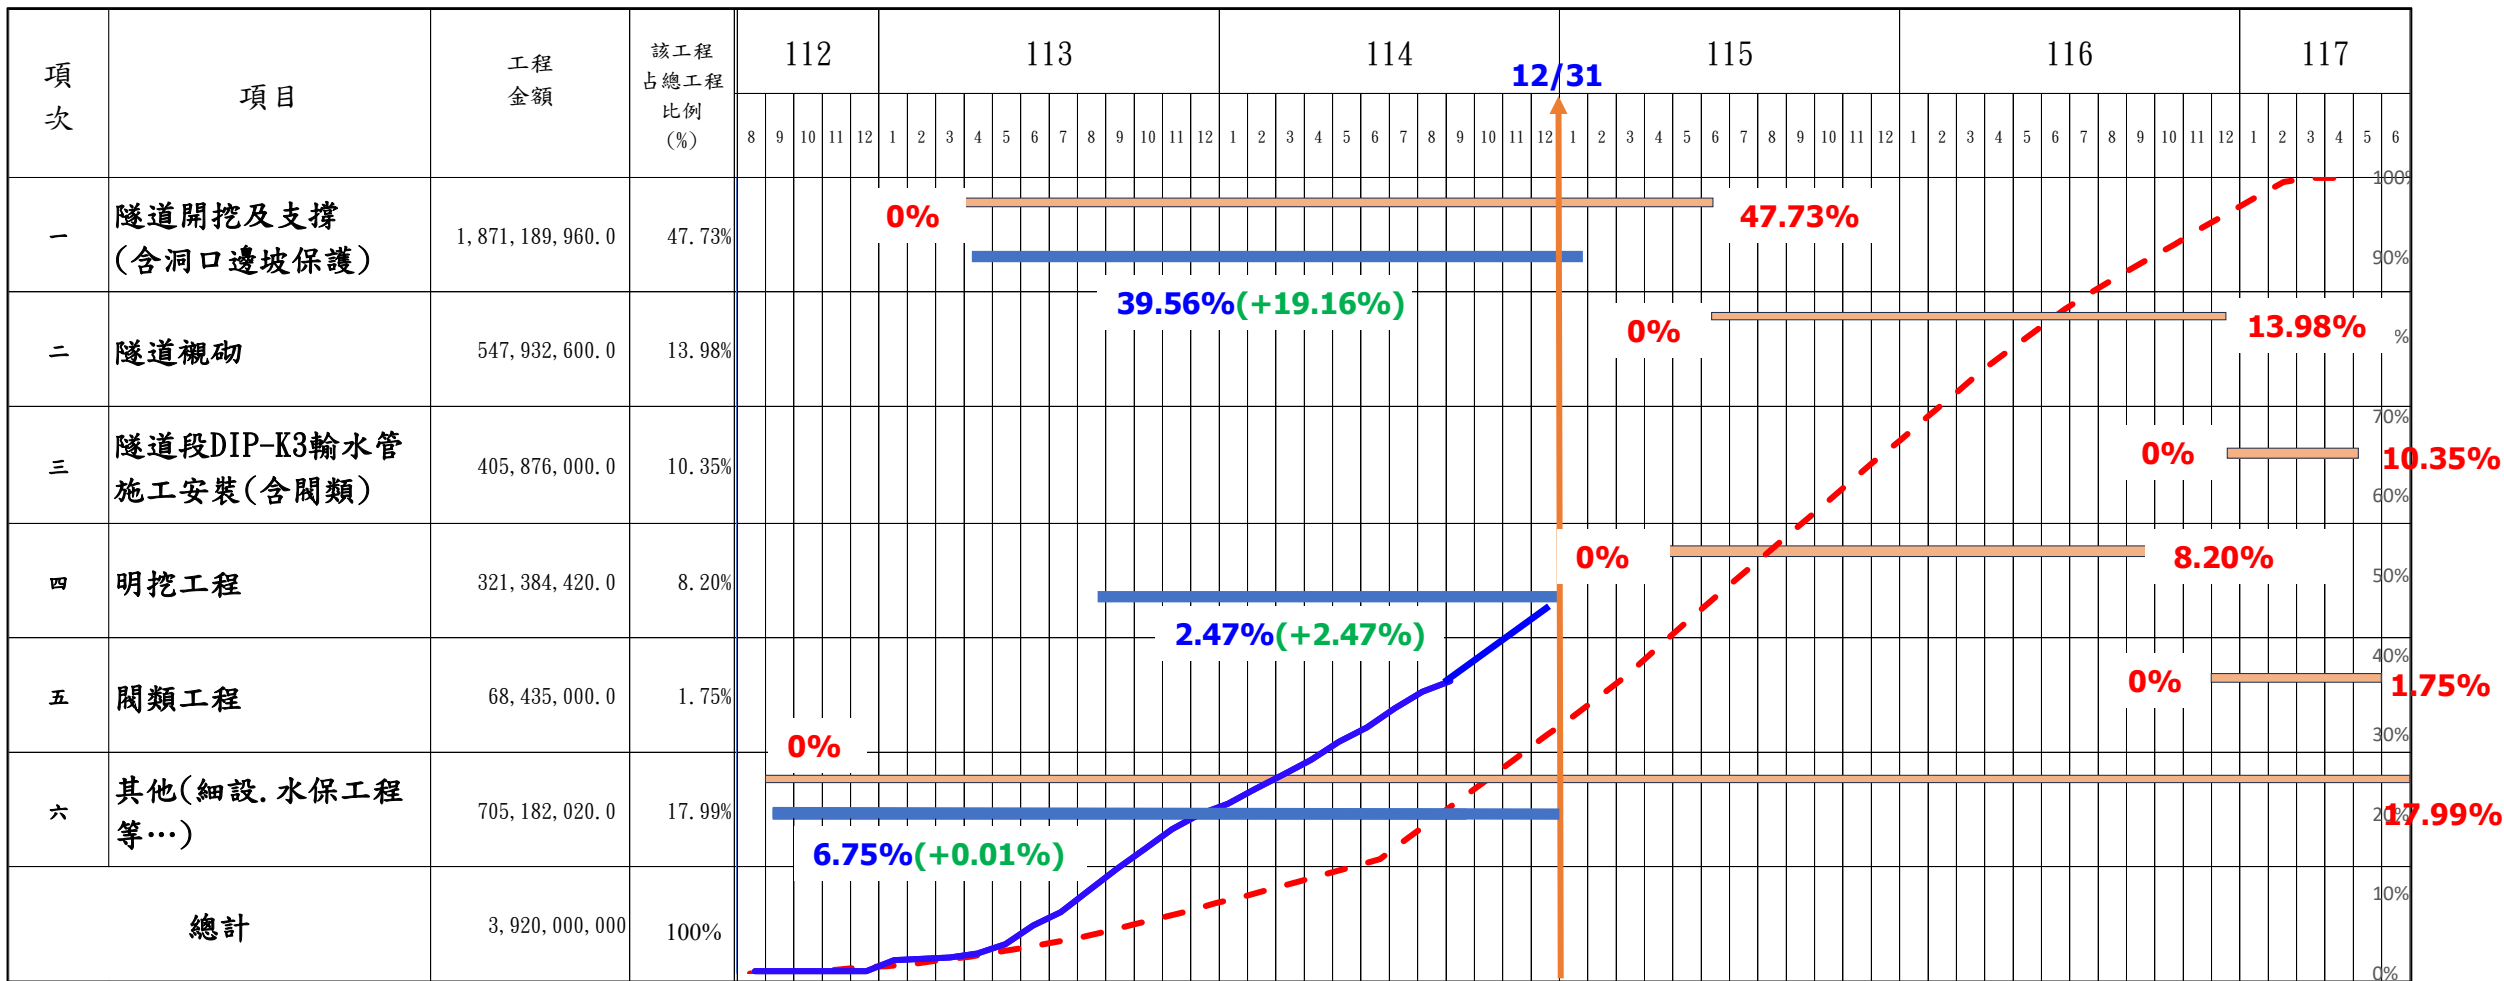


截至114年12月31日：預定進度：27.14%、實際進度：48.78%、+21.64%



隧道銜接段工程標

工程執行現況-進口端

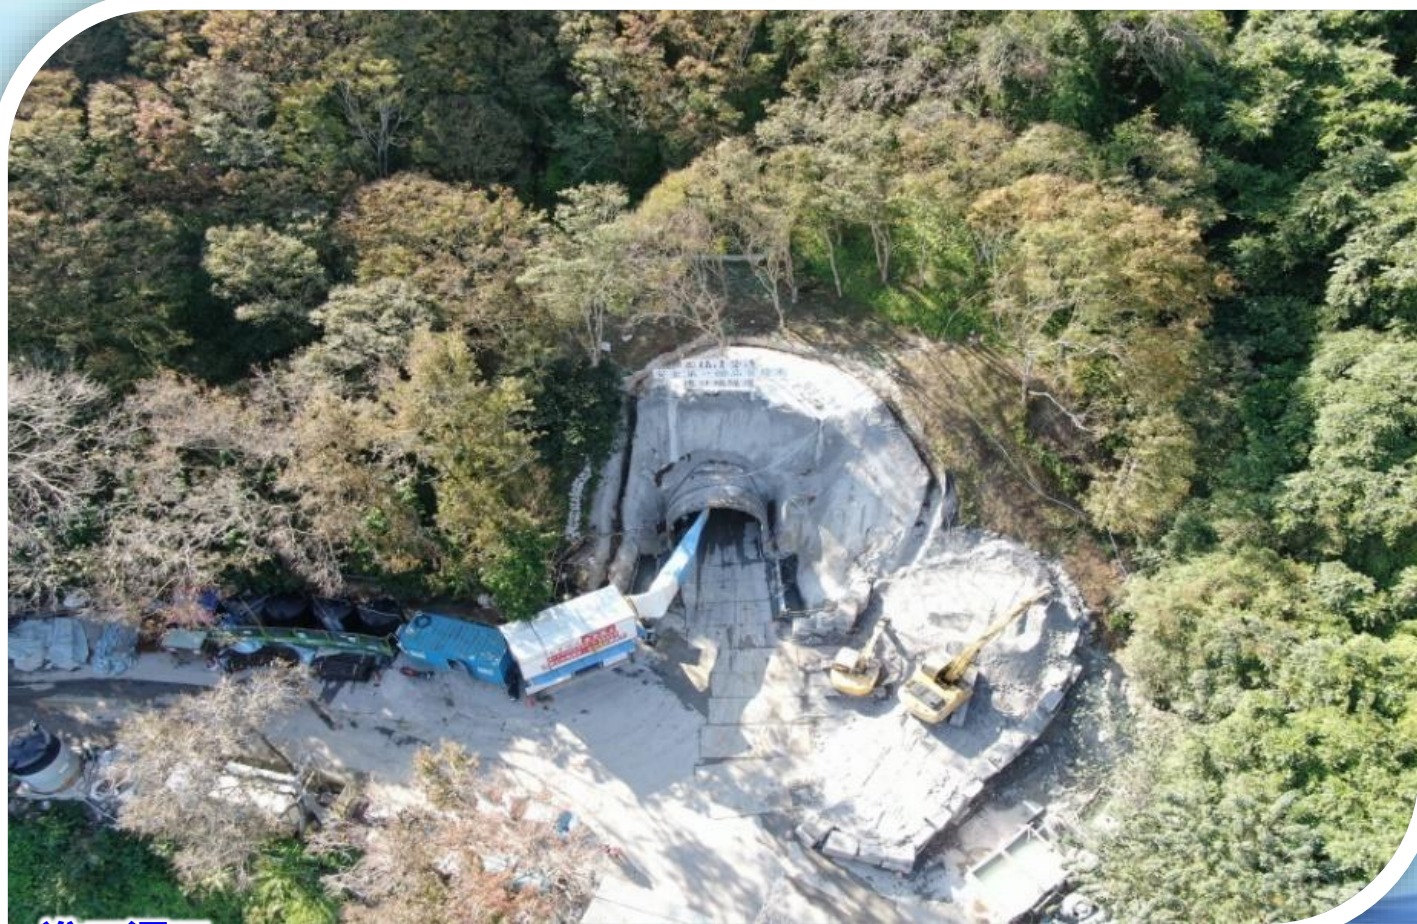

進口洞口：
進口空拍照。



進口一般段：
進口端隧道NT-960開挖面照 2025/12/29



進口一般段：
進口端隧道NT-954結線裝藥作業 2025年12月23日




隧道銜接段工程標

工程執行現況-出口端



出口一般段:

出口端隧道ST-1058開挖面照

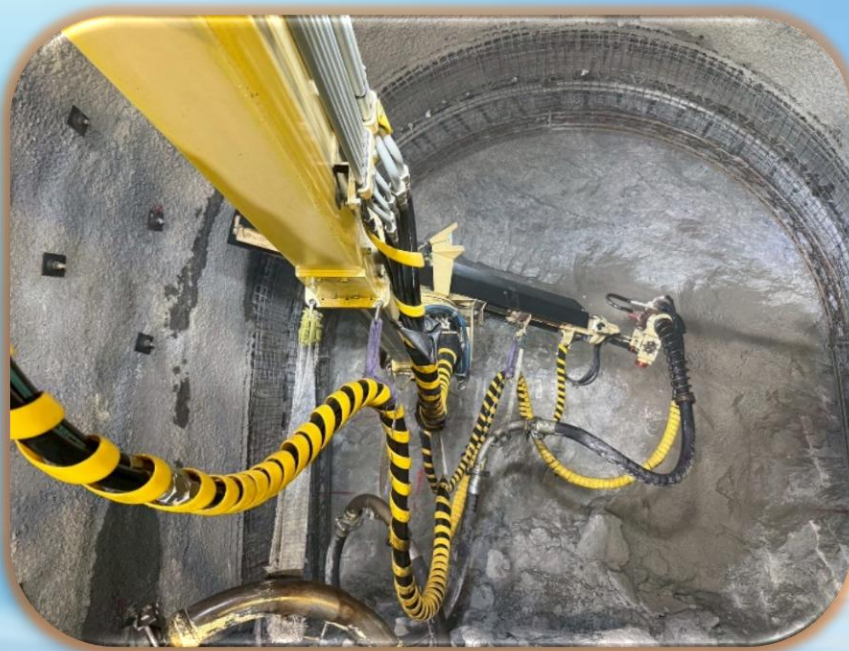

出口一般段:

出口端隧道噴漿作業



出口一般段:

出口端隧道岩栓打設。



隧道銜接段工程標

工程執行現況-明挖段


第一工區-主線段




明挖段:
鋼軌樁引孔打設



明挖段:
竹28-1道路AC臨補

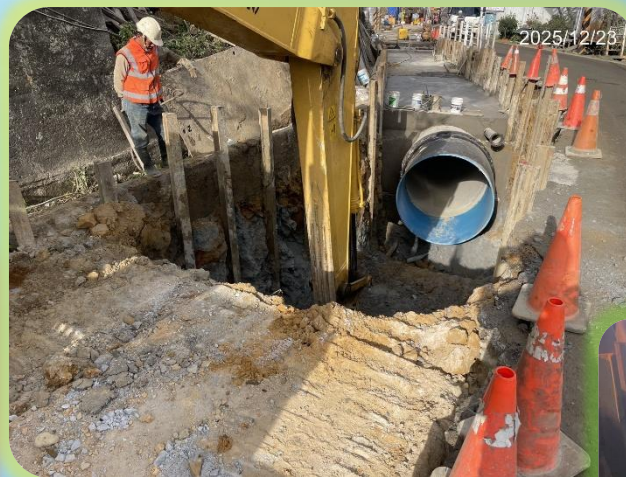

明挖段:
開挖作業

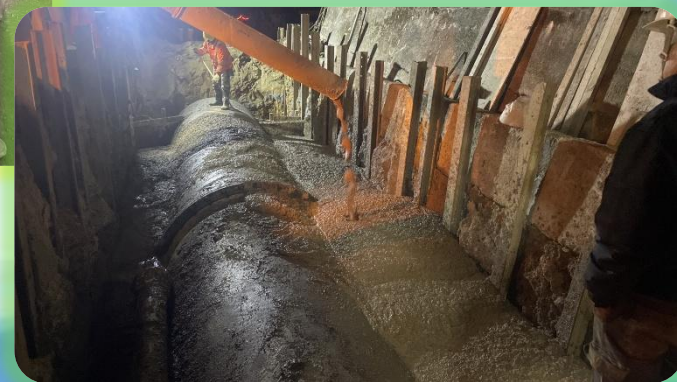

明挖段:
CLSM澆置作業



經濟部

北區水資源分署



隧道銜接段工程標

工程執行現況-明挖段

第二工區-便道段



明挖段:
DIP開挖埋管



明挖段:
警示帶鋪設



明挖段:
CLSM澆置



明挖段:
路面AC假修復
