





# 道路埋設段工程標

# 工程布置

(統計至115/2/28)



### 道路埋設段工程標

### 工程執行現況

#### 第一工區

\*目前已完成1394公尺/3110m。

\*目前工作面改設置於南華橋後(約61K+033)並陸續挖掘出台電既有人孔與既有管線，挖掘出之人孔結構與管線預計暫置阿姆坪固定位置。



第一工區施工位置



第一工區AC刨鋪作業



第一工區AC刨鋪作業



# 道路埋設段工程標

# 工程執行現況

第二工區

\* 目前已完成1070公尺/1070m。



第二工區施工位置



115.02.12

第二工區標線繪製



關西鎮

115.02.12


第二工區標線繪製

### 道路埋設段工程標

### 工程執行現況

#### 第三工區

- \* 目前已完成1979.6公尺/2110公尺且1979公尺已完成AC刨鋪。
- \* 該工區已完成年前收整，已於2/4全路幅刨鋪。

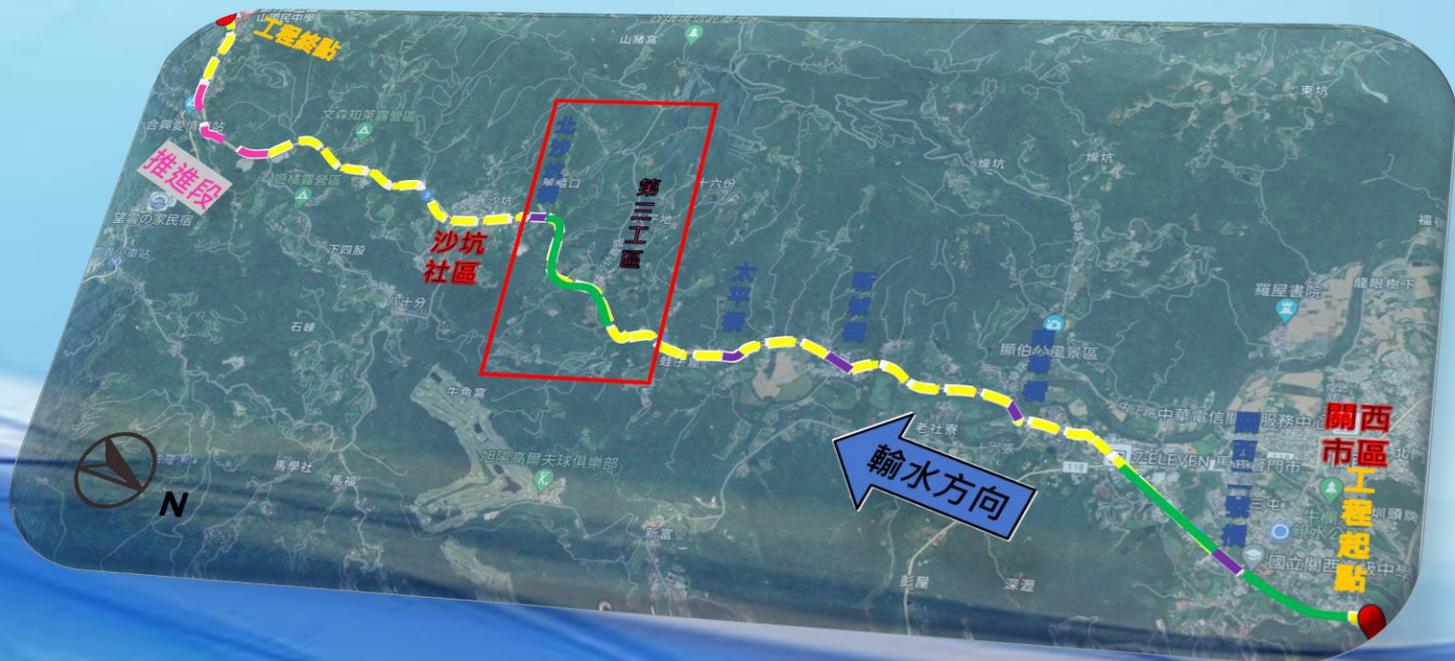

第三工區施工位置



第三工區AC刨鋪作業




第三工區AC刨鋪作業

### 道路埋設段工程標

### 工程執行現況

#### 第四工區

- \* 目前管線已埋設1613m/2957M。
- \* 目前AC刨鋪已完成1613m。
- \* 僅剩沙坑社區瓶頸段未施工，後續將辦理變更設計討論明挖工法改為推進工法施工，目前正在辦理前置作業。

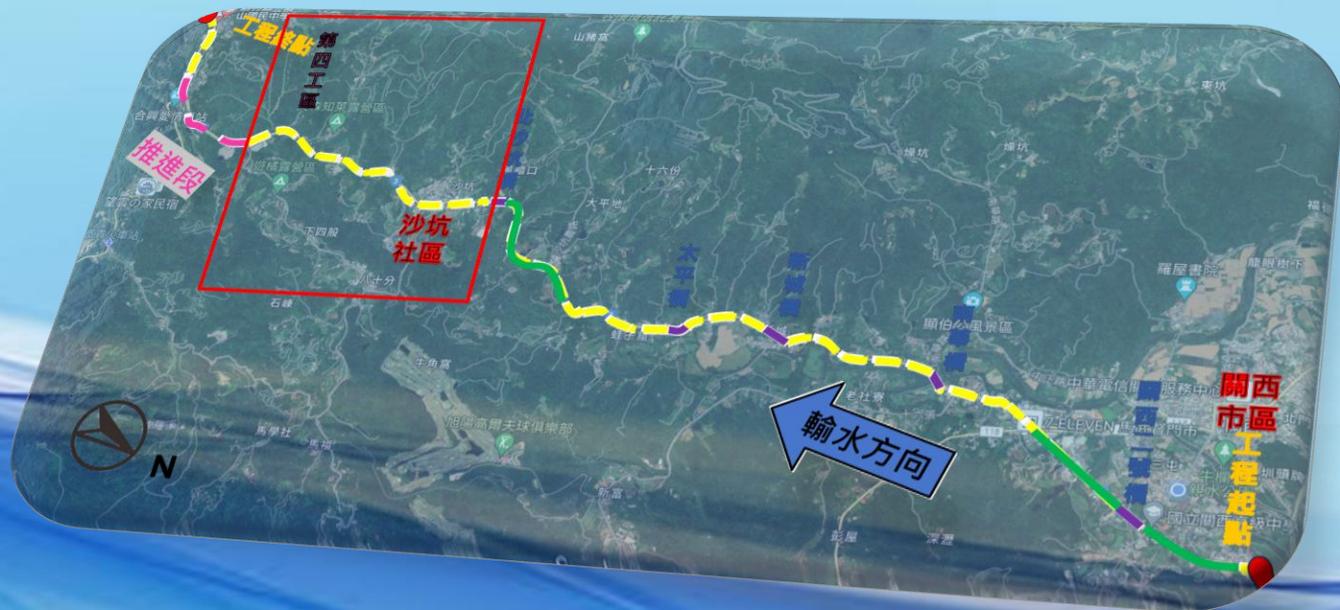

第四工區施工位置



第四工區AC刨鋪作業



第四工區AC刨鋪作業

### 道路埋設段工程標

### 工程執行現況

#### 第五工區

- \* 目前管線已埋設339.1m/557M。
- \* 鋼軌樁持續打設中。
- \* 於10K+997~11K+097，待台電管障移除後施工。



115.02.10

第五工區警示帶鋪設



第五工區施工位置



115.02.10


第五工區自來水管安裝

### 道路埋設段工程標

### 工程執行現況

#### 推進工區

- \* 已完成W01工作井、W02工作井及W03工作井開設。
- \* 目前W02→W01推進作業累計98m/110M。
- \* 目前W02→W03推進作業累計298m/298M。
- \* 目前W03→W04推進作業累計203m/374M。

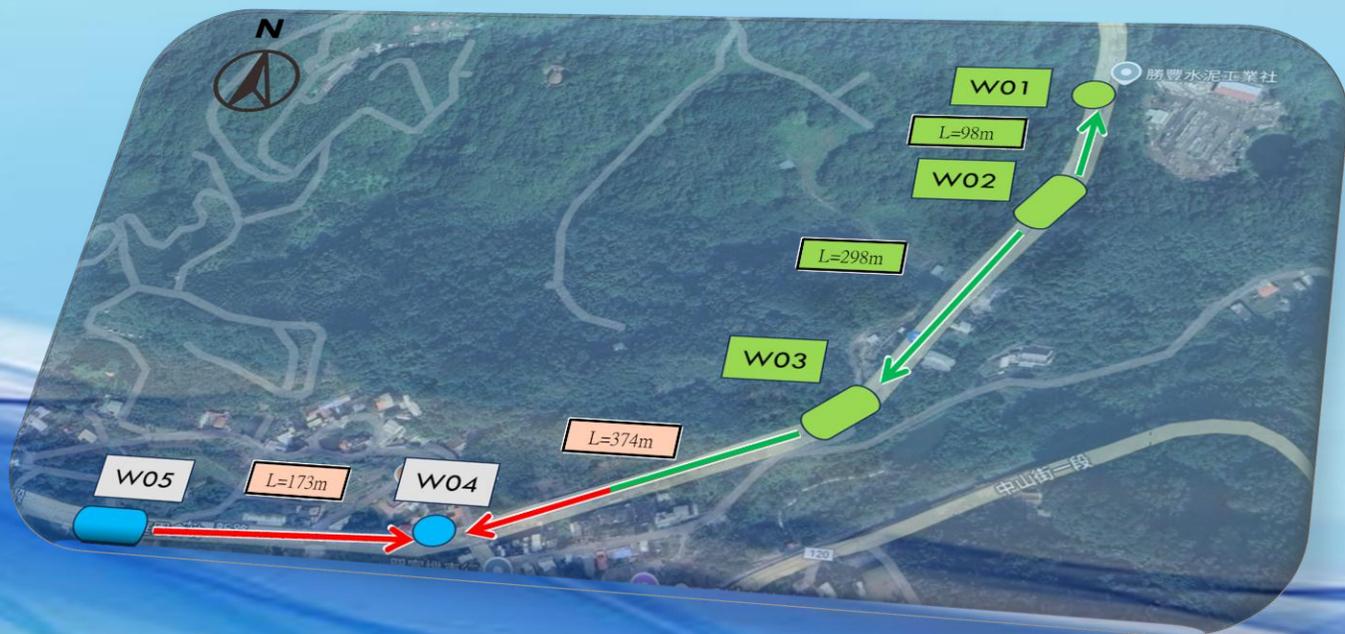

推進工區施工位置



W03→W04推進作業



W03→W04推進作業

### 道路埋設段工程標


### 工程執行現況

#### 水管橋工區

- \*目前關西二號橋A1橋台墩柱混凝土澆置完成。
- \*目前關西二號橋A2橋台墩柱混凝土澆置完成。
- \*目前南華橋A2橋台井式基礎鋼筋綁紮。
- \*目前南華橋A1橋台井式基礎鋼筋綁紮。
- \*目前北沙坑橋A1橋台井式基礎鋼筋綁紮。



關西二號水管橋A1橋台鋼筋查驗

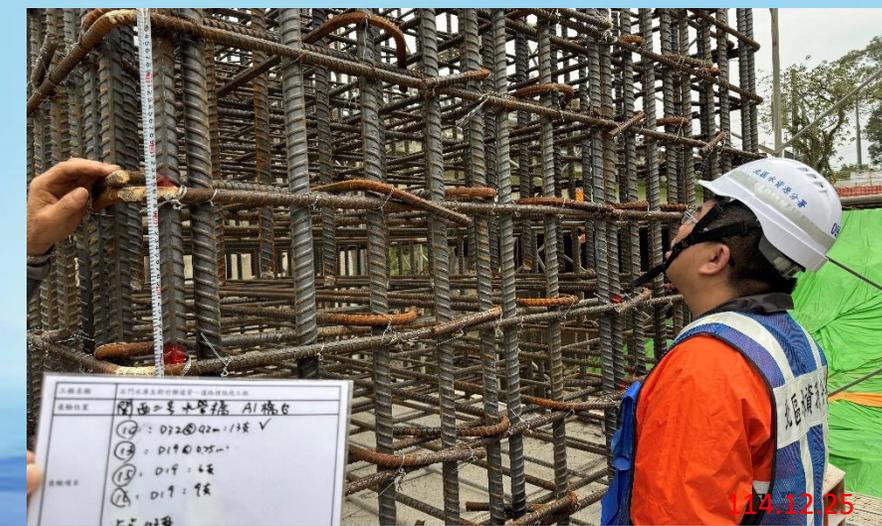

關西二號水管橋A1橋台鋼筋查驗



水管橋工區施工位置
