



跨河放水段工程標

全區施工示意

截至115年2月28日





| 預定進度：17.94% | 實際進度：19.43% |
|----------------------------------|-----------------|
| 台三線(明挖)第一工區 | 長度:2,542.29M |
| 大肚國小推進 | 長度:165.09M |
| 油羅溪(水管橋) | 長度:477.03M |
| 內灣支線推進 | 長度:81.90M |
| 台三線(明挖)第二工區 | 長度:1,623.14M |
| 竹東(水管橋) | 長度:305M |
| 上坪明挖第一工區 -上坪段 (運動公園→員嶼) | 長度：900m/900m |
| 上坪明挖第二工區 -上坪明挖段 (員嶼→竹東圳) | 長度：683.52m/985m |
| 上坪明挖第三工區 -上坪明挖段 (竹東圳→軟橋堤防) | 長度：0m/165m |
| 上坪明挖第四工區 -上坪明挖段 (軟橋堤防→出水口) | 長度：301.1m/850m |

第一工區目前施工情形



上坪溪第一工區：—— 已完成

- *管線已埋設 (900公尺 / 900 公尺)，已完成。
- *管線試水灌水中。
- *2/4完成竹東運動公園路面瀝青混凝土鋪築。
- *2/25 5k+280~5k+656管線加壓漏水檢測作業

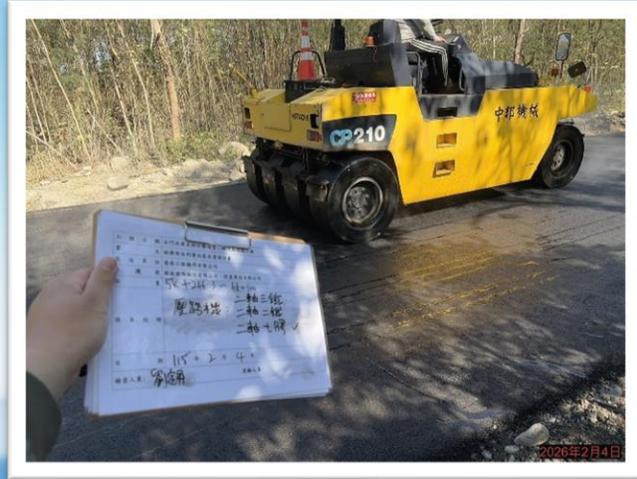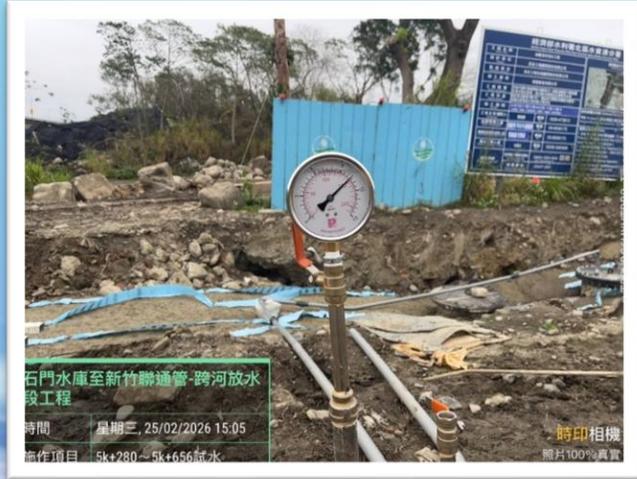

管線加壓漏水檢測

運動公園AC鋪築

第二工區目前施工情形

上坪溪第二工區：—— 已完成
*管線已埋設 (683.52公尺 / 985 公尺)。



管線安裝



扭力查驗



管線回填



警示帶鋪設


第四工區目前施工情形

上坪溪第四工區：—— 已完成

- *氣動槌引孔已完成1400孔@60cm。
- *鋼軌樁打設已完成920支@60cm。
- *管線已埋設 (301.1公尺 / 850公尺)。




← 管線安裝

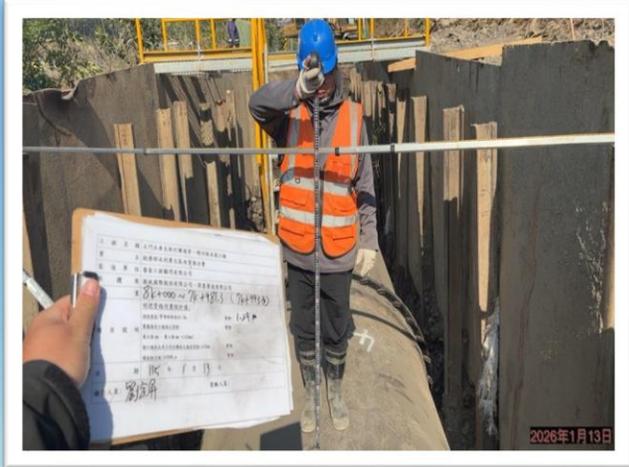

挖深檢查 →



← 扭力查驗

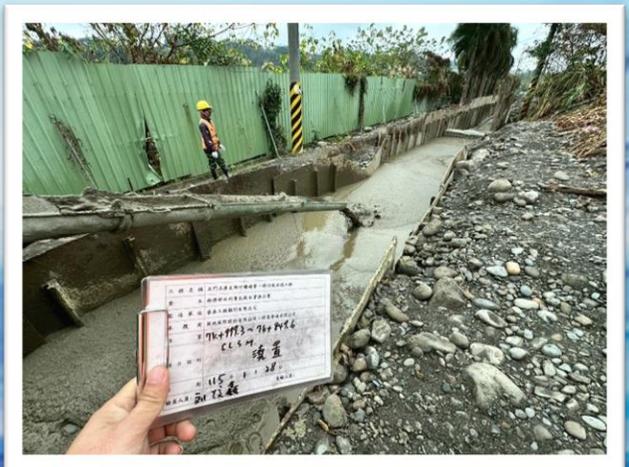

管溝回填 →

緩衝槽工區目前施工情形

緩衝槽工區：●

- *緩衝槽工區整地、放樣。
- *H型鋼材料進場。



← 結構物開挖

工區整地 →



← 結構物開挖

結構物開挖 →

