


貳、工程標案辦理情形

隧道銜接段工程標 工程進度

開工日期112年8月25日、預計117年6月23日完工

項目	隧道開挖及支撐 (含洞口邊坡保護)	隧道襯砌	隧道DIP-K3輸水管 施工安裝	明挖工程	閘類工程	其他
占總工程比例(%)	57.56%	15.13%	2.98%	8.61%	1.83%	13.89%
預計進度(%)	9.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.95%
實際進度(%)	23.39%	0.00%	0.00%	0.87%	0.00%	0.96%

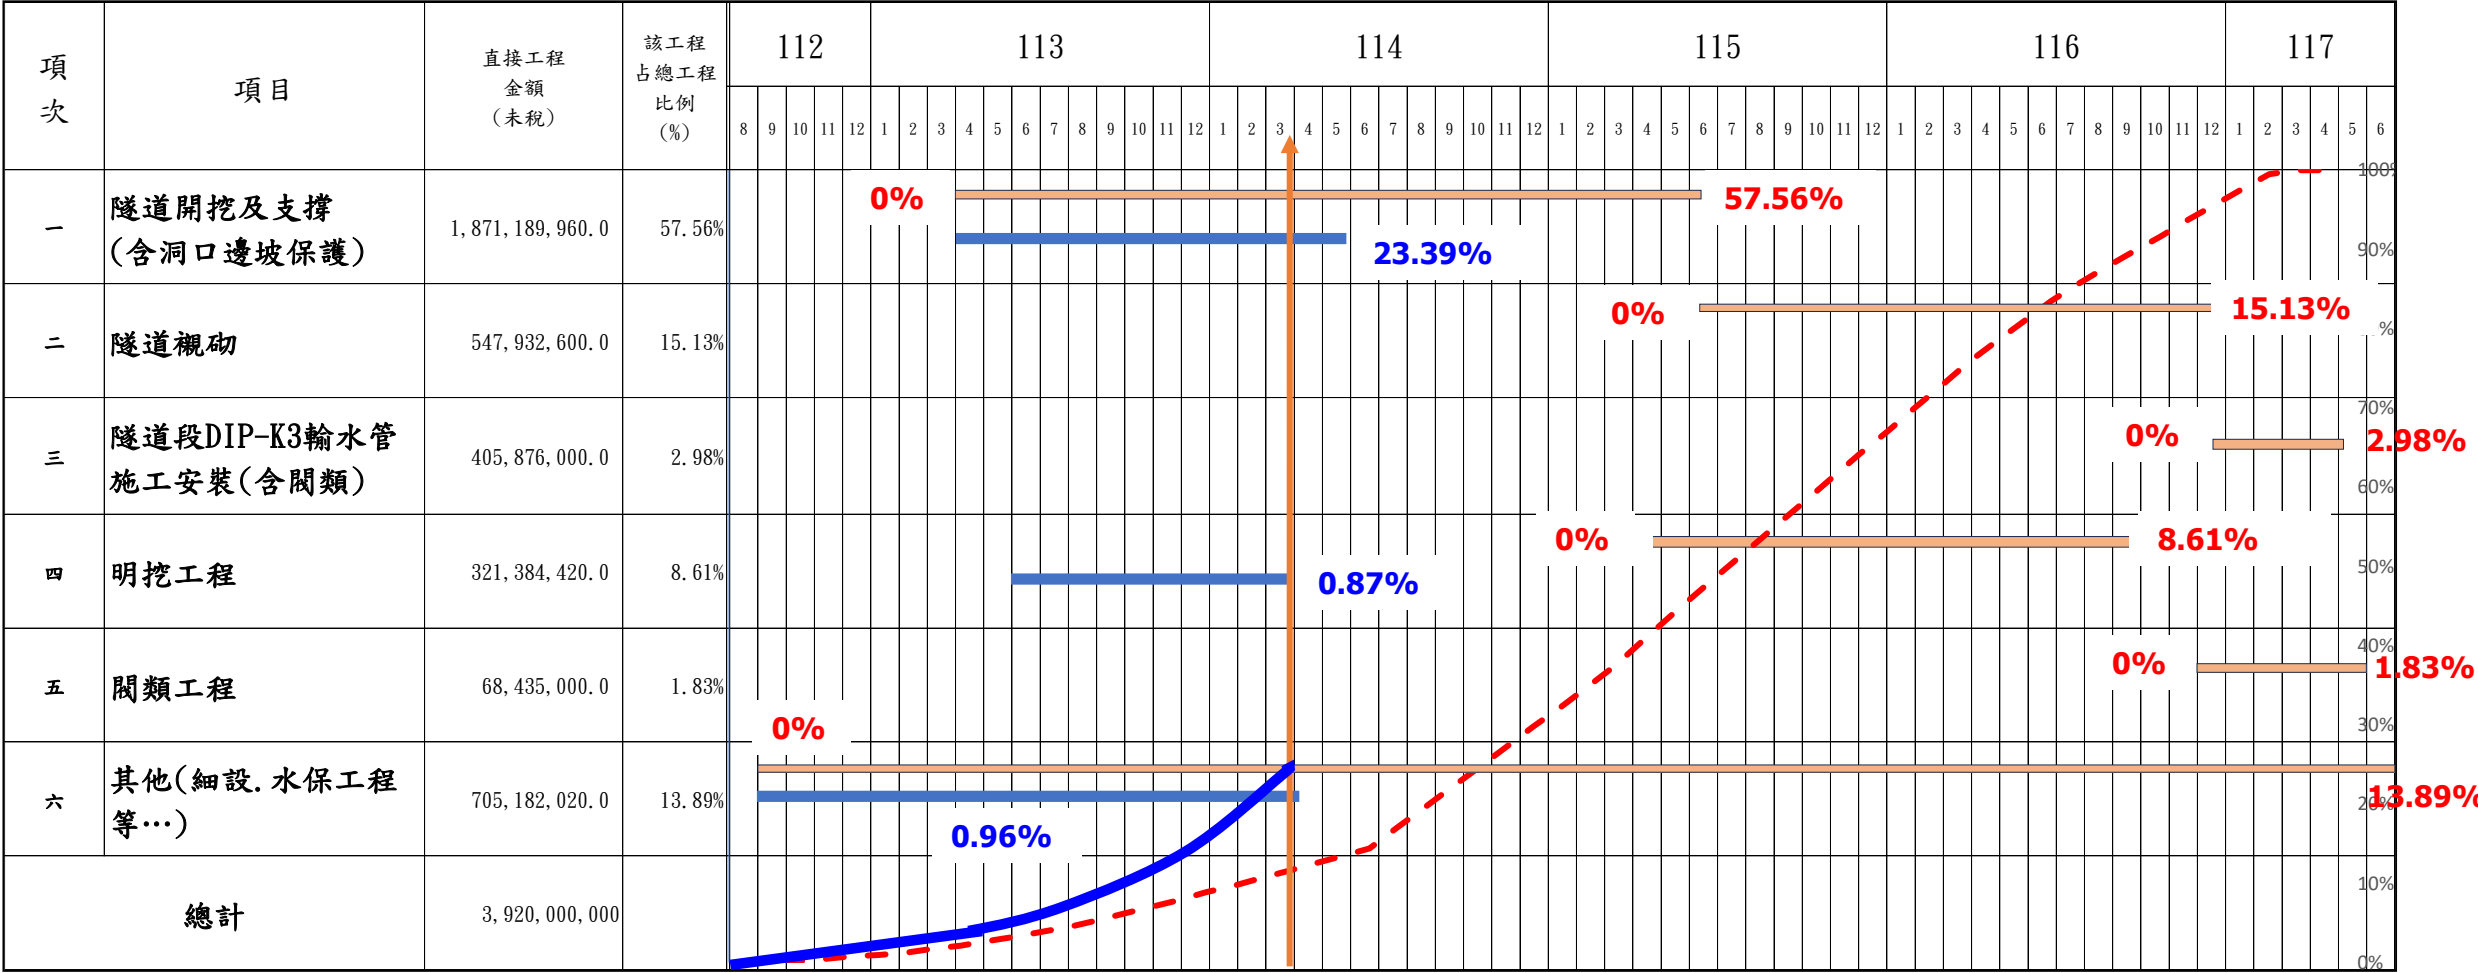


截至114年03月30日：預定進度：10.61%、實際進度：25.22%、+14.61%




隧道銜接段工程標

工程執行現況-進口端

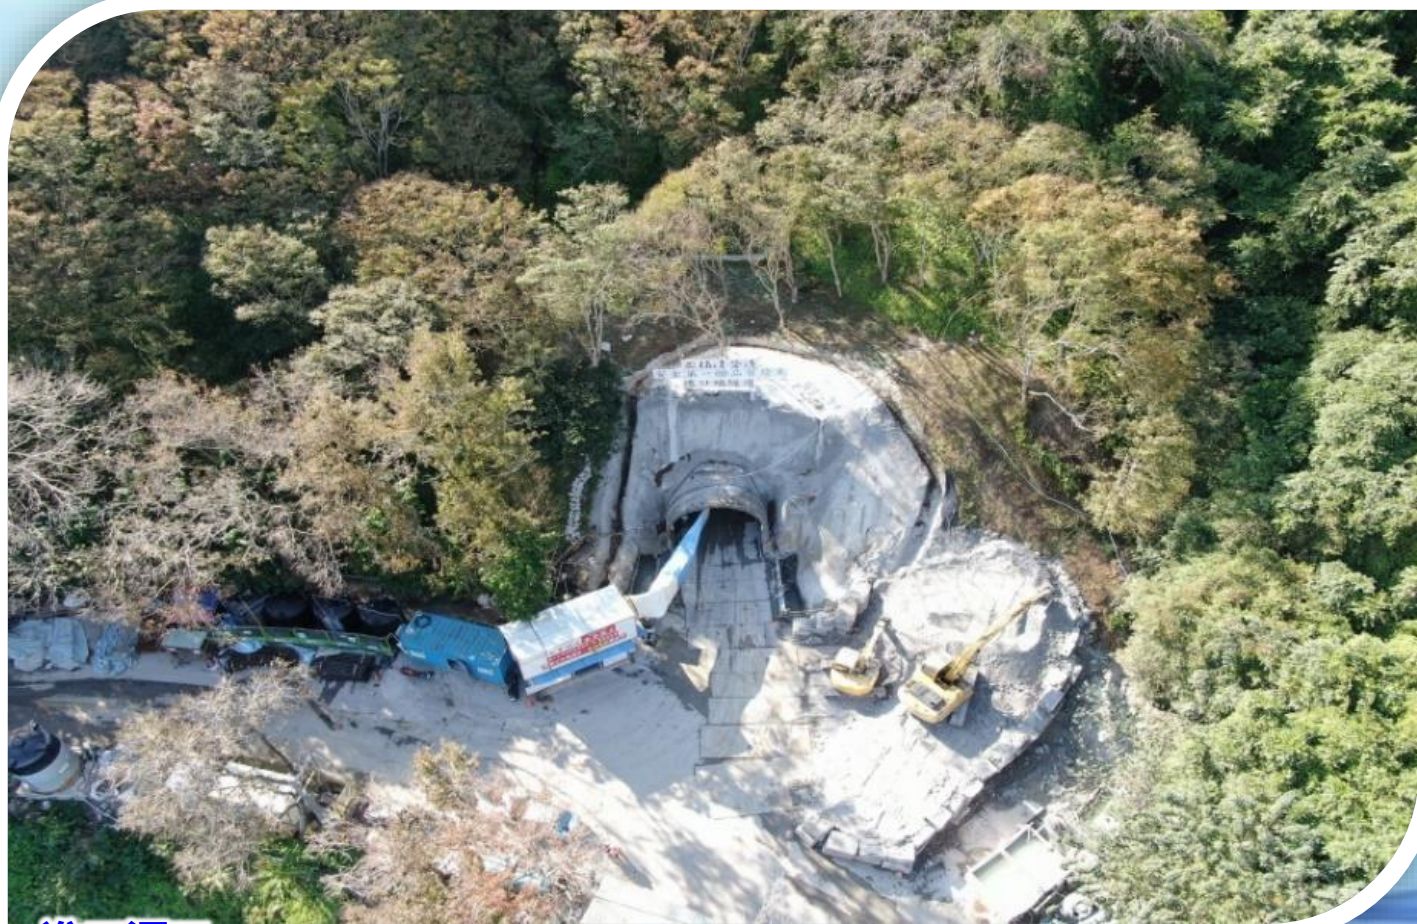

進口洞口：
進口空拍照。

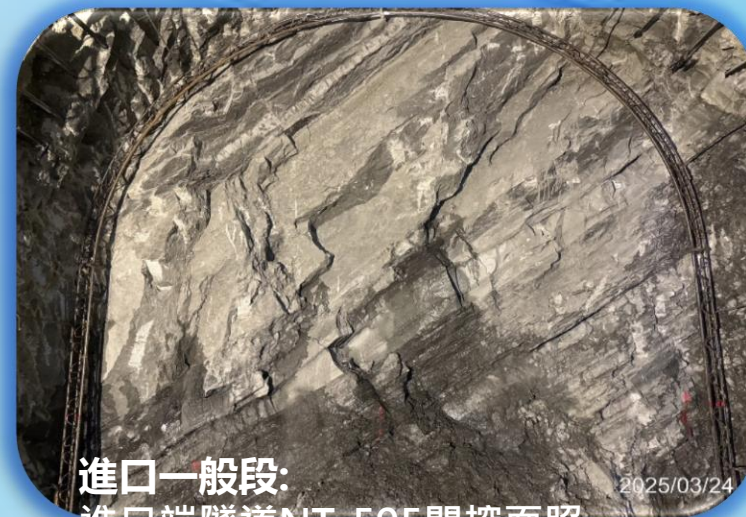

進口一般段：
進口端隧道NT-595開挖面照。



進口一般段：
進口端隧道噴漿作業。



隧道銜接段工程標

工程執行現況-出口端



出口洞口:
出口空拍照。



出口一般段:
出口端隧道ST-500開挖面照。



出口一般段:
出口端隧道開挖作業



隧道銜接段工程標

工程執行現況-明挖段



明挖段：
埋設DIP管。



明挖段：
CLSM回填。



明挖段：
回填整地。



明挖段：
鋼板樁打設。
