


貳、工程標案辦理情形

隧道銜接段工程標

工程進度

開工日期112年8月25日、預計117年6月23日完工

項目	隧道開挖及支撐 (含洞口邊坡保護)	隧道襯砌	隧道DIP-K3輸水管 施工安裝	明挖工程	閘類工程	其他
占總工程比例(%)	47.73%	13.98%	10.35%	8.20%	1.75%	17.99%
預計進度(%)	20.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.60%
實際進度(%)	35.69%	0.00%	0.00%	1.95%	0.00%	2.61%

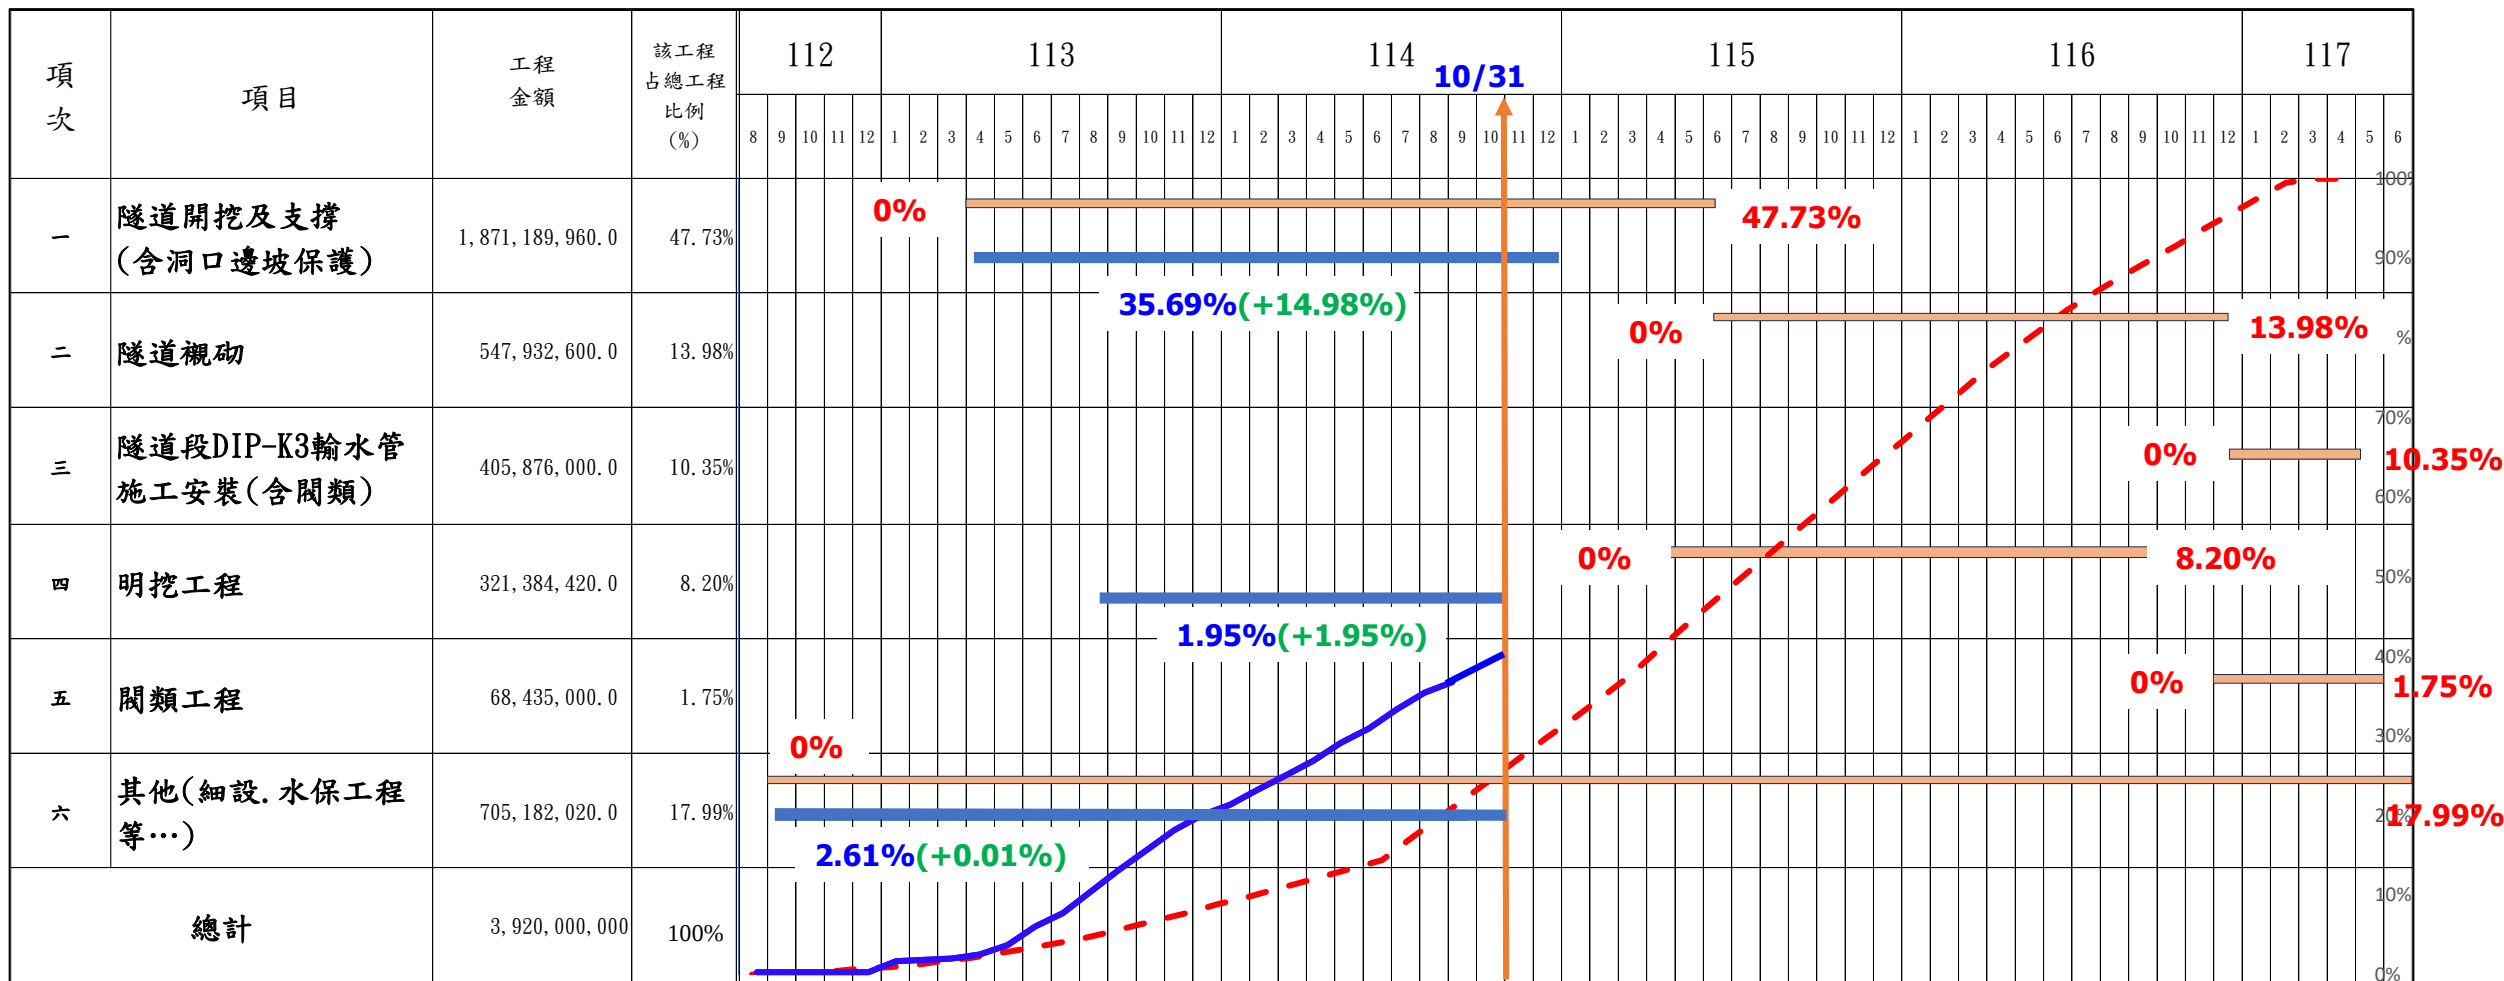


■ 截至114年10月31日：預定進度：23.31%、實際進度：40.25%、+16.94%



隧道銜接段工程標

工程執行現況-進口端

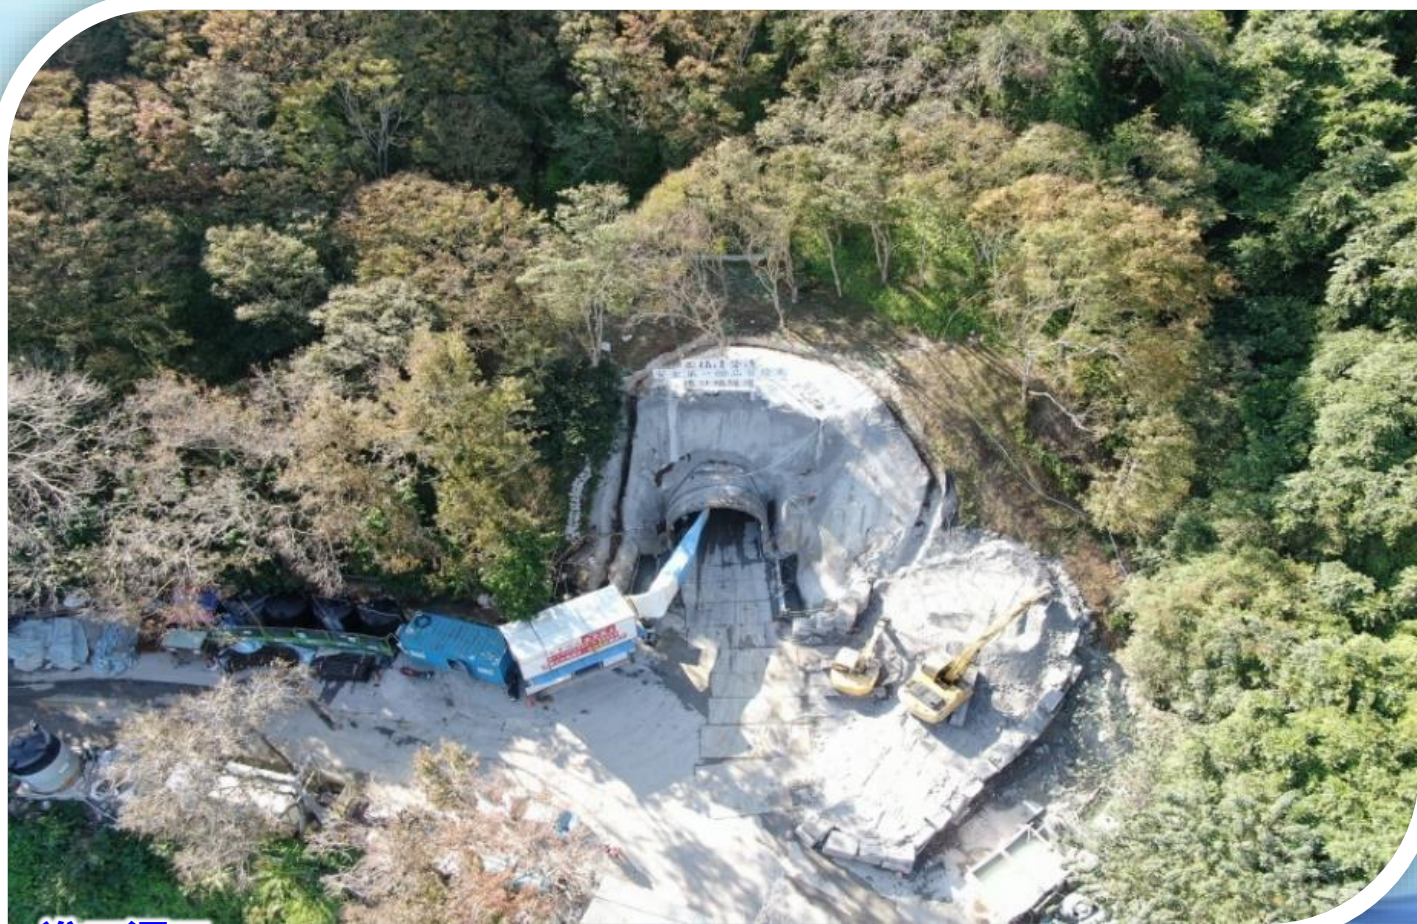

進口洞口：
進口空拍照。



進口一般段：
進口端隧道裝藥結線作業。



進口一般段：
進口端隧道岩栓鑽設作業。



隧道銜接段工程標

工程執行現況-出口端



出口一般段:
出口端隧道ST-947開挖面照。



出口一般段:
出口端隧道開挖作業。



出口一般段:
出口端隧道岩栓打設。



隧道銜接段工程標

工程執行現況-明挖段




明挖段:
CLSM澆置。



明挖段:
DIP17-4埋設安裝。



明挖段:
扭力值檢測。

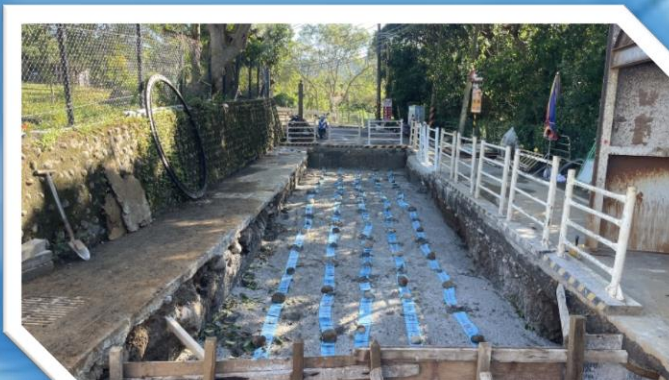

明挖段:
警示帶鋪設。
