




項目	隧道開挖及支撐 (含洞口邊坡保護)	隧道襯砌	隧道DIP-K3輸水管 施工安裝(含閘類 及機電監控工程)	明挖工程(含DIP-K3 輸水管施工安裝、 排氣閘施工安裝)	其他(細設、 水保工程等)
占總工程比例(%)	50.04%	17.19%	14.96%	11.49%	6.32%
預計進度(%)	27.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%
實際進度(%)	44.82%	0.00%	0.00%	4.18%	3.95%

隧道銜接段工程標

工程進度

開工日期112年8月25日、預計117年6月23日完工

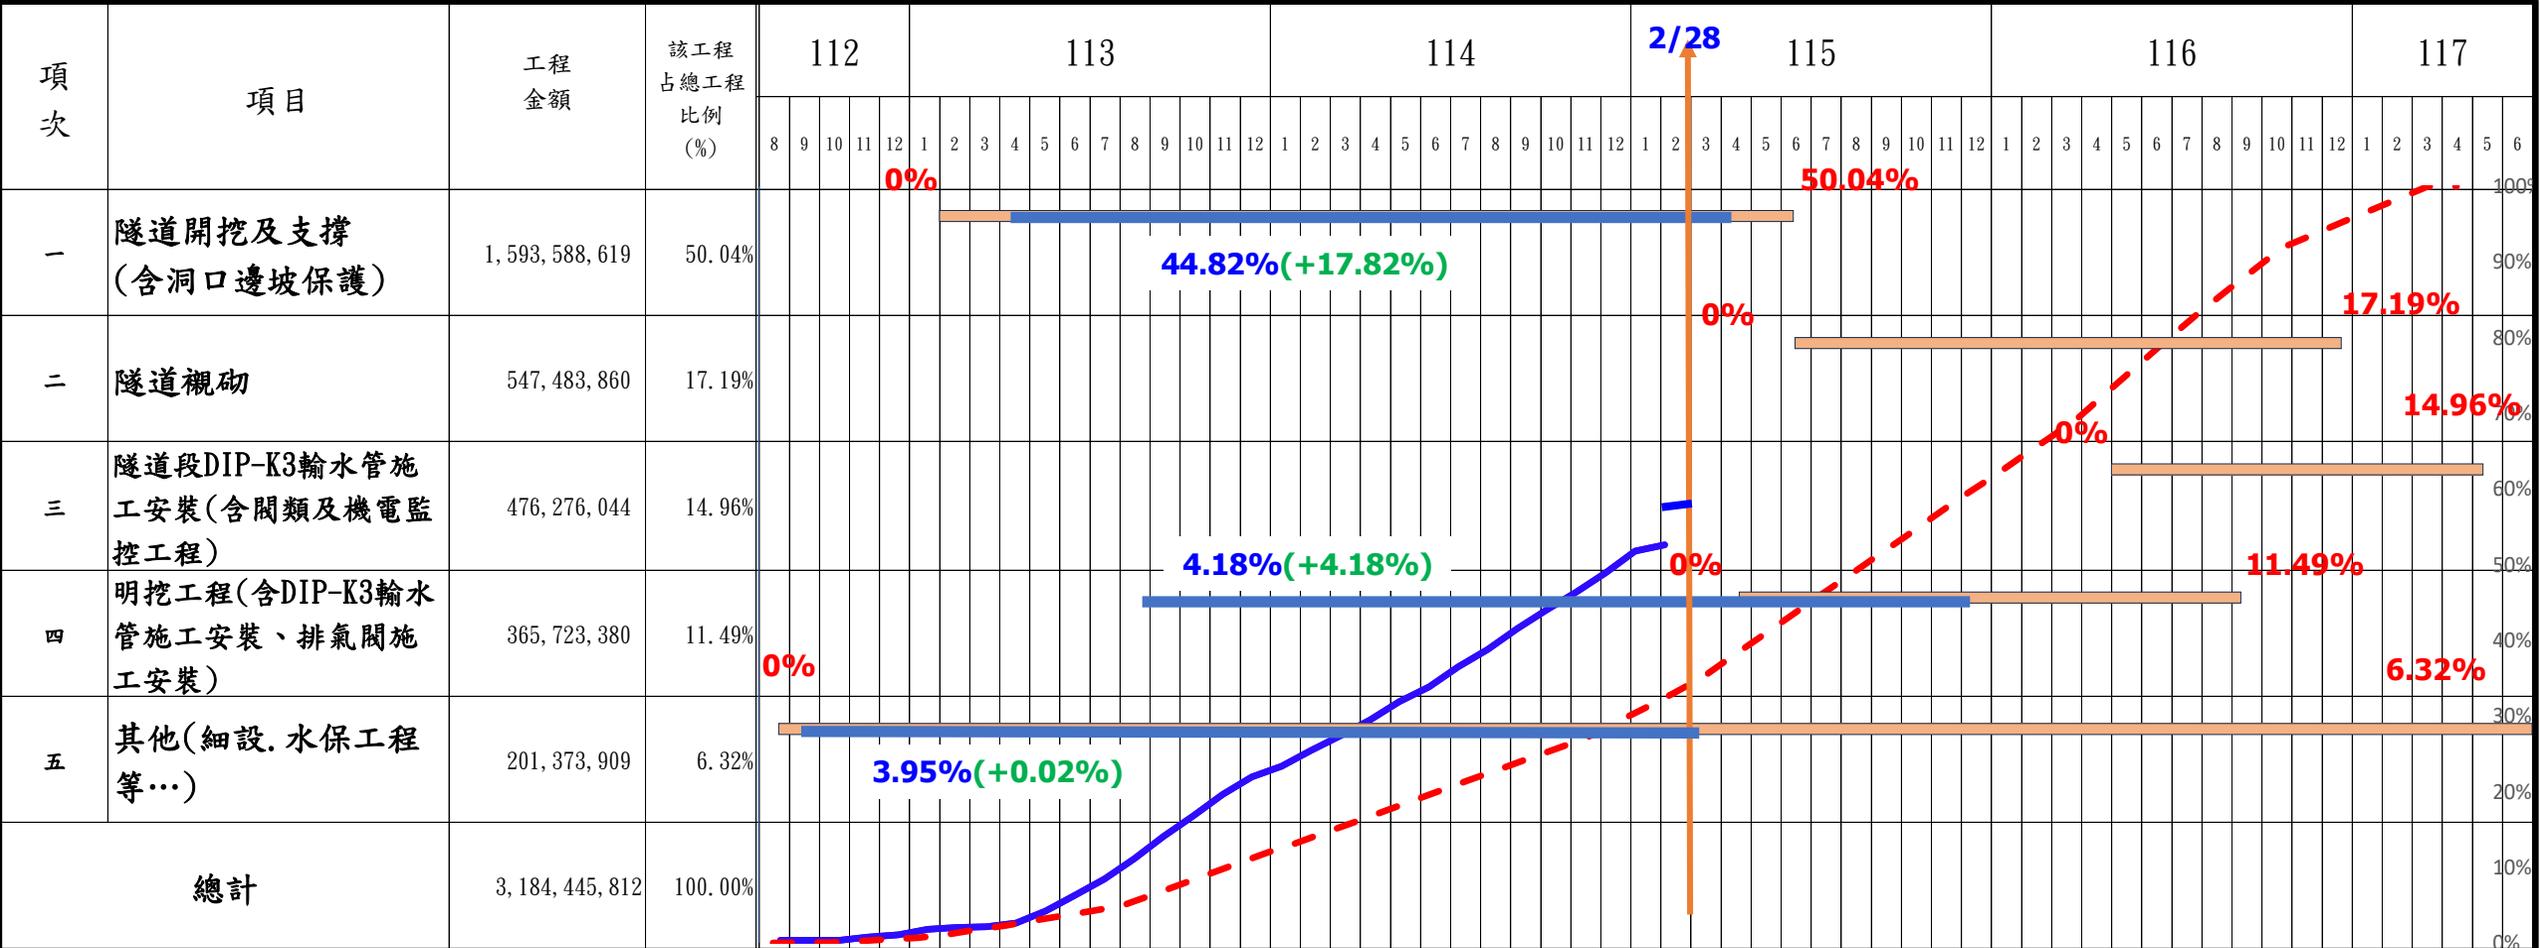

■ 截至115年2月28日：預定進度：30.93%、實際進度：52.95%、+22.02%



隧道銜接段工程標

工程布置


(統計至115/2/28)



隧道銜接段工程標

工程執行現況-進口端

石門水庫至新竹聯通管隧道銜接段工程
隧道三向度收斂變位歷時曲線圖

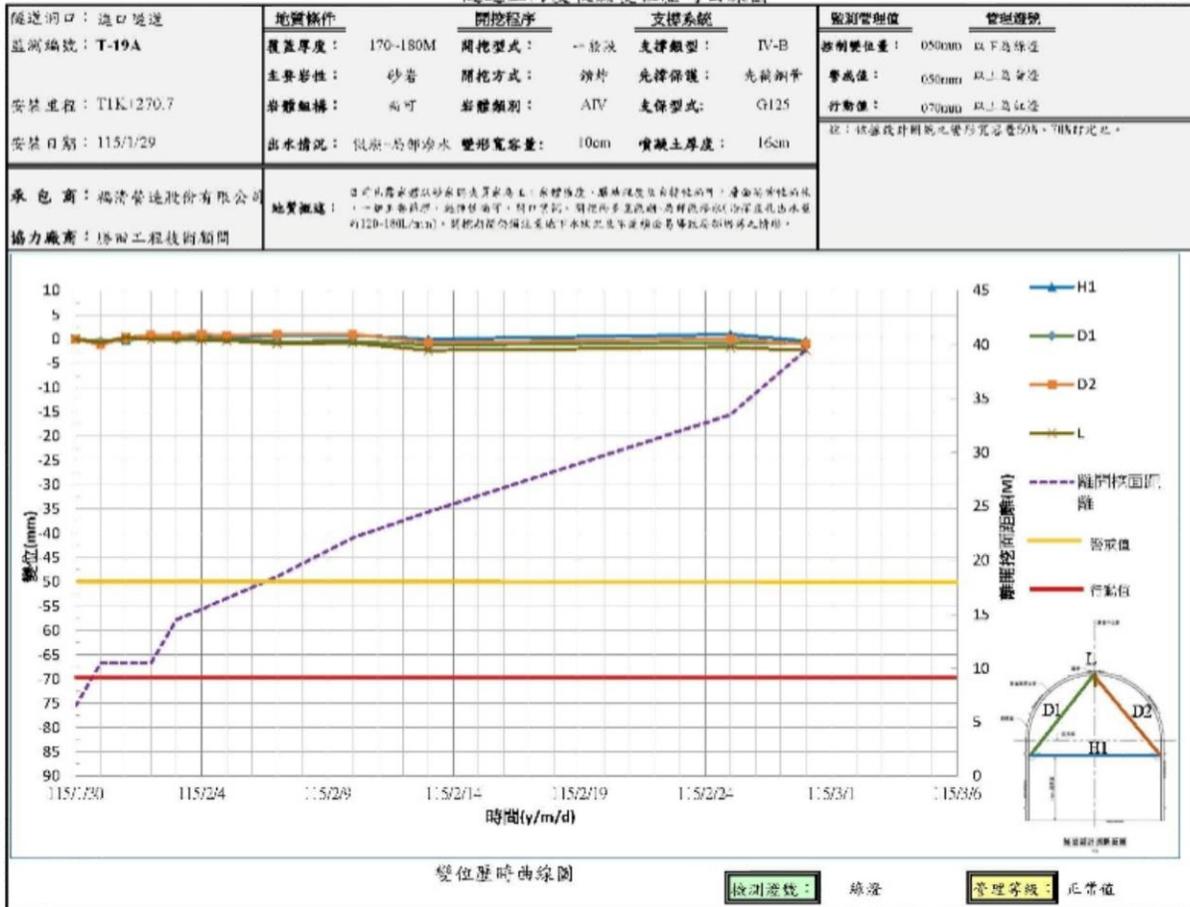

進口擴挖段：進口端隧道NT-1009~1021擴挖段施工照片



進口一般段：進口端隧道噴漿作業

進口一般段：進口計測資料



隧道銜接段工程標

工程執行現況-明挖段

第一工區-主線段



星期五

明挖段:
鋼軌樁引孔打設



明挖段:
警示帶鋪設



明: 2026-02-11

Powered by NoteCam

明挖段:
瀝青混凝土修復



明挖段:
CLSM澆置
