


貳、工程標案辦理情形

道路埋設段工程標

工程進度

項目	明挖工程	推進工程	水管橋工程	閘類工程	機電及監控設備工程	其他
占總工程比例(%)	53.77%	12.44%	5.70%	1.98%	0.53%	25.58%
預計進度(%)	27.82%	3.24%	1.19%	1.00%		13.21%
實際進度(%)	28.66%	4.52%	0.18%	0.20%	0.00%	14.56%

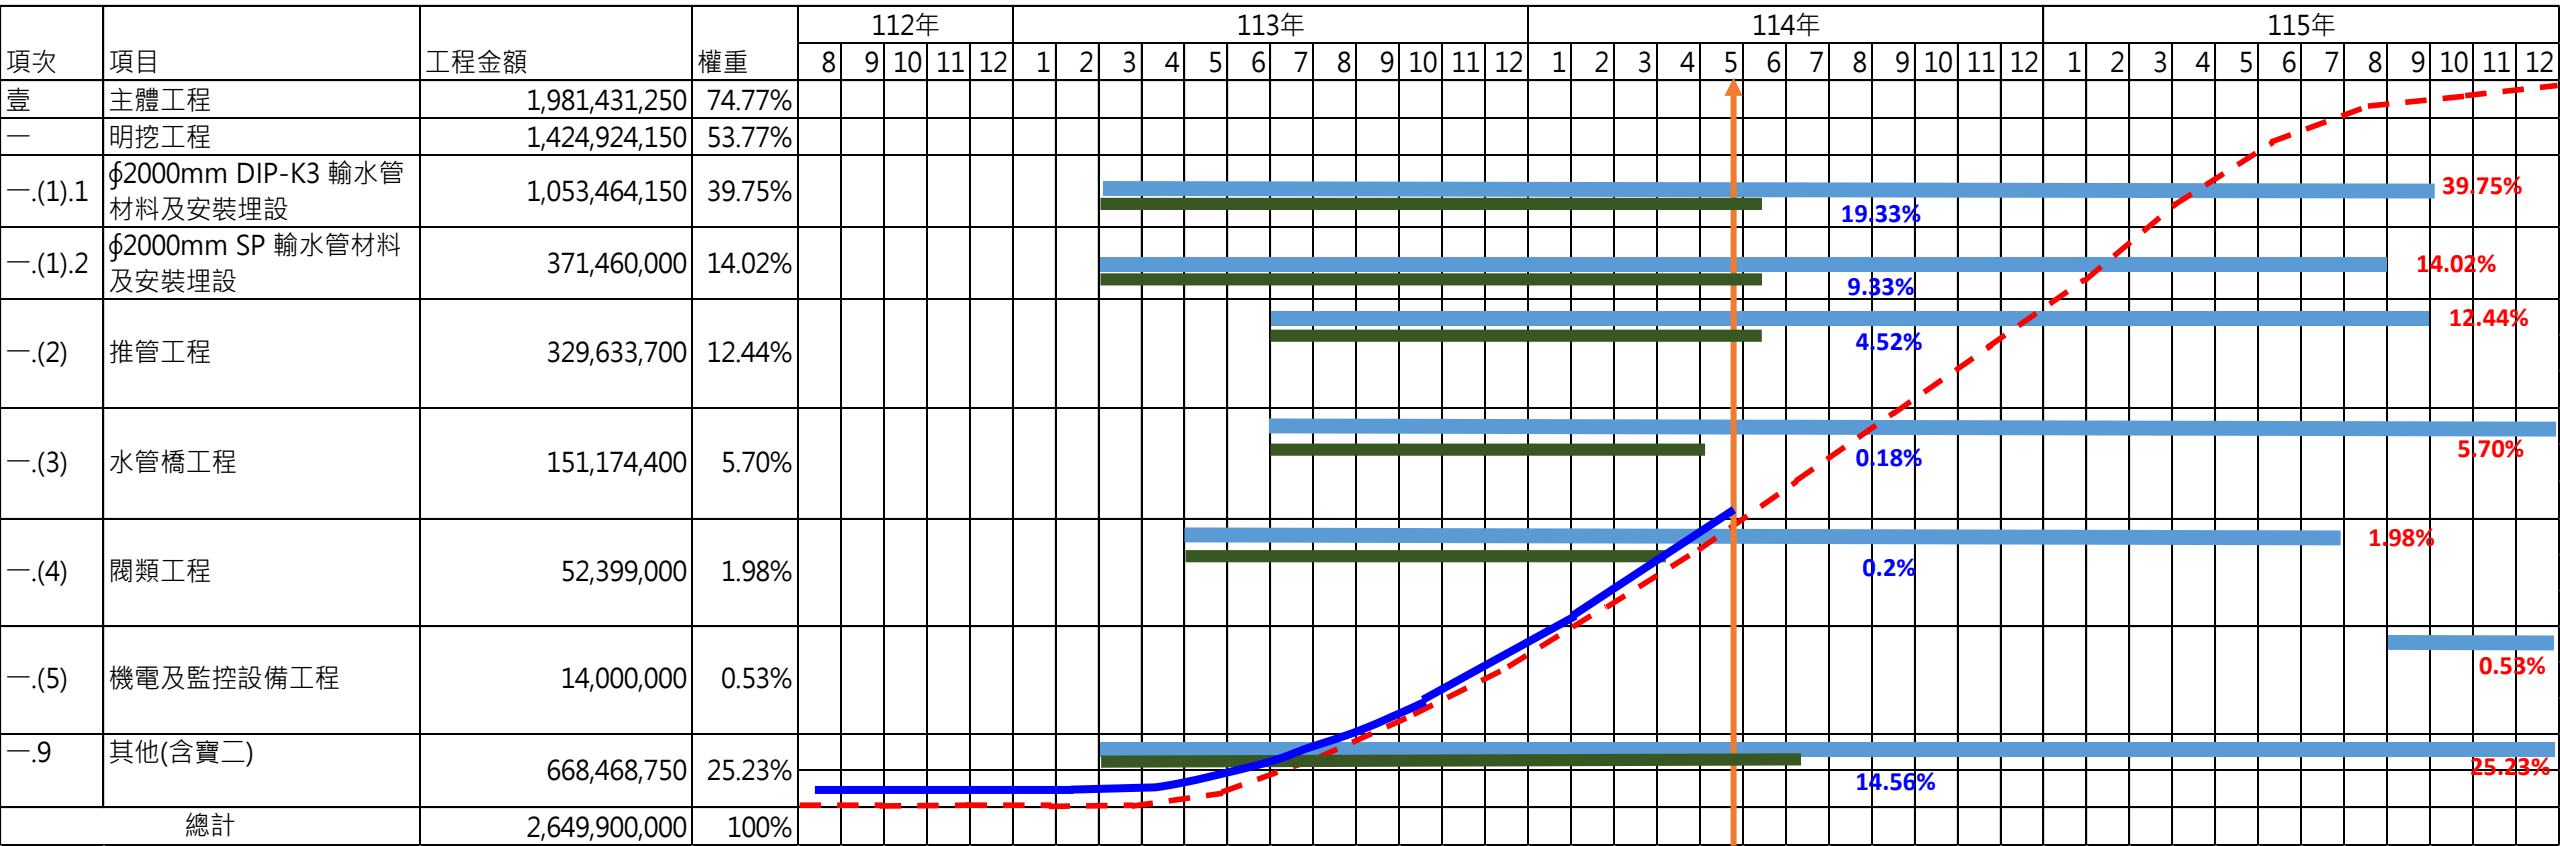

截至114年5月31日： 預定進度： 47.90% 實際進度： 48.12% +0.22%



道路埋設段工程標

工程執行現況



第一工區開挖埋管



第一工區焊接作業



道路埋設段工程標

工程執行現況



第三工區道路切割



第三工區道路切割



道路埋設段工程標

工程執行現況



第四工區氣動錘鑽掘



第四工區管溝回填




道路埋設段工程標

工程執行現況



W02→W03推進作業

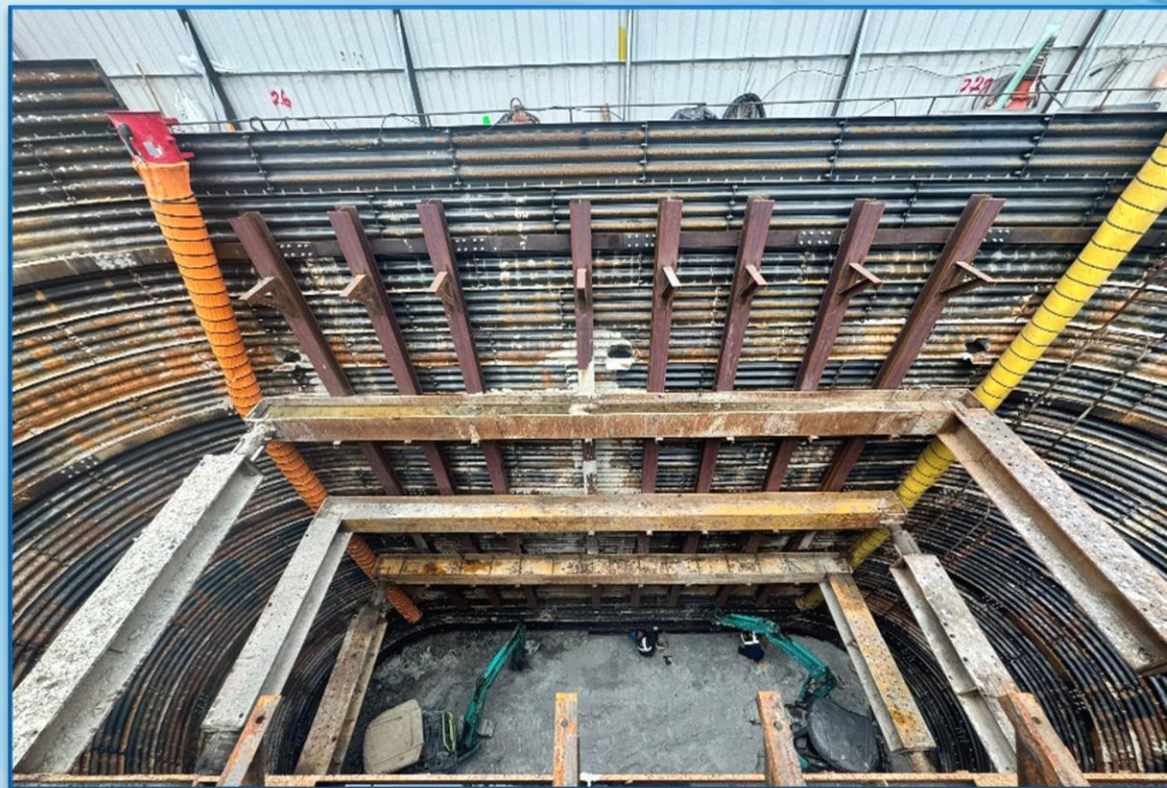

W01工作井機頭出坑作業



道路埋設段工程標

工程執行現況



關西二號橋A1橋台整地



關西二號橋施工順序
