


# 隧道銜接段工程標

## 工程進度

開工日期112年8月25日、預計117年6月23日完工

| 項目        | 隧道開挖及支撐<br>(含洞口邊坡保護) | 隧道襯砌   | 隧道DIP-K3輸水管<br>施工安裝 | 明挖工程  | 閘類工程  | 其他     |
|-----------|----------------------|--------|---------------------|-------|-------|--------|
| 占總工程比例(%) | 47.73%               | 13.98% | 10.35%              | 8.20% | 1.75% | 17.99% |
| 預計進度(%)   | 11.91%               | 0.00%  | 0.00%               | 0.00% | 0.00% | 2.43%  |
| 實際進度(%)   | 28.26%               | 0.00%  | 0.00%               | 1.21% | 0.00% | 2.44%  |

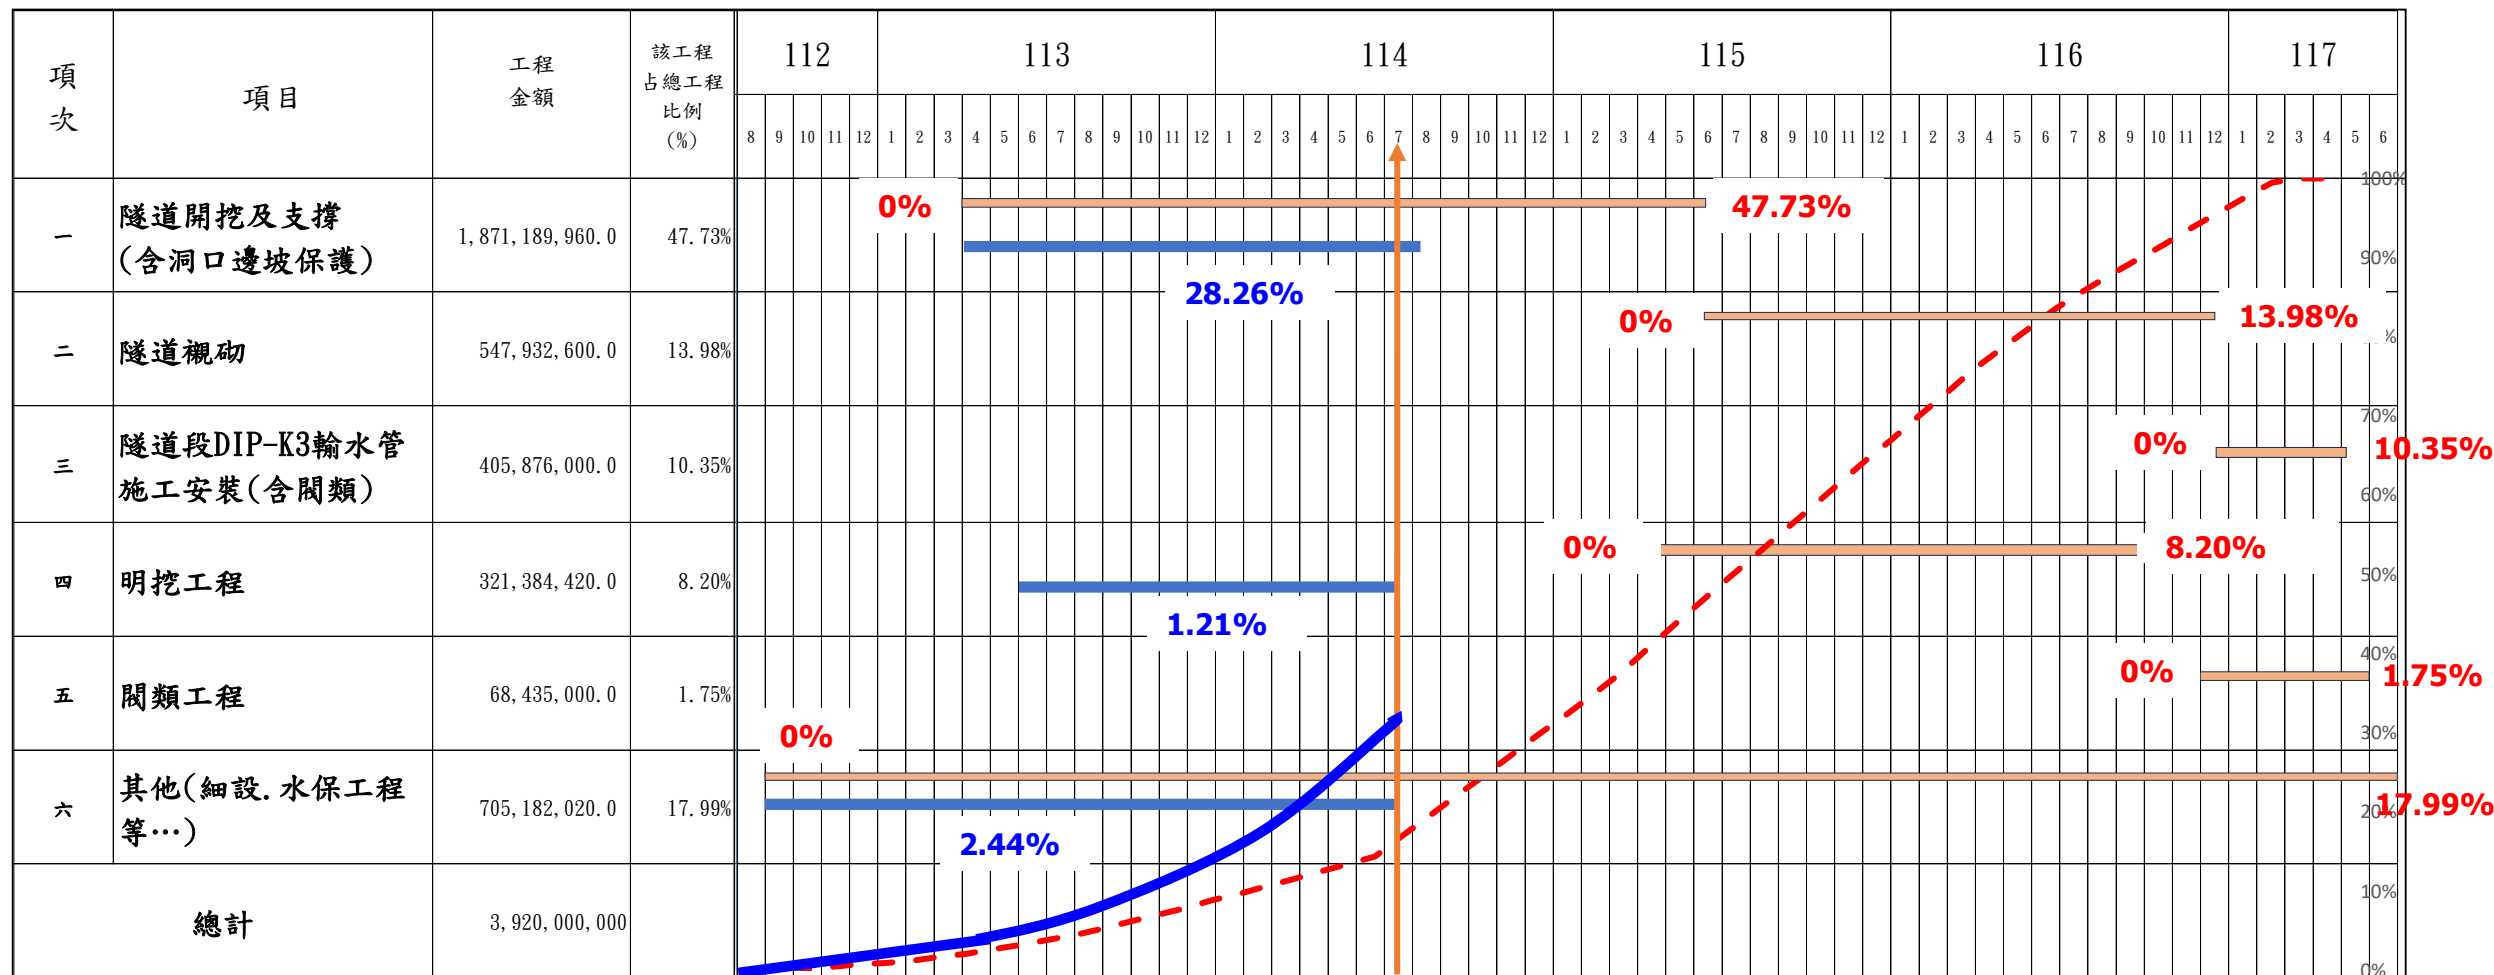


截至114年07月15日：預定進度：14.34%、實際進度：31.91%、+17.57%




## 隧道銜接段工程標

## 工程執行現況-進口端

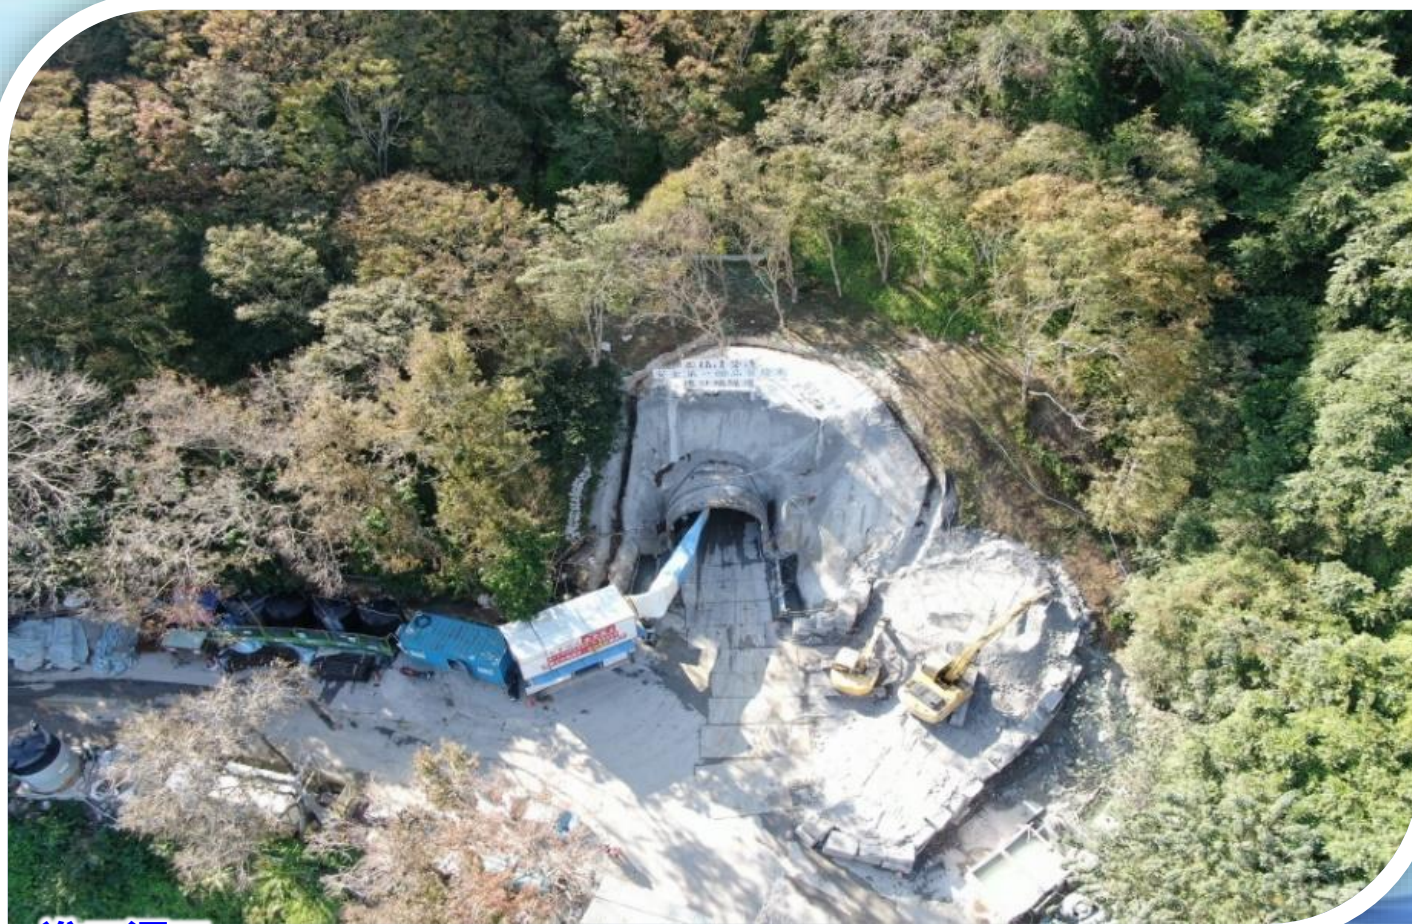

進口洞口：  
進口空拍照。

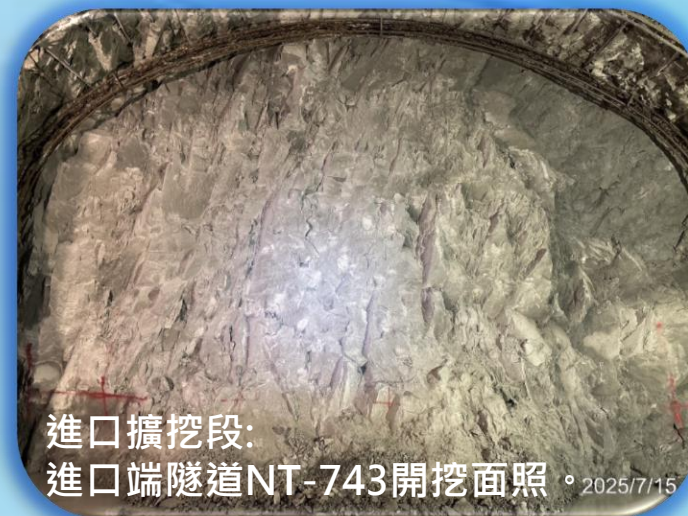

進口擴挖段：  
進口端隧道NT-743開挖面照。2025/7/15



進口擴挖段：  
進口端隧道噴漿作業

2025年7月15日



## 隧道銜接段工程標

## 工程執行現況-出口端



**出口一般段:**  
出口端隧道ST-763開挖面照。



**出口一般段:**  
出口端隧道裝設炸藥結線作業




**出口一般段:**  
出口端隧道開炸後開挖面。



## 隧道銜接段工程標

## 工程執行現況-明挖段

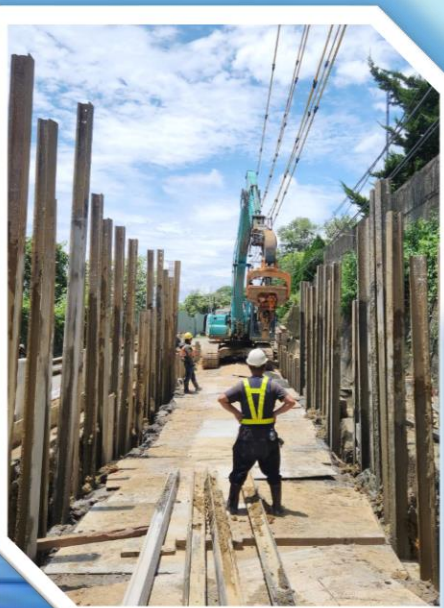

**明挖段:**  
鋼軌樁拔除。



**明挖段:**  
CLSM澆置。



**明挖段:**  
開挖路面AC剔除。



**明挖段:**  
鋼軌樁引孔鑽設。
