

經濟部水利署南區水資源局

曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

半月進度報告

( 111 年 05 月 16 日至 111 年 05 月 31 日 )

主辦機關：經濟部水利署南區水資源局

執行機關：經濟部水利署南區水資源局

監造單位：經濟部水利署南區水資源局曾管中心

曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程工務所

統包商：中華工程股份有限公司

設計分包廠商：巨廷工程顧問股份有限公司

備查日期：111 年 06 月 06 日

備查文號：水南曾字第 11153039840 號

中 華 民 國 1 1 1 年 0 6 月

檔 號：

保存年限：

# 經濟部水利署南區水資源局 函

地址：臺南市楠西區密枝里70號

聯絡人：林恩如

連絡電話：06-5753251#7072

電子信箱：gimi2303742@wrasb.gov.tw

傳 真：06-5753251

受文者：中華工程股份有限公司

發文日期：中華民國111年6月6日

發文字號：水南曾字第11153039840號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴公司所送本局「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」  
111年05月16日至111年05月31日半月進度報告，備查，復  
請查照。

說明：復貴公司111年6月2日中工工務字第1110602001號函。

正本：中華工程股份有限公司

副本：本局曾管中心

電 2022/06/06 文  
交 16:30:07 章

土木工務處 111/06/06



1110606045

# 目 錄

<b>1. 計畫彙總摘要</b> -----	<b>1</b>
1.1 工程概述-----	1
1.2 本期重要記事-----	2
1.3 本期施工概要說明-----	5
1.4 下期主要施工項目-----	8
1.5 遭遇困難及請求協助事項-----	9
<b>2. 計畫進度分析及工作現況報告</b> -----	<b>10</b>
2.1 計畫時程網狀圖-----	10
2.2 計畫時程桿狀圖-----	10
2.3 進度表與S進度曲線-----	10
2.4 工程現況說明-----	10
2.5 要徑分析-----	10
2.6 里程碑追蹤-----	11
2.7 各項申辦作業狀況-----	11
2.8 前後一個月作業項目時程表-----	11
2.9 差異分析、修正措施與建議-----	11
<b>3. 工作數量報告</b> -----	<b>12</b>
3.1 工作數量累計完成表-----	12
3.2 本期施工作業工班統計-----	12
<b>4. 圖說/文件送審管制表</b> -----	<b>13</b>
4.1 圖說送審管制總表-----	13
4.2 文件送審管制總表-----	14
<b>5. 本期施工照片</b> -----	<b>16</b>

# 1. 計畫彙總摘要

## 1.1 工程概述

台灣南部區域降雨豐枯達9：1，枯水季長(10月至隔年5月)，近年極端氣候旱澇兩極及用水成長等情境下，既有供水設施及調度系統已無法滿足跨區調度支援需求，相較台灣其他區域，南部區域整體缺水風險較高，而完備彈性的水源調度與管理機制，為降低缺水風險必要方法之一。

經濟部水利署南區水資源局(以下簡稱南水局)依據99年05月12日奉總統令公布實施之「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部供水特別條例」陸續進行曾文水庫防淤隧道等排砂設施及更新改善工作，達初步應急效果。為增加庫容以維持南部地區供水穩定，南水局歷年來已持續進行水庫更新改善及清淤工作，惟現因受限於水庫基礎設施不足，淤泥暫置區容量有限、供電限制需增加特高壓配電，以及抽泥船與抽泥管設施不足等，尚難達成恢復庫容的目標，爰辦理「**曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程**」(以下簡稱本計畫)。

本計畫奉行政院110年03月03日院臺經字第1100004878號函核定，計畫期程自111年起至114年底止。本計畫考量增設相關基礎設施，進而擴大庫區清淤範圍，每年可增加約306萬m<sup>3</sup>的清淤量，藉由放水渠道及擴大抽泥工程實施完成，不僅可增加淤泥暫置區容量且能減少滲漏損失，亦可增加水資源的利用效率，以提升供水穩定，更進一步以淤積零成長為目標，逐年恢復庫容。

本計畫工作項目包括放水渠道工程、特高壓配電工程、壩前碼頭改善工程、擴大抽泥管工程、其他配合工程等諸項，皆由南水局主辦。復經南水局檢討採統包方式有助於提升採購效率、品質、及早發揮本計畫效益，爰依政府採購法第24條第1項規定，以統包方式辦理本工程。

## 1.2 本期重要記事

### 1. 111 年 05 月 16 日

- (1) 函文檢陳施工階段風險評估報告乙式6份。[111.05.16 中工工務字第1110516005號函]
- (2) 函文檢陳剩餘土石方處理計畫(第一版/第1次)乙式6份。[111.05.16 中工工務字第1110516001號函]
- (3) 函文檢陳交通維持計畫乙式6份。[111.05.16 中工工務字第1110516002號函]
- (4) 函文檢陳墜落災害防止計畫乙式6份。[111.05.16 中工工務字第1110516003號函]
- (5) 函文檢陳防汛及緊急應變計畫乙式6份。[111.05.16 中工工務字第1110516004號函]
- (6) 函文檢陳「擴大抽泥工程- $\phi$  315mm HDPE抽泥管固定工程」細部設計單元(第一版/第2次)乙式10份。[111.05.16 中工工務字第1110516006號函]
- (7) 業主函文同意辦理職業安全衛生人員案。[111.05.16 水南曾字第11130025790號函]

### 2. 111 年 05 月 17 日

- (1) 50mm抽泥管與雙向備援交會處位置放樣。
- (2) 函文檢陳職業安全衛生管理計畫(第一版/第2次)乙式6份。[111.05.17 中工工務字第1110517047號函]
- (3) 業主函文同意辦理人員組織架構及學經歷資料。[111.05.17 水南曾字第11130023380號函]

### 3. 111 年 05 月 18 日

- (1) 函文檢陳鋼筋廠商(協勝發鋼鐵廠股份有限公司)材料送審乙式6份。[111.05.18 中工工務字第1110518004號函]
- (2) 函文檢陳混凝土廠商(玉楠混凝土企業股份有限公司)材料送審乙式6份。[111.05.18 中工工務字第1110518024號函]
- (3) 業主函文同意辦理(大安科技檢驗有限公司)送審資料。[111.05.18 水南曾字第11130026500號函]
- (4) 業主函文同意辦理(明妍科技股份有限公司)送審資料。[111.05.18 水南曾字第11130026610號函]
- (5) 業主函文同意辦理(台灣檢驗科技股份有限公司)送審資料。[111.05.18 水南曾字第11130026650號函]
- (6) 業主函文同意備查施工日誌(111年04月份)。[111.05.18 水南曾字第11130026190號函]

### 4. 111 年 05 月 19 日

- (1) 函文檢陳整體品質計畫(第一版/第2次)乙式6份。[111.05.19 中工工務字第1110519040號函]
- (2) 函文檢陳整體施工計畫(第一版/第2次)乙式10份。[111.05.19 中工工務字第1110519041號函]

## 5. 111 年 05 月 20 日

- (1) 函文檢陳放水渠道工程分項施工計畫(第一版/第1次)乙式6份。[111.05.20 中工工務字第1110518009號函]
- (2) 函文檢陳 $\phi$ 315mm HDPE管工程分項計畫(第一版/第1次)乙式6份。[111.05.20 中工工務字第1110520024號函]
- (3) 函文檢陳本案半月進度報告(111年05月01日至111年05月15日)乙式5份。[111.05.20 中工工務字第1110520033號函]
- (4) 業主函文檢退補充地形測量計畫書，請於發文次日起7日內依據審查意見辦理修正。[111.05.20 水南曾字第11130027290號函]

## 6. 111 年 05 月 24 日

- (1) 函文檢送營建工程空氣汙染防制費已繳費收據正本乙式三份。[111.05.24 中工工務字第1110524030號函]
- (2) 業主函文檢退混凝土廠商(玉楠混凝土企業股份有限公司)送審資料審查意見，請於發文次日起5日內依據審查意見辦理修正。[111.05.24 水南曾字第11153036080號函]
- (3) 業主函文檢送111年06月01日第3次工作會議之開會通知單。[111.05.24 水南曾字第11130027570號 開會通知單]
- (4) 業主函文同意備查統包商提送之111年05月01日至111年05月15日半月進度報告。[111.05.24 水南曾字第11153036690號函]

## 7. 111 年 05 月 26 日

- (1) 業主函文檢退擴大抽泥管工程管徑300mm細部設計成果審查意見，請於發文次日起5日內依據審查意見辦理修正。[111.05.26 水南曾字第11153037150號函]
- (2) 業主函文檢退攝(錄)影計畫(第一版/第1次)設計審查單位及監造單位審查意見各1份，請於發文次日起5日內依據審查意見辦理修正。[111.05.26 水南曾字第11153037140號函]
- (3) 業主函文檢退剩餘土石方處理計畫(第一版/第1次)設計審查單位及監造單位審查意見各1份，請於發文次日起5日內依據審查意見辦理修正。[111.05.26 水南曾字第11153037160號函]
- (4) 業主函文檢送111年06月02日施工規劃階段風險評估報告審查會議之開會通知單。[111.05.26 水南曾字第11130028000號 開會通知單]
- (5) 業主函文檢送111年06月02日交通維持計畫審查會議之開會通知單。[111.05.26 水南曾字第11130027930號 開會通知單]
- (6) 函文檢陳補充地形測量計畫書(第一版/第2次)乙式10份。[111.05.26 中工工務字第1110526012號函]

## 8. 111 年 05 月 27 日

- (1) 函文檢送營造綜合保險單、第三責任意外險、雇主意外責任險批單及繳費收據等各正本一份、副本二份。[111.05.27 中工工務字第1110527008號函]
- (2) 函文檢陳混凝土廠商(玉楠混凝土企業股份有限公司)送審資料(第一版/第2次)乙式6份。[111.05.27 中工工務字第1110527001號函]
- (3) 函文檢陳工程告示牌施工圖及設置位置會勘申請。[111.05.27 中工工務字第1110527002號函]

## 9. 111 年 05 月 30 日

- (1) 放水渠道0K+150~0K+500中心位置計算。

## 10. 111 年 05 月 31 日

- (1) 放水渠道0K+150~0K+500中心位置計算。
- (2) 放水渠道0K+150~0K+500附近控制點設置。
- (3) 函文檢陳攝(錄)影計畫(第一版/第2次)乙式6份。[111.05.31 中工工務字第1110531008號函]
- (4) 函文檢陳剩餘土石方處理計畫(第一版/第2次)乙式6份。[111.05.31 中工工務字第1110531009號函]
- (5) 函文檢陳高密度聚乙烯(HDPE)管廠商(大發管材工業股份有限公司中港分公司)送審資料乙式3份。[111.05.31 中工工務字第1110531021號函]
- (6) 函文檢陳「擴大抽泥管工程- $\phi$ 300mm管線部分」細部設計單元(第一版/第3次),包含細部設計圖、設計計算書、經費概算書及施工技術規範各乙式10份。[111.05.31 中工工務字第1110531033號函]
- (7) 業主函文通知營建工程空氣汙染防制費512萬2,336元案,近期將撥入貴公司指定帳戶。[111.05.31 水南曾字第11130028190號函]

## 1.3 本期施工概要說明

### 1. 空氣污染防治費

- (1) 函文檢送營建工程空氣汙染防制費已繳費收據正本乙式三份。[111.05.24 中工工務字第1110524030號函]
- (2) 業主函文通知營建工程空氣汙染防制費512萬2,336元案，近期將撥入貴公司指定帳戶。[111.05.31 水南曾字第11130028190號函]

### 2. 資料編撰及送審

#### (1) 函送文件：

- A. 函文檢陳剩餘土石方處理計畫(第一版/第1次)乙式6份。[111.05.16 中工工務字第1110516001號函]
- B. 函文檢陳交通維持計畫乙式6份。[111.05.16 中工工務字第1110516002號函]
- C. 函文檢陳墜落災害防止計畫乙式6份。[111.05.16 中工工務字第1110516003號函]
- D. 函文檢陳防汛及緊急應變計畫乙式6份。[111.05.16 中工工務字第1110516004號函]
- E. 函文檢陳施工階段風險評估報告乙式6份。[111.05.16 中工工務字第1110516005號函]
- F. 函文檢陳職業安全衛生管理計畫(第一版/第2次)乙式6份。[111.05.17 中工工務字第1110517047號函]
- G. 函文檢陳鋼筋廠商(協勝發鋼鐵廠股份有限公司)材料送審乙式6份。[111.05.18 中工工務字第1110518004號函]
- H. 函文檢陳混凝土廠商(玉楠混凝土企業股份有限公司)材料送審乙式6份。[111.05.18 中工工務字第1110518024號函]
- I. 函文檢陳整體品質計畫(第一版/第2次)乙式6份。[111.05.19 中工工務字第1110519040號函]
- J. 函文檢陳整體施工計畫(第一版/第2次)乙式10份。[111.05.19 中工工務字第1110519041號函]
- K. 函文檢陳放水渠道工程分項施工計畫(第一版/第1次)乙式6份。[111.05.20 中工工務字第1110518009號函]
- L. 函文檢陳 $\phi$ 315mm HDPE管工程分項計畫(第一版/第1次)乙式6份。[111.05.20 中工工務字第1110520024號函]
- M. 函文檢陳本案半月進度報告(111年05月01日至111年05月15日)乙式5份。[111.05.20 中工工務字第1110520033號函]
- N. 函文檢陳混凝土廠商(玉楠混凝土企業股份有限公司)送審資料(第一版/第2次)乙式6份。[111.05.27 中工工務字第1110527001號函]



- O. 函文檢陳工程告示牌施工圖及設置位置會勘申請。[111.05.27 中工工務字第1110527002號函]
- P. 函文檢陳攝(錄)影計畫(第一版/第2次)乙式6份。[111.05.31 中工工務字第1110531008號函]
- Q. 函文檢陳剩餘土石方處理計畫(第一版/第2次)乙式6份。[111.05.31 中工工務字第1110531009號函]
- R. 函文檢陳高密度聚乙烯(HDPE)管廠商(大發管材工業股份有限公司中港分公司)送審資料乙式3份。[111.05.31 中工工務字第1110531021號函]

(2) 核定/備查文件：

- A. 業主函文同意辦理(大安科技檢驗有限公司)送審資料。[111.05.18 水南曾字第11130026500號函]
- B. 業主函文同意辦理(明妍科技股份有限公司)送審資料。[111.05.18 水南曾字第11130026610號函]
- C. 業主函文同意辦理(台灣檢驗科技股份有限公司)送審資料。[111.05.18 水南曾字第11130026650號函]
- D. 業主函文同意備查施工日誌(111年04月份)。[111.05.18 水南曾字第11130026190號函]
- E. 業主函文同意備查統包商提送之111年05月01日至111年05月15日半月進度報告。[111.05.24 水南曾字第11153036690號函]

(3) 審退文件：

- A. 業主函文檢退補充地形測量計畫書，請於發文次日起7日內依據審查意見辦理修正。[111.05.20 水南曾字第11130027290號函]
- B. 業主函文檢退混凝土廠商(玉楠混凝土企業股份有限公司)送審資料審查意見，請於發文次日起5日內依據審查意見辦理修正。[111.05.24 水南曾字第11153036080號函]
- C. 業主函文檢退攝(錄)影計畫(第一版/第1次)設計審查單位及監造單位審查意見各1份，請於發文次日起5日內依據審查意見辦理修正。[111.05.26 水南曾字第11153037140號函]
- D. 業主函文檢退剩餘土石方處理計畫(第一版/第1次)設計審查單位及監造單位審查意見各1份，請於發文次日起5日內依據審查意見辦理修正。[111.05.26 水南曾字第11153037160號函]

### 3. 品質管制作業

- (1) 於111年05月25日上午10時至南水局實驗室會驗現地填方固化處理試拌之試體28日抗壓強度試驗，圓柱試體9顆(配比：IC、IIC、IIIC，各3顆)。[監造人員：無，統包商：李佩玲，實驗室：南水局燕巢實驗室]

#### 4. 細部設計服務費

(1) 函送文件：

- A. 函文檢陳「擴大抽泥工程- $\phi$  315mm HDPE抽泥管固定工程」細部設計單元(第一版/第2次)乙式10份。[111.05.16 中工工務字第1110516006號函]
- B. 函文檢陳補充地形測量計畫書(第一版/第2次)乙式10份。[111.05.26 中工工務字第1110526012號函]
- C. 函文檢陳「擴大抽泥管工程- $\phi$  300mm管線部分」細部設計單元(第一版/第3次)，包含細部設計圖、設計計算書、經費概算書及施工技術規範各乙式10份。[111.05.31 中工工務字第1110531033號函]

(2) 核定/備查文件：**(本期無)**

(3) 審退文件：

- A. 業主函文檢退擴大抽泥管工程管徑300mm細部設計成果審查意見，請於發文次日起5日內依據審查意見辦理修正。[111.05.26 水南曾字第11153037150號函]

#### 5. 工程會議/會勘、工程督導/查核

- (1) 業主函文檢送111年06月01日第3次工作會議之開會通知單。[111.05.24 水南曾字第11130027570號 開會通知單]
- (2) 業主函文檢送111年06月02日施工規劃階段風險評估報告審查會議之開會通知單。[111.05.26 水南曾字第11130028000號 開會通知單]
- (3) 業主函文檢送111年06月02日交通維持計畫審查會議之開會通知單。[111.05.26 水南曾字第11130027930號 開會通知單]

#### 6. 重要紀事

- (1) 業主函文同意辦理職業安全衛生人員案。[111.05.16 水南曾字第11130025790號函]
- (2) 業主函文同意辦理人員組織架構及學經歷資料。[111.05.17 水南曾字第11130023380號函]
- (3) 函文檢送營造綜合保險單、第三責任意外險、雇主意外責任險批單及繳費收據等各正本一份、副本二份。[111.05.27 中工工務字第1110527008號函]

## 1.4 下期主要施工項目

### 1. 資料編撰及送審

- (1) 各類分項計畫書撰寫。
- (2) 各類材料送審。

### 2. 品質管制作業

- (1) 混凝土試拌、廠驗。

### 3. 細部設計服務費

- (1) 第一階段細部設計修訂。
- (2) 後續階段辦理，需於111年12月15日前提送。

### 4. 預計施作項目

- (1) 測量作業
- (2) 導水箱涵(0k+270~2k+270)整地

## 1.5 遭遇困難及請求協助事項

1. 本期無

## 2. 計畫進度分析及工作現況報告

### 2.1 計畫時程網狀圖

詳於附件一。

### 2.2 計畫時程桿狀圖

詳於附件二。

### 2.3 進度表與S進度曲線

詳於附件三。

### 2.4 工程現況說明

#### 1. 設計作業現況

- (1) 函文檢陳「擴大抽泥工程- $\phi$  315mm HDPE抽泥管固定工程」細部設計單元(第一版/第2次)乙式10份。[111.05.16 中工工務字第1110516006號函]
- (2) 函文檢陳補充地形測量計畫書(第一版/第2次)乙式10份。[111.05.26 中工工務字第1110526012號函]
- (3) 函文檢陳「擴大抽泥管工程- $\phi$  300mm管線部分」細部設計單元(第一版/第3次)，包含細部設計圖、設計計算書、經費概算書及施工技術規範各乙式10份。[111.05.31 中工工務字第1110531033號函]

#### 2. 施工作業現況

- (1) 50mm抽泥管與雙向備援交會處位置放樣。
- (2) 放水渠道0K+150~0K+500中心位置計算。
- (3) 放水渠道0K+150~0K+500附近控制點設置。

### 2.5 要徑分析

- (1) 本期預定累計進度為 0.6600%，實際累計進度為 1.0367%，目前超前 0.3767%。
- (2) 本期各項工程進度情況詳於附件五。
- (3) 依據預定進度，現階段要徑為細部設計第一階段，下期要徑為導水箱涵(0k+270~2k+270)及既有庫區 $\phi$ 300抽泥管上等工程，詳參附件一。

## 2.6 里程碑追蹤

- (1) 抽泥管固定工程(壩前碼頭改善工程部分)：已於111年05月10日函文檢陳，尚在審查中。[111.05.10 中工工務字第1110510008號函]
- (2) 擴大抽泥管工程(0k+000~5k+100)：已於111年05月10日函文檢陳，尚在審查中。[111.05.10 中工工務字第1110510009號函]
- (3) 進水口固床工及導水箱涵(0k+000~2k+400，不含水工機械及截流溝)：已於111年05月10日函文檢陳，尚在審查中。[111.05.10 中工工務字第1110510010號函]

## 2.7 各項申辦作業狀況

- (1) 本案營建工地逕流廢水污染削減計畫書(第一版)已於111年05月06日函文檢陳經濟部南區水資源局，並於111年05月24日收到環保署事業及污水下水道系統廢(污)水管理系統回覆「管制編號：Q8203236，認可核定」，系統亦已顯示審查核准，故不影響111年06月01日進場施作，惟尚未收到核定之公文，持續追蹤中。[111.05.06 中工工務字第1110506044號函]

## 2.8 前後一個月作業項目時程表

詳於附件二。

## 2.9 差異分析、修正措施與建議

本期無。

### 3. 工作數量報告

#### 3.1 工作數量累積完成表

詳於附件四。

#### 3.2 本期施工作業工班統計

##### 1. 施工作業人員統計

工別	單位	前期累計人數	本期使用人數	累計使用人數	備註
施工總負責人	人	29	12	41	
專任工程人員	人	29	12	41	
工地主任	人	29	12	41	
品管人員	人	96	40	136	
職安人員	人	69	28	97	
工程師	人	123	52	175	
測量人員	人	-	3	3	

##### 2. 施工作業機具統計

本期無。

##### 3. 晴雨表

詳於附件五。

## 4. 圖說/文件送審管制表

### 4.1 圖說送審管制總表

未提送，本月屆期提送之文件。	未提送，下月預定提送之文件。
已提送，尚待審閱/核定之文件。	應提送未提送，已逾期預定提送日期。

項次	文件編號	文件名稱	預定提送 (送審)日期	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	附件	核定日期
					提送文號	回覆文號			提送文號	回覆文號			提送文號	回覆文號			核定文號
1	QF-01-01	導水箱涵(2K+400~4K+536)	111.06.30														
	QF-02	放水渠道工程															
2	QF-02-01	進水口、固床工	111.05.10	第一版 第1次	111.05.10 中工工務字第 1110510010號函												
3	QF-02-02	導水箱涵(0K+000~2K+400)	111.05.10	第一版 第1次	111.05.10 中工工務字第 1110510010號函												
4	QF-02-03	導水箱涵(2K+400~4K+536)	111.12.15														
5	QF-02-04	截流工設施	111.12.15														
	QF-03	擴大抽泥管工程															
6	QF-03-01	擴大抽泥管工程(φ300mm HDPE 抽泥管固定工程)	111.04.28	第一版 第1次	111.04.27 中工工務字第 1110427027號函	111.05.10 水南曾字第 11153031880號函	已修正	第一版 第2次	111.05.16 中工工務字第 1110516006號函	111.05.26 水南曾字第 11153037150號函	已修正	第一版 第3次	111.05.31 中工工務字第 1110531033號函				
7	QF-03-02	擴大抽泥管工程 (0K+000~5K+100)	111.05.10	第一版 第1次	111.05.10 中工工務字第 1110510009號函												
8	QF-03-03	擴大抽泥管工程 (5K+100~10K+750)	111.12.15														
9	QF-04-01	特高壓配電工程	111.12.15														
	QF-05	壩前碼頭改善工程															
10	QF-05-01	壩前碼頭改善	111.12.15														
11	QF-05-02	φ400、φ500 HDPE抽泥管固定工 程	111.05.10	第一版 第1次	111.05.10 中工工務字第 1110510008號函												
12	QF-06-01	水工機械工程	111.12.15														
13	QF-07-01	機電監控工程	111.12.15														
14	QF-08-01	職業安全衛生及環境保護	111.05.10														



## 4.2 文件送審管制總表

未提送，本月屆期提送之文件。
未提送，下月預定提送之文件。  
已提送，尚待審閱/核定之文件。
應提送未提送，已逾期預定提送日期。

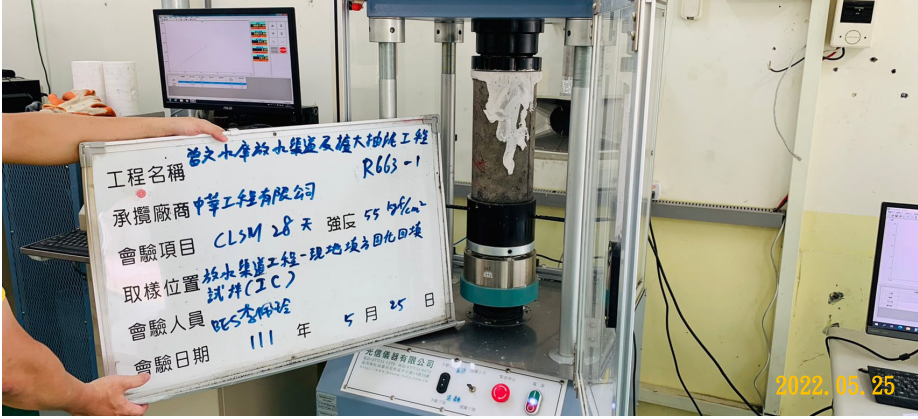
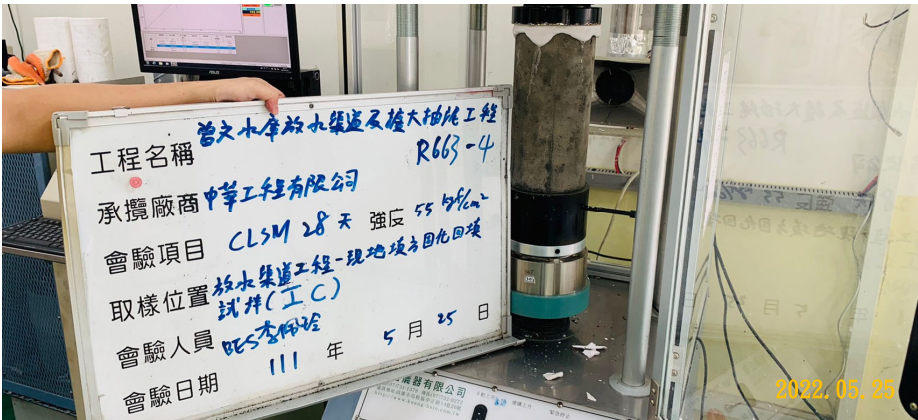
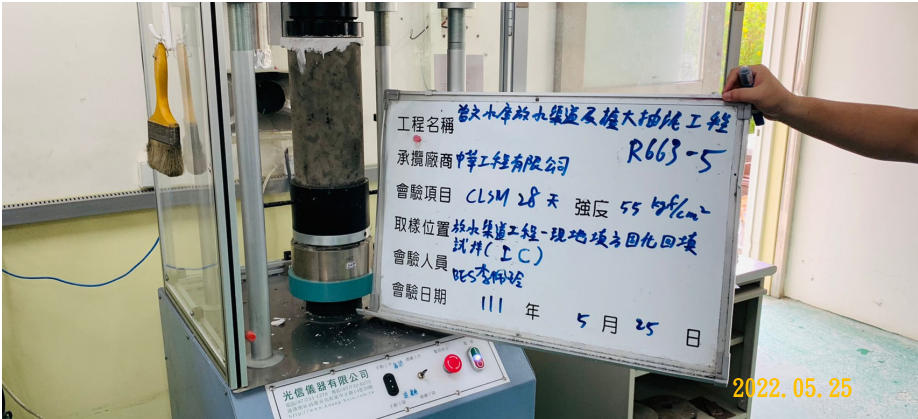
項次	文件編號	文件名稱	預定提送(送審)日期	版次	提送日期	回覆日期	回覆情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆情況	回覆情況	核定日期
					提送文號	回覆文號		提送文號	回覆文號	提送文號		回覆文號	核定文號				
1	QP-01-01	整體施工計畫	111.04.24	第一版第1次	111.04.22 中工工務字第1110422019號函	111.05.13 水南曾字第11130025480號函	已修正	第一版第2次	111.05.20 中工工務字第1110519041號函								
2	QP-02-01	整體品質計畫	111.04.24	第一版第1次	111.04.22 中工工務字第1110422014號函	111.05.13 水南曾字第11130025480號函	已修正	第一版第2次	111.05.20 中工工務字第1110519040號函								
3	QP-03-01	職業安全衛生管理計畫	111.04.24	第一版第1次	111.04.15 中工工務字第1110415063號函	111.05.10 水南曾字第11130024090號函	已修正	第一版第2次	111.05.17 中工工務字第1110517047號函								
4	QP-04-01	設計階段施工風險評估報告	111.06.30														
5	QP-05-01	設計工作執行計畫暨設計品管計畫書	111.03.30	第一版第1次	111.03.28 中工工務字第1110328042號函	111.04.15 水南曾字第11153025750號函	已修正	第一版第2次	111.04.22 中工工務字第1110422006號函	111.05.10 水南曾字第11153031880號函	已修正	第一版第3次	111.05.13 中工工務字第1110513047號函				
6	QP-06-01	實施簽證執行計畫	111.04.24	第一版第1次	111.04.07 中工工務字第111040724號函	111.04.12 水南曾字第111300188000號函	核定										111.04.12 水南曾字第111300188000號函
7	QP-07-01	營建工地逕流廢水汙染削減計畫	111.05.06	第一版第1次	111.05.06 中工工務字第1110506044號函												
8	QP-08-01	補充地形調查計畫書	111.04.24	第一版第1次	111.05.05 中工工務字第1110505038號函	111.05.20 水南曾字第11130027290號函	已修正	第一版第2次	111.05.26 中工工務字第1110526012號函								
9	QP-09-01	管線透地雷達調查計畫書	111.04.07	第一版第1次	111.04.07 中工工務字第111040726號函	111.04.22 水南曾字第11153027850號函	已修正	第一版第2次	111.04.28 中工工務字第1110428052號函	111.05.05 水南曾字第11130023220號函	核定						111.05.05 水南曾字第11130023220號函
10	QP-10-01	補充地質調查計畫書	111.04.07	第一版第1次	111.04.07 中工工務字第1110407025號函	111.04.13 水南曾字第11153025130號函	核定										111.04.13 水南曾字第11153025130號函
11	QP-11-01	防汛及緊急應變計畫	111.05.31	第一版第1次	111.05.16 中工工務字第1110516004號函												
12	QP-12-01	攝(錄)影計畫	111.05.31	第一版第1次	111.05.10 中工工務字第1110511024號函	111.05.26 水南曾字第11153037140號函	已修正	第一版第2次	111.05.31 中工工務字第1110531008號函								
13	QP-13-01	施工階段風險評估報告	111.05.31	第一版第1次	111.05.16 中工工務字第1110516005號函												
14	QP-14-01	剩餘土石方處理計畫	111.05.31	第一版第1次	111.05.16 中工工務字第1110516001號函	111.05.26 水南曾字第11153037160號函	已修正	第一版第2次	111.05.31 中工工務字第1110531009號函								
15	QP-15-01	墜落災害防止計畫	111.05.31	第一版第1次	111.05.16 中工工務字第1110516003號函												
16	QP-16-01	交通維持計畫	111.05.31	第一版第1次	111.05.16 中工工務字第1110516002號函												
17	QP-17-01	SP鋼管製作計畫	111.09.30														
18	QP-18-01	管線工程分項施工計畫	111.09.30														
19	QP-19-01	瀝青混凝土分項施工計畫	111.09.30														
20	QP-20-01	全套管基樁分項施工計畫	111.09.30														

未提送，本月屆期提送之文件。  
 已提送，尚待審閱/核定之文件。  
 未提送，下月預定提送之文件。  
 應提送未提送，已逾期預定提送日期。

項次	文件編號	文件名稱	預定提送 (送審)日期	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	版次	提送日期	回覆日期	回覆 情況	回覆 情況	核定日期
					提送文號	回覆文號			提送文號	回覆文號			提送文號	回覆文號			核定文號
21	QP-21-01	鋼筋工程分項施工計畫	111.09.15														
22	QP-22-01	模板工程分項施工計畫	111.09.15														
23	QP-23-01	混凝土澆置工程分項施工計畫	111.06.30														
24	QP-24-01	噴凝土工程分項施工計畫	111.06.30														
25	QP-25-01	放水渠道工程分項施工計畫 (含現地填方固化處理工程分項計畫)	111.09.30	第一版 第1次	111.05.20 中工工務字第 1110518009號函												
26	QP-26-01	放水渠道工程-現地填方固化處理 試拌計畫	111.04.04	第一版 第1次	111.03.28 中工工務字第 1110328021號函	111.04.12 水南曾字第 11153025120號函	核定										111.04.12 水南曾字第 11153025120號函
27	QP-27-01	閘門工程分項施工計畫	111.09.30														
28	QP-28-01	截流溝工程分項施工計畫	111.09.15														
29	QP-29-01	抽泥管工程分項施工計畫	111.09.15														
30	QP-30-01	φ300mm HDPE管工程分項施工 計畫	111.06.30	第一版 第1次	111.05.20 中工工務字第 1110520024號函												
31	QP-31-01	特高壓工程分項施工計畫	112.11.30														
32	QP-32-01	壩前碼頭改善工程分項施工計畫	111.09.30														
33	QP-33-01	地下管線保護與復舊工程分項施 工計畫	111.09.15														
34	QP-34-01	管路試壓分項施工計畫	111.09.15														
35	QP-35-01	鋼製可撓管製作計畫	111.09.15														
36	QP-36-01	閘類製作計畫	111.09.15														
37	QP-37-01	水工機械安裝分項施工計畫	112.04.20														
38	QP-38-01	水土保持計畫書	112.01.15														

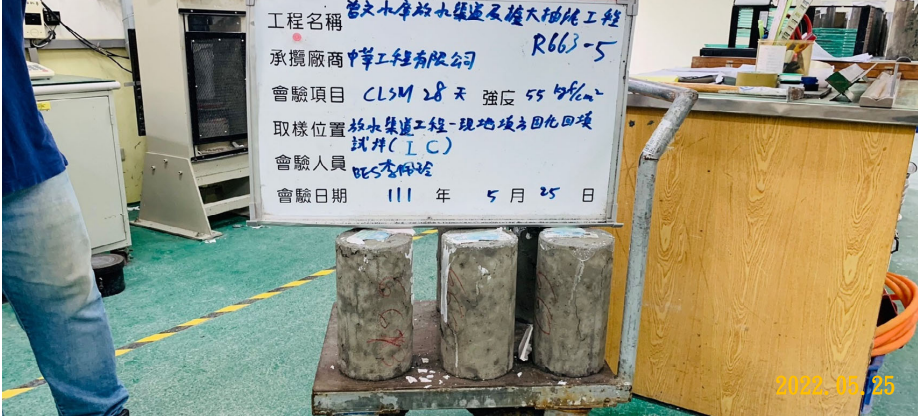
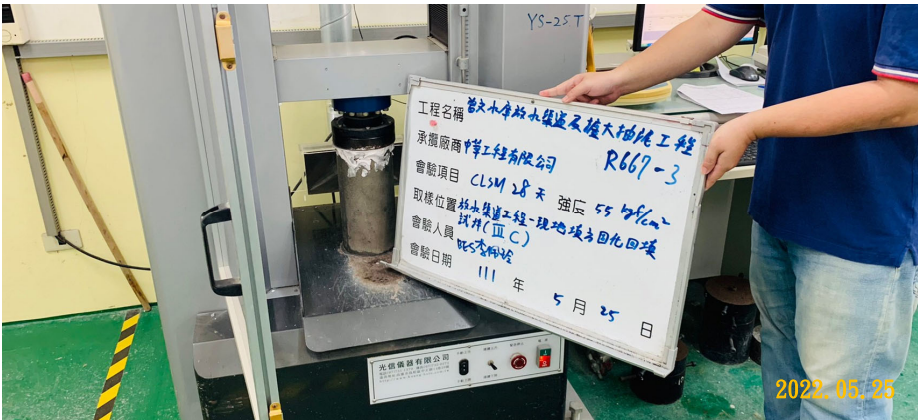
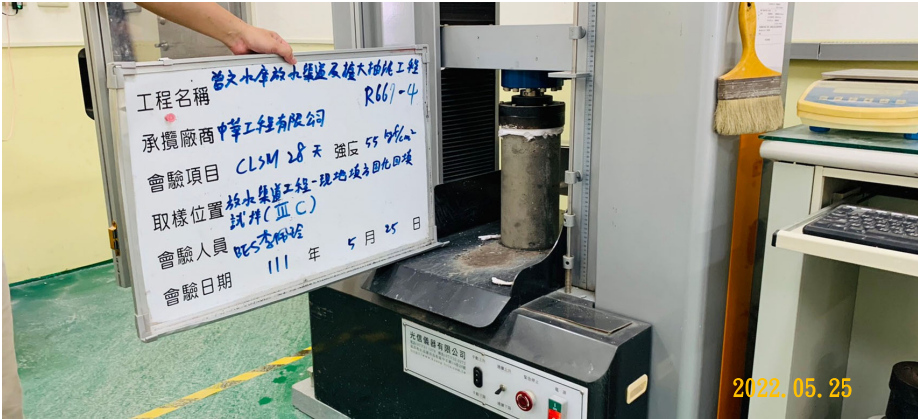
## 5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

項 目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日 期	2022.05.25
		編 號	1
		地 點	
		南水局實驗室	
說明：圓柱試體第1顆，共3顆（ 配比：IC ）			
項 目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日 期	2022.05.25
		編 號	2
		地 點	
		南水局實驗室	
說明：圓柱試體第2顆，共3顆（ 配比：IC ）			
項 目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日 期	2022.05.25
		編 號	3
		地 點	
		南水局實驗室	
說明：圓柱試體第3顆，共3顆（ 配比：IC ）			

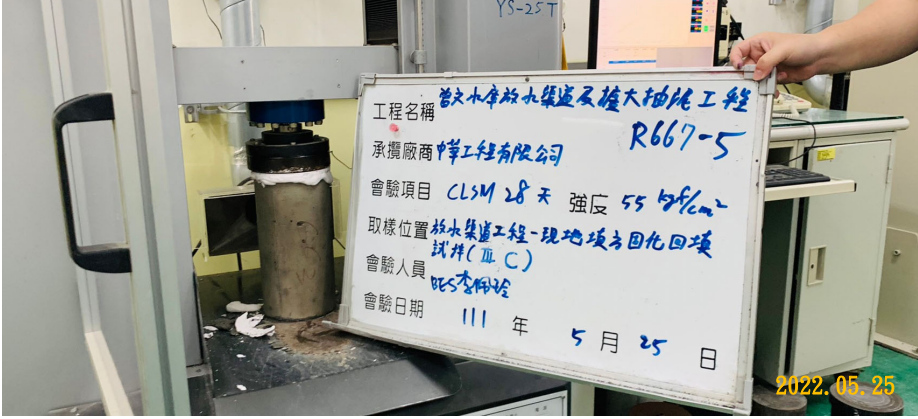
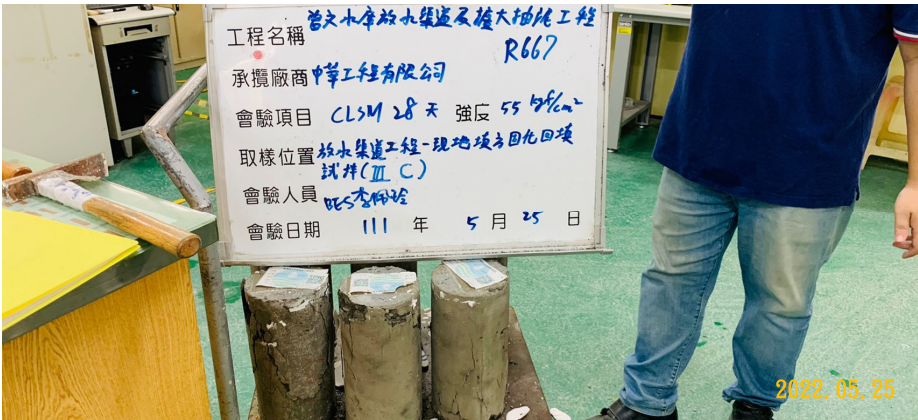
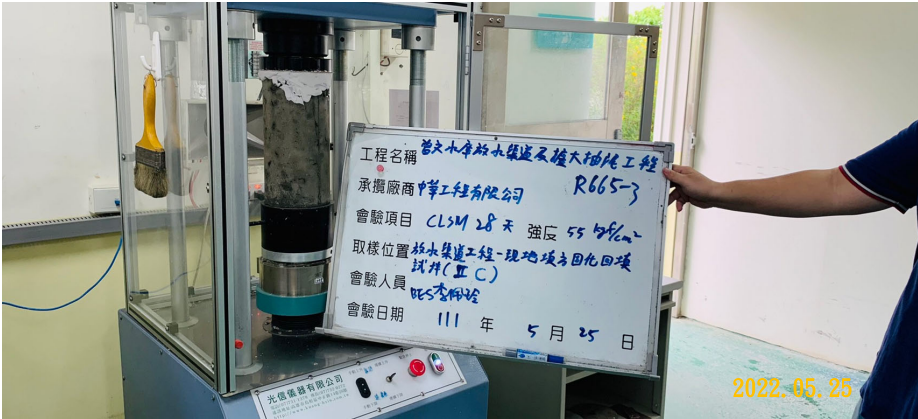
## 5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

項 目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日 期	2022.05.25
		編 號	4
		地 點	南水局實驗室
說明：圓柱試體抗壓結果（ 配比：IC ）			
項 目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日 期	2022.05.25
		編 號	5
		地 點	南水局實驗室
說明：圓柱試體第1類，共3類（ 配比：IIC ）			
項 目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日 期	2022.05.25
		編 號	6
		地 點	南水局實驗室
說明：圓柱試體第2類，共3類（ 配比：IIC ）			

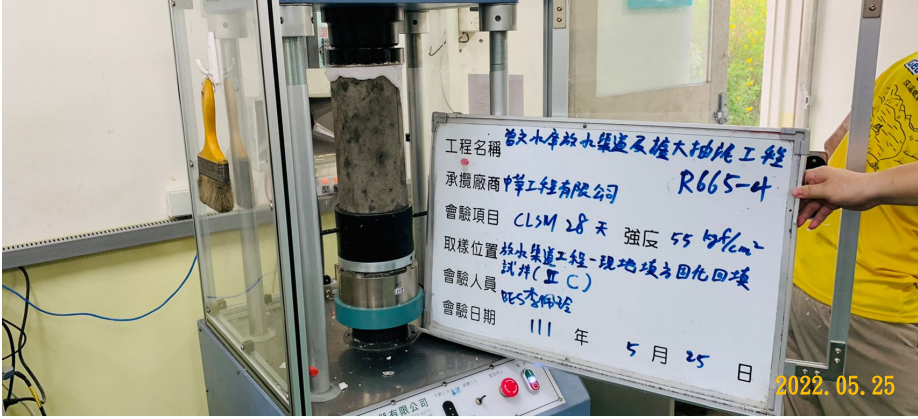
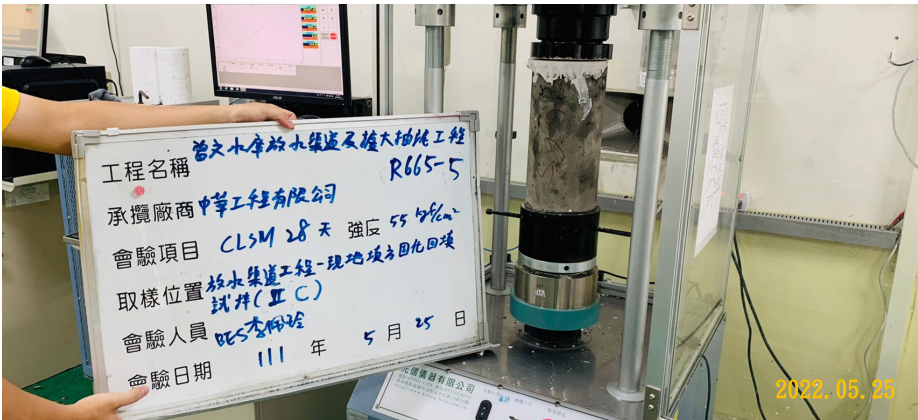

## 5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

項目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日期	2022.05.25
		編號	7
		地點	南水局實驗室
說明：圓柱試體第3顆，共3顆（配比：IIC）			
項目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日期	2022.05.25
		編號	8
		地點	南水局實驗室
說明：圓柱試體抗壓結果（配比：IIC）			
項目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日期	2022.05.25
		編號	9
		地點	南水局實驗室
說明：圓柱試體第1顆，共3顆（配比：IIC）			

## 5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

項目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日期	2022.05.25
		編號	10
		地點	
說明：圓柱試體第2顆，共3顆（ 配比：IIIC ）			
項目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日期	2022.05.25
		編號	11
		地點	
說明：圓柱試體第3顆，共3顆（ 配比：IIIC ）			
項目	現地填方固化處理試拌(第二次)28天抗壓試驗	日期	2022.05.25
		編號	12
		地點	
說明：圓柱試體抗壓結果（ 配比：IIIC ）			

## 5. 本期施工照片

工程名稱：曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程

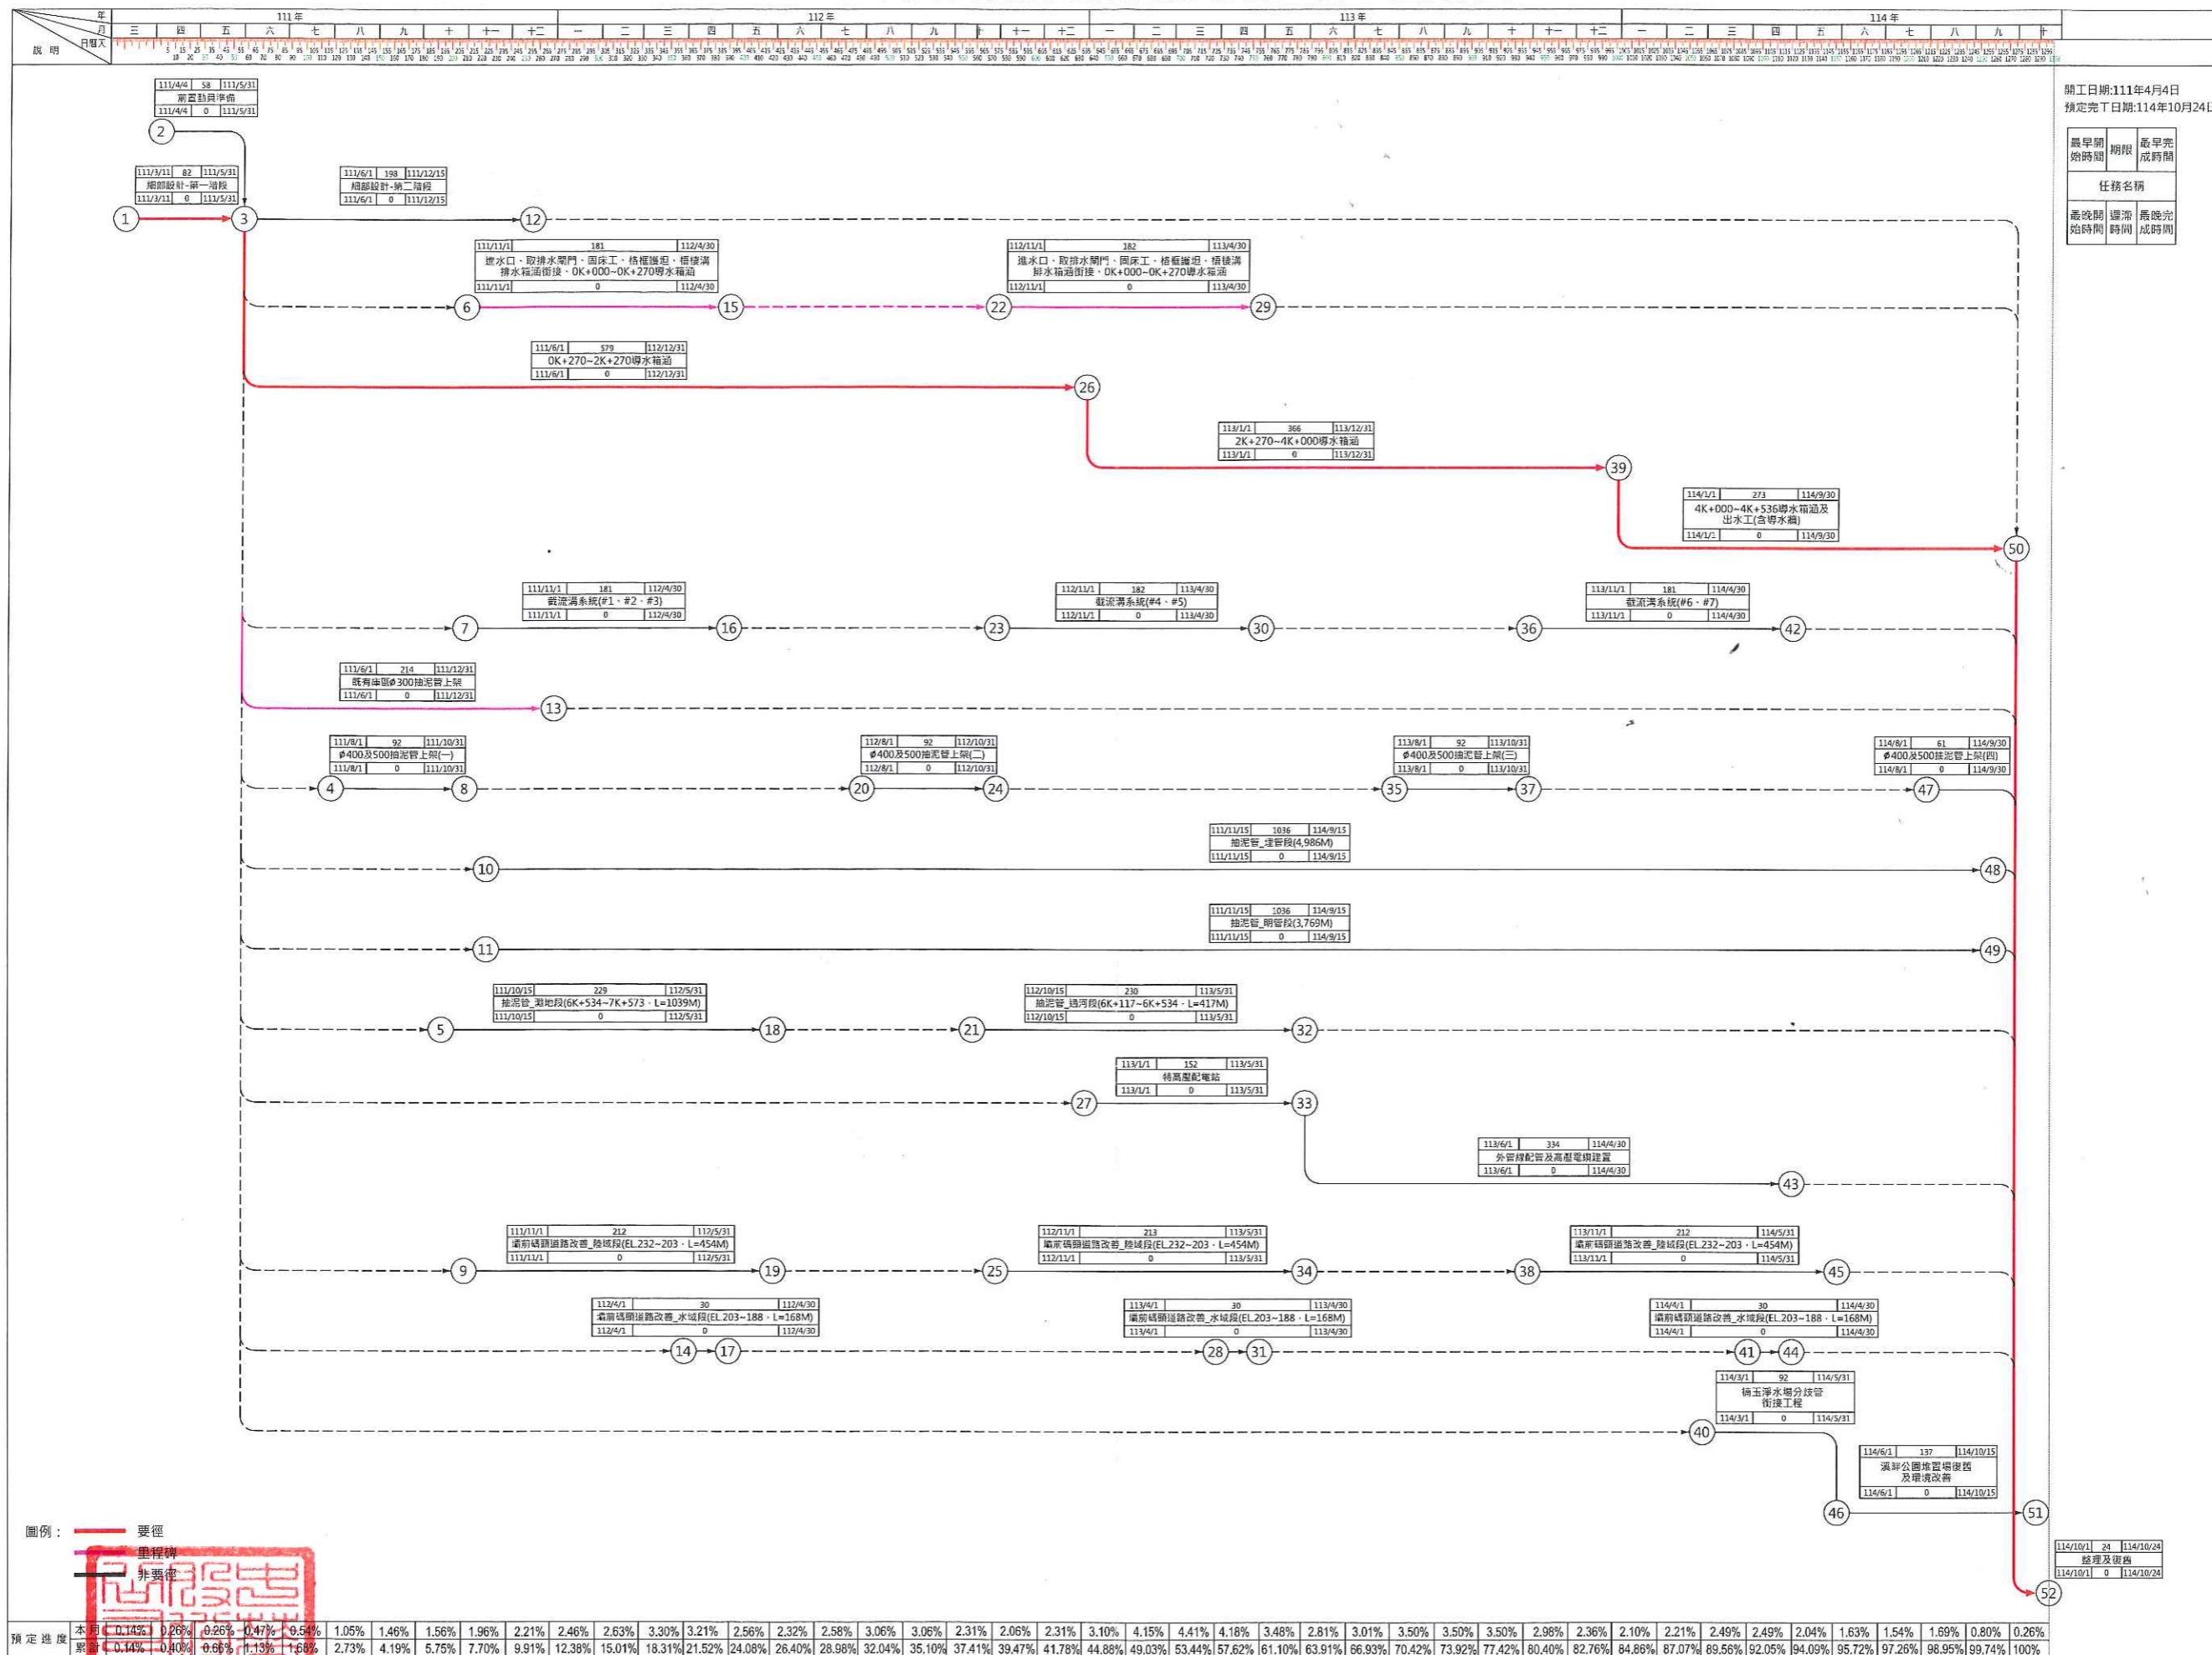
項目	測量作業	日期	2022.05.25
		編號	13
		地點	點
		放水渠道 0K+150~0K+500	
說明：控制點設置。			
項目	測量作業	日期	2022.05.25
		編號	14
		地點	點
		放水渠道 0K+150~0K+500	
說明：控制點設置。			
項目	測量作業	日期	2022.05.25
		編號	15
		地點	點
		放水渠道 0K+150~0K+500	
說明：控制點設置。			

## 6. 附件

- 附件一 計畫時程網狀圖
- 附件二 計畫時程桿狀圖（含前後一個月作業項目時程圖）
- 附件三 進度表與S進度曲線
- 附件四 工作數量累計完成表
- 附件五 晴雨表(含逐時降水量月報表)
- 附件六 營建工地逕流廢水(系統核定頁面)



曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程 工程網狀圖



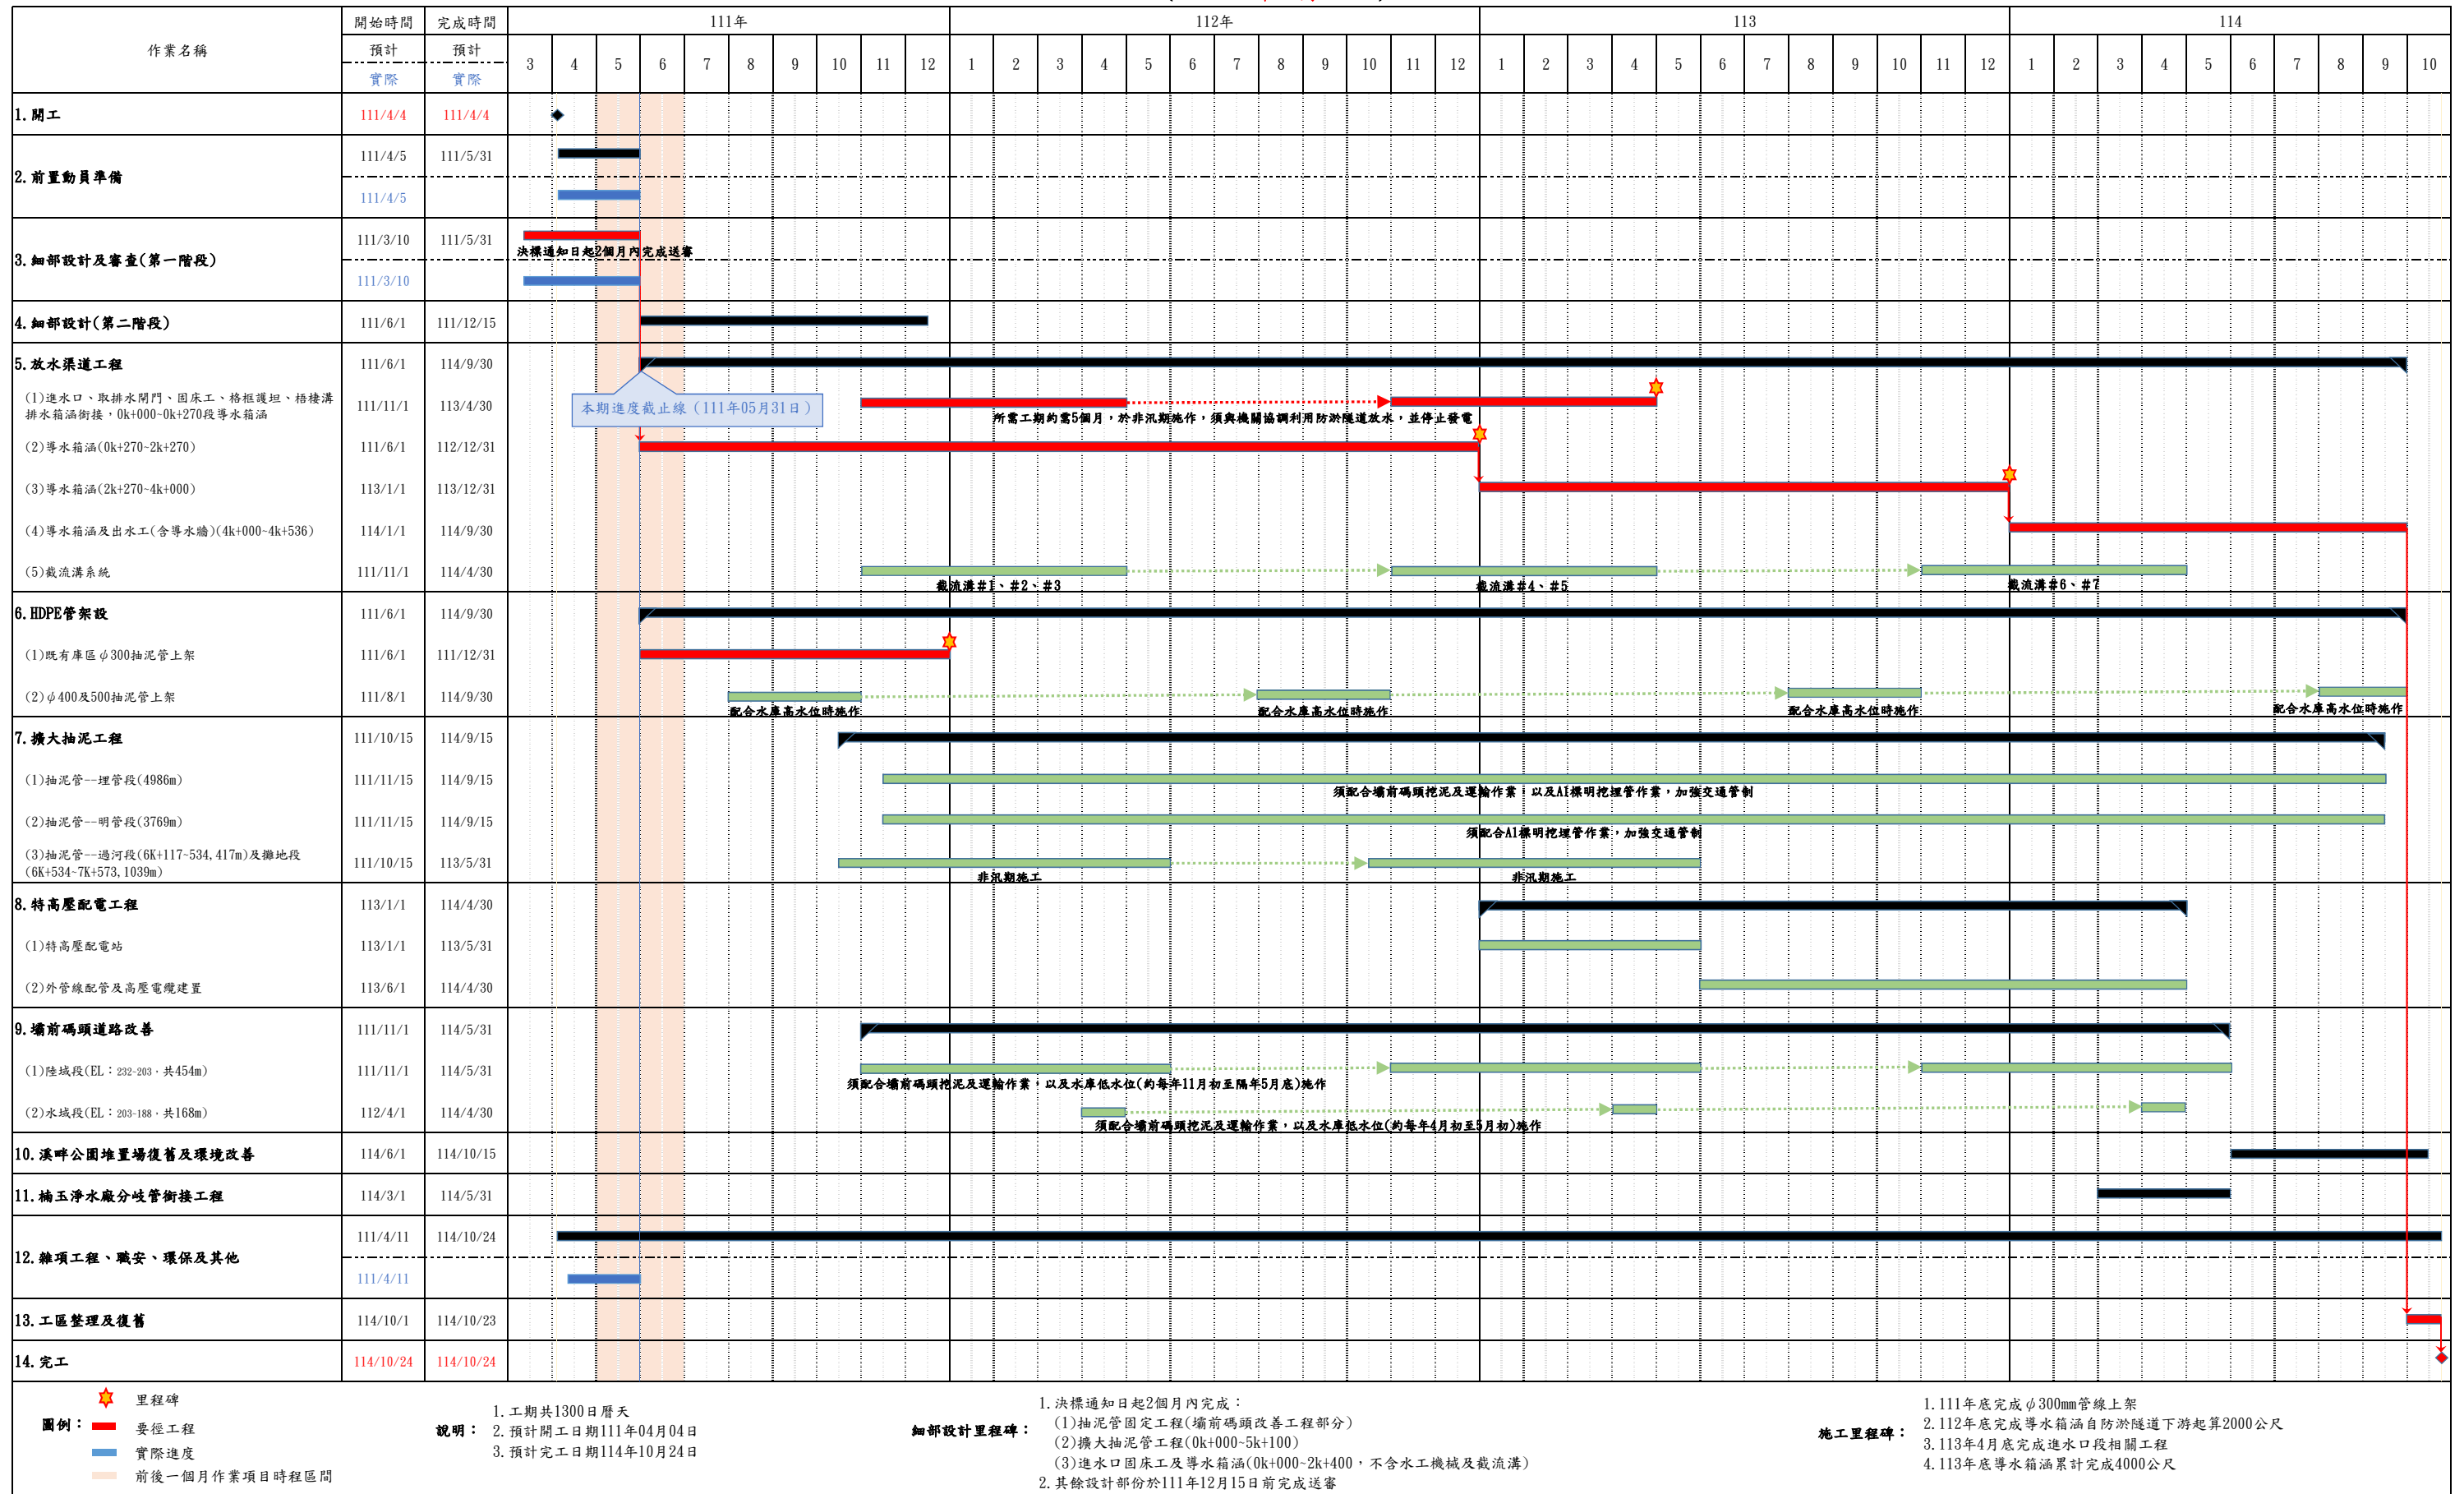
開工日期:111年4月4日  
 預定完工日期:114年10月24日

最早開始時間	最遲開始時間	最早完成時間	最遲完成時間

任務名稱

廠商: [Red Seal] 專任工程人員: [Signature] 工務所主任: [Red Seal] 課長: [Red Seal] 主任工程司: [Red Seal] 副局長: [Red Seal] 局長: [Red Seal]

曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程-施工桿狀圖  
(至 111年05月31日)



曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程 預定/實際進度表與S進度曲線 (111年04月04日至111年05月31日)

開工日期: 111年 04 月 04 日

— 預定進度曲線
— 實際進度曲線

Table with columns for Project Name, Amount, and months from April 2022 to October 2023. It contains multiple rows for different construction items like water pipe installation, pump station, and channel expansion. Includes a summary table at the bottom for progress percentages.

111年5月份預定進度 0.2000 %
(111.05.16-111.05.31)預定進度 0.1340 %
實際進度 0.0051 %

工作數量累計完成表

項次	工程項目	單位	契約數量	契約單價	金額	前期累積完成				本期完成				本期累積完成				備註
						預定進度(%)	實際進度(%)	實際完成數量	實際完成金額(元)	預定進度(%)	實際進度(%)	實際完成數量	實際完成金額(元)	預定進度(%)	實際進度(%)	實際完成數量	實際完成金額(元)	
壹	發包工程費																	
一	放水渠道工程					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二	擴大抽泥管工程					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三	特高壓配電工程					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四	壩前碼頭改善工程					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五	溪畔公園材料堆置場復舊及環境改善	式	1.00	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六	雜項工程																	
f	工務所設施(含土地租用)	式	1.00	16,000,000	16,000,000	3.2100	3.2100	0.0321	513,600	1.1200	1.1200	0.0112	179,200	4.3300	4.3300	0.0433	692,800	
七	細部設計作業費																	
a	細部設計服務費	式	1.00	22,000,000	22,000,000	65.7600	65.7600	0.6576	14,467,200	2.5600	2.5600	0.0256	563,200	68.3200	68.3200	0.6832	15,030,400	
八	職業安全衛生管理費																	
a	職業安全衛生,管理人員	人月	96.00	50,000	4,800,000	3.0917	3.0917	2.9680	148,400	1.0750	1.0750	1.0320	51,600	4.1667	4.1667	4.0000	200,000	
九	環境保護措施費																	
十	品質管制作業費																	
b	品質管(含品管人員薪資及行政管理費)																	
1	品管人員薪資	月	48.00	180,000	8,640,000	3.0900	3.0900	1.4832	266,976	1.0767	1.0767	0.5168	93,024	4.1667	4.1667	2.0000	360,000	
2	行政管理費	月	48.00	148,828	7,143,744	3.0900	3.0900	1.4832	220,741	1.0767	1.0767	0.5168	76,915	4.1667	4.1667	2.0000	297,656	
十一	廠商管理什費	式	1.00	98,459,114	98,459,114	1.1500	1.1500	0.0115	1,132,280	0.1600	0.1600	0.0016	157,534	1.3100	1.3100	0.0131	1,289,814	
十二	工程保險費	式	1.00	31,869,616	31,869,616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十三	營業稅	式	1.00	86,190,476	86,190,476	0.9720	0.9720	0.0097	837,460	0.0650	0.0650	0.0007	56,074	1.0370	1.0370	0.0104	893,534	
貳	有價材料折價費																	
一	瀝青混凝土挖(刨)除料	M3	-	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	總計				1,810,000,000	0.5260	0.9716	-	17,586,657	0.1340	0.0651	-	1,177,547	0.6600	1.0367	-	18,764,204	

111年度		曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程 晴雨表 (至 111.05.31)																															統計天數(天)																																							
日期	月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	晴	雨	陰	颶																																				
1	上午																																			0	0	0	0																																	
	下午																																				0	0	0	0																																
2	上午																																				0	0	0	0																																
	下午																																					0	0	0	0																															
3	上午																																					0	0	0	0																															
	下午																																						0	0	0	0																														
4	上午				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰	晴	晴	晴	晴	晴	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	25	0	2	0																															
	下午				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰	晴	晴	晴	晴	晴	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				0																																
5	上午	陰	雨	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰	雨	雨	陰	雨	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	陰	雨	雨	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	陰	14	11.5	5.5	0																																		
	下午	陰	雨	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰	雨	雨	陰	雨	雨	雨	陰	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	雨					0																																		
6	上午																																				0	0	0	0																																
	下午																																						0	0	0	0																														
7	上午																																					0	0	0	0																															
	下午																																						0	0	0	0																														
8	上午																																						0	0	0	0																														
	下午																																							0	0	0	0																													
9	上午																																						0	0	0	0																														
	下午																																							0	0	0	0																													
10	上午																																						0	0	0	0																														
	下午																																							0	0	0	0																													
11	上午																																						0	0	0	0																														
	下午																																							0	0	0	0																													
12	上午																																						0	0	0	0																														
	下午																																							0	0	0	0																													
備註	晴	代表晴天																															雨	代表雨天，日降雨量超過5公厘者。																															本年度累計				39	11.5	7.5	0
	陰	代表陰天																															颶	代表颶風																															總工期累計				39	11.5	7.5	0



降水量(mm)																											
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	總和	日/時	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	&	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	-	1.0	0.5	-	0.5	0.5	0.5	2.0	2.0	2.5	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	2.0	0.5	-	0.5	1.0	24.5	2	
3	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	3.5	3	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	-	-	-	-	&	-	-	-	-	-	-	&	-	3.0	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	3.5	10	
11	-	-	-	-	-	-	-	0.5	8.0	1.5	-	-	-	&	&	-	-	&	&	-	-	&	-	-	10.0	11	
12	&	-	&	-	&	-	-	&	-	&	&	&	&	&	2.0	2.5	-	1.0	-	&	-	-	0.5	-	6.0	12	
13	-	-	-	&	-	&	-	&	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
14	-	-	-	0.5	1.0	0.5	0.5	2.0	4.0	4.0	2.5	2.0	2.5	3.0	7.0	-	0.5	1.5	0.5	0.5	-	-	1.5	1.5	35.5	14	
15	0.5	4.5	4.0	0.5	3.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	5.0	-	1.0	5.5	-	0.5	1.0	6.0	4.5	39.0	15	
16	1.0	3.5	4.0	2.0	0.5	-	-	-	0.5	-	-	0.5	1.5	0.5	0.5	1.5	1.0	5.0	4.5	0.5	0.5	-	0.5	-	28.0	16	
17	0.5	-	-	0.5	2.5	1.0	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	17	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	23
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	3.0	6.0	-	&	-	-	-	-	-	0.5	-	-	10.0	24	
25	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.5	10.5	0.5	-	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	-	-	17.0	25	
26	0.5	-	-	-	-	-	-	2.5	3.0	0.5	-	-	3.0	4.5	10.5	-	0.5	2.5	-	2.0	-	&	-	3.0	32.5	26	
27	5.0	7.0	0.5	-	-	-	-	&	-	-	-	-	1.5	0.5	3.5	0.5	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	19.5	27	
28	-	-	-	-	-	-	&	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	5.5	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	31	
總和	7.5	16.0	9.5	4.0	7.5	2.0	2.0	7.5	18.0	8.5	4.5	14.0	21.5	31.5	26.0	19.0	3.5	13.0	11.5	6.0	2.5	2.0	9.0	10.5	總和		
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		日/時	

## 事業及污水下水道系統廢(污)水管理系統

Q8203236 您好，您的密碼效期倒數 0 天 | [? 操作說明](#) [登出](#)[首頁](#) [服務](#) [申請\(報\)](#)

## 營建工地逕流廢水

[申請\(報\)](#) > [廢\(污\)水管理計畫](#) > [營建工地逕流廢水](#)

## Q 查詢條件

審查結果 [查詢](#)[清除查詢](#)[新增](#)

※若變更基本資料或展延工期請用上一筆核准案件進行變更

[填寫說明下載](#)

| 共 1 筆 | 跳至 1 頁 | 上一頁 下一頁 每頁顯示 10 筆

序號	管制編號	事業名稱	開發名稱	放流水標準行業別	目前列管狀況	申請日期	審查結果
1	Q8203236	經濟部水利署南區水資源局-曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程	經濟部水利署南區水資源局-曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程	營建工地	屬於水污法定義範圍內之列管事業	111-05-12	核准

[變更](#)[檢視](#)[下載收執聯](#)

| 共 1 筆 | 跳至 1 頁 | 上一頁 下一頁 每頁顯示 10 筆

## 行政院環境保護署 版權所有

[📍 通訊地址](#)：10045 臺北市中正區中華路一段 83 號[📞 聯絡電話](#)：02-2311-7722[📅 更新日期](#)：110 年 9 月 6 日

## 聯絡資訊

[✉ 系統操作問題諮詢信箱](#)：wpmis@gi-tech.com.tw

系統問題請優先利用諮詢信箱，敘明機關/機構名稱、管制編號、電話、系統疑問及截圖，以利排除。

[👤 因應嚴重特殊傳染性肺炎\(COVID-19\)](#)，居家上班期間請撥打緊急聯絡電話：0978-151-062。[📞 法規相關問題諮詢](#)：02-2775-3919 分機 217陳先生、247周先生、207林小姐[👤 系統操作問題諮詢](#)：02-2778-8500 分機 331顏先生、213黃先生、231林先生、322林小姐[👤 免檢測申報諮詢](#)：02-2775-3919 分機 277錢先生

聯絡時間：週一~週五 上午09:00~12:00、下午13:30~18:00

請使用 1024\*768px 以上螢幕解析度獲得最佳網頁瀏覽環境。

[隱私權及資訊安全宣告](#) | [網頁資料開放宣告](#) | [首長信箱](#)

