

經濟部水利署南區水資源局
曾文南化聯通管統包工程 A3 標

半月進度報告

(111.07.01~111.07.15)



主辦機關：經濟部水利署南區水資源局

監造單位：經濟部水利署南區水資源局工務課

曾文南化聯通管統包工程 A3 標工務所

統包廠商：瑞鋒營造有限公司

共同承攬

東山林工程有限公司

細部設計：永鉅技術顧問有限公司

中 華 民 國 111 年 7 月

目錄

第一章	計畫彙總摘要	1
1.1	工程概述	1
1.2	本期重要記事	3
1.3	本期施工概要說明	7
1.4	下期主要施工項目	12
1.5	遭遇困難及請求協助事項	15
第二章	計畫進度分析及工作現況報告	16
2.1	進度報告及分析（至 111 年 7 月 15 日止）	16
2.2	計畫時程網狀圖	24
2.3	計畫時程桿狀圖	24
2.4	預定進度及實際進度 S 曲線	24
2.5	工程現況說明	24
2.6	要徑分析	25
2.7	施工里程碑	25
2.8	各項申辦作業狀況	26
2.9	前後一個月作業項目時程圖	26
2.10	差異分析、修正措施與建議	27
第三章	工作數量報告	28
3.1	工作數量累計完成表	28
3.2	本期施工作業人員及機具統計	28
3.3	晴雨表	29
第四章	圖說/文件送審管制表	30
4.1	文件送審管制總表	30
4.2	圖說送審管制總表	30

本期施工照片	31
附件	32

圖目錄

圖 1-1 工程位置圖 (A3 標)	2
--------------------------	---

表目錄

表 1-1	本期施工項目對應契約計價項目	10
表 1-2	下期施工項目對應契約計價項目	13
表 2-1	半月施工進度百分比（111 年 7 月 1 日至 111 年 7 月 15 日）	16
表 2-2	施工里程碑追蹤管控表（至 111 年 7 月 15 日止）	26
表 3-1	施工作業人員統計表（111 年 7 月 1 日至 111 年 7 月 15 日）	28
表 3-2	施工作業機具統計表（111 年 7 月 1 日至 111 年 7 月 15 日）	29

第一章 計畫彙總摘要

1.1 工程概述

「曾文南化聯通管工程計畫」奉行政院 107 年 6 月 11 日院台經字第 1070020685 號函核定，計畫期程自 108 年起至 113 年止，總經費以 120 億元上限。本計畫管路行經台南市楠西區、玉井區及南化區，沿既有道路埋設，全長約 25 公里，設計輸水能力為每日 80 萬噸。衡酌本計畫由機關辦理之工作內容、施工能量、工程區域與地理位置，以及增加廠商競爭等因素，分為 A1、A2、A3 等三件工程標案，本標案為「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」工程位置如圖 1-1 所示。

本工程於 109 年 5 月 14 日開工，預計 113 年 6 月 21 日竣工，工期計 1500 日曆天，總預算金額為 30 億 5 千萬元整，工程範圍起自楠西／玉井區界往南約 100 公尺（台 3 線里程約 370.6K），至南化區北寮里既設南化高屏聯通管銜接點之輸水管段，另包含鏡面水庫右山脊之平壓管路及放流工乙座，其中主管段（曾文電廠壓力鋼管至既有南化高屏聯通管北寮銜接點）及平壓管段（自既有南化高屏聯通管設平壓管至鏡面水庫）由經濟部水利署南區水資源局主辦。主要工程項目包含明挖段 6,147M，推管段 3,109M，及水管橋 333M，合計總長為 9,589M。

本計畫完成輸水管路聯通後，可使曾文水庫庫水直接支援供應南化淨水場及南化高屏聯通管，增加區域水資源調度及備援能力，強化南部地區公共用水之抗限缺水能力，供水穩定可促進產業發展，提高南部區域生活品質。本計畫分管段（自南化區四埔至南化淨水場之銜接管段）由台灣自來水股份有限公司南區工程處主辦。

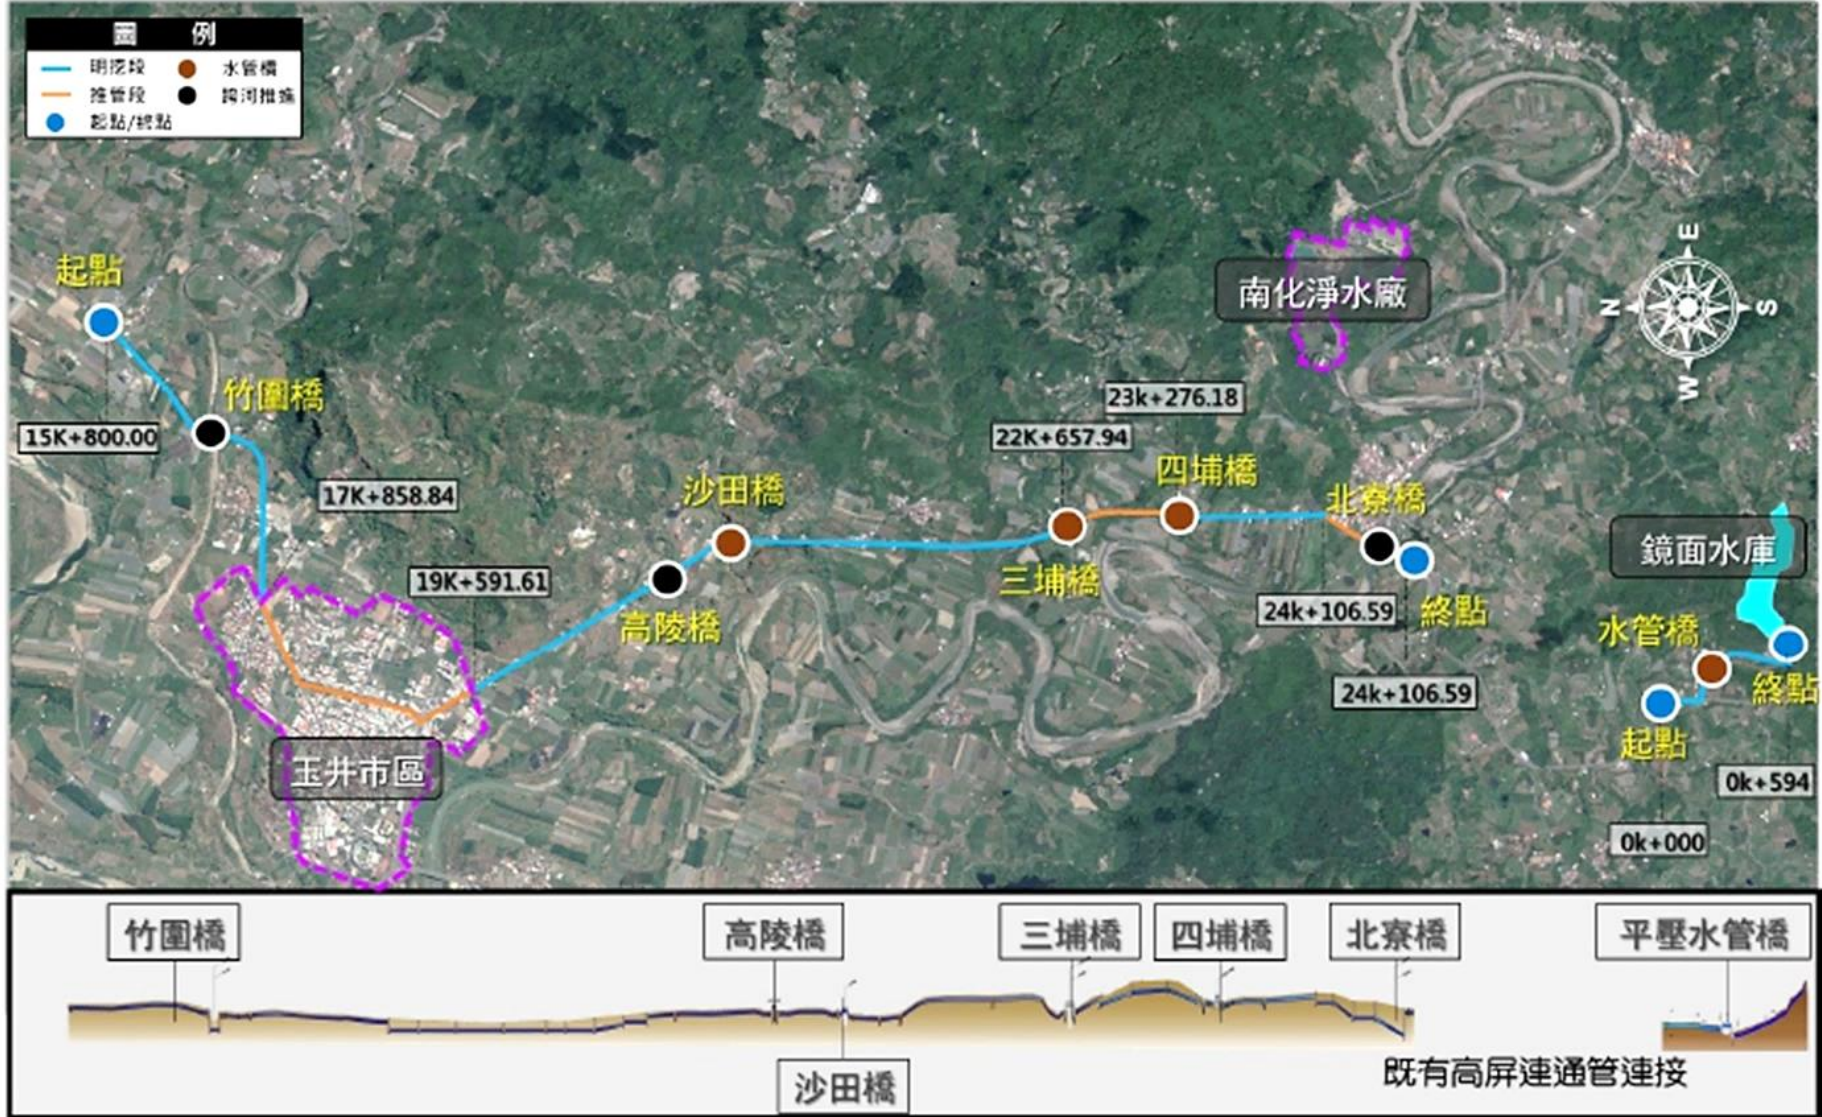


圖 1-1 工程位置圖 (A3 標)

1.2 本期重要記事

1. 111.07.04

- (1) 有關申請展延「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」地盤穩定及營運安全措施計畫報告提送期程至 111 年 7 月 8 日案，同意辦理，請查照。〔水南工字第 11153046060 號〕
- (2) 函轉勞動部「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第 70 條規定解釋令 1 份，請查照。〔聯管 A3 備字第 1110704-1 號〕
- (3) 檢送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」機電監控工程細部設計圖（第一版）A1 影印圖 1 份、A3 縮圖乙式 12 份及 AutoCAD 電腦圖檔 3 份，詳附件，請查照。〔瑞玉字第 1110704099 號〕
- (4) 復「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」水土保持計畫，新增臨時水保設施修正圖說，詳說明，請查照。〔瑞玉字第 1110704100 號〕
- (5) 檢送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」W51 工作井小變更圖說，詳附件，請查照。〔瑞玉備字第 1110704-001 號〕
- (6) 檢送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」進版 111 年 6 月「計畫文件送審時程管制總表」，如附件，擬請核備。〔瑞玉備字第 1110704-004 號〕

2. 111.07.05

- (1) 所送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」管路工程-明挖覆蓋段經費概算書（第一版第七次），同意辦理，請查照。〔水南工字第 11106028490 號〕
- (2) 檢送 111 年 6 月 20 日辦理「111 年度曾文南化聯通管統包工程區域聯防計畫-曾文南化聯通管統包工程 A1、A2、A3 標第三次稽查會議」之缺失改善對策及結果表，如說明，請查照。〔瑞玉字第 1110705101 號〕

3. 111.07.06

- (1) 辦理「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」工程簡報製作、文件建置及工地施工品質精進之專案輔導會議，請查照。〔水南工字第 11106030300 號〕
- (2) 所送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」機電監控工程(第一版) A1、A3 尺寸細部設計圖及 AUTOCAD 圖檔，備查，請查照。〔水南工字第 11153047980 號〕
- (3) 經濟部水利署南區水資源局辦理「111 年推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔」工程類實地評審第二次預演。
- (4) 專任工程人員工地督察。

4. 111.07.07

- (1) 檢送水利署 111 年 6 月 29 日走動式督導本局「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」督導紀錄 1 份，請查照。〔水南工字第 11106031480 號〕
- (2) 所送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」W55 至 W57 工作井變更設計案(第二案變更設計)及 A1 尺寸原圖，同意辦理，請查照。〔水南工字第 11106018490 號〕
- (3) 檢送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」管路工程-明挖覆蓋段經費概算書(第一版定稿本)，詳如說明，請查照。〔瑞玉字第 1110707103 號〕
- (4) 檢送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」水管橋工程變更設計細部設計圖及設計計算書(第一版第三次)，詳如說明，請查照。〔瑞玉字第 1110707104 號〕

5. 111.07.08

- (1) 辦理「111 年推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔」工程類實地評審第三次預演〔水南工字第 11119008580 號〕

- (2) 辦理「111 年推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔」工程類實地評審第四次預演〔水南工字第 11119008590 號〕
- (3) 所送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標 19K+748~24K+804 等明挖段及推進段水土保持計畫」新增臨時水土保持設施案，請依水土保持局意見補正後再送本局辦理，如說明，請查照。〔水南工字第 11153049660 號〕
- (4) 審查「曾文南化聯通管工程環境監測及生態檢核 (4/6)」委託技術服務 111 年第 2 季季報告〔水南工字第 11106031200 號〕
- (5) 檢送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」W54 工作井銜接四埔橋穿越地下箱涵之替代方案變更設計圖、水理計算表、經費比較表及審查意見回覆表，詳如說明，請查照。〔瑞玉字第 1110708105 號〕
- (6) 檢送「曾文南化聯統管統包工程 A3 標」地盤穩定及營運安全措施 (第一版第二次)，如說明，請查照。〔瑞玉備字第 1110708-001 號〕

6. 111.07.11

- (1) 所送 111 年 4 月 21 日本局督導「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」缺失改善對策及結果表，同意結案，請查照。〔水南工字第 11106031840 號〕
- (2) 檢送勞動部職業安全衛生署訂定之「職場永續健康與安全 SDGs 揭露實務建議指南」1 份，請查照。〔聯管 A3 備字第 1110711-1 號〕
- (3) 檢送本公司承攬「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」111 年 06 月份監測報告書，乙式六份。請 惠予審查。〔瑞玉備字第 1110711-001 號〕

- (4) 經濟部水利署南區水資源局辦理「111 年推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔」工程類實地評審第三次預演。
7. 111.07.12
- (1) 經濟部水利署南區水資源局辦理「111 年推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔」工程類實地評審第四次預演。
8. 111.07.13
- (1) 所送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」之「水管橋施工計畫(第一版第一次)」,如說明,請查照。〔水南工字第 11153050310 號〕
- (2) 檢送本局 111 年 6 月 20 日「111 年度曾文南化聯通管統包工程區域聯防計畫-曾文南化聯通管統包工程 A1、A2、A3 標第三次稽查會議」成果報告 1 份,請查照。〔水南工字第 11106031910 號〕
9. 111.07.14
- (1) 原訂 111 年 7 月 20 日上午 10 時於本局曾文辦公區第一會議室召開之「曾文南化聯通管工程環境監測及生態檢核(4/6)」委託技術服務 111 年第 2 季季報告審查會議,因故改於 111 年 7 月 22 日下午 2 時召開,地點及辦理方式不變,請查照。〔水南工字第 11106032450 號〕
- (2) 本局「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」外接式排氣閥預定設施位置會勘〔水南工字第 11106031420 號〕
- (3) 有關「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」地方陳情調整本工程里程 21K+939 穿越地下箱涵施作方式會勘〔水南工字第 11106031810 號〕
- (4) 111 年地方公職人員選舉暨憲法修正案之複決案投票日訂於 111 年 11 月 26 日(星期六),投票禁挖期間為 111 年 11 月 20 日起至 111 年 11 月 27 日止,請查照。〔水南工字第 11106032800 號〕

10. 111.07.15

- (1) 檢送農委會水土保持局召開「『曾文南化聯通管統包工程 A3 標』鏡面水庫平壓管段 0K+450 至鏡面水庫平壓管放流工」水土保持計畫第 2 次審查會開會通知單 1 份，如附件，請查照。〔水南工字第 11106032800 號〕
- (2) 所送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」管路工程-明挖覆蓋段經費概算書（第一版定稿本），備查，請查照。〔水南工字第 11153049550 號〕
- (3) 檢送「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」W55~W57 工作井變更設計圖（第二案變更設計）A1 影印圖、A3 縮圖及 AutoCAD 電腦圖檔，詳如說明，請查照。〔瑞玉字第 1110715106 號〕
- (4) 檢送有關「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」111 年 07 月份協議組織會議紀錄乙份。請查照。〔瑞玉備字第 1110715-001 號〕
- (5) 有關「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」工地主任黃俊龍君請假事宜，如說明，請查照。〔瑞玉備字第 1110715-002 號〕

1.3 本期施工概要說明

1. 前置作業

- (1) WSP、SP 管生產製造。

2. 計畫書審查

- (1) 已核定（或原則同意）

A. 本期無。

- (2) 審查中

A. 管線試水計畫（第一版第二次）。

- (3) 修改中

A. 水管橋施工計畫（第一版第二次）。

B. 水工機械施工計畫（第一版第三次）。

3. 細部設計審查

(1) 已核定（或原則同意）

A. 本期無。

(2) 審查中

A. 本期無。

(3) 修改中

A. 「鏡面平壓管段-調整池及消能設施」細部設計圖及設計計算書（第一版第六次）。

4. 現場施工

(1) W38 工作井

A. 球閥窰井開挖。

(2) 中正段（W39 工作井至 W40 工作井、明挖 3）

A. 16k+770~16k+830 鋼軌樁打設。

B. 16k+830~16k+891 鋼管吊裝、鋼管銲接。

C. 16k+891~16k+952 CLSM（工地型拌合）回填。

D. 17k+803~17K+850 管溝開挖、水平支撐施作、鋼管吊裝、鋼管銲接。

(3) W44 工作井→W45 工作井

A. 推進工程施作。

(4) W48 工作井→沙田段（明挖 4）

A. 19k+605~19k+650 職安設施改善及佈設。

(5) 沙田水管橋

A. A1 橋台 第一升層施作、排泥管安裝、鋼管吊裝、鋼管銲接。

(6) 三埔水管橋

A. A1 橋台 第一升層施作、排泥管安裝、鋼管吊裝、鋼管銲接。

B. A2 橋台 第一升層施作、排泥管安裝、鋼管吊裝、鋼管銲接。

(7) W51 工作井

A. 工作井開坑作業。

(8) W52 工作井→W53 工作井

A. 推進設備維修。

(9) W54 工作井

A. 工作井開坑作業。

(10) W57 工作井

A. 推進設備安裝。

(11) W59 工作井→W58 工作井

A. 鋼管銲接。

(12) 鏡面水庫水管橋（平壓管段水管橋）

A. A1 橋台 第三~五升層施作。

B. A2 橋台 第四~五升層施作。

表 1-1 本期施工項目對應契約計價項目

	施工項目	計價項目	備註
1	主體工程施工及相關作業	壹.一：主體工程 壹.一.(一)：管路工程 壹.一.(一).1：2600mm ϕ 推進用鋼管(WSP)及推進施工 壹.一.(一).2：2600mm ϕ 鋼管及安裝埋設(含工地銲接) 壹.一.(一).3：32600mm ϕ 推進管工作井 壹.一.(一).4：挖方(機械) 壹.一.(一).5：控制性低強度回填材料及施工，混凝土用粒料 壹.一.(一).6：瀝青混凝土刨除 壹.一.(一).8：道路施工及復舊	
2	雜項工程施工及相關作業	壹.二：雜項工程 壹.二.(三)：工地參訪費 壹.二.(四)：施工攝影、拍照及文件製作費 壹.二.(六)：工地影像監控系統 壹.二.(七)：工地辦公室及材料倉庫 壹.二.(八)：工地辦公室及倉庫用地租金 壹.二.(九)：工地電力、電信、給水費及瓦斯費 壹.二.(十)：既有道路施工中維護費 壹.二.(十一)：施工擋排抽水費 壹.二.(十二)：施工測量及放樣 壹.二.(十三)：地上物處理及雜物清理費 壹.二.(十五)：汛期工地防災減災作業費 壹.二.(二十三)：資料編撰及送審 壹.二.(二十五)：地下管線探管與試挖費 壹.二.(二十六)：地下管線臨時吊掛、遷移及復舊 壹.二.(二十七)：鄰近建築物現況調查與監測 壹.二.(二十八)：橋梁下推進施工中監測 壹.二.(二十九)：其他雜項工程	

	施工項目	計價項目	備註
3	職業安全衛生管理及相關作業	壹.三：職業安全衛生費 壹.三.(二)：職業安全衛生管理員 壹.三.(三)：職業安全衛生，宣導 壹.三.(四)：個人防護具 壹.三.(五)：消防及急救設備 壹.三.(六)：施工圍籬 壹.三.(七)：活動廁所 壹.三.(八)：工地警衛保全 壹.三.(九)：黃色警示帶 壹.三.(十)：電焊機自動防止電擊裝置及防護設備 壹.三.(十一)：施工警告標示 壹.三.(十二)：交通維持費 壹.三.(十三)：道路管制人員 壹.三.(十四)：工區人員進出管制系統 壹.三.(十五)：夜間照明及用電設備(含照明設備、自動電擊防止裝置及反光器等) 壹.三.(十七)：上下設備與防墜等安全防護設施 壹.三.(十九)：開挖施工穩定安全監測 壹.三.(二十)：開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋪設止滑鋼板 壹.三.(二十一)：臨水作業救生設備 壹.三.(二十二)：其他安衛設施及管理維護費	
4	環境保護措施及相關作業	壹.四：環境保護措施費 壹.四.(一)：車輛清洗及設備費 壹.四.(二)：工地灑水費 壹.四.(四)：振動噪音防制 壹.四.(五)：工地清潔費 壹.四.(六)：空氣污染防治措施費 壹.四.(七)：水污染防治措施及施工廢水處理 壹.四.(八)：其他環境保護措施	
5	品質管制相關作業	壹.五：廠商品質管制作業費 壹.五.(一)：品質管理費 壹.五.(二)：檢驗費	

1.4 下期主要施工項目

1. 前置作業

(1) WSP、SP 管生產製造。

2. 計畫書審查

(1) 管線試水計畫（第一版第二次）。

(2) 水管橋施工計畫（第一版第二次）。

(3) 水工機械施工計畫（第一版第三次）。

3. 細部設計審查

(1) 「鏡面平壓管段-調整池及消能設施」細部設計圖及設計計算書
（第一版第六次）。

4. 現場施工

(1) 明挖段：瀝青刨除、鋼軌樁打設、擋土鋼板打設、管溝開挖、水平支撐施作、鋼管吊裝、鋼管銲接、CLSM（工地型拌合）回填、水平支撐拆除、鋼軌樁拔除、擋土鋼板拔除、瀝青鋪築。

(2) 推進段：工作井開坑作業、推進設備安裝、推進工程施作、推進設備拆除、工作井回填作業。

(3) 水管橋：橋台基礎施作。

表 1-2 下期施工項目對應契約計價項目

項次	施工項目	計價項目	備註
1	主體工程施工及相關作業	壹.一：主體工程 壹.一.(一)：管路工程 壹.一.(一).1：2600mm ϕ 推進用鋼管(WSP)及推進施工 壹.一.(一).2：2600mm ϕ 鋼管及安裝埋設(含工地銲接) 壹.一.(一).3：32600mm ϕ 推進管工作井 壹.一.(一).4：挖方(機械) 壹.一.(一).5：控制性低強度回填材料及施工，混凝土用粒料 壹.一.(一).6：瀝青混凝土刨除 壹.一.(一).8：道路施工及復舊	
2	雜項工程施工及相關作業	壹.二：雜項工程 壹.二.(三)：工地參訪費 壹.二.(四)：施工攝影、拍照及文件製作費 壹.二.(六)：工地影像監控系統 壹.二.(七)：工地辦公室及材料倉庫 壹.二.(八)：工地辦公室及倉庫用地租金 壹.二.(九)：工地電力、電信、給水費及瓦斯費 壹.二.(十)：既有道路施工中維護費 壹.二.(十一)：施工擋排抽水費 壹.二.(十二)：施工測量及放樣 壹.二.(十三)：地上物處理及雜物清理費 壹.二.(十五)：汛期工地防災減災作業費 壹.二.(二十三)：資料編撰及送審 壹.二.(二十五)：地下管線探管與試挖費 壹.二.(二十六)：地下管線臨時吊掛、遷移及復舊 壹.二.(二十七)：鄰近建築物現況調查與監測 壹.二.(二十八)：橋梁下推進施工中監測 壹.二.(二十九)：其他雜項工程	

項次	施工項目	計價項目	備註
3	職業安全衛生管理及相關作業	壹.三：職業安全衛生費 壹.三.(二)：職業安全衛生管理員 壹.三.(三)：職業安全衛生，宣導 壹.三.(四)：個人防護具 壹.三.(五)：消防及急救設備 壹.三.(六)：施工圍籬 壹.三.(七)：活動廁所 壹.三.(八)：工地警衛保全 壹.三.(九)：黃色警示帶 壹.三.(十)：電焊機自動防止電擊裝置及防護設備 壹.三.(十一)：施工警告標示 壹.三.(十二)：交通維持費 壹.三.(十三)：道路管制人員 壹.三.(十四)：工區人員進出管制系統 壹.三.(十五)：夜間照明及用電設備(含照明設備、自動電擊防止裝置及反光器等) 壹.三.(十七)：上下設備與防墜等安全防護設施 壹.三.(十九)：開挖施工穩定安全監測 壹.三.(二十)：開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋪設止滑鋼板 壹.三.(二十一)：臨水作業救生設備 壹.三.(二十二)：其他安衛設施及管理維護費	
4	環境保護措施及相關作業	壹.四：環境保護措施費 壹.四.(一)：車輛清洗及設備費 壹.四.(二)：工地灑水費 壹.四.(四)：振動噪音防制 壹.四.(五)：工地清潔費 壹.四.(六)：空氣污染防治措施費 壹.四.(七)：水污染防治措施及施工廢水處理 壹.四.(八)：其他環境保護措施	
5	品質管制相關作業	壹.五：廠商品質管制作業費 壹.五.(一)：品質管理費 壹.五.(二)：檢驗費	

1.5 遭遇困難及請求協助事項

本期無。

第二章 計畫進度分析及工作現況報告

2.1 進度報告及分析（至 111 年 7 月 15 日止）

1. 本期預定累計進度為 48.84%，實際累計進度為 52.75%，超前 3.91%。
2. 本期各項工程進度情況詳於表 2-1。
3. 下期主要要徑為：
 - (1) 計畫文件編撰及送審。
 - (2) 細部設計圖及經費概算書繪製、編撰及送審。
 - (3) WSP、SP 鋼管工廠製造生產。
 - (4) 管路工程-明挖段施作。
 - (5) 管路工程-推進段施作。
 - (6) 水管橋工程施作。

表 2-1 半月施工進度百分比（111 年 7 月 1 日至 111 年 7 月 15 日）

項次	工程項目	前期累積		本期		本期累積	
		完成進度(%)		完成進度(%)		完成進度(%)	
		預定	實際	預定	實際	預定	實際
壹	發包工作費						
壹.一	主體工程						
壹.一. 一.(一)	管路工程						
壹.一. 一.(一).1	2600mm ϕ 推進用 鋼管(WSP)及推進 施工	49.11	73.29	2.27	1.55	51.38	74.84
壹.一. 一.(一).2	2600mm ϕ 鋼管及 安裝埋設(含工地 銲接)	39.63	58.35	0.02	0.39	39.66	58.74

項次	工程項目	前期累積		本期		本期累積	
		完成進度(%)		完成進度(%)		完成進度(%)	
		預定	實際	預定	實際	預定	實際
壹.一. (一).3	2600mm ϕ 推進管 工作井	55.94	68.18	1.59	8.48	57.53	76.67
壹.一. (一).4	挖方(機械)	54.14	48.38	1.17	1.35	55.32	49.73
壹.一. (一).5	控制性低強度回填 材料及施工，混凝 土用粒料	39.63	46.34	0.02	0.92	39.66	47.26
壹.一. (一).6	瀝青混凝土刨除	50.63	38.97	1.23	0.00	51.87	38.97
壹.一. (一).7	瀝青混凝土鋪面復 舊	50.63	15.01	1.23	0.00	51.87	15.01
壹.一. (一).8	道路施工及復舊	50.63	54.69	1.23	0.00	51.87	54.69
壹.一. (一).9	制水閘窰井	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
壹.一. (一).10	排泥閘窰井	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
壹.一. (一).11	排氣閘窰井及路肩 地面護框	46.75	0.00	1.33	11.11	48.07	11.11
壹.一. (一).12	可撓管窰井	64.69	0.00	1.84	0.00	66.53	0.00
壹.一. (一).13	平壓管路調整池及 放流工	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
壹.一. (一).14	ϕ 2600mm 水管橋 (SP)及工地安裝	64.69	0.00	1.84	0.00	66.53	0.00
壹.一. (一).15	地盤穩定及管路營 運安全措施	50.63	0.00	1.23	0.00	51.87	0.00
	小計						
壹. 一.(二)	水工機械						
壹.一. (二).1	ϕ 2600mm 電動球 閘及工地安裝	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00

項次	工程項目	前期累積		本期		本期累積	
		完成進度(%)		完成進度(%)		完成進度(%)	
		預定	實際	預定	實際	預定	實際
壹.一. (二).2	φ 2600mm 電動蝶閥及工地安裝	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
壹.一. (二).3	閥壓力計與相關儀表設備製作安裝	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
壹.一. (二).4	φ 2600mm 雙拉桿伸縮接頭及工地安裝	46.75	75.00	1.33	16.00	48.07	91.00
壹.一. (二).5	φ 2600mm 鋼製可撓管及工地安裝	46.75	75.00	1.33	0.00	48.07	75.00
壹.一. (二).6	φ 400mm 排泥閥及工地安裝	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
壹.一. (二).7	φ 400mm 雙拉桿伸縮接頭及工地安裝	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
壹.一. (二).8	φ 200mm 複合式排氣閥及工地安裝	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
壹.一. (二).9	φ 200mm 彈性座封閥及工地安裝	46.75	25.00	1.33	0.00	48.07	25.00
壹.一. (二).10	φ 200mm 緩衝塞閥及工地安裝	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
壹.一. (二).11	φ 2600mm 超音波流量計及安裝費	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
	小計						
壹. 一.(三)	機電工程						
壹.一. (三).1	遠方監控站	46.75	0.00	1.33	0.00	48.07	0.00
	小計						
	主體工程計						
壹.二	雜項工程						

項次	工程項目	前期累積		本期		本期累積	
		完成進度(%)		完成進度(%)		完成進度(%)	
		預定	實際	預定	實際	預定	實際
壹. 二.(一)	施工便道施設及維護費	50.63	30.83	1.23	0.00	51.87	30.83
壹. 二.(二)	工程告示牌，長300x 寬 170cm	50.63	0.00	1.23	0.00	51.87	0.00
壹. 二.(三)	工地參訪費	43.93	59.21	1.03	1.28	44.97	60.49
壹. 二.(四)	施工攝影、拍照及文件製作費	43.93	59.21	1.03	1.28	44.97	60.49
壹. 二.(五)	3D 動畫及工程模型製作	50.63	50.00	1.23	0.00	51.87	50.00
壹. 二.(六)	工地影像監控系統	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹. 二.(七)	工地辦公室及材料倉庫	43.93	100.00	1.03	0.00	44.97	100.00
壹. 二.(八)	工地辦公室及倉庫用地租金	43.93	59.21	1.03	1.28	44.97	60.49
壹. 二.(九)	工地電力、電信、給水費及瓦斯費	43.93	58.27	1.03	1.28	44.97	59.55
壹. 二.(十)	既有道路施工中維護費	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.二. (十一)	施工擋排抽水費	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.二. (十二)	施工測量及放樣	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.二. (十三)	地上物處理及雜物清理費	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.二. (十四)	工地拆除復舊費	50.63	0.00	1.23	0.00	51.87	0.00
壹.二. (十五)	汛期工地防災減災作業費	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.二. (十六)	竣工文件及竣工圖	50.63	0.00	1.23	0.00	51.87	0.00
壹.二. (十七)	管內 CCTV 檢視費	50.63	17.88	1.23	0.00	51.87	17.88

項次	工程項目	前期累積		本期		本期累積	
		完成進度(%)		完成進度(%)		完成進度(%)	
		預定	實際	預定	實際	預定	實際
壹.二. (十八)	無水試運轉測試費	50.63	0.00	1.23	0.00	51.87	0.00
壹.二. (十九)	配合整體功能試運轉測試費	50.63	0.00	1.23	0.00	51.87	0.00
壹.二. (二十)	管路試水壓費	50.63	0.00	1.23	0.00	51.87	0.00
壹.二. (二十一)	φ 2600mm 盲蓋封板	50.63	0.00	1.23	0.00	51.87	0.00
壹.二. (二十二)	洗管作業費	50.63	0.00	1.23	0.00	51.87	0.00
壹.二. (二十三)	資料編撰及送審	43.93	59.21	1.03	1.28	44.97	60.49
壹.二. (二十四)	工區既有結構物及設施復舊	50.63	0.00	1.23	0.00	51.87	0.00
壹.二. (二十五)	地下管線探管與試挖費	43.93	59.21	1.03	1.28	44.97	60.49
壹.二. (二十六)	地下管線臨時吊掛、遷移及復舊	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.二. (二十七)	鄰近建築物現況調查與監測	43.93	89.21	1.03	1.28	44.97	90.49
壹.二. (二十八)	橋梁下推進施工中監測	43.93	59.21	1.03	1.28	44.97	60.49
壹.二. (二十九)	其他雜項工程	43.93	59.21	1.03	1.28	44.97	60.49
	雜項工程計						

項次	工程項目	前期累積		本期		本期累積	
		完成進度(%)		完成進度(%)		完成進度(%)	
		預定	實際	預定	實際	預定	實際
壹.三	職業安全衛生費						
壹. 三.(一)	職業安全衛生教育 訓練	43.93	94.12	1.03	0.00	44.97	94.12
壹. 三.(二)	職業安全衛生管理 員	43.93	50.00	1.03	0.00	44.97	50.00
壹. 三.(三)	職業安全衛生，宣 導	43.93	59.21	1.03	1.28	44.97	60.49
壹. 三.(四)	個人防護具	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹. 三.(五)	消防及急救設備	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹. 三.(六)	施工圍籬	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹. 三.(七)	活動廁所	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹. 三.(八)	工地警衛保全	50.63	50.00	1.23	0.00	51.87	50.00
壹. 三.(九)	黃色警示帶	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹. 三.(十)	電焊機自動防止電 擊裝置及防護設備	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.三. (十一)	施工警告標示	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.三. (十二)	交通維持費	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.三. (十三)	道路管制人員	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.三. (十四)	工區人員進出管制 系統	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.三. (十五)	夜間照明及用電設 備(含照明設備、自 動電擊防止裝置及 反光器等)	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49

項次	工程項目	前期累積		本期		本期累積	
		完成進度(%)		完成進度(%)		完成進度(%)	
		預定	實際	預定	實際	預定	實際
壹.三. (十六)	危險性工作場所安全評估審查作業	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
壹.三. (十七)	上下設備與防墜等安全防護設施	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.三. (十八)	有害氣體測定器	50.63	100.00	1.23	0.00	51.87	100.00
壹.三. (十九)	開挖施工穩定安全監測	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.三. (二十)	開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋪設止滑鋼板	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.三. (二十一)	臨水作業救生設備	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹.三. (二十二)	其他安衛設施及管理維護費	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
	職業安全衛生費計						
壹.四	環境保護措施費						
壹. 四.(一)	車輛清洗及設備費	43.93	59.21	1.03	1.28	44.97	60.49
壹. 四.(二)	工地灑水費	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹. 四.(三)	環境保護訓練講習及宣傳	50.63	17.68	1.23	0.00	51.87	17.68
壹. 四.(四)	振動噪音防制	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹. 四.(五)	工地清潔費	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹. 四.(六)	空氣污染防治措施費	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49

項次	工程項目	前期累積		本期		本期累積	
		完成進度(%)		完成進度(%)		完成進度(%)	
		預定	實際	預定	實際	預定	實際
壹. 四.(七)	水污染防治措施及 施工廢水處理	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
壹. 四.(八)	其他環境保護措施	50.63	59.21	1.23	1.28	51.87	60.49
	環境保護措施費計						
壹.五	廠商品質管制作業 費						
壹. 五.(一)	品質管理費	43.93	59.17	1.03	1.28	44.97	60.45
壹. 五.(二)	檢驗費	43.93	59.21	1.03	1.28	44.97	60.49
	廠商品質管制作業 費計						
壹.六	工程設計費						
壹. 六.(一)	補充地質調查	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
壹. 六.(二)	細部設計費	95.82	51.59	0.29	0.00	96.11	51.59
	工程設計費計						
壹.七	廠商管理什費	43.93	61.61	1.03	1.28	44.97	62.89
壹.八	工程保險	43.93	37.70	1.03	0.00	44.97	37.70
壹.九	營業稅	47.60	0.00	1.29	0.00	48.89	0.00
	發包工作費計						

2.2 計畫時程網狀圖

工程預定進度表（桿狀圖及網狀圖）（修正第一版）業經經濟部水利署南區水資源局於 111 年 1 月 4 日水南工字第 11006082520 號函同意，詳附件一「預定進度網狀圖（修正一版）」。

2.3 計畫時程桿狀圖

工程預定進度表（桿狀圖及網狀圖）（修正第一版）業經經濟部水利署南區水資源局於 111 年 1 月 4 日水南工字第 11006082520 號函同意，詳附件二「預定進度桿狀圖」。

2.4 預定進度及實際進度 S 曲線

工程預定進度表（桿狀圖及網狀圖）（修正第一版）業經經濟部水利署南區水資源局於 111 年 1 月 4 日水南工字第 11006082520 號函同意，詳附件三「預定進度（修正一版）及實際進度 S 曲線」。

2.5 工程現況說明

1. 設計作業現況

- (1) 「鏡面平壓管段-調整池及消能設施」細部設計圖及設計計算書（第一版第六次），統包廠商修改中。

2. 施工作業現況

- (1) W38 工作井：球閥窰井開挖。
- (2) 中正段：鋼軌樁打設、管溝開挖、水平支撐施作、鋼管吊裝、鋼管銲接、CLSM（工地型拌合）回填。
- (3) W44 工作井→W45 工作井：推進工程施作。
- (4) W48 工作井→沙田段：職安設施改善及佈設。

- (5) 沙田水管橋：A1 橋台 第一升層施作、排泥管安裝、鋼管吊裝、鋼管銲接。
- (6) 三埔水管橋：A1 橋台 第一升層施作、排泥管安裝、鋼管吊裝、鋼管銲接；A2 橋台 第一升層施作、排泥管安裝、鋼管吊裝、鋼管銲接。
- (7) W51 工作井：工作井開坑作業。
- (8) W52 工作井→W53 工作井：推進設備維修。
- (9) W54 工作井：工作井開坑作業。
- (10) W57 工作井：推進設備安裝。
- (11) W59 工作井→W58 工作井：鋼管銲接。
- (12) 鏡面水庫水管橋：A1 橋台 第三~五升層施作；A2 橋台 第四~五升層施作。

2.6 要徑分析

依據經濟部水利署南區水資源局 111 年 1 月 4 日水南工字第 11006082520 號函同意之工程預定進度表(桿狀圖及網狀圖)(修正第一版)，現階段要徑為「明挖管段－沙田段－19K+595-高陵橋」，詳附件一「預定進度網狀圖(修正一版)」及附件二「預定進度桿狀圖」。

2.7 施工里程碑

- 1. 110 年管線安裝長度 1,100m：於 110 年 8 月 4 日達成。
- 2. 111 年管線安裝長度 3,500m：施作中，作業進度詳表 2-2。

表 2-2 施工里程碑追蹤管控表 (至 111 年 7 月 15 日止)

位置	111 年施作 (m)	區段累計施作 (m)	區段長度 (m)	備註
龜丹段	30.4	752.4	809.0	
中正段	486.4	950.0	1,158.0	
沙田段	266.0	706.8	824.0	
三埔段	288.8	364.8	1,316.0	
平壓管段	76.0	235.6	518.5	
W41→W42	293.6	293.6	293.6	完成
W43→W44	321.6	321.6	321.6	完成
W44→W45	75.7	75.7	84.0	
W46→W48	102.2	354.4	354.4	完成
W52→W53	191.3	191.3	310.4	
W57→W58	0.0	0.0	148.8	
W59→W58	184.8	184.8	184.8	完成
111 年累計施作 (m)	2,316.8			
完成百分比 (%)	66.19%			

2.8 各項申辦作業狀況

本期無。

2.9 前後一個月作業項目時程圖

工程預定進度表 (桿狀圖及網狀圖) (修正第一版) 業經經濟部水利署南區水資源局於 111 年 1 月 4 日水南工字第 11006082520 號函同意，詳附件四「上月、本月及下月預定進度桿狀圖」。

2.10 差異分析、修正措施與建議

本期無。

第三章 工作數量報告

3.1 工作數量累計完成表

詳附件五「工作數量累計完成表」。

3.2 本期施工作業人員及機具統計

1. 施工作業人員統計

表 3-1 施工作業人員統計表（111 年 7 月 1 日至 111 年 7 月 15 日）

工別	單位	前期 作業人數	本期 作業人數	累計 作業人數	備註
施工總負責人	人	594	13	607	
專任工程人員	人	126	1	127	
工地主任	人	616	10	626	
品管人員	人	1749	30	1779	
職安人員	人	1176	21	1197	
工程師	人	3534	97	3631	
測量人員	人	54	0	54	
一般工（普通工）	人	7738	185	7923	
技術工（其他工）	人	6146	180	6326	
鋼筋工	人	721.5	33	754.5	
電銲工	人	2788	80	2868	
義交人員	人	4604	104	4708	
模板工	人	192	36	228	
混凝土工	人	946.5	0	946.5	
吊掛手	人	5	0	5	
鐵工	人	635	53	688	
機械操作工	人	0	0	0	

2. 施工作業機具統計

表 3-2 施工作業機具統計表（111 年 7 月 1 日至 111 年 7 月 15 日）

機具	單位	前期 使用機具數	本期 使用機具數	累計 使用機具數	備註
吊車	台	897	8	905	
卡車	台	970	17	987	
PC 17 或 30 或 50	台	644	17	661	
PC200	台	878.5	15	893.5	
鑽掘機（330）	台	244	2	246	
打樁機（470）	台	314	3	317	
CASE380	台	271	7	278	
山貓	台	34.5	0	34.5	
水車	台	467	13	480	
預拌車	台	499	12	511	
泵浦車	台	117	2	119	
壓路機	台	27.5	0	27.5	
割草機	台	31	0	31	
地改灌漿設備	組	28	0	28	
鑽孔設備	組	4	0	4	
割路機	台	1	0	1	
吊卡車	台	379	4	383	

3.3 晴雨表

詳附件六「晴雨表」。

第四章 圖說/文件送審管制表

4.1 文件送審管制總表

詳附件七「統包團隊應辦事項追蹤管制表」及附件七-1「計畫文件送審時程管制總表」。

4.2 圖說送審管制總表

詳附件七「統包團隊應辦事項追蹤管制表」及附件七-2「細部設計單元送審時程管制總表」。

本期施工照片



中正段：16k+770~16k+830 鋼軌樁打設




W44 工作井：推進工程施工



沙田水管橋：A1 橋台 鋼管吊裝



三埔水管橋：A1 橋台 第一層模板組立

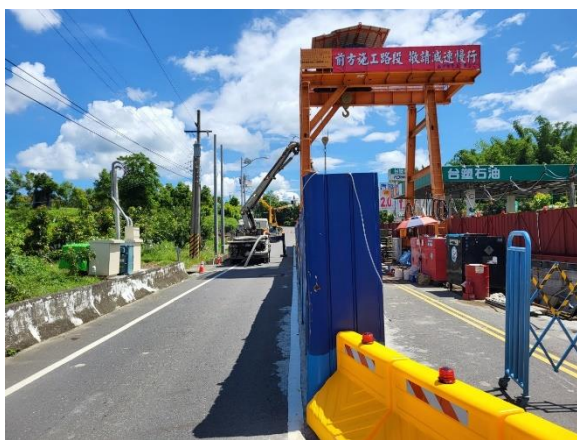

W57 工作井：推進設備安裝




鏡面水庫水管橋：A2 橋台 第四層澆置

附件

- 附件一 預定進度網狀圖（修正一版）
- 附件二 預定進度桿狀圖
- 附件三 預定進度（修正一版）及實際進度 S 曲線
- 附件四 上月、本月及下月預定進度桿狀圖
- 附件五 工作數量累計完成表
- 附件六 晴雨表
- 附件七 統包團隊應辦事項追蹤管制表
- 附件七-1 計畫文件送審時程管制總表
- 附件七-2 細部設計單元送審時程管制總表

附件一

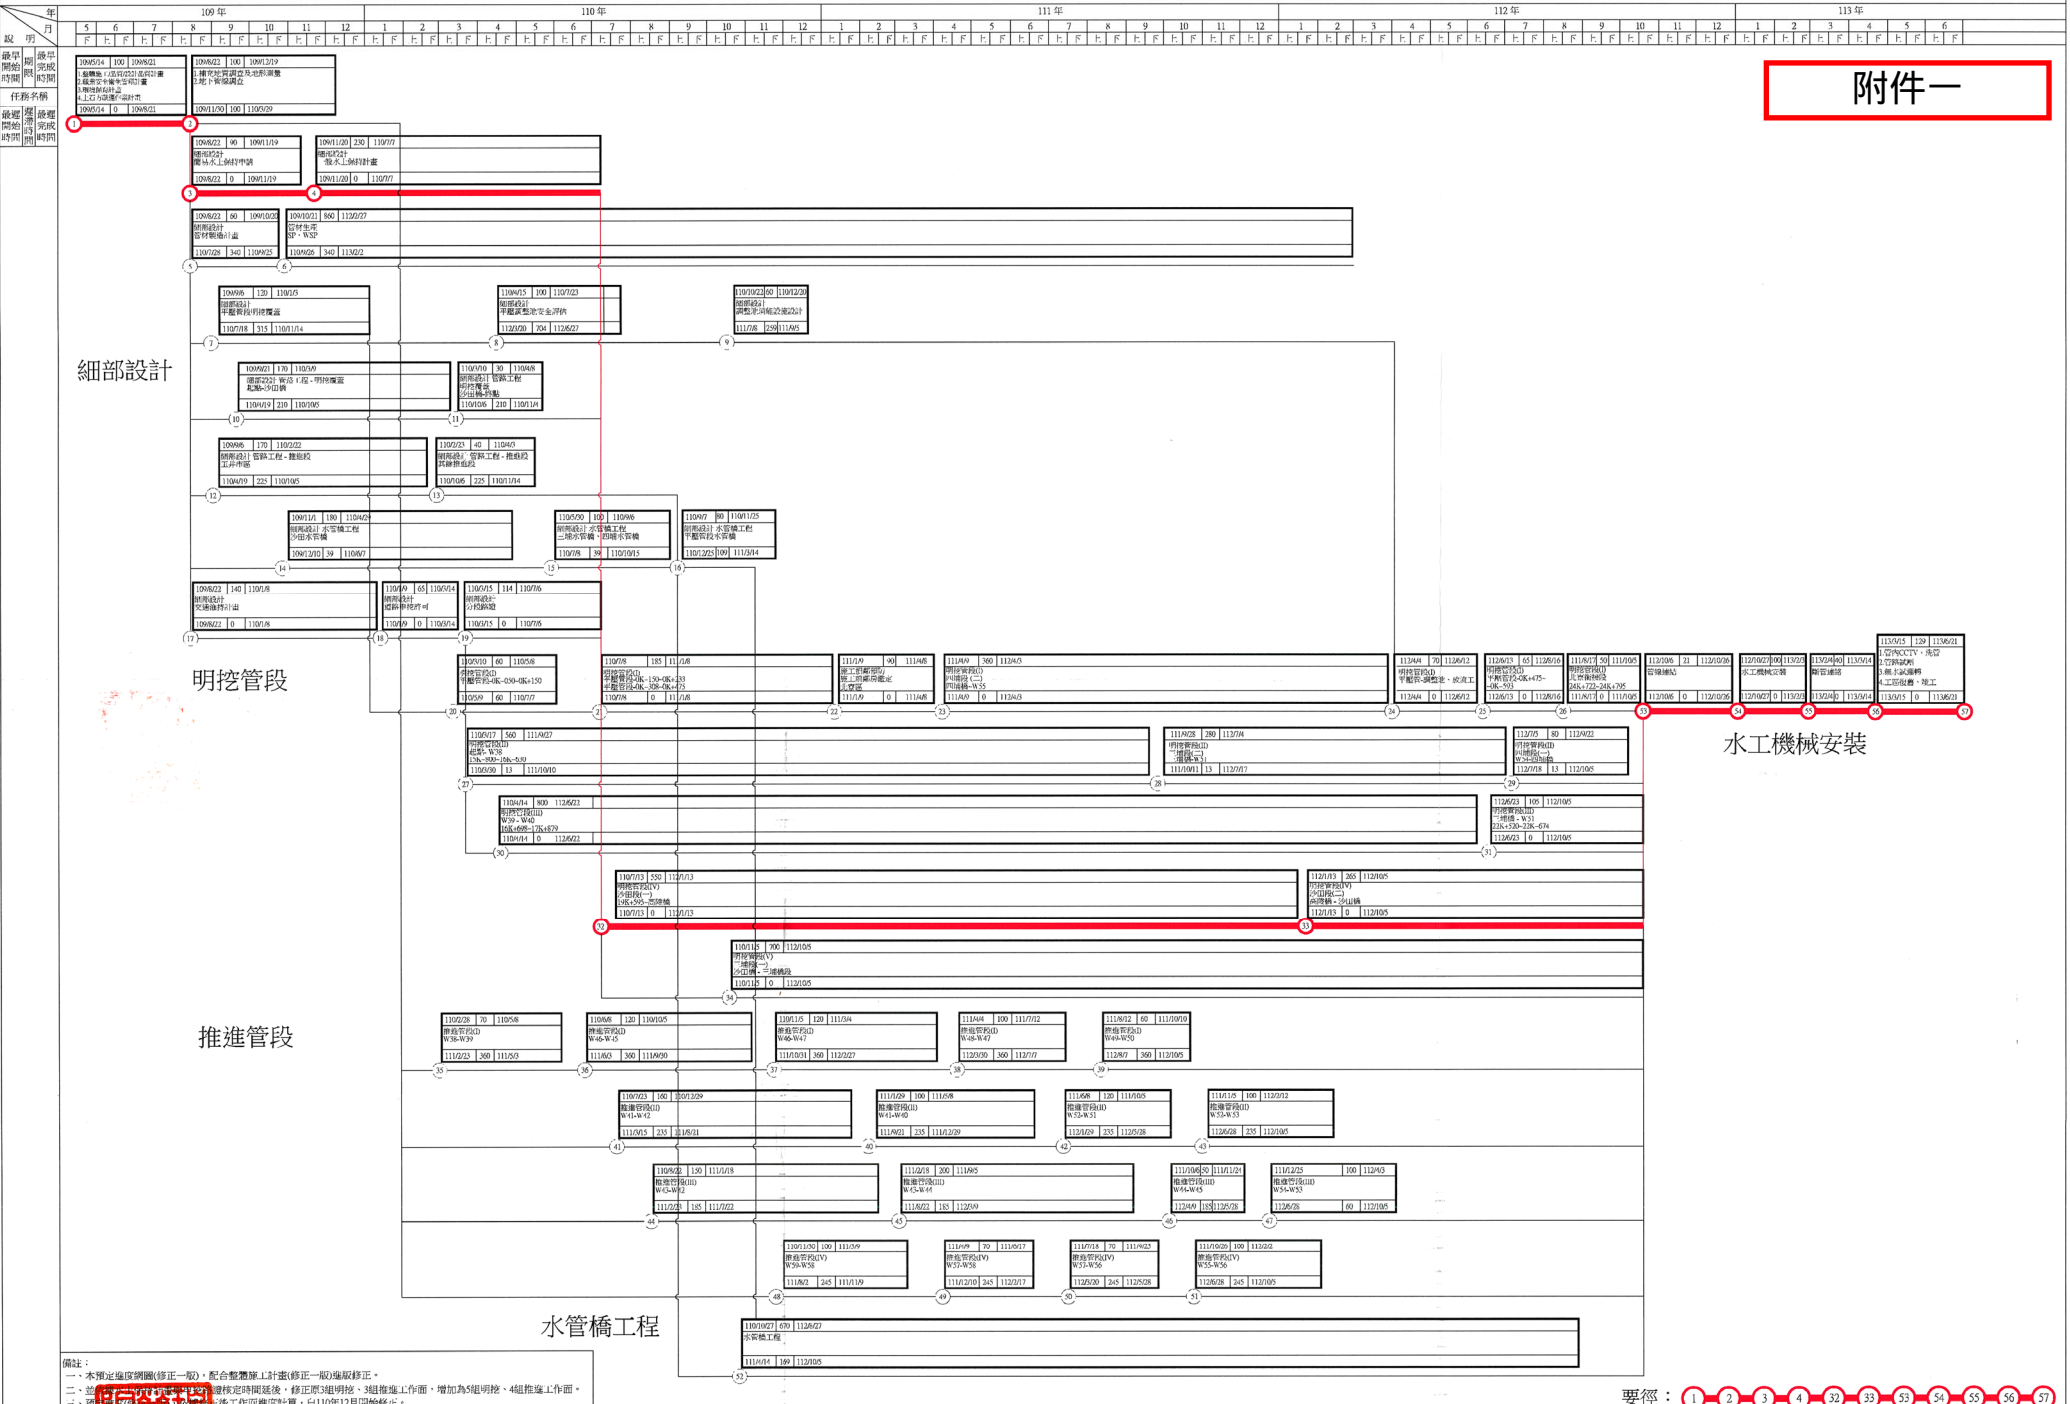


備註：
 一、本預定進度網狀圖(修正一版)、配合總機聯工計畫(修正一版)編取修正。
 二、並根據本計畫所定各項工作之預定進度，修正原3組明挖、3組推進工作，增加5組明挖、4組推進工作。
 三、本預定進度網狀圖係根據本計畫所定各項工作之預定進度，自110年12月開始修正。

預定	當月	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	45.0	45.5	46.0	46.5	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	50.0	50.5	51.0	51.5	52.0	52.5	53.0	53.5	54.0	54.5	55.0	55.5	56.0	56.5	57.0																													
進度	累計	0.0	0.25	0.65	1.05	1.45	1.85	2.25	2.65	3.05	3.45	3.85	4.25	4.65	5.05	5.45	5.85	6.25	6.65	7.05	7.45	7.85	8.25	8.65	9.05	9.45	9.85	10.25	10.65	11.05	11.45	11.85	12.25	12.65	13.05	13.45	13.85	14.25	14.65	15.05	15.45	15.85	16.25	16.65	17.05	17.45	17.85	18.25	18.65	19.05	19.45	19.85	20.25	20.65	21.05	21.45	21.85	22.25	22.65	23.05	23.45	23.85	24.25	24.65	25.05	25.45	25.85	26.25	26.65	27.05	27.45	27.85	28.25	28.65	29.05	29.45	29.85	30.25	30.65	31.05	31.45	31.85	32.25	32.65	33.05	33.45	33.85	34.25	34.65	35.05	35.45	35.85	36.25	36.65	37.05	37.45	37.85	38.25	38.65	39.05	39.45	39.85	40.25	40.65	41.05	41.45	41.85	42.25	42.65	43.05	43.45	43.85	44.25	44.65	45.05	45.45	45.85	46.25	46.65	47.05	47.45	47.85	48.25	48.65	49.05	49.45	49.85	50.25	50.65	51.05	51.45	51.85	52.25	52.65	53.05	53.45	53.85	54.25	54.65	55.05	55.45	55.85	56.25	56.65	57.05

廠商： [Red Seal] 工務所主任： [Red Seal] 課長： [Red Seal] 主任工程司： [Red Seal] 副局長： [Red Seal] 局長： [Red Seal]

要徑： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

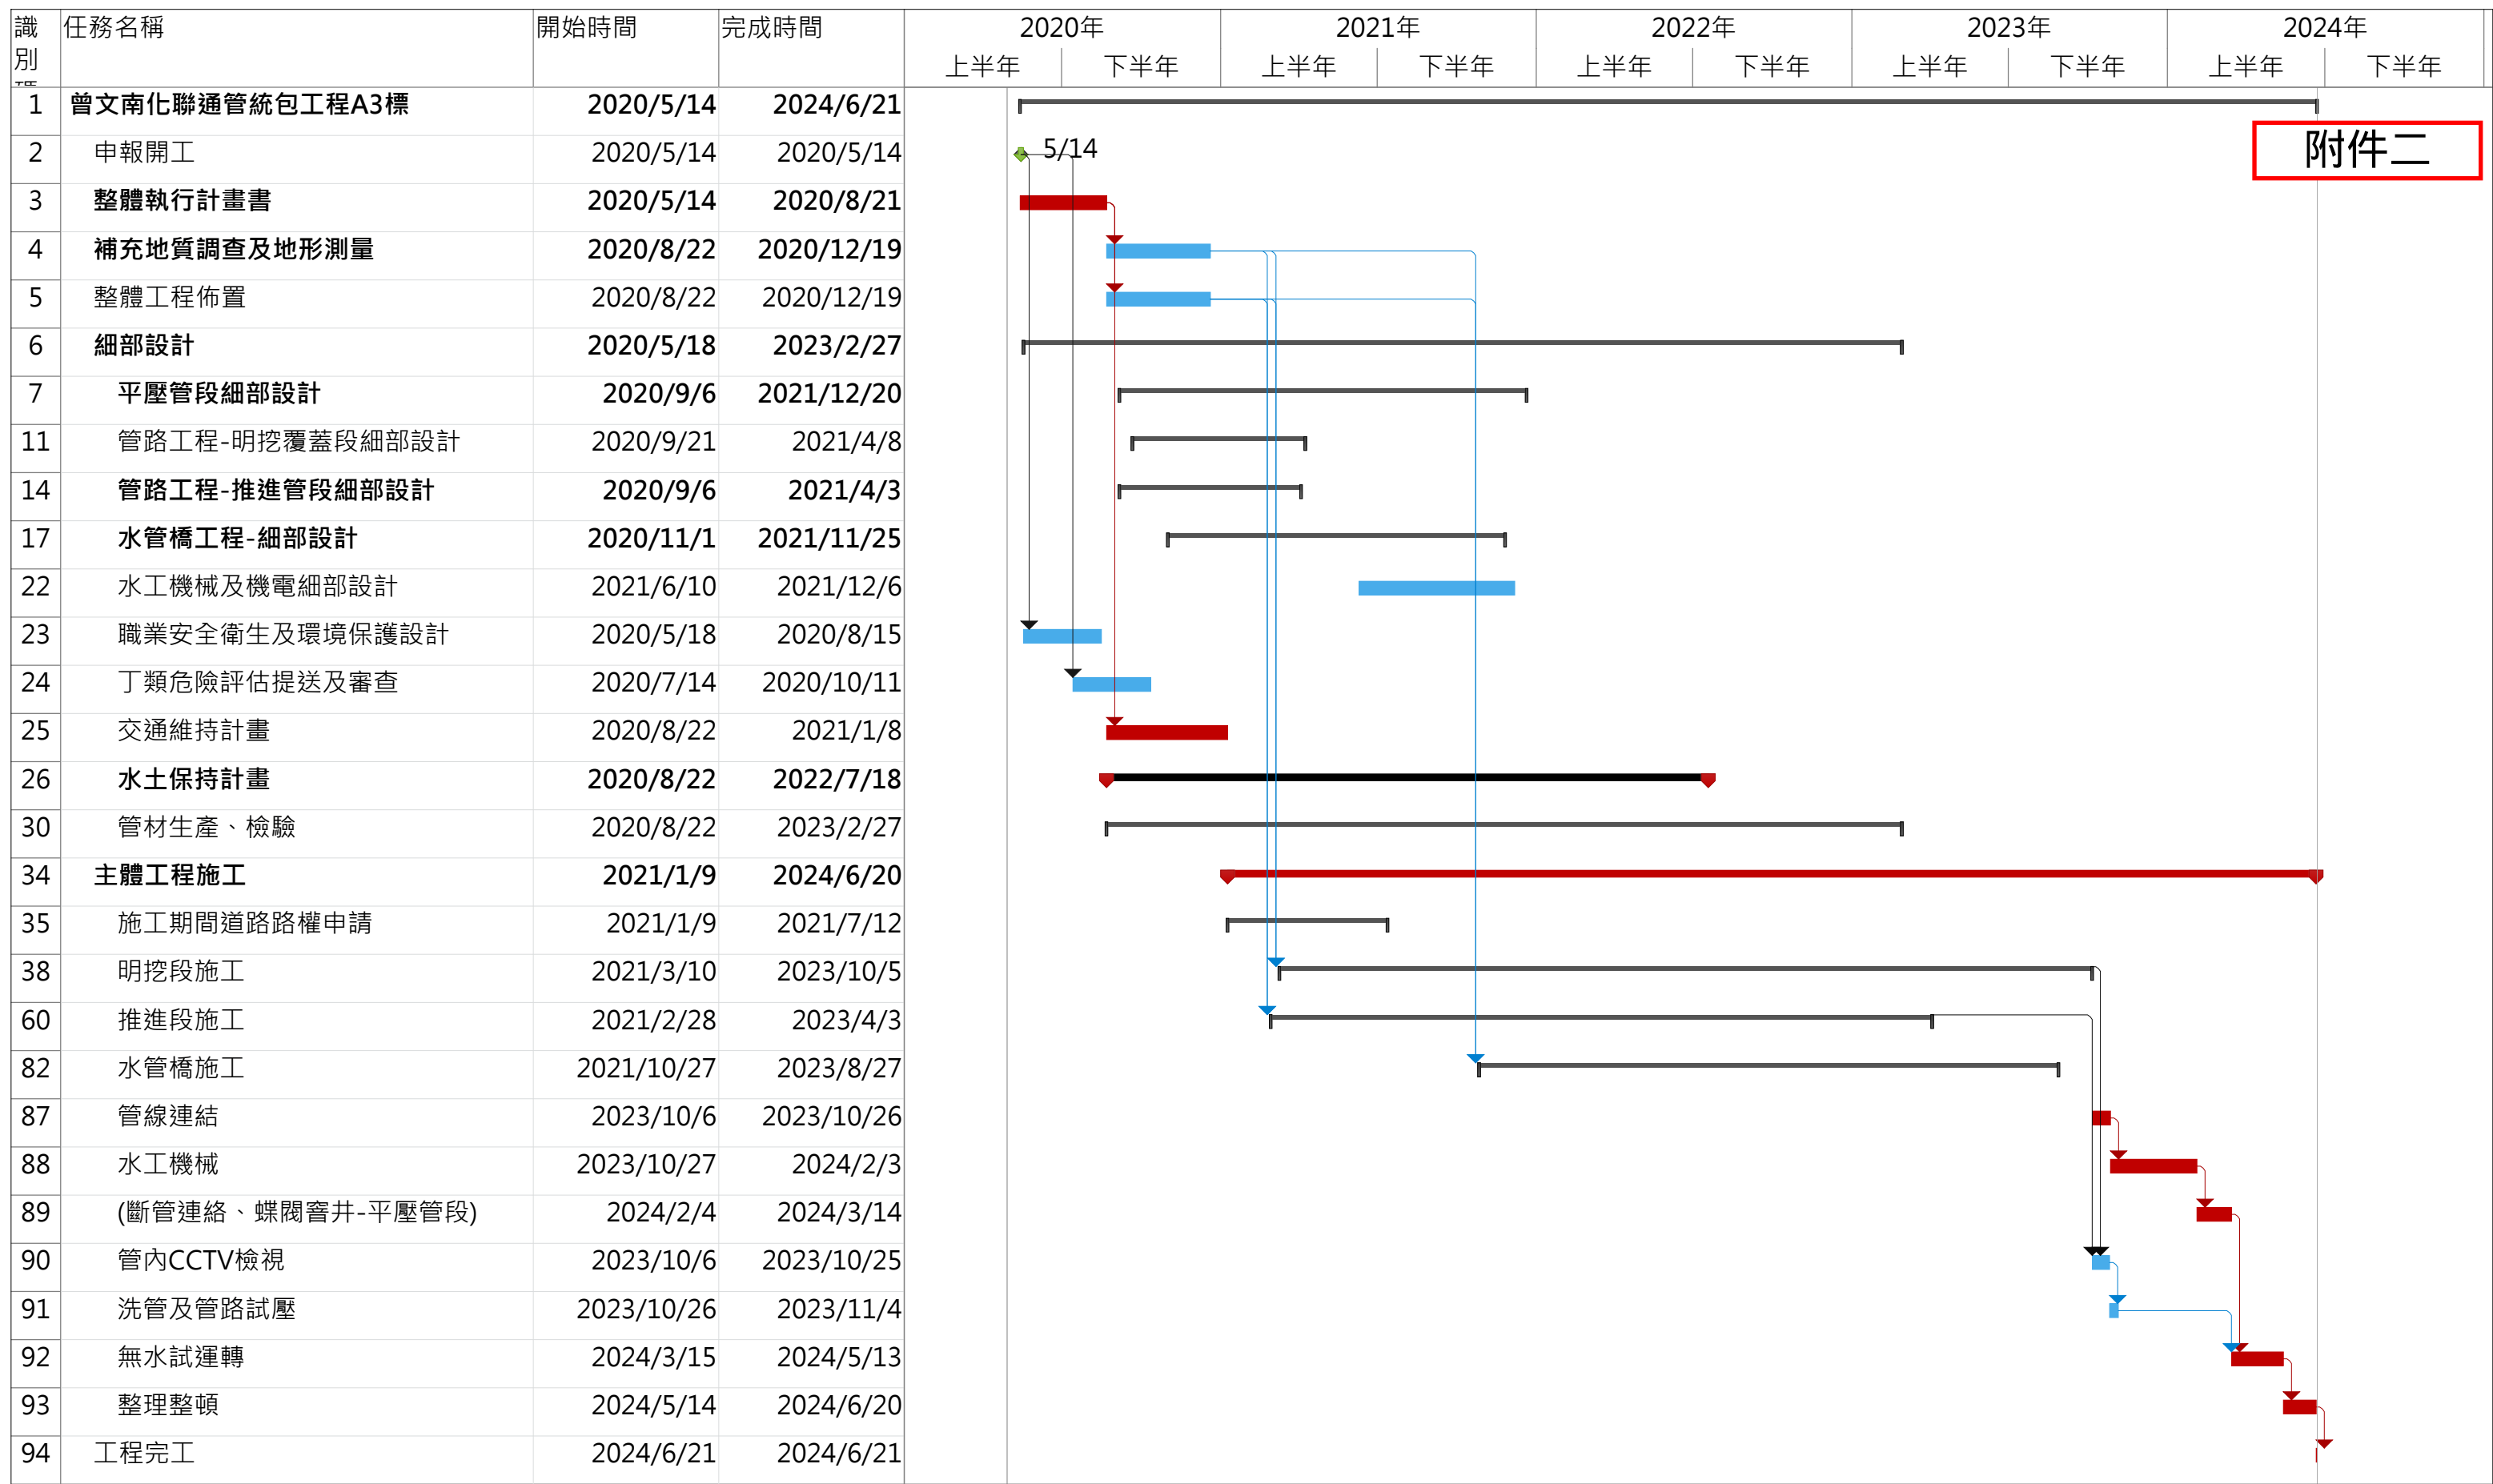


附件二

專案: 管制表1090712(V3) 日期: 2022/1/20	任務 分割 里程碑 摘要	專案摘要報告 外部任務 外部里程碑 非作用中的任務	非作用中的里程碑 非作用中的摘要 手動任務 僅包含工期	手動上顯型摘要 手動摘要 僅定義開始日期 僅包含完成時間	期限 要徑 要徑分隔 比較基準	進度 進度落後
-------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------

附件三

曾文南化聯通管統包工程A3標 預定及實際進度S曲線 (修正一版) (提送 110.12)

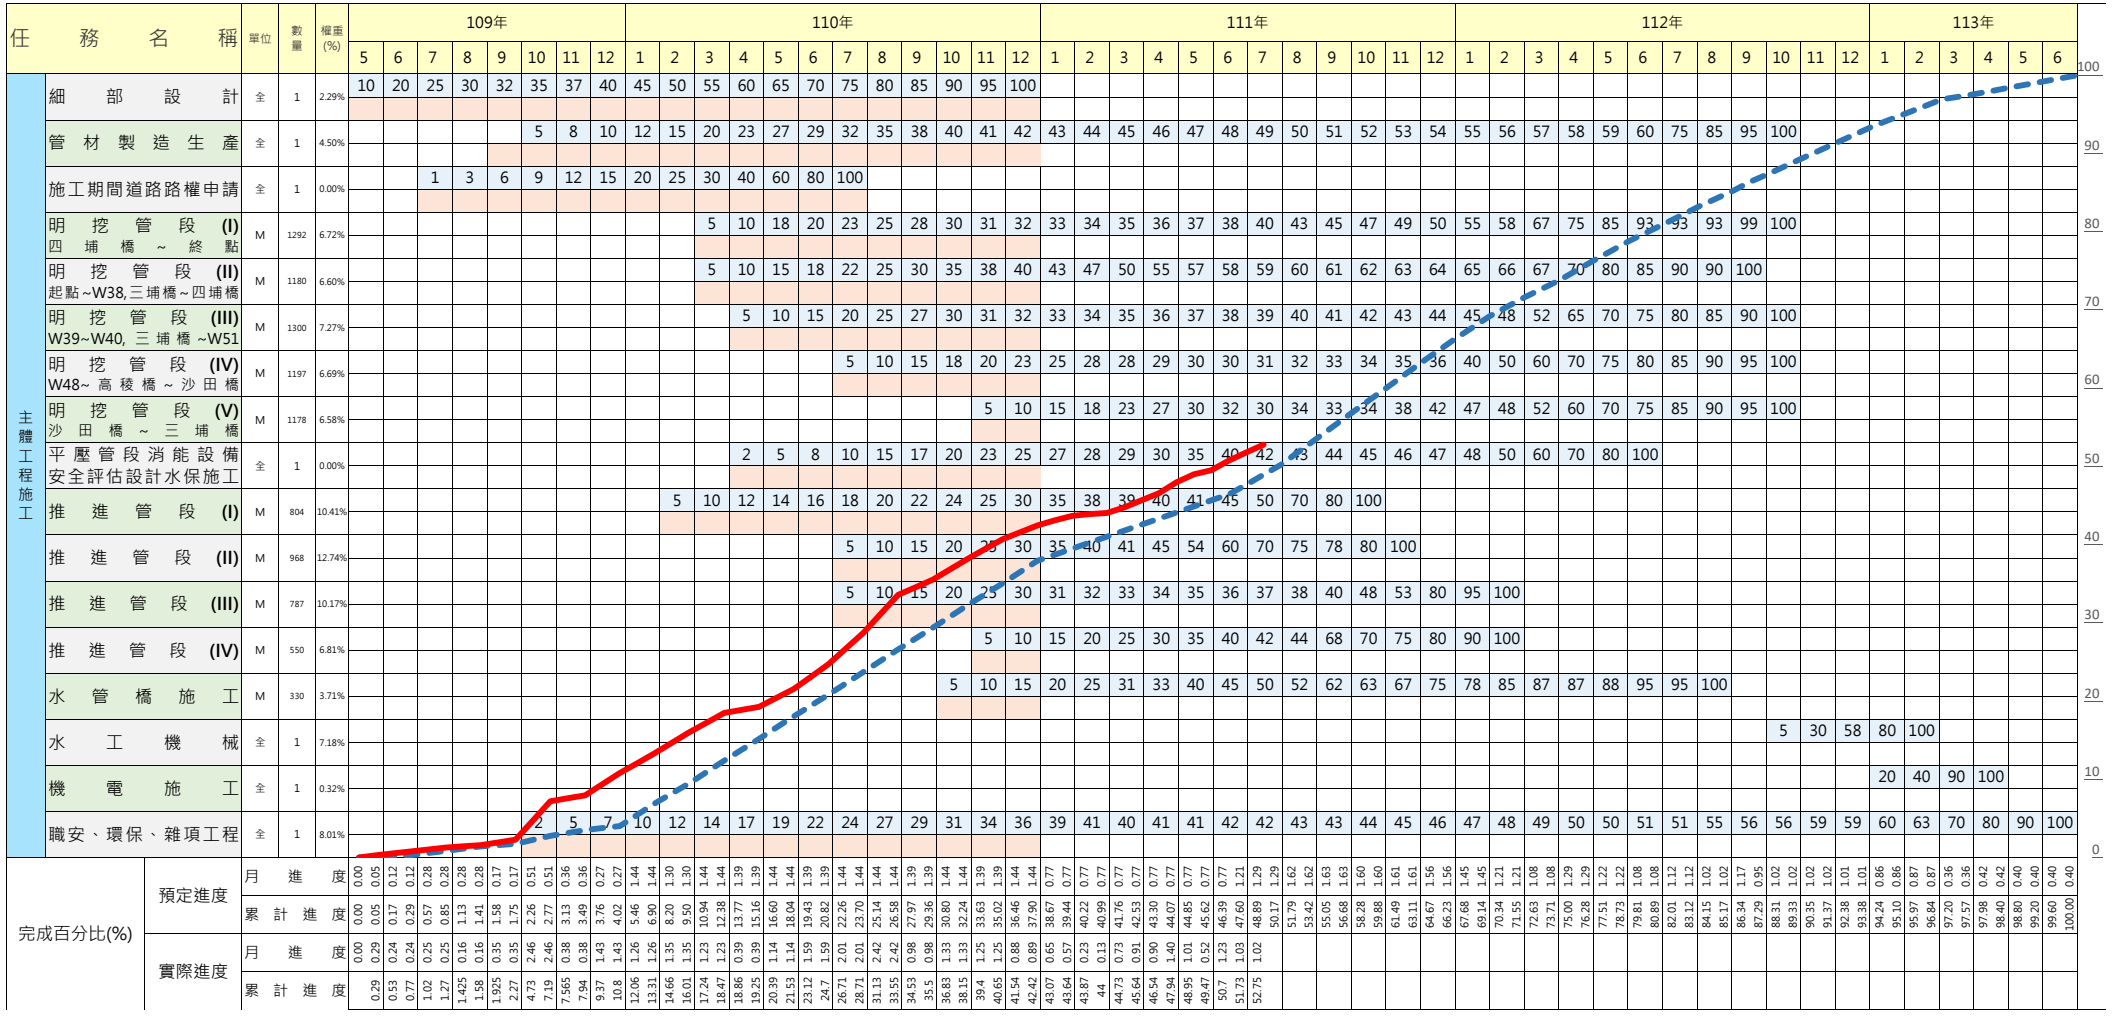

附件四

識別	任務名稱	開始時間	完成時間	五月	六月	七月	八月	九月
1	曾文南化聯通管統包工程A3標	2020/5/14	2024/6/21					
2	申報開工	2020/5/14	2020/5/14					
3	整體執行計畫書	2020/5/14	2020/8/21					
4	補充地質調查及地形測量	2020/8/22	2020/12/19					
5	整體工程佈置	2020/8/22	2020/12/19					
6	細部設計	2020/5/18	2023/2/27					
7	平壓管段細部設計	2020/9/6	2021/12/20					
8	平壓塔段明挖覆蓋設計	2020/9/6	2021/1/3					
9	平壓池及安全評估設計	2021/4/15	2021/7/23					
10	調整池及消能設施設計	2021/10/22	2021/12/20					
11	管路工程-明挖覆蓋段細部設計	2020/9/21	2021/4/8					
12	工程起點至W38明挖段主管段設計	2020/9/21	2021/3/9					
13	W38至工程終點明挖段主管段設計	2021/3/10	2021/4/8					
14	管路工程-推進管段細部設計	2020/9/6	2021/4/3					
15	玉井市區推進管段主管段設計	2020/9/6	2021/2/22					
16	其餘推進管段主管段設計	2021/2/23	2021/4/3					
17	水管橋工程-細部設計	2020/11/1	2021/11/25					
18	沙田水管橋細部設計	2020/11/1	2021/4/29					
19	三埔水管橋細部設計	2021/5/30	2021/9/6					
20	四埔水管橋細部設計	2021/5/30	2021/9/6					
21	平壓段水管橋細部設計	2021/9/7	2021/11/25					
22	水工機械及機電細部設計	2021/6/10	2021/12/6					
23	職業安全衛生及環境保護設計	2020/5/18	2020/8/15					
24	丁類危險評估提送及審查	2020/7/14	2020/10/11					
25	交通維持計畫	2020/8/22	2021/1/8					
26	水土保持計畫	2020/8/22	2022/7/18					
27	簡易水土保持計畫	2020/8/22	2020/11/19					
28	一般水土保持計畫	2020/11/20	2021/7/7					
29	鏡面水庫放流工水土保持計畫	2022/1/20	2022/7/18					
30	管材生產、檢驗	2020/8/22	2023/2/27					
31	管材製造計畫	2020/8/22	2020/10/20					
32	管材生產-1	2020/10/21	2020/12/19					
33	管材生產-2	2020/12/20	2023/2/27					
34	主體工程施工	2021/1/9	2024/6/20					
35	施工期間道路路權申請	2021/1/9	2021/7/12					
36	首次提送全段路權申請	2021/1/9	2021/3/14					
37	分段路證同意	2021/3/15	2021/7/12					
38	明挖段施工	2021/3/10	2023/10/5					
39	明挖管段一組	2021/3/10	2023/10/5					
48	第二工作面	2021/3/17	2023/9/22					
52	第三工作面	2021/4/14	2023/10/5					
55	第四工作面	2021/7/13	2023/10/5					
58	第五工作面	2021/11/5	2023/10/5					
60	推進段施工	2021/2/28	2023/4/3					
61	第一機組	2021/2/28	2022/10/10					
67	第二機組	2021/7/23	2023/2/12					
72	第三機組	2021/8/22	2023/4/3					
77	第四機組	2021/11/30	2023/2/2					
82	水管橋施工	2021/10/27	2023/8/27					
83	沙田橋(L=76M)	2021/10/27	2023/4/19					
84	平壓管橋(L=79M)	2021/12/26	2023/6/18					
85	三埔橋(L=101M)	2022/1/5	2023/6/28					
86	四埔橋(L=83M)	2022/3/6	2023/8/27					
87	管線連結	2023/10/6	2023/10/26					
88	水工機械	2023/10/27	2024/2/3					
89	(斷管連絡、蝶閥窰井-平壓管段)	2024/2/4	2024/3/14					
90	管內CCTV檢視	2023/10/6	2023/10/25					
91	洗管及管路試壓	2023/10/26	2023/11/4					
92	無水試運轉	2024/3/15	2024/5/13					
93	整理整頓	2024/5/14	2024/6/20					
94	工程完工	2024/6/21	2024/6/21					

上月進度 (6月)

本月進度 (7月)

下月進度 (8月)

專案: 管制表1090712(V3) 日期: 2022/7/16

任務分割 里程碑

摘要 專家摘要報告 外部任務

外部里程碑 非作用中的任務 非作用中的里程碑

非作用中的摘要 僅包含工期

手動上顯型摘要 手動摘要 僅定義開始日期

僅包含完成時間 期限 要徑

要徑分隔 比較基準 進度

進度落後

經濟部水利署南區水資源局
工作數量累計完成表

附件五

工程名稱：曾文南化聯通管統包工程A3標
承攬廠商：瑞鋒營造有限公司
契約編號：D51-310-03
契約金額：參拾億伍仟萬元整

項次	工程項目	單位	契約數量	契約單價	金額	前期完成數量			本期完成數量			累計完成數量		
						數量	複價	百分比	數量	複價	百分比	數量	複價	百分比
壹	發包工作費													
壹.一	主體工程													
壹.一.(一)	管路工程													
壹.一.(一).1	2600mmφ推進用鋼管(WSP)及推進施工	M	3,109	354,000	1,100,586,000	2278.616	806,630,022	73.2910%	48.181	17,056,200	1.5497%	2326.797	823,686,222	74.8407%
壹.一.(一).2	2600mmφ鋼管及安裝埋設(含工地銲接)	M	6,147	111,100	682,931,700	3586.608	398,472,167	58.3473%	24.178	2,686,220	0.3933%	3610.787	401,158,387	58.7406%
壹.一.(一).3	2600mmφ推進管工作井	處	22	4,000,000	88,000,000	15.000	60,000,000	68.1818%	1.867	7,466,667	8.4848%	16.867	67,466,667	76.6667%
壹.一.(一).4	挖方(機械)	M3	138,843	40	5,553,720	67169.380	2,686,775	48.3779%	1880.500	75,220	1.3544%	69049.880	2,761,995	49.7323%
壹.一.(一).5	控制性低強度回填材料及施工·混凝土用粒料	M3	79,069	1,630	128,882,470	36639.755	59,722,800	46.3390%	728.670	1,187,732	0.9216%	37368.425	60,910,532	47.2605%
壹.一.(一).6	瀝青混凝土刨除	M2	39,857	130	5,181,410	15530.500	2,018,965	38.9656%	0.000	0	0.0000%	15530.500	2,018,965	38.9656%
壹.一.(一).7	瀝青混凝土鋪面復舊	M2	18,652	750	13,989,000	2800.000	2,100,000	15.0118%	0.000	0	0.0000%	2800.000	2,100,000	15.0118%
壹.一.(一).8	道路施工及復舊	M2	21,205	1,800	38,169,000	11596.481	20,873,666	54.6875%	0.000	0	0.0000%	11596.481	20,873,666	54.6875%
壹.一.(一).9	制水閘管井	座	5	2,000,000	10,000,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(一).10	排泥閘管井	座	13	320,000	4,160,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(一).11	排氣閘管井及路肩地面護框	座	18	320,000	5,760,000	0.000	0	0.0000%	2.000	640,000	#####	2.000	640,000	11.1111%
壹.一.(一).12	可撓管管井	座	8	840,000	6,720,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(一).13	平壓管路調整池及放流工	式	1	5,000,000	5,000,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(一).14	φ2600mm水管橋(SP)及工地安裝	M	333	300,000	99,900,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(一).15	地盤穩定及管路營運安全措施	式	1	19,000,000	19,000,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
	小計				2,213,833,300		1,352,504,395	61.0933%		29,112,039	1.3150%		1,381,616,434	62.41%
壹.一.(二)	水工機械													
壹.一.(二).1	φ2600mm 電動球閥及工地安裝	組	4	28,670,000	114,680,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(二).2	φ2600mm 電動蝶閥及工地安裝	組	1	4,000,000	4,000,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(二).3	閘壓力計與相關儀表設備製作安裝	組	10	110,000	1,100,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(二).4	φ2600mm 雙拉桿伸縮接頭及工地安裝	組	5	2,321,280	11,606,400	3.750	8,704,800	75.0000%	0.800	1,857,024	#####	4.550	10,561,824	91.0000%
壹.一.(二).5	φ2600mm 鋼製可撓管及工地安裝	組	8	5,553,600	44,428,800	6.000	33,321,600	75.0000%	0.000	0	0.0000%	6.000	33,321,600	75.0000%
壹.一.(二).6	φ400mm 排泥閥及工地安裝	組	26	265,512	6,903,312	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(二).7	φ400mm 雙拉桿伸縮接頭及工地安裝	組	13	107,640	1,399,320	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(二).8	φ200mm 複合式排氣閥及工地安裝	組	18	143,520	2,583,360	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(二).9	φ200mm 彈性座封閥及工地安裝	組	27	22,000	594,000	6.750	148,500	25.0000%	0.000	0	0.0000%	6.750	148,500	25.0000%
壹.一.(二).10	φ200mm 緩衝塞閥及工地安裝	組	18	56,000	1,008,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.一.(二).11	φ2600mm 超音波流量計及安裝費	組	1	5,000,000	5,000,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
	小計				193,303,192		42,174,900	21.8180%		1,857,024	0.9607%		44,031,924	22.7787%

項次	工程項目	單位	契約數量	契約單價	金額	前期完成數量			本期完成數量			累計完成數量		
						數量	複價	百分比	數量	複價	百分比	數量	複價	百分比
壹.一.(三)	機電工程													
壹.一.(三).1	遠方監控站	組	5	1,750,000	8,750,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
	小計				8,750,000		0	0.0000%		0	0.0000%		0	0.0000%
	主體工程計				2,415,886,492		1,394,679,295	57.7295%		30,969,063	1.2819%		1,425,648,358	59.0114%
壹.二	雜項工程													
壹.二.(一)	施工便道施設及維護費	M	1,200	8,000	9,600,000	370.000	2,960,000	30.8333%	0.000	0	0.0000%	370.000	2,960,000	30.8333%
壹.二.(二)	工程告示牌·長300x寬170cm	面	10	10,000	100,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.二.(三)	工地參訪費	式	1	3,000,000	3,000,000	0.592	1,776,151	59.2050%	0.013	38,456	1.2819%	0.605	1,814,607	60.4869%
壹.二.(四)	施工攝影、拍照及文件製作費	式	1	720,000	720,000	0.592	426,276	59.2050%	0.013	9,230	1.2819%	0.605	435,506	60.4869%
壹.二.(五)	3D動畫及工程模型製作	式	1	4,000,000	4,000,000	0.500	2,000,000	50.0000%	0.000	0	0.0000%	0.500	2,000,000	50.0000%
壹.二.(六)	工地影像監控系統	式	1	3,600,000	3,600,000	0.592	2,131,381	59.2050%	0.013	46,148	1.2819%	0.605	2,177,529	60.4869%
壹.二.(七)	工地辦公室及材料倉庫	式	1	8,500,000	8,500,000	1.000	8,500,000	100.0000%	0.000	0	0.0000%	1.000	8,500,000	100.0000%
壹.二.(八)	工地辦公室及倉庫用地租金	式	1	3,000,000	3,000,000	0.592	1,776,151	59.2050%	0.013	38,456	1.2819%	0.605	1,814,607	60.4869%
壹.二.(九)	工地電力、電信、給水費及瓦斯費	式	1	32,400,000	32,400,000	0.583	18,880,026	58.2717%	0.013	415,333	1.2819%	0.596	19,295,359	59.5536%
壹.二.(十)	既有道路施工中維護費	式	1	6,000,000	6,000,000	0.592	3,552,301	59.2050%	0.013	76,914	1.2819%	0.605	3,629,215	60.4869%
壹.二.(十一)	施工擋排抽水費	式	1	3,000,000	3,000,000	0.592	1,776,151	59.2050%	0.013	38,456	1.2819%	0.605	1,814,607	60.4869%
壹.二.(十二)	施工測量及放樣	式	1	1,880,000	1,880,000	0.592	1,113,054	59.2050%	0.013	24,100	1.2819%	0.605	1,137,154	60.4869%
壹.二.(十三)	地上物處理及雜物清理費	式	1	3,000,000	3,000,000	0.592	1,776,151	59.2050%	0.013	38,456	1.2819%	0.605	1,814,607	60.4869%
壹.二.(十四)	工地拆除復舊費	式	1	500,000	500,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.二.(十五)	汛期工地防災減災作業費	全	1	3,000,000	3,000,000	0.592	1,776,151	59.2050%	0.013	38,456	1.2819%	0.605	1,814,607	60.4869%
壹.二.(十六)	竣工文件及竣工圖	式	1	1,280,000	1,280,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.二.(十七)	管內CCTV檢視費	M	9,588	320	3,068,160	1714.000	548,480	17.8765%	0.000	0	0.0000%	1714.000	548,480	17.8765%
壹.二.(十八)	無水試運轉測試費	式	1	500,000	500,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.二.(十九)	配合整體功能試運轉測試費	式	1	3,600,000	3,600,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.二.(二十)	管路試水壓費	式	1	1,900,000	1,900,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.二.(二十一)	φ2600mm 盲蓋封板	式	1	52,000	52,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.二.(二十二)	洗管作業費	式	1	1,000,000	1,000,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.二.(二十三)	資料編撰及送審	式	1	5,000,000	5,000,000	0.592	2,960,251	59.2050%	0.013	64,094	1.2819%	0.605	3,024,345	60.4869%
壹.二.(二十四)	工區既有結構物及設施復舊	式	1	2,000,000	2,000,000	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%	0.000	0	0.0000%
壹.二.(二十五)	地下管線探管與試挖費	式	1	750,000	750,000	0.592	444,038	59.2050%	0.013	9,614	1.2819%	0.605	453,652	60.4869%
壹.二.(二十六)	地下管線臨時吊掛、遷移及復舊	式	1	150,000	150,000	0.592	88,808	59.2050%	0.013	1,922	1.2819%	0.605	90,730	60.4869%
壹.二.(二十七)	鄰近建築物現況調查與監測	式	1	5,906,800	5,906,800	0.892	5,269,162	89.2050%	0.013	75,719	1.2819%	0.905	5,344,881	90.4869%
壹.二.(二十八)	橋梁下推進施工中監測	式	1	200,000	200,000	0.592	118,410	59.2050%	0.013	2,564	1.2819%	0.605	120,974	60.4869%
壹.二.(二十九)	其他雜項工程	式	1	10,000,000	10,000,000	0.592	5,920,502	59.2050%	0.013	128,189	1.2819%	0.605	6,048,691	60.4869%
	雜項工程計				117,706,960		63,793,444	54.1968%		1,046,107	0.8887%		64,839,551	55.0856%
壹.三	職業安全衛生費													
壹.三.(一)	職業安全衛生教育訓練	次	17	30,000	510,000	16.000	480,000	94.1176%	0.000	0	0.0000%	16.000	480,000	94.1176%
壹.三.(二)	職業安全衛生管理員	月	50	45,000	2,250,000	25.000	1,125,000	50.0000%	0.000	0	0.0000%	25.000	1,125,000	50.0000%
壹.三.(三)	職業安全衛生·宣導	式	1	800,000	800,000	0.592	473,640	59.2050%	0.013	10,255	1.2819%	0.605	483,895	60.4869%
壹.三.(四)	個人防護具	式	1	800,000	800,000	0.592	473,640	59.2050%	0.013	10,255	1.2819%	0.605	483,895	60.4869%
壹.三.(五)	消防及急救設備	式	1	200,000	200,000	0.592	118,410	59.2050%	0.013	2,564	1.2819%	0.605	120,974	60.4869%
壹.三.(六)	施工圍籬	式	1	2,000,000	2,000,000	0.592	1,184,100	59.2050%	0.013	25,638	1.2819%	0.605	1,209,738	60.4869%
壹.三.(七)	活動廁所	式	1	250,000	250,000	0.592	148,013	59.2050%	0.013	3,204	1.2819%	0.605	151,217	60.4869%

附件六

晴雨表

111年度		曾文南化聯通管統包工程A3標 晴雨表 (截至111年7月15日)																														統計天數(天)																												
日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	晴	雨	陰	颶																								
月份	時段																																																											
1	上午	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	29	0.5	1.5	/																						
	下午	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰	晴	晴	晴	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	29	0.5	1.5	/																				
2	上午	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	雨	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴							22.5	5	0.5	/																					
	下午	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	雨	陰	雨	晴	晴	晴	晴	晴							22.5	5	0.5	/																					
3	上午	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	27.5	3.5	/	/																				
	下午	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	27.5	3.5	/	/																			
4	上午	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	29	1	/	/																				
	下午	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	29	1	/	/																			
5	上午	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	陰	雨	雨	雨	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	雨	雨	17.5	11.5	2	/																					
	下午	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	陰	陰	雨	雨	雨	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	雨	雨	17.5	11.5	2	/																					
6	上午	晴	晴	晴	陰	晴	晴	雨	雨	陰	陰	陰	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	22	3.5	4.5	/																				
	下午	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	雨	陰	陰	陰	陰	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	22	3.5	4.5	/																					
7	上午	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴																					11.5	2.5	1	/																				
	下午	雨	雨	陰	陰	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴																					11.5	2.5	1	/																				
8	上午																																			/	/	/	/																					
	下午																																			/	/	/	/																					
9	上午																																			/	/	/	/																					
	下午																																			/	/	/	/																					
10	上午																																			/	/	/	/																					
	下午																																			/	/	/	/																					
11	上午																																			/	/	/	/																					
	下午																																			/	/	/	/																					
12	上午																																			/	/	/	/																					
	下午																																			/	/	/	/																					
晴	代表晴天																										陰																										本年度累計				159	27.5	9.5	/
雨	代表雨天																										颶																										總工期累計				664	109.5	18.5	1

經濟部水利署南區水資源局 曾文南化聯通管統包工程A3標

統包團隊應辦事項追蹤管制表

附件七

日期： 111/07/15

項次	階段	契約規定/完成期限/提送期限			應辦事項		辦理單位/人員		辦理情形說明	備註
		契約金額	開工日	竣工日	設計	施工				
決標日	109/4/21	3,050,000,000								
簽約日	109/5/4	109/5/14	113/6/21	履約工期	1500日曆天					
1	設計	簽約	109/5/4	109/5/4	簽約事宜	與南水局契約列印、裝訂、用印		瑞鋒 龔秀琴	於5/4日函文提送契約文件(瑞鋒字第1090000185號函)	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
2	設計	簽約後10日內	109/5/14	109/5/14	提報開工	採購契約第7條.(一).2.機關簽約日之次日起10日內開工	永鉅 張家祥	瑞鋒 蘇純瑩	於5/13日函文提送開工文件(瑞鋒字第1090000204號函)	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
3	設計	決標通知21日內	109/5/12		履約保證金	投標須知第24條,接獲繳納通知日次日起算21日		瑞鋒 蘇純瑩		<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
4	設計	決標通知21日內	109/5/12		鄰損保證金	投標須知補充規定第10條,防鄰損保證金得以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票或設定質權之金融機構定期存款單為之。保證金以金融機構簽發之本票或支票、保付支票或郵政匯票繳交者,應為即期並以機關為受款人。保證金以設定質權之金融機構定期存款單繳交者,應記載機關為質權人,並加註拋棄行使抵銷權。驗收合格且無待解決事項後,如未動支或尚有剩餘時,一次無息退還。			於5/25日南水局檢選防鄰損保證金之定期存款單質權設定申請書(水南工字第10906029890號函)	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
5	設計	簽約後30日內	109/6/3	109/5/29	公共工程專業技師簽證執行計畫	採購契約第9條.(六).1.廠商須於簽約後30日內提報其實地簽證之執行計畫,經機關同意後執行之。屬設計簽證者,包括:■補充測量、■補充地質調查與鑽探、■施工規範與施工說明、■數量計算、■預算書、■設計圖與計算書、■施工安全評估、■工地環境保護監測與防治。	永鉅 張家祥		於5/29日函文提送實施簽證計畫(瑞鋒字第1090000247號函) 於6/10日檢送實施簽證計畫審查意見(水南工字第10953037510號函) 於6/15日函文提送實施簽證執行計畫(第二次)(瑞鋒字第1090000296號函) 於6/23日檢送實施簽證執行計畫(第二次)審查意見(水南工字第10953041280號函) 於7/2日函文提送實施簽證計畫(第三次)(瑞鋒字第1090000333號函) 於7/2日函文提送實施簽證執行計畫(第三次)(瑞鋒字第1090000333號函) 於7/22日所送實施簽證執行計畫(第三次)同意辦理(水南工字第10950037660號函) 於7/31日所送實施簽證執行計畫(第一次定稿版)(瑞玉字第011號函) 於8/05日所送實施簽證執行計畫(第一次定稿版)備查(水南工字第10950041580號函)	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
6	設計	決標通知30日內	109/5/20	109/5/20	整體施工計畫	依屢補書第六條第三項於決標通知日起30日曆天內提出設計品質計畫、整體施工計畫各10份予機關/機關工程司審核		瑞鋒 張智雄	於5/19日函文提送整體施工計畫(瑞鋒字第1090000218號函) 於6/10日檢送整體施工計畫審查意見(水南工字第10906034460號函) 於6/15日函文檢送整體施工計畫(第二次)(瑞鋒字第1090000295號函) 於6/23日檢送整體施工計畫(第二次)審查意見(水南工字第10953041260號函) 於7/1日函文提送整體施工計畫(第三次)(瑞鋒字第1090000330號函) 於7/22日召開整體施工計畫與整體品質計畫審查會議通知(水南工字第10906045840號) 於7/29日檢送整體施工計畫原則同意(水南工字第10906047060號函) 於8/4日函文提送整體施工計畫(第一版)(瑞玉字第019號函) 於8/13日檢送整體施工計畫(第一版)同意辦理(水南工字第10906050940號函) 於8/13日檢送整體品質計畫(第一版)同意辦理(水南工字第10906050920號函) 於8/25日函文提送整體品質計畫(第一版定稿本)(瑞玉字第051號函) 於8/31日函文提送整體施工計畫(第一版定稿本)(瑞玉字第057號函) 於8/31日所送整體品質計畫(定稿本)同意備查(水南工字第10950046260號函)	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
7	設計	簽約後30日內	109/6/3	109/5/20	整體品質計畫	經濟部水利署廠商品質管制規定。三.(一).新臺幣二億元以上工程,應於工程簽約後30日內函送監造單位審查		瑞鋒 張智雄	於5/19日函文提送整體品質計畫(瑞鋒字第1090000219號函) 於6/5日檢送整體品質計畫之審查意見(水南工字第10906033150號函) 於6/10日函文提送整體品質計畫(第二次)(瑞鋒字第1090000283號函) 於7/01日函文提送整體品質計畫(第三次)(瑞鋒字第1090000331號函) 於7/29日檢送整體品質計畫原則同意(水南工字第10906047061號函) 於8/04日函文提送整體品質計畫(第一版)(瑞玉字第018號函)	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦

項次	階段	契約規定/完成期限/提送期限			應辦事項		辦理單位/人員		辦理情形說明	備註
							設計	施工		
8	設計	決標通知 30日內	109/5/20	109/5/20	整體安全衛生 管理計畫	提送期限依附錄16規定,比照整體施工 計畫,訂約後30日內提送	瑞鋒 陳淑慧	於5/19日函文提送職業衛生安全計畫(瑞鋒字第1090000217號函) 於6/5日函文檢送職業衛生安全計畫之審查意見(水南工字第10906033160號函) 於6/10日函文提送職業安全衛生管理計畫(第二次)(瑞鋒字第1090000284號函) 於8/6日檢送職業安全衛生管理計畫(第三次)同意辦理(水南工字第10906049140號函) 於8/13日函文提送職業安全衛生管理計畫(第二次) 於6/24日檢送職業安全衛生管理計畫(第二次)審查意見(水南工字第109530413號函) 於7/06日函文提送職業安全衛生管理計畫(第三次)(瑞鋒字第1090000342號函) 於8/14日函文提送職業安全衛生管理計畫(定稿本)(瑞鋒玉字第032號函) 於8/14日所送職業安全衛生管理計畫(定稿本)備查(水南工字第10950044410號函)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦	
9	設計	決標通知 30日內	109/5/20	109/5/20	設計品質計畫	履約補充說明書第六條(三).統包商應 於訂約後30日曆天內提出設計品質計 畫	永鉅 張家祥	於5/19日函文提送設計品質計畫(瑞鋒字第1090000220號函) 於6/5日檢送設計品質計畫之審查意見(水南工字第10906033210號函) 於6/10日函文提送設計品質計畫(第二次)(瑞鋒字第1090000285號函) 於06/23日檢送設計品質計畫(第二次)審查意見(水南工字第1095040740號函) 於7/2日函文提送設計品質計畫(第三次)(瑞鋒字第1090000332號) 於7/31日函文提送設計品質計畫(第一版定稿)(瑞玉字第010號函) 於8/05日所送設計品質計畫(第一版定稿)備查(水南工字第19050041570號函)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦	
10	設計	簽約後盡 速(先以30 日評估)	109/6/3	109/5/29	現地調查計畫	依據履約補充說明書第二章-現地調查 需求,調查前先提送現地調查計畫, 可包含地形測量、地下管線調查,並 提送現地調查成果報告。另地質測量 成果需提送補充地質調查報告書。	鉅識 李志宏 鑽探 謝孟達	瑞鋒 管路調查	於5/29日函文提送現地調查計畫(測量計畫)、現地調查計畫(鑽探計畫) (瑞鋒字第1090000244號函、瑞鋒字第1090000245號函) 於6/8日檢送現地調查計畫(鑽探計畫)審查意見(水南工字第10953037320號函) 於6/10日提送現場調查計畫(鑽探計畫)(第二次)(瑞鋒字第1090000286號函) 於6/15日提送現地調查計畫(測量計畫)(第一版第一次)審查意見(水南工字第10953038180號函) 於6/17日函文提送現地調查計畫(測量計畫)(第一版第二次)(瑞鋒字第1090000303號函) 於6/20日檢送現地調查計畫(鑽探計畫)(第二次)審查意見(水南工字第1095304047號函) 於6/24日檢送現地調查計畫(測量計畫)(第二次)審查意見(水南工字第1095304號函) 於6/24日函文提送現地調查計畫(鑽探計畫)(第三次)(瑞鋒字第1090000323號) 於7/6日函文提送現地調查計畫(測量計畫)(第三次)(瑞鋒字第1090000338號) 於7/10日函文提送透地雷達檢測計畫(現場調查計畫)(瑞鋒字第1090000353號) 於7/22日所送現地調查計畫(鑽探計畫)(第一版)同意辦理(水南工字第10906044300號) 於7/22日所送設計品質計畫(第一版)同意辦理(水南工字第10950037650號) 於7/28日檢送現地調查計畫(地下管線調查計畫)(第一次)審查意見(水南工字第10953049450號) 於7/30日檢送現地調查計畫(測量計畫)(第一版)同意辦理(水南工字第10950038570號函) 於7/31日函文提送現場調查計畫(第一版定稿)[瑞玉字第013號函] 於8/05日所送 現場調查計畫(鑽探計畫)(第一版定稿本),備查(水南工字第10950041600 號函) 於8/17日函文提送現地調查計畫(測量計畫)(第一版定稿本)(瑞玉字第037號函) 於8/18日函文提送現地調查計畫(地下管線調查)(第一版)(瑞玉字第038號函) 於8/19日所送現地調查計畫(測量計畫)(定稿本)備查(水南工字第10950044880號函) 於9/8日現地調查計畫(地下管線調查)(第三次)(瑞玉字第064號函) 於10/5日補充地質調查成果報告乙式六份(瑞玉字第093號函) 於10/8日現地調查計畫(地下管線調查)(第一版定稿本)(瑞玉字第101號函) 於10/30日補充地質調查成果報告(第一版第二次),乙式六份。(瑞玉字第129號函)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
11	設計	簽約後盡 速(先以31 日評估)	109/6/4	109/5/29	設計階段風險 評估報告書	依據履約補充說明書第五條經機關核 定後,撥付本工程設計服務費用之 10%。	鴻發 連建榮	於5/29日函文提送設計階段風險評估(瑞鋒字第1090000246號函) 於6/10日檢送設計階段風險評估報告書審查意見(水南工字第10953037490號函) 於6/17日函文提送設計階段風險評估報告(第二次)(瑞鋒字第1090000302號函) 於6/29日檢送設計階段風險評估報告書(第二次)審查意見(水南工字第10953041920號函) 於7/6日函文提送設計階段風險評估報告(第三次)(瑞鋒字第1090000341號函) 於7/23日所送設計階段風險評估報告(第三次)同意辦理(水南工字第10950038580號函) 於7/31日函文提送設計階段風險評估(第一版定稿)(瑞玉字第012號函) 於8/05日所送設計階段風險評估(第一版定稿)備查(水南工字第10950041590號函) 於8/25日危險性工作場所施工安全評估報告書一式六份(瑞鋒字第1090000410號函)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦	
12	設計	簽約後 30日內	109/6/3		整體預定進度 表	採購契約第9條.(八).廠商擬定施工順 序及預定進度表等	瑞鋒 張智雄	於8/13日檢送整體施工計畫(第一版)同意辦理(水南工字第10906050940號函)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦	

項次	階段	契約規定/完成期限/提送期限		應辦事項		辦理單位/人員		辦理情形說明	備註	
						設計	施工			
13	設計	決標通知日起21天	109/5/12		配合事項表	履約補充說明書第二條(一).6統包商應於決標通知日起 21 日曆天內，向機關提送需機關配合之「配合事項表」以供審核。該「配合事項表」應儘可能列明機關依照法令配合統包商申請證照/許可所應提出之文件、證明或行政措施等，清單內應標示項目名稱、提出時間(以決標通知日為起點)及目的敘述等	瑞鋒	目前無須配合事項	■結案 □追蹤續辦	
14	設計	決標通知日起30天	109/5/20	109/5/20	工地辦公室之平面配置以及使用材料	履約補充說明書第十五條(一)工地辦公室之平面配置以及使用材料、規格及數量需於決標通知日起30日曆天內送交機關/監造單位審核	瑞鋒 張智雄	於5/20日函文提送工地辦公室配置(瑞鋒字第1090000226號函) 於5/26日南水局檢還工地辦公室各樓層平面圖(水南工字第10950027120號函) 於6/5日函文提送辦公室各樓層平面圖及檢核表(瑞鋒字第1090000271號函) 於7/7日檢送辦公室配置圖同意辦理(水南工字第10905040630號函) 於8/25日本公司選定以預拌土壤材料(RMSM)為回填材料，才依設廠作業期約需六個月以上，故擬以CLSM替代供料。〔瑞鋒字第1090000413號函〕 於8/28日本公司擬租楠西段保生殿共六筆土地設置預拌形混凝土設備。〔瑞鋒字第1090000416號函〕 於9/3日函文提送工地辦公室調整後配置圖(含檢核表)(瑞玉字第062號函) 於9/7日提送工地辦公室調整配置乙案，同意辦理。(水南工字第10950048120號函) 於9/10日工地型預拌混凝土設備案，同意辦理。(水南工字第10950046990號) 於9/14日提送CLSM材料製造商送審(第一次)(瑞玉字第071號) 於9/15日提送混凝土材料製造商送審(第一次)(瑞玉字第072號) 於09/22日CLSM廠商資料送審同意辦理。(水南工字第10906061030號)	於5/20日函文提送工程紀錄影片製作人資料(瑞鋒字第1090000236號函) 於5/29日發文補件(水南工字第10950028170號函) 於6/3日函文補送影片製作人資料(瑞鋒字第1090000255號函) 於6/8日檢送影片製作人資料審查意見(水南工字第10950030510號函) 於6/11日函文檢送工程紀錄影片製作人補正資料(瑞鋒字第1090000289號函) 於6/16日同意辦理工程紀錄影片製作人資料(水南工字第10950032230號函)	■結案 □追蹤續辦
15	設計	決標通知日起60天	109/6/20	109/5/25	工程紀錄影片製作人資料	履約補充說明書第十六條(三)統包商應於決標通知日起60日曆天內提送影片製作人姓名、經驗及其相關資料予監造單位審核	瑞鋒 施培桐	於5/25日函文提送人員資料(瑞鋒字第1090000205號函) 於5/22日南水局發文補件(水南工字第10906028830號函) 於5/27日函文提送人員組織資格審查意見補附相關佐證資料(瑞鋒字第1090000241號函) 於6/20日所送人員組織表及學經歷資格同意辦理(水南工字第10906036000號函)	■結案 □追蹤續辦	
16	設計	提報開工前	109/5/14	109/5/14	工地人員資料提報	機關需求書第11條.(二).統包商應於開工前提送人員組織架構，將其工作組織與下列人員(至少應包含但不限於)之姓名、身分證影本、學經歷、勞保卡及薪資證明等資料，報請機關審查；工地施工人員(含施工分包商)之姓名、身分證影本及負責工項，則報請機關備30查；變更時亦同。 (1.施工總負責人、2.細部設計負責人、3.各設計單元設計人員、4.工地主任、5.設計品保工程師、6.施工品管工程師、7.安全衛生工程師、8.駐地設計人員)	瑞鋒 張智雄	於5/13日函文提送人員資料(瑞鋒字第1090000205號函) 於5/22日南水局發文補件(水南工字第10906028830號函) 於5/27日函文提送人員組織資格審查意見補附相關佐證資料(瑞鋒字第1090000241號函) 於6/20日所送人員組織表及學經歷資格同意辦理(水南工字第10906036000號函)	■結案 □追蹤續辦	
17	設計	開工日起10天	109/5/24	109/5/13	施工前會議	依據契約「附錄10-經濟部水利署辦理工程工作協調及召開工程會議規定事項」，由監造單位在工程開工後十日內召開施工協調會議。	瑞鋒 張智雄	於5/13日辦理走動式督導，於6/4日辦理施工協調會議，於6/10日函文檢送會議記錄(水南工字第10906035430號函)	■結案 □追蹤續辦	
18	設計	開工日起120天	109/9/11		工地辦公室	機關需求書第15條.(六).工地辦公室須於開工日起120 日曆天內完成	瑞鋒 張智雄	工地辦公室整修中	■結案 □追蹤續辦	

項次	階段	契約規定/完成期限/提送期限		應辦事項		辦理單位/人員		辦理情形說明	備註
						設計	施工		
19	設計	開工日起 30天	109/6/12		土石方載運作業計畫	機關需求書第17條.(三).統包商應於開工日起30日內依契約圖說提出載運作業計畫(含運輸機具、路線、交通管制、環境污染防治計畫、載運作業計畫進度表、機具、車輛識別證及工地負責人等)送機關核可後據以執行，統包商應依所提載運作業計畫進度將剩餘土石方運離。該計畫應考量運輸路線之道路、隧道、橋樑等現場狀況及相關法令之規定，並提出相關補強改善措施。	瑞鋒 張智雄	於8/19函文提送土石載運計畫(第一版第一次)(瑞玉字第040號函) 於8/25檢送提送土石載運計畫(第一版第一次)書面意見(水南工字第10906055620號函) 於8/27檢送-載運計畫(第一版第一次)逾期一案(水南工字第10906055580號函) 於8/28函文提送載運計畫逾期申覆意見說明(瑞峰字第1090000423號) 於8/31函文提送載運計畫(第一版第二次)(瑞玉字第055號函) 於9/9日檢送載運計畫(第一版第二次)書面審查意見。(水南工字第10953060800號) 於9/11日之載運計畫無逾期乙案意見回復，尚屬合理。(水南工字第10906060240號) 於9/24日函文提送載運計畫(第三次)(瑞玉字第083號) 於10/22日載運計畫(第一版第三次)同意辦理。(水南工字第10906068640號)	■結案 □追蹤續辦
20	設計	開工日起 5天	109/5/19	109/5/29	營造綜合保險投保前會勘	採購契約附錄12.廠商應於開工後五工作天內邀集保險公司及機關工地工程司工地現場會勘及協商契約內容，經工地工程司認可後，納入保險契約附加條款。	瑞鋒 饒家琪	於5/29日函文提送綜合保險單據等(瑞鋒字第1090000248號函) 於5/29日請領1600萬元保險金(瑞鋒字第1090000367號函) 於7/27回覆請領保險金額1600相關(水南工字第10950039530號函)	■結案 □追蹤續辦
21	設計	提報開工前	109/5/14		申報空汙費繳納	依空氣汙染防制法第16條第1項第1款所定對營建工程徵收之空氣汙染防制費，營建業主應於開工前檢具登載工程類別、面積、工期、經費、涉及空氣汙染防制費計算之相關工程資料及自行計算空氣汙染防制費費額，向直轄市、縣(市)主管機關申報，經核定費額後，依規定期限繳納至指定金融機構代收專戶	瑞鋒 陳淑慧	於6/10日函文檢送營建空汙費繳費單(水南工字第10906035000號函) 於6/24日所申請歸墊空汙費近期將撥入貴公司指定帳戶(水南工字第10950033630號函)	■結案 □追蹤續辦
22	設計	提報開工前	109/5/14	109/5/13	重大公共工程開工管制條件廠商應辦事項檢核表	依據契約附錄16.經濟部水利署公共工程施工階段契約約定權責分工表，函報開工時應檢附重大公共工程開工管制條件廠商應辦事項檢核表。	永鉅 張家祥	於5/13日函文提送重大公共工程開工管制條件廠商應辦事項檢核表(瑞鋒字第1090000210號函) 於5/22日南水局函文備查(水南工字第10906028640號函)	■結案 □追蹤續辦
23	設計	施工前	109/8/31		細部設計(平壓管段、各水管橋)	依據履約補充說明書第二條第一項本工程契約範圍內輸水管線推進及明挖覆蓋、水管橋架設、閘類等水工機械、監控與電力系統之細部設計、施工、編制施工預算書、變更設計、修正預算、試壓試水及試運轉。	永鉅 蔡裕展	平壓管段： 於9/14日函文提送管路工程-明挖覆蓋-平壓管段(OK+050-OK+150)細部設計圖(第一版)(瑞玉字第069號) 於9/28日，管路工程-明挖覆蓋-平壓管段(OK+050-OK+150)細部設計圖(第一版)經審查後如說明(水南工字第10953065110號函) 於10/7日函文提送管路工程-明挖覆蓋-平壓管段(OK+050-OK+150)細部設計圖(第一版第二次)(瑞玉字第099號) 於11/12日函文提送管路工程-明挖覆蓋-平壓管段(OK+050-OK+150)細部設計圖、設計概算書及設計計算書(第一版第三次)。(瑞玉字第142號) 於12/01日，有關管路工程-明挖覆蓋-平壓管段(OK+050-OK+150)細部設計圖、概算書及計算書(第一版第三次)，審查意見。(水南工字第10906079970號) 於110/01/08日函文提送管路工程-明挖覆蓋-平壓管段(OK+050-OK+150)細部設計圖、設計概算書及設計計算書(第一版第四次)。(瑞玉字第1100108005號) 於110/02/19日，管路工程-明挖覆蓋-平壓管段(OK+050-OK+150)(第一版)細部設計圖及設計計算書，同意辦理。(水南工字第1105309660號)	■結案 □追蹤續辦

項次	階段	契約規定/完成期限/提送期限		應辦事項		辦理單位/人員		辦理情形說明	備註
						設計	施工		
								水管橋： 沙田水管橋： 於10/15日函文提送水管橋工程細部設計圖及設計計算書(第一版第一次)(瑞玉字第099號) 於11/06日函文檢送水管橋工程細部設計圖及設計計算書(第一版第一次)審查意見(水南工字第10906073770號函) 於110/01/08日函文提送水管橋工程細部設計圖及設計計算書(第一版第二次)(瑞玉字第1100108008號) 於110/01/29日函文檢送水管橋工程細部設計圖及設計計算書(第一版第二次)審查意見(水南工字第11053043560號函) 於110/02/19日函文提送水管橋工程細部設計圖及設計計算書(第一版第三次)(瑞玉字第11002190028號) 於110/03/15日函文檢送水管橋工程細部設計圖及設計計算書(第一版第三次)書面審查意見(水南工字第11053022550號函) 於110/04/20檢送水管工程(第一版第四次)細部設計圖及設計計算書各一份(瑞玉字第1100420061號) 於110/05/25日所送水管橋工程(沙田水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第四次)，退回修正(水南工字第11053022550號函) 於110/06/01函文檢送水管橋工程(沙田水管橋)(第一版第五次)細部設計圖及設計計算書各一份(瑞玉字第1100601098號) 於110/08/05水管橋工程(沙田水管橋)(第一版第五次)細部設計圖及設計計算書，同意辦理，如說明，請查照。(水南工字第11006047940號)	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
								平壓管段水管橋： 於110/06/29日函文提送水管橋工程(平壓管段水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第一次)(瑞玉字第1100629127號) 於110/07/16函文提送水管橋工程(平壓管段水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第一次)審查意見，如說明，請鑒核。(水南工字第11053058380號) 於110/07/28函文提送水管橋工程(平壓管段水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第二次)，如說明，請查照。(瑞玉字第1100728154號) 於110/08/17檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」水管橋工程(平壓管段水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第二次)審查意見，如說明，請查照。(水南工字第11053066360號) 於110/08/30檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」，水管橋工程(平壓管段水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第三次)，如說明，請查照。(瑞玉字第1100830185號) 於110/09/16檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」水管橋工程(平壓管段水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第三次)審查意見，如說明，請查照。(水南工字第11053074930號) 於110/09/29檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」，水管橋工程(平壓管段水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第四次)，如說明，請查照。(瑞玉字第1100929209號) 於110/10/14檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」水管橋工程(平壓管段水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第四次)書面審查意見，請查照。(水南工字第11053081150號) 於110/10/26檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」，水管橋工程(平壓管段水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第五次)，如說明，請查照。(瑞玉字第1101026226號) 於110/11/19所送「曾文南化聯通管統包工程A3標」水管橋工程(平壓管段水管橋)(第一版第五次)細部設計圖及設計計算書，同意辦理，如說明，請查照。(水南工字第11006073570號)	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦

項次	階段	契約規定/完成期限/提送期限		應辦事項		辦理單位/人員		辦理情形說明	備註
						設計	施工		
								<p>三埔水管橋、四埔水管橋： 於110/05/27日函文提送水管橋工程(三埔水管橋、四埔水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第一次)瑞玉字第1100527093號 於110/06/11日，檢送水管橋工程(三埔水管橋、四埔水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第一次)審查意見乙份(水南工字第11053049160號) 於110/07/22日函文提送水管橋工程(三埔橋水管橋、四埔橋水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第二次)，如說明，請查照。(瑞玉字第1100722146號) 於110/08/16檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」水管橋工程(三埔水管橋、四埔水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第二次)審查意見，如說明，請查照。(水南工字第11053065050號) 於110/08/26檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」水管橋工程(三埔橋水管橋、四埔橋水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第三次)，如說明，請查照。(瑞玉字第1100826180號) 於110/09/03所送「曾文南化聯通管統包工程A3標」水管橋工程(三埔水管橋、四埔水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版第三次)審查結果，如說明，請查照。(水南工字第11053071610號) 於110/10/20所送「曾文南化聯通管統包工程A3標」水管橋工程(三埔水管橋、四埔水管橋)(第一版第三次)細部設計圖及設計計算書，同意辦理，如說明，請查照。(水南工字第11006064170號) 於110/10/29檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」水管橋工程(三埔水管橋、四埔水管橋)細部設計圖及設計計算書(第一版)，如說明，請查照。(瑞玉字第1101029231號)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
24	設計	施工前	109/12/31	細部設計 (主管段)	依據履約補充說明書第二條第一項本工程契約範圍內輸水管線推進及明挖覆蓋、水管橋架設、閘類等水工機械、監控與電力系統之細部設計、施工、編制施工預算書、變更設計、修正預算、試壓試水及試運轉。	永鉅 蔡裕展	<p>推進段：W38-W39工作井(竹圍橋) 於9/8函文提送管路工程-推進段-W38-W39工作井(竹圍橋)細部設計圖(第一版)(瑞玉字第065號函) 於10/8函文提送管路工程-推進段-W38-W39(第一版第二次)工作井細部設計圖、設計概算書及設計計算書(瑞玉字第0102號函) 於10/28日，推進段W38-W39工作井(竹圍橋)細部設計圖說(第一版第二次)之審查意見乙份(水南工字第10906071390號函) 於11/6日函文提送管路工程-推進段-W38-W39(第一版第三次)工作井細部設計圖、設計概算書及設計計算書(瑞玉字第136號) 於12/10日，管路工程-推進段W38-W39工作井(竹圍橋)細部設計文件(第一版第三次)書面審查意見(水南工字第10953084050號) 於12/23日函文提送管路工程-推進段-W38-W39(第一版第四次)工作井細部設計圖、設計概算書及設計計算書(瑞玉字第1091223182號) 於110/02/17日，管路工程-推進段W38-W39工作井(第一版)細部設計圖及設計計算書，同意辦理。(水南工字第11006005140號)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦	
							<p>明挖覆蓋-起點至沙田橋 於10/7管路工程-明挖覆蓋-起點至沙田橋細部設計(第一版)，審查意見。(水南工字第10953066180號) 於10/8管線工程-明挖覆蓋-起點至沙田橋細部設計(第一版)審查意見。(水南工字第10953066180號函) 於10/16日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-起點至沙田橋細部設計圖及設計計算書(第一版第二次)(瑞玉字第117號) 於11/5日管路工程-明挖覆蓋段-起點至沙田橋細部設計圖、設計概算書及計算設計書(第一版第二次)，審查意見。(水南工字第10953074130號) 於11/20日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-起點至沙田橋細部設計圖及設計計算書(第一版第三次)(瑞玉字第158號) 於12/1日，管路工程-明挖覆蓋段-起點至沙田橋細部設計圖、設計概算書及計算設計書(第一版第三次)，審查意見。(水南工字第10906080050號) 於110/01/08日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-起點至沙田橋細部設計圖及設計計算書(第一版第四次)(瑞玉字第1100108005號) 於110/02/24日，管路工程-明挖覆蓋段-起點至沙田橋細部設計圖、設計概算書及計算設計書(第一版第四次)，審查意見。(水南工字第11053011710號) 於110/03/09日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-起點至沙田橋細部設計圖及設計計算書(第一版第五次)(瑞玉字第1100309035號) 於110/03/23日，管路工程-明挖覆蓋段-起點至沙田橋細部設計圖、設計概算書及計算設計書(第一版第五次)，審查意見。(水南工字第11053024981號) 於110/03/30日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-起點至沙田橋細部設計圖及設計計算書(第一版第五次修正)(瑞玉字第1100330052號)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦 路段重新分段提送	

項次	階段	契約規定/完成期限/提送期限		應辦事項		辦理單位/人員		辦理情形說明	備註
						設計	施工		
								明挖覆蓋段-沙田至終點 於10/7管路工程-明挖覆蓋段-沙田至終點細部設計(第一版)審查意見。(南水工字第10953066190號函) 於10/16日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-沙田橋至終點細部設計圖及設計計算書(第一版第二次)。(瑞玉字第118號) 於11/5日管路工程-明挖覆蓋段-沙田橋至終點細部設計圖、設計概算書及計算設計書(第一版第二次),審查意見。(水南工字第10953074150號) 於11/20日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-沙田橋至終點細部設計圖及設計計算書(第一版第三次)(瑞玉字第159號) 於12/1日,管路工程-明挖覆蓋段-沙田橋至終點細部設計圖、設計概算書及計算設計書(第一版第三次),審查意見。(水南工字第10906080060號) 於110/01/08日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-沙田橋至終點細部設計圖及設計計算書(第一版第四次)(瑞玉字第1100108007號) 於110/02/24日,管路工程-明挖覆蓋段-沙田橋至終點細部設計圖、設計概算書及計算設計書(第一版第四次),審查意見。(水南工字第11053011700號) 於110/03/09日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-沙田橋至終點細部設計圖及設計計算書(第一版第五次)(瑞玉字第1100309035號) 於110/03/23日,管路工程-明挖覆蓋段-沙田橋至終點細部設計圖、設計概算書及計算設計書(第一版第五次),審查意見。(水南工字第11053024981號) 於110/03/30日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-沙田橋至終點細部設計圖及設計計算書(第一版第五次修正)(瑞玉字第1100330053號)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
								管路工程-明挖覆蓋段-起點至W38推進井 於110/03/19日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-起點至W38推進井(第一版第一次)細部設計圖及設計計算書(瑞玉字第1100319042號) 於110/03/31日,退回修正管路工程-明挖覆蓋段-起點至W38推進井(第一版第一次)細部設計圖及設計計算書。(水南工字第11053028280號) 於110/04/1日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-起點至W38推進井(第一版第二次)細部設計圖及設計計算書(瑞玉字第1100401055號) 於110/04/8日,同意依圖施作管路工程-明挖覆蓋段-起點至W38推進井(第一版第二次)細部設計圖及設計計算書。(水南工字第11053029660號)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
								管路工程-明挖覆蓋段-W38推進井至終點(不含三埔橋上下游銜接段) 於110/03/30日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-起點至沙田橋(第一版第五次修正)細部設計圖及設計計算書(瑞玉字第1100330052號) 於110/03/30日函文提送管路工程-明挖覆蓋段-沙田橋至終點(第一版第五次修正)細部設計圖及設計計算書(瑞玉字第1100330053號) 於110/04/20 所送「曾文南化聯通管統包工程A3標」『管路工程-明挖覆蓋-W38推進井至終點(不含三埔橋上下游銜接段)』細部設計圖及設計計算書,同意辦理。(水南工字第11053032670號)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
25	設計	施工前	109/9/30		交通維持計畫 編制(委外) 依履約補充說明書第十九條(六)統包商應依道路、交通主管機關核可之交通維持計畫辦理並申請道路挖掘許可	鴻發 陳俊安		於8/07提送交通維持計畫(瑞玉字第027號函) 於8/21提送修正後交維計畫(瑞玉字第043號函) 於8/27所送交維計畫調整整體工程佈置路線修正後提送(水南工字第10950045850號函) 於9/29日提送修正後之交通維持計畫。(瑞玉字第090號) 於109/10/28召開交通維持計畫書審查會議 於109/11/9 曾文A3標交通維持計畫書審查會議紀錄1份。(水南工字第10953075310號) 於11/19日檢送本公司承攬「曾文南化聯通管統包工程A3標」交通維持計畫(第一次定稿本)。(瑞玉字第154號) 於110/01/04日所送「曾文南化聯通管統包工程A3標」交通維持計畫乙案,業經台南市政府交通局109年12月25日函復審查通過。(水南工字第10950070630號) 於110/01/08日檢送有關「曾文南化聯通管統包工程A3標」交通維持計畫(核定版),乙式六份。(瑞玉字第1100108010號) 於110/01/15日交通維持計畫(核定版),備查。(水南工字第11053002180號)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦

項次	階段	契約規定/完成期限/提送期限		應辦事項		辦理單位/人員		辦理情形說明	備註
						設計	施工		
26	設計	施工前	109/9/30		申辦道路道路挖掘許可文件(路證)	公路局台3線道路挖掘許可(包含鑽探、試挖作業、明挖分段路證、工作井開路證等)	瑞鋒 鄭宇超	於8/26日道路挖掘宣道會會議紀錄(水南工字第10906055640號) 於8/28日台南市道路挖掘之規定與施工時間不同影響整體施工規劃工期說明(瑞峰字第1090000422號) 於9/11日研討整體工期乙案。(水南工字第10906059980號) 於11/11日公路總局於曾文工務段辦公室召開「110年度道路挖掘、管制管線協調會」。(聯管A3備字第1091109-1號) 於110/01/20日函文申請,因施工位置位於台3線省道上,依規定需提報省(縣)道挖掘公路申請,請機關協助用印。(瑞玉字第1100120016號) 於110/06/02日函文檢送本工程「曾文南化聯通管統包工程A3標」,依據交通部公路總局受理挖掘公路作業程序,惟因整體趕趕工期如期完工需要,擬請協調相關主管機關,准予分區同時施工。(瑞玉字第1100602100號) 於110/06/10日南區水資源局函文交通部公路總局第五區養護工程處曾文工務段,為利本局「曾文南化聯通管統包工程A2標」及「曾文南化聯通管統包工程A3標」(以下稱A2標、A3標)如期完成,擬請准予分區同時施工案。(水南工字第11053047110號)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
27	設計	施工前	109/12/31		丁類危評	依據危險性工作場所暨檢查辦法辦理	鴻發 許智泰	於7/29檢送丁類危評開會通知單(水南工字第10906045200號函) 於8/7日檢送丁類評估審查會議紀錄1份(水南工字第10906049710 號函) 於8/18日檢送丁類評估審查修正資料(瑞玉字第039號函) 於8/21日檢送丁類評估審查後認可,轉南職安備查(水南工字第10906054310號函) 於9/10日檢送丁危審查結果會議紀錄。(勞職南4字第1091049836號) 於9/25日轉呈丁危檢送職安中心(瑞玉字第086號) 於10/5日丁類危險性工作場所審查案合格函(水南工字第10953066650號)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
28	設計	施工前	109/9/30		工區內之地形測量	工程施工前,廠商應辦理工區內之地形測量,不論地貌現況與原設計圖是否相符,均應函報監造單位,如地貌現況與原設計圖不相符時,監造單位應立即辦理會測。	鉅識 李志宏	於5/29檢送現地調查計畫(測量計畫)(瑞鋒字第1090000244號函) 於6/17檢送現地調查計畫(測量計畫)(第一版第二次)(瑞鋒字第1090000303號函) 於7/6檢送現地調查計畫(測量計畫)(第一版第三次)(瑞鋒字第1090000338號函) 於7/30所送現地調查計畫(測量計畫)(第一版),同意辦理。(水南工字第10950038570號函)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
29	設計	施工前	109/9/30		施工損壞鄰房事件預防與調處計畫	統包商須於實際施工前將「施工損壞鄰房事件預防與調處計畫」報機關/監造單位核准,內容至少包含影響範圍分析、施工前中後鄰近建築物現況調查與監測作為(監測設備得共用本局他案監測計畫,惟需自訂監測頻率、警戒行動值等)、損鄰事件爭議調處程序及敦親睦鄰措施(含民房防塵作為及參與地方民俗儀式)等,前述施工前鄰近建築物現況調查須委託經機關認可之第三公正單位辦理,施工前鄰近建築物現況調查結果需報機關認可並納入本計畫作為附錄,本項相關費用已包含於契約「鄰近建築物現況調查與監測費」內。	鴻發 許智泰	於6/5日函文檢送鄰房現況鑑定計畫(瑞鋒字第1090000275號函) 於6/22日檢送修正後鄰房鑑定計畫(第二次)(瑞鋒字第1090000320號函) 於6/22日檢送鄰房現況鑑定計畫(第一次)審查意見(水南工字第10953040480號函) 於7/10日函文檢送鄰近建築物及工地安全監測計畫(第一次)(瑞鋒字第1090000354號函) 於8/06日函文提送施工損壞鄰房事件預防與調處計畫(第二次)(瑞玉字第023號函) 於8/26日函文提送施工損壞鄰房事件預防與調處計畫(第三次)(瑞玉字第056號函) 於9/15日所送施工損壞鄰房事件預防與調處計畫(第三次)同意辦理。(水南工字第10953060870號) 於09/21日函文提送施工損壞鄰房事件預防與調處計畫(第一版定稿本)(瑞玉字第078號) 於10/14日施工損壞鄰房事件預防與調處計畫(第一版)定稿本,備查。(水南工字第10950054350號)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦

項次	階段	契約規定/完成期限/提送期限		應辦事項		辦理單位/人員		辦理情形說明	備註
						設計	施工		
30	設計	施工前	109/9/30		簡易水土保持申請書封面、簡易水土保持申報書、水土保持處理項目及數量明細表、地籍圖謄本、申請人身份證明文件影本、實施地點位置圖、水土保持設施平面配置圖、構造物示意圖、整坡斷面圖、主管機關證明文件、全部文件加蓋印章。	永鉅 張嘉琪		鏡面段(0K+050-0K+150)簡易水土保持申請： 於8/05日函文提送鏡面段(0K+050-0K+150)簡易水土保持申請書(瑞玉字第022號) 於8/14日檢送鏡面段(0K+050-0K+150)簡易水土保持申請書(水南工字第10906052800號函) 於10/19日，行政院農業委員會水土保持局台南分局訂於109年10月23日(星期五)召開鏡面水庫平壓管段0K+050-0K+150段簡易水土保持申報書審查會議(水南工字第10953070410號函) 於11/03日，鏡面水庫平壓管段0K+050-150簡易水土保持申報書之審查會議紀錄乙份。水南工字第10953073010號 於11/16日，檢送修正後之鏡面水庫平壓管段(0K+050至0K+150)簡易水土保持申請書。(瑞玉字第149號) 於110/01/15 鏡面水庫平壓管段0K+050-0K+150段簡易水土保持申報書，業奉行政院農業委員會水土保持局臺南分局核定。(水南工字第10950070330號) 於110/01/15 提送鏡面段0K+050-150簡易水土保持申報書開工報告。(瑞玉字第1100115013號) 於110/01/20 提送鏡面水庫平壓管段0K+050-0K+150段簡易水土保持申報書核定本，乙式六份。(瑞玉字第1100120015號) 於110/01/26 鏡面水庫平壓管段0K+050-0K+150段簡易水土保持申報書核定本(影本)乙式6份，備查。(水南工字第11053004920號) 於110/01/26 申報本局「曾文南化聯通管統包工程A3標」鏡面水庫平壓管段0K+050-0K+150段簡易水土保持申報書案開工，如說明。(水南工字第11053003820號) 於110/02/05 有關鏡面水庫平壓管段0K+050-0K+150段簡易水土保持申報書開工報告，經水土保持局臺南分局同意備查。(水南工字第11053007510號)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
								19K+701~24K+804明挖段及推進段水土保持計畫申請： 109.11.13，檢送本公司承攬「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+701-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫。(瑞玉字第145號) 109.11.24，檢還所送「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+701-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫乙式7份(附件另送)，如說明。(水南工字第10953077990號) 109.12.17，19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫，乙式七份。(瑞玉字第1091217175號) 110.01.20，19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫，如說明。(水南工字第11053004140號) 110.01.21，檢送有關「曾文南化聯通管統包工程A3標」補正後19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫。請 惠予審查。(瑞玉字第1100120018號) 110.01.21，19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫繳納審查費乙案。(水南工字第11050002310號。) 110.01.28 檢送農委會水土保持局召開「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估報告)現勘及審查會通知單1份，請查照。(水南工字第11053005840號) 110.02.23 檢送農委會水土保持局110年2月4日召開「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估報告)現勘及審查會紀錄1份，如說明，請查照。(水南工字第11053011020號) 110.03.23 有關貴公司申請19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估報告)修正本提送期限展延案，如說明，請查照。(水南工字第11053023690號) 110.03.23 檢送19K+748-24K+801明挖段及推進段水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估報告)(瑞玉字第1100323044號) 110.04.20 檢送農委會水土保持局召開「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估報告)第2次審查會議開會通知單1份(水南工字第11053032340號)	■結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦

項次	階段	契約規定/完成期限/提送期限		應辦事項		辦理單位/人員		辦理情形說明	備註
						設計	施工		
								110.05.17 檢送水土保持局於110年5月4日召開「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估報告)第2次審查會紀錄1份,如說明,請查照。(水南工字第11053041170號) 110.05.25 同意所請展延「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫修正本提送期程。(水南工字第11053044440號) 110.05.28 檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫乙式15份。(瑞玉字第1100528094號) 110.06.24 檢送水土保持局書面審查「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估報告)案之紀錄1份,如說明,請查照。(水南工字第11053052240號) 110.07.01 檢送「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+748-24K+804等明挖段及推進段水土保持計畫(核定本初稿)乙式10份,如說明,請查照。(瑞玉字第1100701130號) 110.07.26 有關「曾文南化聯通管統包工程A3標」19K+748-24K+804明挖段及推進段水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估)業經水土保持局審閱確認完成修正,請製作水土保持計畫核定本送局憑辦,如說明,請查照。(水南工字第11050039350號)	
31	施工	施工前30天	109/9/1		分項施工計畫 本工程之施工計畫分為整體施工計畫與分項施工計畫。整體施工計畫依前項規定期限提報,分項施工計畫則於分項工程施工前30日曆天行文函送機關審核。整體施工計畫應對各分項施工計畫之提送時程加以說明。		瑞鋒 張智雄	整體施工計畫 於5/19日檢送整體施工計畫乙式10份(瑞鋒字第1090000218號函) 於6/10日檢送整體施工計畫之書面審查意見1份(水南工字第10906034460號函) 於6/15日檢送整體施工計畫(第一版第二次)(瑞鋒字第1090000295號函) 於6/23日檢送整體施工計畫(第一版第二次)之書面審查意見1份(水南工字第10953041260號函) 於7/1日檢送整體施工計畫(第一版第三次)(瑞鋒字第1090000330號函) 於7/29日所送整體施工計畫(第一版)原則同意(水南工字第10906047060號函) 分項施工計畫:另詳附件7-1「文件送審時程管制總表」。	<input type="checkbox"/> 結案 <input checked="" type="checkbox"/> 追蹤續辦
32	施工	整體工程佈置細部設計核定後15天內	110/1/15		工程簡介 統包商須於本工程細部設計圖說核定後15日內提出工程簡介(折頁式)初稿予監造單位審查,審查後7日內印製1,000份工程簡介(亦可分次印製),以利宣導。		永鉅 張家祥	待細部設計核定後提送	<input type="checkbox"/> 結案 <input checked="" type="checkbox"/> 追蹤續辦
33	施工	實際施工後60天內	109/11/29		工程簡報影片 統包商應於工程實際施工後60日曆天內製作宣導用工程簡報影片,其時間為至少10分鐘,且每2個月至少更新乙次。		瑞鋒 施培棚	於110/01/05日 檢送有關本公司承攬「曾文南化聯通管統包工程A3標」工程宣導影片。(瑞玉字第1100105001號) 於110/01/22日 工程簡報影片,經審查後如說明,請查照見復。(水南工字第11006004390號) 於110/03/25 檢送有關本公司承攬「曾文南化聯通管統包工程A3標」工程宣導影片。(瑞玉字第1100325045號) 於110/04/6日 所送「曾文南化聯通管統包工程A3標」工程簡報影片,經審查後如說明,請查照見復。(水南工字第11006023320號) 於110/05/21 檢送有關本公司承攬「曾文南化聯通管統包工程A3標」工程宣導影片、工程施工紀錄影片。請 惠予審查。(瑞玉字第1100521089號) 於110/05/28日 所送「曾文南化聯通管統包工程A3標」工程簡報影片(110年5月),經審查後如說明。(水南工字第11006036080號) 於110/07/21 檢送有關本公司承攬「曾文南化聯通管統包工程A3標」工程宣導影片、工程施工紀錄影片。請 惠予審查。(瑞玉字第1100721144號) 於110/07/29 所送「曾文南化聯通管統包工程A3標」工程紀錄影片及工程宣導影片,備查,請查照。(水南工字第11006050180號)	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦
34	竣工	竣工前60天	113/4/23		操作維護手冊、教育訓練計畫 操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱草稿,應於竣工前60天,提出1份送審;並於竣工前30天,提出1份正式格式之完整資料送審。製造商可證明其現成之手冊資料,足以符合本條之各項規定者,不在此限。 廠商須於竣工前15天,提出20份經機關核可之操作與維護資料及教育訓練計畫。		瑞鋒	待竣工前60天前提出	<input type="checkbox"/> 結案 <input checked="" type="checkbox"/> 追蹤續辦
35	施工	施工前	109/9/30		臨時電申請 因應工區作業用電		瑞鋒	暫無此需求	<input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 追蹤續辦

決標日：109.04.21
 簽約日：109.05.04
 開工日：109.05.14

曾文南化聯通管統包工程A3標
 計畫文件送審時程管制總表

附件七-1

截止日期：111年7月15日

類別	項次	計畫書/文件名稱	契約規定送審期限	修訂版次	廠商		監造單位/機關業主				
			應/預定送審日期		日期	文號	日期	文號	審查結果		
整體工作執行及整體工程佈置等	1	設計品質計畫	決標通知日起 30日曆天內	1-1	109.05.19	瑞鋒字第1090000219號	109.06.05	水南工字第10906033210號	修正並提送		
				1-2	109.06.10	瑞鋒字第1090000285號	109.06.23	水南工字第10953040740號	修正並提送		
	1-3	109.07.02		瑞鋒字第1090000332號	109.07.22	水南工字第10950037650號	同意辦理				
	1	109.07.30		瑞玉字第010號	109.08.05	水南工字第10950041570號	備查				
				109.06.03	2-1	110.03.09	瑞玉字第1100309037號	110.03.29	水南工字第11006021910號	修正並提送	
					2-2	110.03.31	瑞玉字第1100331054號	110.04.08	水南工字第11053028720號	修正並提送	
					2-3	110.04.21	瑞玉字第1100421062號	110.05.18	水南工字第11006029160號	同意辦理	
					2	110.05.21	瑞玉字第1100521088號	110.05.24	水南工字第11053043870號	備查	
	2	整體品質計畫	訂約次日 30日內	1-1	109.05.19	瑞鋒字第1090000220號	109.06.05	水南工字第10906033150號	修正並函送		
				1-2	109.06.10	瑞鋒字第1090000283號	109.06.23	水南工字第10953040750號	修正並提送		
				1-3	109.07.01	瑞鋒字第1090000331號	109.07.22	水南工字第10906045840號	召開審查會		
				1	109.08.04	瑞玉字第018號	109.07.29	水南工字第10906074061號	原則同意		
				1	109.08.25	瑞玉字第051號	109.08.13	水南工字第10906050920號	同意辦理		
				109.06.03	修1-1	110.11.08	瑞玉字第1101108243號	110.11.23	水南工字第11006076110號	修正說明並提送	
					修1-2	110.11.29	瑞玉字第1101129259號	110.12.09	水南工字第11006078380號	同意辦理	
					修1	110.12.28	瑞玉字第1101228278號			同意辦理	
	3	整體施工計畫	決標通知日起 30日曆天內	1-1	109.05.19	瑞鋒字第1090000218號	109.06.10	水南工字第10906034460號	修正並函送		
				1-2	109.06.15	瑞鋒字第1090000295號	109.06.23	水南工字第10953041260號	修正並提送		
				1-3	109.07.01	瑞鋒字第1090000330號	109.07.22	水南工字第10906045840號	召開審查會		
1				109.08.04	瑞玉字第019號	109.07.29	水南工字第10906074060號	原則同意			
			1	109.08.31	瑞玉字第057號	109.08.13	水南工字第10906050940號	同意辦理			
			109.06.03	修1-1	110.11.08	瑞玉字第1101108244號	110.11.23	水南工字第11006076120號	修正說明並提送		
				修1-2	110.11.29	瑞玉字第1101129260號	110.12.09	水南工字第11006078400號	同意辦理		
				修1	110.12.28	瑞玉字第1101228279號			同意辦理		
4	職業安全衛生管理計畫	訂約次日 30日內	1-1	109.05.19	瑞鋒字第1090000217號	109.06.05	水南工字第10906033160號	修正並函送			
			1-2	109.06.10	瑞鋒字第1090000284號	109.06.24	水南工字第10953041360號	修正並提送			
			1-3	109.07.06	瑞鋒字第1090000342號	109.08.06	水南工字第10906049410號	同意辦理			
			1	109.08.13	瑞玉字第032號	109.08.14	水南工字第10950044410號	備查			
					109.06.03	修訂	110.07.09	瑞玉備字第1100709-002號	110.07.14	聯管A3備字第11000714-1號	以公文檢送
							110.07.16	瑞玉字第1100716138號			(修正內容對照表)
						2-1	110.07.21	瑞玉字第1100721145號	110.07.23	水南工字第11053059170號	詳述版次及檢附附件
						2-2	110.08.20	瑞玉字第1100820176號	110.08.06	水南工字第11053064560號	修正說明並提送
				2-3	110.09.08	瑞玉字第1100908195號	110.09.03	水南工字第11053071590號	修正說明並提送		
				2	110.11.01	瑞玉字第1101101233號	110.10.21	水南工字第11006065690號	同意辦理		
							110.11.04	水南工字第11006071500號	備查		
5	環境保育(環境保護執行)計畫	訂約次日 30日內	1-1	109.06.11	瑞鋒字第1090000290號	109.06.24	水南工字第10953041910號	修正並提送			
			1-2	109.08.04	瑞玉字第020號	109.08.11	水南工字第10950042390號	同意辦理			
		109.06.03	1	109.08.17	瑞玉字第033號	109.08.18	水南工字第10950044730號	備查			
6	丁類危險性工作場所安全評估	施工前				109.07.16	瑞玉字第004號	109.07.29	水南工字第10906045200號	召開審查會	
						109.08.18	瑞玉字第039號	109.08.07	水南工字第10906049710號	修正並提送	
		109.08.13				109.08.21	水南工字第10906054310號	經審查後認可			
			1	109.09.25	瑞玉字第086號	109.09.01	勞職南4字第1090507708號	召開審查會			
				1	110.06.17	瑞玉字第1100617117號	109.09.10	勞職南4字第1091049836號	修正經送職安署		
						109.10.05	水南工字第10953066650號	勞安署審查合格			
						110.07.01	水南工字第11006042590號	同意辦理			
7	設計階段風險評估報告	-	1-1	109.05.29	瑞鋒字第1090000246號	109.06.10	水南工字第10953037490號	修正並函復			
			1-2	109.06.17	瑞鋒字第1090000302號	109.06.29	水南工字第10953041920號	修正並函復			
			1-3	109.07.06	瑞鋒字第1090000341號	109.07.23	水南工字第10950038580號	同意辦理			
		109.06.13	1	109.07.30	瑞玉字第012號	109.08.05	水南工字第10950041590號	備查			
8	施工階段風險評估報告	施工前	1-1	109.08.03	瑞玉字第017號	109.08.07	水南工字第10953052970號	修正並提送			
			1-2	109.08.13	瑞玉字第031號	109.08.21	水南工字第10906053490號	同意辦理			
				1	109.08.24	瑞玉字第048號	109.08.25	水南工字第10950045940號	同意備查		
		109.08.13	2-1	110.09.30	瑞玉字第1100930210號	110.10.13	水南工字第11053081160號	退回修正			
			2-2	110.10.26	瑞玉字第1101026227號	11.12.03	水南工字第11006077040號	同意辦理			
			2	111.02.14	瑞玉字第1110214017號						
9	墜落災害防止計畫	進場前30日	1-1	109.12.28	瑞玉字第1091228184號	110.01.15	水南工字第11053002570號	修正說明並提送			
			1-2	110.01.27	瑞玉字第1100127021號	110.02.19	水南工字第11053009720號	修正說明並提送			
				1-3	110.03.05	瑞玉字第1100305033號	110.03.24	水南工字第11053024460號	同意辦理		
		109.12.31	1	110.08.11	瑞玉字第1100811167號						
10	局限空間危害防止計畫	進場前30日	1-1	110.01.05	瑞玉字第1100105002號	110.01.19	水南工字第11053004150號	修正說明並提送			
			1-2	110.02.03	瑞玉字第1100203026號	110.02.22	水南工字第11053010170號	修正說明並提送			
			1-3	110.03.09	瑞玉字第1100309034號	110.03.29	水南工字第11053026890號	同意辦理			
		110.01.30	1	110.08.11	瑞玉字第1100811168號						
11	營建工地逕流廢水汙染削減計畫	施工前				109.08.21	瑞玉字第047號	109.08.27	水南工字第10950045890號	補正並提送	
						109.08.31	瑞玉字第058號	109.09.23	水南工字第10953063890號	補正後過局憑辦	
							109.09.28	瑞玉字第088號	109.10.20	水南工字第10953069980號	南市環保局核可
		109.09.30	1	109.10.29	瑞玉字第125號						

決標日：109.04.21
 簽約日：109.05.04
 開工日：109.05.14

曾文南化聯通管統包工程A3標
 計畫文件送審時程管制總表

截止日期：111年7月15日

類別	項次	計畫書/文件名稱	契約規定送審期限	修訂版次	廠商		監造單位/機關業主		
			應/預定送審日期		日期	文號	日期	文號	審查結果
整體工作執行及整體工程佈置等	12	防汛及緊急應變計畫	109.09.30	1-1	109.08.28	瑞玉字第053號	109.09.10	水南工字第10953061000號	修正並提送
				1-2	109.09.17	瑞玉字第076號	109.09.28	水南工字第10953065570號	修正並提送
				1-3	109.10.12	瑞玉字第105號	109.10.26	水南工字第10953071570號	同意辦理
				1	109.10.30	瑞玉字第128號	109.11.03	水南工字第10950057360號	備查
	13	交通維持計畫	109.09.30	1	109.08.07	瑞玉字第027號	109.08.27	水南工字第10950045850號	修正再送
					109.08.21	瑞玉字第043號	109.10.26	水南工字第10950056340號	召開審查會
					109.09.29	瑞玉字第090號	109.11.09	水南工字第10953075310號	修正後提送
					109.11.19	瑞玉字第1091119154號	110.01.04	水南工字第10950070630號	南市交通局通過
				110.01.08	瑞玉字第1100108010號	110.01.15	水南工字第11053002180號	備查	
				一變	110.06.25	瑞玉字第1100625123號	110.07.16	水南工字第11053057970號	召開審查會
				一變	110.07.29	瑞玉字第1100729155號	110.07.26	水南工字第11053060640號	修正後再提送
				一變	110.09.01	瑞玉字第1100901187號	110.08.09	水南工字第11050041460號	召開審查會
	14	鄰房現況鑑定計畫	109.12.01	1-1	109.06.05	瑞鋒字第1090000275號	109.06.22	水南工字第10953040480號	修正並提送
				1-2	109.06.22	瑞鋒字第1090000320號	109.07.24	水南工字第10906045280號	同意辦理
	15	施工損壞鄰房事件預防與調處計畫	109.07.31	原名為「鄰近建築物及工地安全監測計畫」		1-1	109.07.10	瑞鋒字第1090000354號	
				1-1	109.07.16	瑞玉字第001號			
				1-2	109.08.06	瑞玉字第023號	109.09.15	水南工字第10953060870號	同意辦理
				1-3	109.08.26	瑞玉字第056號			
				1	109.09.24	瑞玉字第082號	109.10.14	水南工字第10950054350號	備查
				1	109.10.12	瑞玉字第106號			
	16	施工前鄰房現況鑑定報告書(第一階段)	-		109.10.06	瑞玉字第096號			
			109.12.31						
	17	施工前鄰房現況鑑定報告書(第二階段)	-		109.11.04	瑞玉字第134號	109.11.09	水南工字第10950058500號	認可
			109.12.31						
	18	施工前鄰房現況鑑定報告書(第三階段)	-		111.03.30	瑞玉字第1110330042號	111.04.07	水南工字第11153023120號	認可
111.03.31									
19	橋樑下推進施工中安全監測計畫-高陵橋	110.10.30	0	109.08.06	瑞玉字第025號	109.08.07	水南工字第10950043040號	提出安全計算書	
			1-1	110.05.31	瑞玉字第1100531097號	110.06.09	水南工字第11053047760號	退回修正	
			1-2	110.06.24	瑞玉字第1100624122號	110.07.08	水南工字第11053055690號	修正說明並提送	
			1-3	110.07.23	瑞玉字第1100723147號	110.08.06	聯管A3備字第1100806-1號	併入爆管應變計畫	
			1	110.10.26	瑞玉字第1101026228號	110.09.17	水南工字第11053075660號	養工處同意辦理	
20	平壓管路放流工安全評估	110.12.31	修正二修	110.03.16	瑞玉字第1100316040號	110.03.24	水南工字第11006020950號	修正並送	
				110.04.09	瑞玉字第1100409056號	110.04.15	水南工字第11053031020號	修正再送	
				110.04.23	瑞玉字第1100423064號				
			三修	110.05.07	瑞玉字第1100507076號	110.05.10	水南工字第11006029170號	召開審查會	
				110.05.31	瑞玉字第1100531096號	110.05.21	水南工字第11006033850號	修正並送	
				110.07.19	瑞玉字第1100719140號	110.06.18	水南工字第11006038780號	召開二次審查會	
				110.08.23	瑞玉字第1100823177號	110.06.23	水南工字第11006041860號	審查會改期	
21	現地調查計畫(測量計畫)	109.06.13	1-1	109.05.29	瑞鋒字第1090000244號	109.06.15	水南工字第10953038180號	修正並送	
			1-2	109.06.17	瑞鋒字第1090000303號	109.06.24	水南工字第10953041870號	修正並送	
			1-3	109.07.06	瑞鋒字第1090000338號	109.07.30	水南工字第10953038570號	同意辦理	
22	現地調查計畫(鑽探計畫)	109.07.31	1	109.08.17	瑞玉字第037號	109.08.19	水南工字第10950044880號	備查	
			1-1	109.05.29	瑞鋒字第1090000245號	109.06.08	水南工字第10953037320號	修正後提送	
			1-2	109.06.10	瑞鋒字第1090000286號	109.06.20	水南工字第10953040470號	修正後提送	
			1-3	109.06.24	瑞鋒字第1090000323號	109.07.22	水南工字第10906044300號	同意辦理	
23	現地調查計畫(地下管線調查計畫)	109.07.31	原名為「透地雷達檢測計畫」		1-1	109.07.10	瑞鋒字第1090000353號		
			1-1	109.07.16	瑞玉字第002號	109.07.28	水南工字第10953049450號	修正後提送	
			1-2	109.08.18	瑞玉字第038號				
			1-2	109.08.19	瑞玉字第041號	109.09.01	水南工字第10906056760號	修正並提送	
			1-3	109.09.08	瑞玉字第064號	109.10.05	水南工字第10906063630號	同意辦理	
			1	109.10.08	瑞玉字第0101號	109.10.13	水南工字第10950053760號	備查	
24	地下管線調查成果報告	109.11.30	1-1	109.11.11	瑞玉字第0140號	109.11.25	水南工字第10953080140號	修正並提送	
			1-2	109.12.7	瑞玉字第1091207167號	110.01.04	水南工字第10906085970號	認可	
			1	109.01.08	瑞玉字第1100108009號	110.01.12	水南工字第11053001990號	備查	
25	補充地質調查成果報告	109.10.30	1-1	109.10.05	瑞玉字第093號	109.10.20	水南工字第10953070760號	認可	
			1-2	109.10.30	瑞玉字第129號	109.11.26	水南工字第10906077490號	認可	
			1	109.12.04	瑞玉字第1091204168號	109.12.09	水南工字第10953083830號	備查	

決標日：109.04.21
 簽約日：109.05.04
 開工日：109.05.14

曾文南化聯通管統包工程A3標
 計畫文件送審時程管制總表

截止日期：111年7月15日

類別	項次	計畫書/文件名稱	契約規定送審期限	修訂版次	廠商		監造單位/機關業主			
			應/預定送審日期		日期	文號	日期	文號	審查結果	
整體工作執行及整體工程佈置等	26	補充測量成果報告	-	1-1	109.11.12	瑞玉字第141號	109.12.01	水南工字第10906079940號	完成修正並提交	
			110.01.31	1-2	109.12.15	瑞玉字第1091215173號	110.01.29	水南工字第11006004650號	認可	
				1	110.02.03	瑞玉字第1100203027號	110.02.08	水南工字第11053008560號	備查	
	27	鏡面水庫平壓管段(OK+050~OK+150)簡易水土保持申報書	進場前30日	1	109.08.05	瑞玉字第022號	109.08.14	水南工字第10906052800號	檢具後提交	
			109.08.05		109.11.16	瑞玉字第1091116149號	109.10.19	水南工字第10953070410號	召開審查會	
	28	明挖段及推進段(19K+748~24K+804)水土保持計畫	進場前30日	1	109.11.13	瑞玉字第145號	109.11.23	水南工字第10953077990號	補充資料後再送	
					109.12.17	瑞玉字第1091217175號	110.01.20	水南工字第11053004140號	補正份數	
					110.01.20	瑞玉字第1100120018號	110.01.28	水南工字第11053005840號	現勘及審查會	
					110.03.23	瑞玉字第1100323044號	110.02.22	水南工字第11053011020號	修正並提交	
						110.05.24	瑞玉字第1100524092號	110.03.23	水南工字第11053023690號	展延提交期限
			109.12.15		110.05.28	瑞玉字第1100528094號	110.04.20	水南工字第11053032340號	第2次審查會	
					110.07.01	瑞玉字第1100701130號	110.05.17	水南工字第11053041170號	修正後提交	
					110.07.27	瑞玉字第1100727149號	110.05.25	水南工字第11053044440號	展延提交期程	
					110.08.11	110.08.11	水南工字第11050039350號	110.06.24	水南工字第11053052240號	修正(補)正並提交
						110.08.11	水南工字第11050041940號	110.07.26	水南工字第11050039350號	水保局確認完成
	29	實施簽證之執行計畫	-	1-1	109.05.29	瑞鋒字第1090000247號	109.06.10	水南工字第10953037510號	修正並提交	
			109.06.13	1-2	109.06.15	瑞鋒字第1090000296號	109.06.23	水南工字第10953041280號	修正並提交	
				1	109.07.02	瑞鋒字第1090000333號	109.07.22	水南工字第10950037660號	同意辦理	
	30	工程紀錄影片製作人資料	決標通知日起60日曆天內	更換	109.07.30	瑞玉字第011號	109.08.05	水南工字第10950041580號	備查	
			109.06.19		109.05.25	瑞鋒字第1090000236號	109.05.29	水南工字第10950028170號	資料補附再送	
					109.06.03	瑞鋒字第1090000255號	109.06.08	水南工字第10950030510號	修正後提交	
	31	新型冠狀病毒(COVID-19)緊急應變計畫	-	1-1	110.06.29	瑞玉備字第1100629-002號	110.07.06	聯管A3備字第1100706-2號	同意辦理	
			-	1	110.07.12	瑞玉備字第1100712-001號				
	32	土石方載運計畫	進場前30日	1-1	109.08.19	瑞玉字第040號	109.08.25	水南工字第10906055620號	修正並提交	
			109.10.31	1-2	109.08.31	瑞玉字第055號	109.09.09	水南工字第10953060800號	修正並提交	
				1	109.09.24	瑞玉字第083號	109.10.22	水南工字第10906068640號	同意辦理	
	33	RMSM拌和計畫/工地型CLSM拌和計畫	施工前	1-1	110.05.12	瑞玉字第1100512084號	110.05.27	水南工字第11053045210號	退回修正	
			110.06.30	1-2	110.06.10	瑞玉字第1100610111號	110.07.15	水南工字第11006045130號	同意辦理	
				1	110.08.11	瑞玉字第1100811169號				
	34	鐸接程序書(廠製)	進場前30日	1-1	109.12.01	瑞玉字第1091201166號	109.12.15	水南工字第10953085660號	修正並提交	
			109.12.01	1-2	109.12.22	瑞玉字第1091222179號	110.01.13	聯管A3備字第1100113-2號	同意辦理	
	35	工地鐸接程序書	進場前30日	1-1	110.01.21	瑞玉備字第1100121-001號				
			110.03.31	1-2	110.03.17	瑞玉備字第1100317-002號	110.03.26	水南工字第11053026880號	修正並提交	
				1	110.04.09	瑞玉字第1100409057號	110.04.23	水南工字第11053034050號	修正並提交	
	36	管線試水計畫	進場前30日	1-1	110.04.29	瑞玉字第1100429068號	110.06.10	水南工字第11006036960號	同意辦理	
			111.06.30	1	110.06.18	瑞玉字第1100617119號	110.06.18	水南工字第11053051400號	備查	
	37	與既有管線連絡計畫	進場前30日	1-1	111.05.11	瑞玉字第1110511065號	111.05.24	水南工字第11153036990號	修正說明並提交	
			112.06.30	1-2	111.06.06	瑞玉字第1110606082號				
	38	試運轉計畫書	進場前30日							
			112.10.30							
39	操作及維護手冊	竣工前60天								
		113.04.22								
40	教育訓練計畫	竣工前60天								
		113.04.22								

決標日：109.04.21
 簽約日：109.05.04
 開工日：109.05.14

曾文南化聯通管統包工程A3標
 計畫文件送審時程管制總表

截止日期：111年7月15日

類別	項次	計畫書/文件名稱	契約規定送審期限	修訂版次	廠商		監造單位/機關業主		
			應/預定送審日期		日期	文號	日期	文號	審查結果
使用河川公地申請書	41	三埔水管橋使用河川公地申請書			109.07.30	瑞玉字第009號	109.08.14	水南工字第10906052270號	檢送第六河川局
	42	四埔水管橋使用河川公地申請書			109.07.30 109.08.21	瑞玉字第014號 瑞玉字第046號	109.08.14	水南工字第10906052680號	修正並提送
	43	沙田水管橋使用河川公地申請書			109.07.30 109.08.21	瑞玉字第015號 瑞玉字第046號	109.08.14	水南工字第10906052680號	修正並提送
	44	竹圍橋推進段使用河川公地申請書			109.12.23	瑞玉字第1091223180號	109.09.30 109.11.12 109.11.24 110.02.26	水南工字第10950052240號 水南工字第10953076790號 水南工字第10953078240號 水南工字第11050007790號	檢送第六河川局 修正並提送 檢送第六河川局 經濟部同意辦理
	45	北寮橋推進段使用河川公地申請書			109.12.23	瑞玉字第1091223180號	109.10.13 109.11.09 109.11.24 110.02.22	水南工字第10950054380號 水南工字第10953075760號 水南工字第10953078240號 水南工字第11050007410號	檢送第六河川局 修正並提送 檢送第六河川局 經濟部同意辦理
	46	平壓管段水管橋(鏡面一號橋)使用河川公地申請書			109.12.23 110.03.22 110.06.16	瑞玉字第1091223181號 瑞玉字第1100322043號 瑞玉字第1100616115號	110.01.04 110.03.15 110.03.25 110.04.23 110.05.10 110.06.18 110.07.14 110.08.05 110.09.03	水南工字第10906086450號 水南工字第10953022650號 水南工字第11053025960號 水南工字第11053034380號 水南工字第11053039610號 水南工字第11053050870號 聯管A3備字第1100714-2號 水南工字第11053062720號 水南工字第11050045060號	檢送第六河川局 修正提送 檢送第六河川局 六河局辦理會勘 修正並過局憑辦 檢送第六河川局 六河局辦理會勘 六河局審查符合許可書
明挖埋管工程	47	SP鋼管製作計畫	進場前30日	1-1	109.07.23	瑞玉字第006號	109.07.30	水南工字第10953050680號	修正並提送
			109.09.30	1-2	109.08.06	瑞玉字第024號	109.08.13	水南工字第10953054270號	修正並提送
	109.09.30	1-3		109.08.20	瑞玉字第042號	109.09.04	水南工字第10906055830號	同意辦理	
		48	管線工程施工計畫	進場前30日	1	109.09.08	瑞玉字第063號	109.09.08	水南工字第10950048800號
	109.12.01			1-1	109.10.06	瑞玉字第097號	109.10.22	水南工字第10953071560號	修正後提送
		109.12.01	1-2	109.10.29	瑞玉字第126號	109.11.20	水南工字第10953077770號	修正說明後提送	
	109.12.01		1-3	109.12.01	瑞玉字第1091201163號	109.12.30	水南工字第10906086020號	同意辦理	
		49	瀝青混凝土施工計畫	進場前30日	1	110.01.08	瑞玉字第1100108011號	110.01.15	水南工字第11053002200號
	110.06.30			1-1	110.05.07	瑞玉字第1100507077號	110.05.25	水南工字第11053044330號	退回修正
		110.06.30	1-2	110.06.07	瑞玉字第1100607105號	110.07.14	水南工字第11006045300號	同意辦理	
50	明挖分項品質計畫		-	-	原名為「開挖支撐分項品質計畫」，依據經濟部水利署南區水資局110年8月6日水南工字第11053064180號函更名為「管線工程施工計畫書(含品質計畫)」，再依據巨廷工程顧問股份有限公司110年8月24日巨字第1100001453號函修正為「明挖分項品質計畫」。				
		-	1-1	110.07.09	瑞玉字第1100709133號	110.08.06	水南工字第11053064180號	修正完成並提送	
110.07.09	1-2	110.08.13	瑞玉字第1100813173號	110.08.25	水南工字第11053069290號	修正完成並提送			
	1-3	110.09.06	瑞玉字第1100906192號	110.09.15	水南工字第11053075620號	修正完成並提送			
110.09.24	1-4	110.09.24	瑞玉字第1100922204號	110.09.28	水南工字第11053077540號	展延提送期限			
	1-5	110.10.01	瑞玉字第1101001211號	110.10.15	水南工字第11053081850號	修正完成並提送			
110.10.25	修1	110.10.25	瑞玉字第1101025223號	110.11.15	水南工字第11006074180號	同意辦理			
	修1	110.11.22	瑞玉字第1101122252號	110.11.23	水南工字第11053092600號	備查			
推進工程	51	WSP鋼管製造計畫	進場前30日	1-1	109.07.29	瑞玉字第008號	109.08.07	水南工字第10953052950號	修正並提送
			109.09.30	1-2	109.08.25	瑞玉字第050號	109.09.04	水南工字第10953059440號	修正並提送
	109.09.30	1-3		109.09.11	瑞玉字第068號	109.09.24	水南工字第10953064720號	修正並提送	
		109.10.27	1-4	109.09.30	瑞玉字第092號	109.10.22	水南工字第10906069420號	同意辦理	
	52		推進工程施工計畫	進場前30日	1	109.10.27	瑞玉字第0124號	109.10.29	水南工字第10950056720號
		110.01.30		1-1	109.09.10	瑞玉字第067號	109.09.23	水南工字第10953064350號	修正並提送
	110.01.30		1-2	109.10.05	瑞玉字第095號	109.10.13	水南工字第10906066030號	區分工作井工程	
		110.01.30	1-1	109.10.14	瑞玉字第112號	109.11.03	水南工字第10906072680號	修正並提送	
	110.01.30		1-2	109.11.16	瑞玉字第1091116148號	109.12.07	水南工字第10906081550號	修正並提送	
		110.01.30	1-3	109.12.21	瑞玉字第1091221177號	110.01.20	水南工字第11006002370號	同意辦理	
53	工作井工程施工計畫		進場前30日	1	110.01.27	瑞玉字第1100127022號	110.01.29	水南工字第11050004540號	備查
		110.01.30	1-1	109.10.14	瑞玉字第107號	109.11.02	水南工字第10906072190號	修正並提送	
110.01.30	1-2		109.11.13	瑞玉字第143號	109.12.01	水南工字第10953081700號	修正並提送		
	110.01.30	1-3	109.12.08	瑞玉字第1091208171號	110.01.15	水南工字第11006001070號	同意辦理		
54		推進分項品質計畫	-	1	110.01.27	瑞玉字第1100127023號	110.01.29	水南工字第11050004550號	備查
	-		-	原名為「工作井分項品質計畫」，依據經濟部水利署南區水資局110年8月6日水南工字第11053064180號函更名為「推進工程施工計畫書(含品質計畫)」，再依據巨廷工程顧問股份有限公司110年8月24日巨字第1100001453號函修正為「推進分項品質計畫」。					
110.07.09	1-1	110.07.09	瑞玉字第1100709133號	110.08.06	水南工字第11053064180號	修正完成並提送			
	1-2	110.08.13	瑞玉字第1100813173號	110.08.25	水南工字第11053069290號	修正完成並提送			
110.09.06	1-3	110.09.06	瑞玉字第1100906192號	110.09.15	水南工字第11053075620號	修正完成並提送			
	1-4	110.09.24	瑞玉字第1100922204號	110.09.28	水南工字第11053077540號	展延提送期限			
110.10.01	1-5	110.10.01	瑞玉字第1101001211號	110.10.15	水南工字第11053081850號	修正完成並提送			
	修1	110.10.25	瑞玉字第1101025223號	110.11.15	水南工字第11006074180號	同意辦理			
110.11.22	修1	110.11.22	瑞玉字第1101122252號	110.11.23	水南工字第11053092600號	備查			

決標日：109.04.21
 簽約日：109.05.04
 開工日：109.05.14

曾文南化聯通管統包工程A3標
 計畫文件送審時程管制總表

截止日期：111年7月15日

類別	項次	計畫書/文件名稱	契約規定送審期限 應/預定送審日期	修訂 版次	廠商		監造單位/機關業主		
					日期	文號	日期	文號	審查結果
水管橋工程	55	水管橋施工計畫	進場前30日 111.06.30	1-1	111.06.28	瑞玉字第1110628096號	111.07.13	水南工字第11153050310號	修正說明並提送
	56	全套管基樁施工計畫	進場前30日 110.12.30	1-1 1-2 1-3 1	110.08.04 110.08.26 110.09.10 110.10.13	瑞玉字第1100804160號 瑞玉字第1100826181號 瑞玉字第1100910197號 瑞玉字第1101013215號	110.08.19 110.09.06 110.10.04 110.10.14	水南工字第11053067170號 水南工字第11053072410號 水南工字第11006063490號 水南工字第11006066520號	修改補正再過局 修改補正再過局 同意辦理 備查
機電監控工程	57	閥類製造計畫	-	1-1	110.05.11	瑞玉字第1100511079號	110.05.13	水南工字第11053040600號	請考量合併
					110.06.11	瑞玉字第1100611113號	110.07.02	水南工字第11053054240號	修正並函送
					110.07.16	瑞玉字第1100716136號	110.09.15	水南工字第11006059610號	整併修正再提送
					110.08.31	依據經濟部水利署南區水資局110年9月15日水南工字第11006059610號函，將「雙拉桿式伸縮接頭製作計畫」、「鋼製可撓管製作計畫」、「排氣閥製作計畫」、「緩衝閥製作計畫」、「手動偏心旋塞閥製作計畫」、「彈性座封閥製作計畫」、「電動球型制水閥製作計畫」及「電動蝶型閥製作計畫」整併為「閥類製造計畫」。			
58	水工機械施工計畫	水工機械細部設計單元同意辦理後14日	1-1 1-2	110.11.05	瑞玉字第1101105241號	110.11.10	水南工字第11006071480號	同意辦理	
				110.11.29	瑞玉字第1101129261號	110.12.02	水南工字第11053094830號	備查	
				111.02.07	瑞玉備字第1110207-003號	111.02.28	聯管A3備字第1110208-2號	同意展延	
				111.02.08	依據經濟部水利署南區水資局111年3月9日水南工字第11153016200號函暨瑞鋒營造有限公司111年2月24日瑞玉字第1110225029號函，將「閥類運輸計畫」及「水工機械安裝施工計畫」併案為「水工機械施工計畫」提送。				
58	水工機械施工計畫	水工機械細部設計單元同意辦理後14日	1-1 1-2	111.02.24	瑞玉字第1110225029號	111.03.09	水南工字第11153016200號	修正說明並提送	
				111.03.17	瑞玉字第1110317038號	111.03.21	水南工字第11153019240號	同意展延	
				111.03.23	瑞玉字第1110323039號	111.03.25	水南工字第11153020600號	同意展延	
				111.05.19	瑞玉字第1110519072號	111.06.06	水南工字第11153038750號	修正說明並提送	

註1：其他未列之分項工程，將依契約規範及工程需求予與增加。

註2：分項計畫書可併於整體計畫書編寫。

註3：將「水管橋工程施工計畫」及「鋼構吊裝分項計畫」併案為「水管橋施工計畫」提送。

註4：依據經濟部水利署南區水資局110年9月15日水南工字第11006059610號函，將「雙拉桿式伸縮接頭製作計畫」、「鋼製可撓管製作計畫」、「排氣閥製作計畫」、「緩衝閥製作計畫」、「手動偏心旋塞閥製作計畫」、「彈性座封閥製作計畫」、「電動球型制水閥製作計畫」及「電動蝶型閥製作計畫」整併為「閥類製造計畫」。

註5：依據經濟部水利署南區水資局111年3月9日水南工字第11153016200號函暨瑞鋒營造有限公司111年2月24日瑞玉字第1110225029號函，將「閥類運輸計畫」及「水工機械安裝施工計畫」併案為「水工機械施工計畫」提送。

項次	次編號	計畫書/文件名稱	契約規定送審期限		修訂版次	廠商		監造單位/機關業主				
			應/預定送審日期			日期	文號	日期	文號	審查結果		
1	1	整體工程佈置	109.09.13 設計品質計畫 (第二版)	1-1	109.07.31	瑞玉字第016號	109.08.19	水南工字第10953055060號	修正並提送			
				1-2	109.09.03	瑞玉字第061號	109.09.21	水南工字第10906062240號	修正並提送			
				1-3	109.10.05	瑞玉字第094號	109.11.24	水南工字第10906076550號	同意辦理			
2	2-1	起點至W38推進井	109.11.30 設計品質計畫 (第二版)	1	110.01.28	瑞玉字第1100128024號	110.02.04	水南工字第11053007160號	備查 (A1圖、A3圖、CAD圖)			
				1-1	110.03.17	瑞玉字第1100317041號	110.03.18	水南工字第11053025040號	調整長度範圍再送			
				1-1	110.03.19	瑞玉字第1100319042號	110.03.31	水南工字第11053028280號	修正或說明並提送			
				1-2	110.04.01	瑞玉字第1100401055號	110.04.08	水南工字第11053029660號	同意依圖先行施作			
				1	110.04.15	瑞玉備字第1100415-002號	110.04.16	聯管A3備字第1100416-1號	備查			
				1	110.12.30	瑞玉字第1101230280號	111.01.14	水南工字第11106000790號	同意辦理 (A1原圖)			
	2-2	管路工程—明挖覆蓋段	W38推進井至終點 (不含三埔橋上下游銜接段)	109.11.30 設計品質計畫 (第二版)	原名為「管路工程—明挖覆蓋段—起點至沙田橋 (W38推進井至沙田橋)」					109.10.07	水南工字第10953066180號	修正並提送
					1-1	109.09.16	瑞玉字第074號	109.10.07	水南工字第10953066180號	修正並提送		
					1-2	109.10.16	瑞玉字第117號	109.11.05	水南工字第10953074130號	修正並提送		
					1-3	109.11.20	瑞玉字第1091120158號	109.12.01	水南工字第10906080050號	修正或說明並提送		
						109.12.16	瑞玉備字第1091216-001號	109.12.07	聯管A3備字第1091207-1號	召開細部設計圖研討會		
						109.12.16	瑞玉備字第1091216-001號	109.12.14	聯管A3備字第1091214-1號	細部設計圖研討會改時		
						109.12.16	瑞玉備字第1091216-001號	109.12.17	聯管A3備字第1091217-2號	展延提送期限		
						109.12.31	瑞玉備字第1091231-001號	109.12.22	聯管A3備字第1091222-1號	細部設計圖研討會議紀錄		
					1-4	110.01.08	瑞玉字第1100108006號	110.01.04	聯管A3備字第1100104-2號	再展延提送期限		
	110.03.09	瑞玉字第1100309035號	110.02.23	聯管A3備字第1100223-1號	召開細部設計圖審查會							
	110.03.09	瑞玉字第1100309035號	110.02.24	水南工字第11053011710號	修正並提送							
	110.03.30	瑞玉字第1100330052號	110.02.26	聯管A3備字第1100226-2號	新增審查會內容							
	110.03.30	瑞玉字第1100330052號	110.03.12	水南工字第11006017820號	A2及A3銜接介面協調會							
	110.03.30	瑞玉字第1100330052號	110.03.16	聯管A3備字第1100316-1號	細部設計檢討會議紀錄							
	110.03.30	瑞玉字第1100330052號	110.03.18	水南工字第11006019260號	介面協調會議紀錄							
	110.03.30	瑞玉字第1100330052號	110.03.22	水南工字第11053024981號	修正並提送							
	110.03.30	瑞玉字第1100330052號	110.04.07	聯管A3備字第1100407-1號	細部設計圖討論會議							
	110.03.30	瑞玉字第1100330052號	110.04.12	聯管A3備字第1100412-2號	細部設計圖討論會議紀錄							
			原名為「管路工程—明挖覆蓋段—沙田橋至終點 (不含三埔橋上下游銜接段)」					109.10.07	水南工字第10953066190號	修正並提送		
			1-1	109.09.16	瑞玉字第075號	109.10.07	水南工字第10953066190號	修正並提送				
			1-2	109.10.16	瑞玉字第118號	109.11.05	水南工字第10953074150號	修正並提送				
			1-3	109.11.20	瑞玉字第1091120159號	109.12.01	水南工字第10906080060號	修正或說明並提送				
				109.12.16	瑞玉備字第1091216-001號	109.12.07	聯管A3備字第1091207-1號	召開細部設計圖研討會				
				109.12.16	瑞玉備字第1091216-001號	109.12.14	聯管A3備字第1091214-1號	細部設計圖研討會改時				
				109.12.16	瑞玉備字第1091216-001號	109.12.17	聯管A3備字第1091217-2號	展延提送期限				
				109.12.31	瑞玉備字第1091231-001號	109.12.22	聯管A3備字第1091222-1號	細部設計圖研討會議紀錄				
			1-4	110.01.08	瑞玉字第1100108007號	110.01.04	聯管A3備字第1100104-2號	再展延提送期限				
			1-5	110.03.09	瑞玉字第1100309036號	110.02.23	聯管A3備字第1100223-1號	召開細部設計圖審查會				
				110.03.09	瑞玉字第1100309036號	110.02.24	水南工字第11053011700號	修正並提送				
				110.03.09	瑞玉字第1100309036號	110.02.26	聯管A3備字第1100226-2號	新增審查會內容				
				110.03.09	瑞玉字第1100309036號	110.03.12	水南工字第11006017820號	A2及A3銜接介面協調會				
				110.03.09	瑞玉字第1100309036號	110.03.16	聯管A3備字第1100316-1號	細部設計檢討會議紀錄				
				110.03.09	瑞玉字第1100309036號	110.03.18	水南工字第11006019260號	介面協調會議紀錄				
				110.03.09	瑞玉字第1100309036號	110.03.22	水南工字第11053024981號	修正並提送				
				110.03.30	瑞玉字第1100330053號	110.04.07	聯管A3備字第1100407-1號	細部設計圖討論會議				
				110.03.30	瑞玉字第1100330053號	110.04.12	聯管A3備字第1100412-2號	細部設計圖討論會議紀錄				
			依據經濟部水利署南區水資局曾文南化聯通管統包工程A3標工務所110年4月12日聯管A3備字第1100412-2號備忘錄，合併「管路工程—明挖覆蓋段—起點至沙田橋 (W38推進井至沙田橋)」及「管路工程—明挖覆蓋段—沙田橋至終點 (不含三埔橋上下游銜接段)」並調整名稱為「管路工程—明挖覆蓋段—W38推進井至終點 (不含三埔橋上下游銜接段)」。					110.04.15	聯管A3備字第1100415-1號	原則同意辦理		
				1	110.04.26	瑞玉備字第1100426-001號	110.04.20	水南工字第11053032670號	同意辦理			
				1	110.12.30	瑞玉字第1101230280號	110.04.26	聯管A3備字第1100426-1號	備查			
				1	110.12.30	瑞玉字第1101230280號	111.01.14	水南工字第11106000790號	同意辦理 (A1原圖)			
2-3	3	三埔橋上下游銜接段	110.06.01 設計品質計畫 (第二版)	1-1	110.06.01	瑞玉字第1100601099號	110.06.17	水南工字第11053050650號	退回修正			
				1-2	110.06.29	瑞玉字第1100629128號	110.07.15	水南工字第11053057850號	退回修正			
				1-3	110.07.28	瑞玉字第1100728153號	110.08.13	水南工字第11053065560號	修正再送			
				1-4	110.08.23	瑞玉字第1100823179號	110.09.03	水南工字第11053071620號	納入水保圖說再送			
				左岸	110.11.03	瑞玉字第1101103236號	110.10.26	水南工字第11006064250號	同意辦理 (除左岸邊坡)			
				左岸	110.11.30	瑞玉字第1101130262號	110.11.22	水南工字第11006075420號	檢討再提送			
				左岸	110.12.13	瑞玉字第1101213267號	110.12.01	水南工字第11053095140號	展延提送期限			
				左岸	111.01.11	瑞玉字第1110111004號	110.12.24	水南工字第11053101110號	完成修正再送			
				左岸	111.01.17	瑞玉字第1110117023號	111.02.07	水南工字第11153006600號	完成修正再送			
				左岸	111.02.17	瑞玉字第1110217023號	111.03.17	水南工字第11153018360號	完成修正再送			
				左岸	111.04.06	瑞玉字第1110406047號	111.03.23	水南工字第11106014500號	修正提送程			
				1	111.06.17	瑞玉字第1110617090號	111.06.02	水南工字第11106024660號	同意辦理			
	111.06.17	瑞玉字第1110617090號	111.06.27	水南工字第11153044070號	備查 (A1圖、A3圖、CAD圖)							

決標日：109.04.21
 簽約日：109.05.04
 開工日：109.05.14

曾文南化聯通管統包工程A3標
 細部設計單元送審時程管制總表

截止日期：111年7月15日

項次	次編號	計畫書/文件名稱	契約規定送審期限 應/預定送審日期	修訂版次	廠商		監造單位/機關業主						
					日期	文號	日期	文號	審查結果				
3	3	管路工程—推進段	109.11.30 設計品質計畫 (第二版)	1	「管路工程—推進段—W38-W39工作井(竹圍橋)」								
					1-1	109.09.08	瑞玉字第065號	109.09.26	水南工字第10953065500號	修正並提送			
					1-2	109.10.08	瑞玉字第0102號	109.10.28	水南工字第10906071390號	修正並提送			
					1-3	109.11.06	瑞玉字第0136號	109.11.25	聯管A3備字第1091125-1號	原則同意			
					1-4	109.12.23	瑞玉字第1091223182號	109.12.10	水南工字第10953084050號	修正並提送			
					1	110.03.02	瑞玉備字第1100302-002號	110.02.17	水南工字第11006005140號	同意辦理			
					1	110.03.02	瑞玉備字第1100302-002號	110.03.02	聯管A3備字第1100302-2號	備查			
					「管路工程—推進段—玉井市區」								
					1-1	110.01.15	瑞玉字第1100115014號	110.02.19	水南工字第11006009100號	修正並提送			
					「管路工程—推進段—其餘推進管段」								
1-1	110.01.20	瑞玉字第1100120017號	110.02.19	水南工字第11006009100號	修正並提送								
依據經濟部水利署南區水資局110年2月19日水南工字第11006009100號函，將「管路工程—推進段—玉井市區」及「管路工程—推進段—其餘推進管段」合併為「管路工程—推進段」提送。													
					110.02.23	聯管A3備字第1100223-1號	110.02.26	聯管A3備字第1100226-2號	召開細部設計圖審查會 新增審查會內容				
					110.03.16	聯管A3備字第1100316-1號	110.03.16	聯管A3備字第1100316-1號	細部設計檢討會議紀錄				
					110.04.07	水南工字第11006021920號	110.04.07	水南工字第11006021920號	同意辦理				
					110.06.04	水南工字第11006034870號	110.06.04	水南工字第11006034870號	同意辦理(A1原圖)				
					110.06.11	水南工字第11053049360號	110.06.11	水南工字第11053049360號	備查(A1圖、A3圖、CAD圖)				
					110.06.21	水南工字第11006041080號	110.06.21	水南工字第11006041080號	仍依核定圖施作				
4	4-1	沙田水管橋	109.10.31 設計品質計畫 (第二版)	1	「水管橋工程」								
					1-1	109.10.15	瑞玉字第111號	109.11.06	水南工字第10906073770號	修正並提送			
						109.12.16	瑞玉備字第1091216-001號	109.12.14	聯管A3備字第1091214-1號	召開細部設計圖研討會 細部設計圖研討會改時			
						109.12.31	瑞玉備字第1091231-001號	109.12.17	聯管A3備字第1091217-2號	展延提送期限			
					1-2	110.01.08	瑞玉字第1100108008號	109.12.22	聯管A3備字第1091222-1號	細部設計圖研討會議紀錄			
					1-3	110.02.19	瑞玉字第1100219028號	110.01.04	聯管A3備字第1100104-2號	再展延提送期限			
						110.03.26	瑞玉備字第1100326-001號	110.01.29	水南工字第11053006480號	修正並提送			
						110.04.16	瑞玉備字第1100416-001號	110.02.23	聯管A3備字第1100223-1號	召開細部設計圖審查會			
						110.04.20	瑞玉字第1100420061號	110.02.26	聯管A3備字第1100226-2號	新增審查會內容			
						110.04.20	瑞玉字第1100420061號	110.03.12	水南工字第11053022550號	修正並提送			
		110.04.16	瑞玉備字第1100416-001號	110.03.16	聯管A3備字第1100316-1號	細部設計檢討會議紀錄							
		110.04.22	聯管A3備字第1100422-1號	110.03.29	聯管A3備字第1100329-1號	展延提送期限							
		110.04.27	聯管A3備字第1100427-1號	110.04.27	聯管A3備字第1100427-1號	召開細部設計圖審查會 細部設計檢討會議紀錄							
	依據經濟部水利署南區水資局曾文南化聯通管統包工程A3標工務所110年4月27日聯管A3備字第1100427-1號備忘錄，將本細部設計單元區分為「水管橋工程(沙田水管橋、平壓管段水管橋)」及「水管橋工程(三埔水管橋、四埔水管橋)」兩項子單元。												
						110.05.25	水南工字第11053043560號	110.08.05	水南工字第11006047940號	退回修正 同意辦理			
						110.06.01	瑞玉字第1100601098號	110.06.01	瑞玉字第1100601098號	同意辦理(水管橋A1原圖)			
						110.08.10	瑞玉字第1100810166號	110.08.10	瑞玉字第1100810166號	備查(水管橋A1圖、A3圖、CAD圖)			
						110.11.25	瑞玉字第1101125257號	110.12.17	水南工字第11006080170號	同意辦理(水管橋A1原圖)			
						110.12.22	瑞玉字第1101222272號	110.12.24	水南工字第11053101370號	備查(水管橋A1圖、A3圖、CAD圖)			
	4-2	4-2	平壓管段水管橋	110.06.30 設計品質計畫 (第二版)	1	「水管橋工程」							
1-1						110.06.29	瑞玉字第1100629127號	110.07.16	水南工字第11053058380號	修正再送			
1-2						110.07.28	瑞玉字第1100728154號	110.08.17	水南工字第11053066360號	修正再送			
1-3						110.08.30	瑞玉字第1100830185號	110.09.16	水南工字第11053074930號	修正再送			
1-4						110.09.29	瑞玉字第1100929209號	110.10.14	水南工字第11053081150號	修正並送			
1-5						110.10.26	瑞玉字第1101026226號	110.11.19	水南工字第11006073570號	同意辦理			
1						110.11.26	瑞玉備字第1101126-001號	110.11.26	聯管A3備字第1101126-3號	備查			
1						110.11.25	瑞玉字第1101125257號	110.12.17	水南工字第11006080170號	同意辦理(水管橋A1原圖)			
1						110.12.22	瑞玉字第1101222272號	110.12.24	水南工字第11053101370號	備查(水管橋A1圖、A3圖、CAD圖)			
4-3						4-3	三埔水管橋、四埔水管橋	110.05.30 設計品質計畫 (第二版)	1	「水管橋工程」			
	1-1	110.05.27	瑞玉字第1100527093號	110.06.11	水南工字第11053049160號					修正並提送			
	1-2	110.06.24	瑞玉字第1100624121號	110.06.28	水南工字第11053052850號					展延提送期限			
	1-3	110.07.22	瑞玉字第1100722146號	110.08.16	水南工字第11053065050號					修正再送			
	1-3	110.08.26	瑞玉字第1100826180號	110.09.03	水南工字第11053071610號					納入水保圖說再送			
	1	110.10.29	瑞玉字第1101029231號	110.10.20	水南工字第11006064170號					同意辦理			
	1	110.11.25	瑞玉字第1101125257號	110.12.17	水南工字第11006080170號					同意辦理(水管橋A1原圖)			
	1	110.12.22	瑞玉字第1101222272號	110.12.24	水南工字第11053101370號					備查(水管橋A1圖、A3圖、CAD圖)			

決標日：109.04.21
 簽約日：109.05.04
 開工日：109.05.14

曾文南化聯通管統包工程A3標
 細部設計單元送審時程管制總表

截止日期：111年7月15日

項次	次編號	計畫書/文件名稱	契約規定送審期限		廠商		監造單位/機關業主							
			應/預定送審日期	修訂版次	日期	文號	日期	文號	審查結果					
5	5-1	鏡面平壓管段	明挖覆蓋段	施工前3個月	「鏡面平壓管段—明挖覆蓋段(OK+050-OK+150)」					109.09.28	水南工字第10953065110號	修正並提送		
					1-1	109.09.14	瑞玉字第069號	109.11.02	水南工字第10953072880號	修正或說明並提送				
					1-2	109.10.07	瑞玉字第099號	109.12.01	水南工字第10906079970號	修正或說明並提送				
					1-3	109.11.12	瑞玉字第142號	109.12.07	聯管A3備字第1091207-1號	召開細部設計圖研討會				
								109.12.14	聯管A3備字第1091214-1號	細部設計圖研討會改時				
								109.12.17	聯管A3備字第1091217-2號	展延提送期限				
								109.12.22	聯管A3備字第1091222-1號	細部設計圖研討會議紀錄				
								110.01.04	聯管A3備字第1100104-2號	再展延提送期限				
					1-4	110.01.08	瑞玉字第1100108005號	110.02.19	水南工字第11053009660號	同意辦理				
					1	110.03.02	瑞玉備字第1100302-001號	110.03.02	聯管A3備字第1100302-1號	備查				
					「鏡面平壓管段—明挖覆蓋段(OK+050-OK+450)」									
			110.05.07 設計品質計畫 (第二版)	1-1	110.05.05	瑞玉字第1100505074號	110.05.20	水南工字第11053042270號	退回修正					
				1-2	110.06.02	瑞玉字第1100602101號	110.06.21	水南工字第11053050970號	修正或說明並提送					
				1-3	110.06.29	瑞玉字第1100629126號	110.08.09	水南工字第11006049820號	同意辦理					
				1	110.08.11	瑞玉備字第1100811-002號								
		5-2	調整池及消能設施	施工前3個月	1-1	110.10.15	瑞玉字第1101015217號	110.11.08	水南工字第11006072450號	修正並送				
	1-2				110.11.22	瑞玉字第1101122254號	110.12.13	水南工字第11006080920號	完成修正並送					
1-3	110.12.24				瑞玉字第1101224277號	111.01.25	水南工字第11106004380號	完成修正並再送						
1-4	111.02.15				瑞玉字第1110215019號	111.02.17	水南工字第11153010380號	展延提送期限						
	111.03.01				瑞玉字第1110301031號	111.03.28	水南工字第11153020810號	完成修正再送						
	111.04.07				瑞玉字第1110407049號	111.05.24	水南工字第11106024620號	檢討後再送						
6	6-1	水工機械與機電監控工程	水工機械工程	施工前3個月	1-1	110.06.10	瑞玉字第1100610112號	110.07.02	水南工字第11053053890號	修正並提送				
						110.07.16	瑞玉字第1100716137號	110.07.20	水南工字第11053059100號	展延提送期限				
					1-2	110.07.23	瑞玉字第1100723148號	110.08.04	水南工字第11006051160號	納入監控設備				
								110.08.13	水南工字第11053066020號	修正再送				
								110.09.03	聯管A3備字第1100903-1號	召開審查會				
								110.09.14	水南工字第11053074400號	修正並送				
								110.09.16	聯管A3備字第1100916-1號	修正後再送				
								110.09.28	水南工字第11053077510號	展延提送期限				
								110.11.03	水南工字第11053087120號	修正並送				
								111.01.25	水南工字第11006074240號	同意辦理				
								111.03.04	水南工字第11106008860號	核定(A1原圖)				
								111.03.16	水南工字第11153017430號	備查(A1圖、A3圖、CAD圖)				
			110.06.15 設計品質計畫 (第二版)	1-4	110.09.14	瑞玉字第1100922203號								
				1-5	110.10.15	瑞玉字第1101015218號	110.11.03	水南工字第11053087120號	修正並送					
				1	110.11.05	瑞玉字第1101105240號	111.01.25	水南工字第11006074240號	同意辦理					
				1	111.02.21	瑞玉字第1110221026號	111.03.04	水南工字第11106008860號	核定(A1原圖)					
				1	111.03.11	瑞玉字第1110311034號	111.03.16	水南工字第11153017430號	備查(A1圖、A3圖、CAD圖)					
		6-2	機電監控工程	施工前3個月	1-1	110.08.16	瑞玉字第1100816174號	110.09.02	水南工字第11053071000號	修正再送				
1-2	110.09.16				瑞玉字第1100916199號	110.11.08	水南工字第11006072460號	修正並送						
1-3	110.11.22				瑞玉字第1101122255號	111.01.20	水南工字第11106003430號	修正後再送						
1-4	111.01.26				瑞玉字第1110126014號	111.03.25	水南工字第11106011310號	召開審查會						
						111.04.08	水南工字第11106016410號	修正後再送						
						111.06.02	水南工字第11106024570號	同意辦理						
		110.08.15 設計品質計畫 (第二版)	1	111.06.10	瑞玉字第1110610087號	111.06.27	水南工字第11106028320號	核定(A1原圖)						
			1	111.07.04	瑞玉字第1110704099號	111.07.06	水南工字第11153047980號	備查(A1圖、A3圖、CAD圖)						
7	7	職業安全衛生	施工前3個月	1-1	110.03.23	瑞玉備字第110323-002號	110.03.26	聯管A3備字第1100326-2號	以正式公文函送					
				1-1	110.03.30	瑞玉字第1100330051號	110.04.12	水南工字第11053031470號	修正或說明並提送					
				1-2	110.04.26	瑞玉字第1100426067號	110.05.12	水南工字第11053040090號	退回修正					
				1-3	110.05.24	瑞玉字第1100524091號	110.06.07	水南工字第11053047630號	修正或說明並提送					
				1-4	110.06.17	瑞玉字第1100617118號	110.07.16	水南工字第11006047240號	修正或說明並提送					
			110.04.15 設計品質計畫 (第二版)	1-5	110.07.30	瑞玉字第1100730156號	110.09.24	水南工字第11006057540號	同意辦理					
				1	110.09.28	瑞玉字第1100928207號								

註1：如有未表列項目，承商應依契約相關規定提送文件審查及辦理相關行政程序。

註2：依據經濟部水利署南區水資局曾文南化聯通管統包工程A3標工務所110年4月12日聯管A3備字第1100412-2號備忘錄，合併「管路工程—明挖覆蓋段—起點至沙田橋(W38推進井至沙田橋)」及「管路工程—明挖覆蓋段—沙田橋至終點(不含三埔橋上下游銜接段)」並調整名稱為「管路工程—明挖覆蓋段—W38推進井至終點(不含三埔橋上下游銜接段)」。

註3：依據經濟部水利署南區水資局110年2月19日水南工字第11006009100號函，將「管路工程—推進段—五井市區」及「管路工程—推進段—其餘推進管段」合併為「管路工程—推進段」提送。

註4：依據經濟部水利署南區水資局曾文南化聯通管統包工程A3標工務所110年4月27日聯管A3備字第1100427-1號備忘錄，將本細部設計單元區分為「水管橋工程(沙田水管橋、平壓管段水管橋)」及「水管橋工程(三埔水管橋、四埔水管橋)」兩項子單元。
