



旱溪排水(鷺村橋至日新橋)整治工程

108.11至109.3履約管理報告





簡報大綱



一 工程配置及辦理情形



二 進度管理



三 施工過程紀要



四 計畫書核定情形




五 材料試驗及施工抽查情形



一、工程配置圖及辦理情形

主要工項：

1. 堤防拆除及土方暫置
2. 塊石護岸
3. 堤頂鋪面工程
4. 人行鋼橋
5. 植栽工程
6. 澆灌系統
7. 其他周邊景觀設施

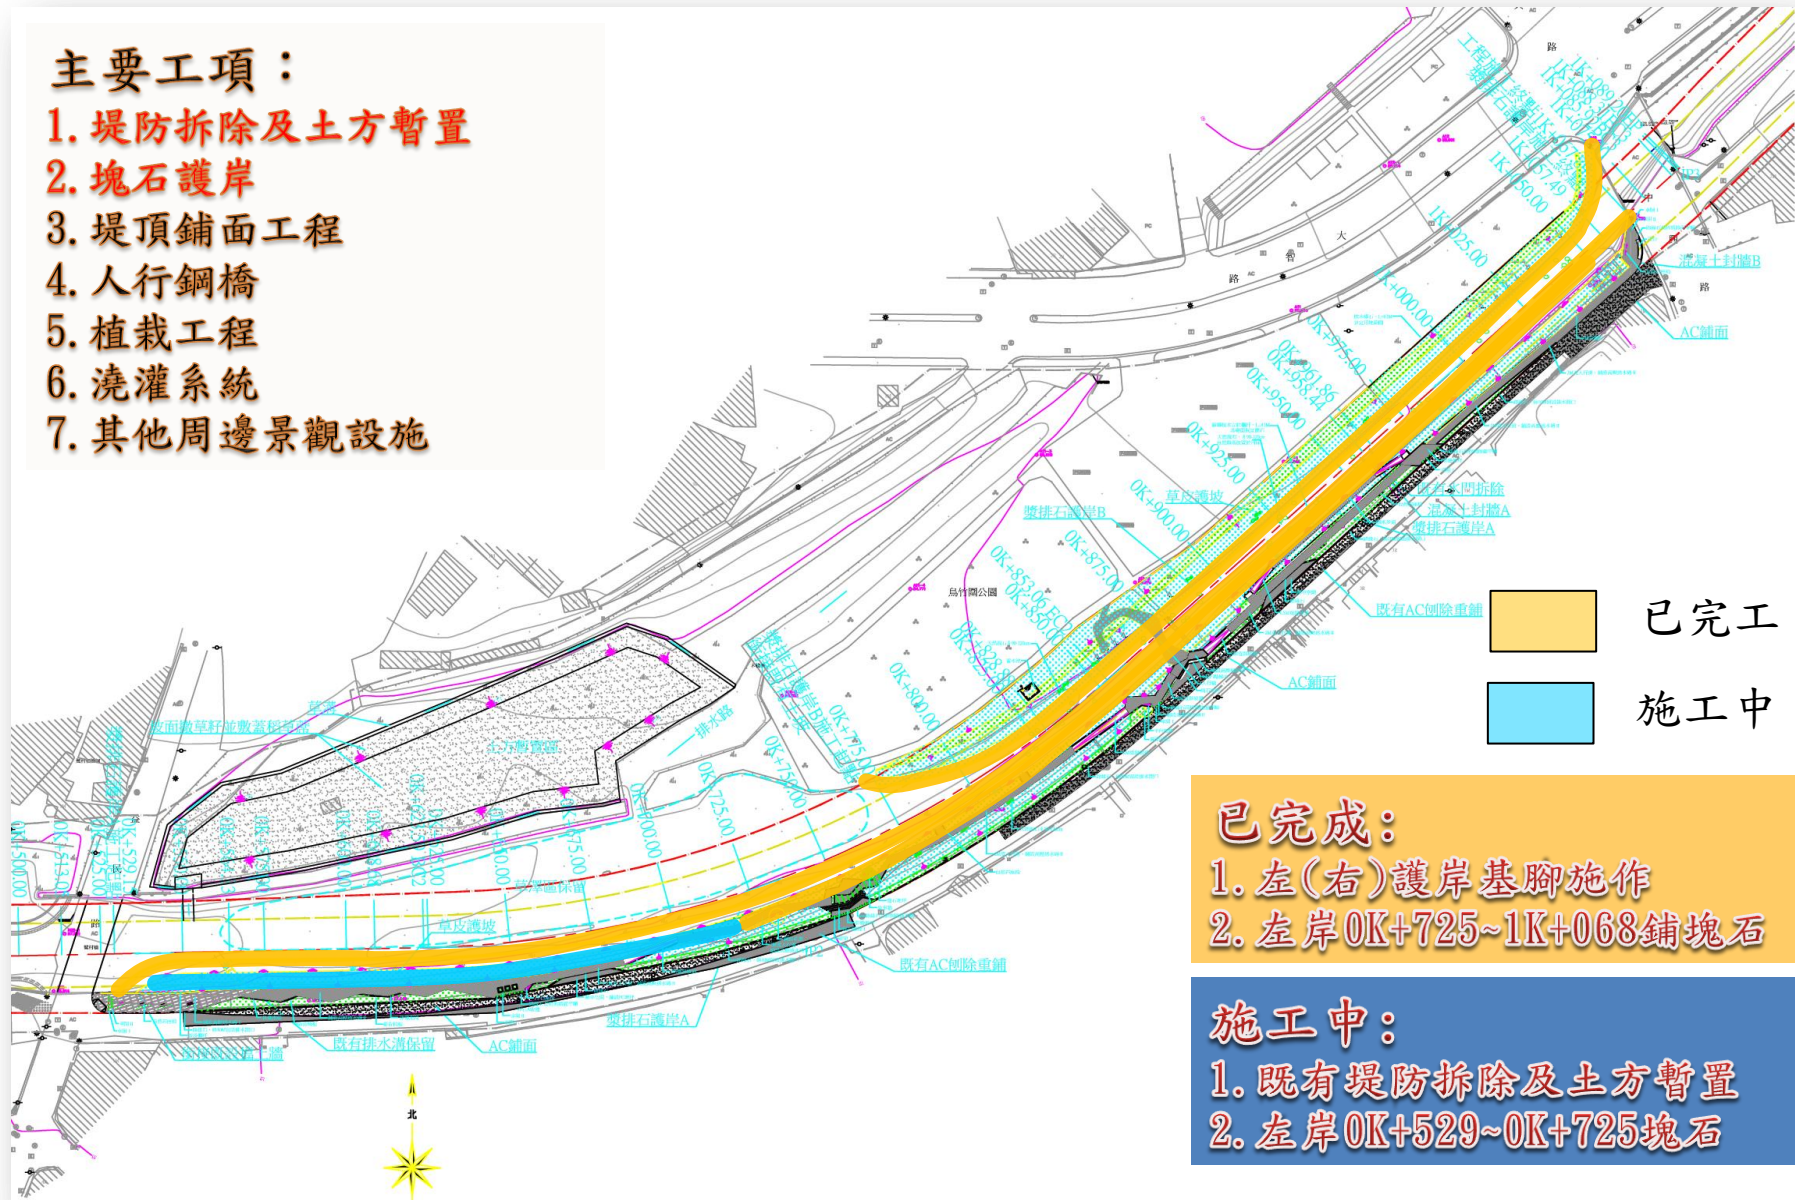

已完成：


1. 左(右)護岸基腳施作
2. 左岸OK+725~1K+068鋪塊石

施工中：

1. 既有堤防拆除及土方暫置
2. 左岸OK+529~OK+725塊石



二、進度管理

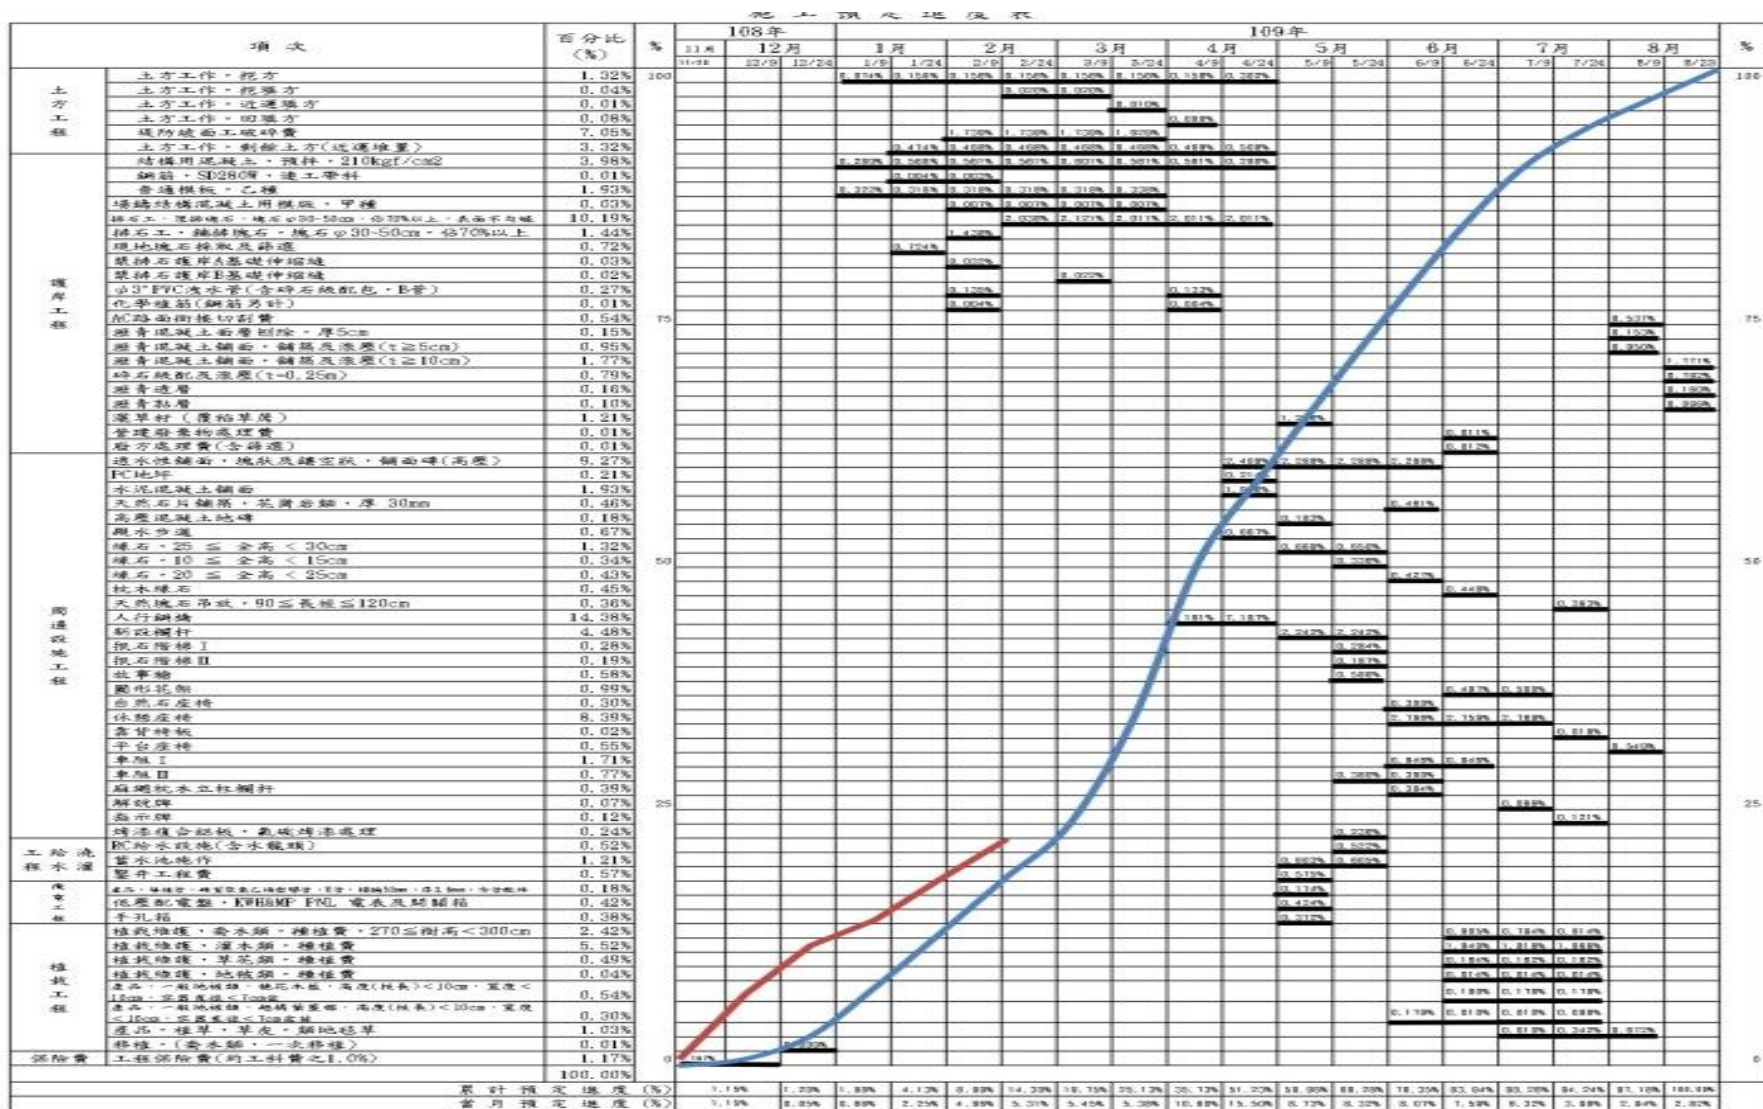

預定進度

實際進度

工程進度：預定進度**18.58%**，實際進度**23.56%**，超前**4.98%**
(截至109.03.06)



三、施工過程紀要



施工前




護岸基腳開挖



護岸基腳澆置



護岸基腳完成

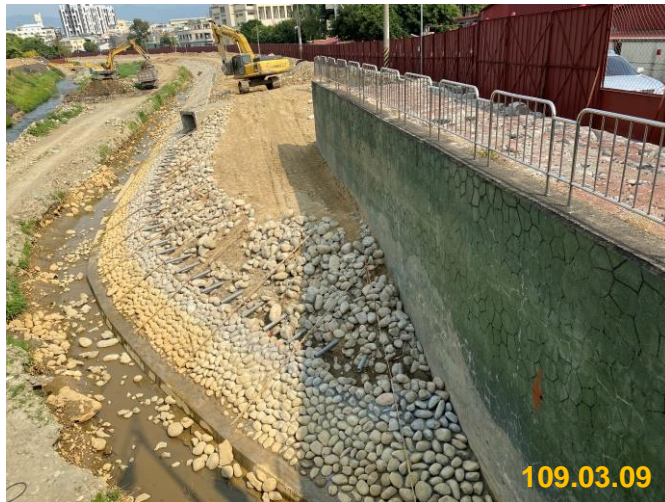

排石護坡施作



排石護坡完成



四、計畫書核定情形

一、施工計畫審查及認可情形

提送版次	應提送日期	實際提送(核定) 日期	主要修正內容及文號	備註
核定 第一版	108.12.03	108.11.27 (108.12.03)	水三工字第10801083440號	

二、品質計畫審查及認可情形

提送版次	應提送日期	實際提送(核定) 日期	主要修正內容及文號	備註
核定 第一版	108.12.03	108.11.27 (108.12.03)	水三工字第10801084390號	

註:108.11.18簽約，施工及品質應於15天內(108.12.03)提送



五、材料試驗及施工抽查情形

材料品質檢(試)驗成果統計表


項次	材料項目	檢(試)驗項目	單位	契約數量	目前應驗次數	已試驗	檢(試)驗結果		合格率	備註
							合格	不合格		
1	預拌混凝土	混凝土圓柱試體試壓試驗(每組5個)	組	4	4	4	4	-	100%	
2	鋼筋	竹節鋼筋拉伸試驗	組	5	1	1	1	-	100%	
		竹節鋼筋抗彎試驗	組	5	1	1	1	-	100%	
		鋼筋化學成分分析試驗	組	5	1	1	1	-	100%	
		熱處理鋼筋判定試驗	組	5	1	1	1	-	100%	
3	土方材料	粗細粒料篩分析試驗	次	2	-	-	-	-	-	
4	瀝青材料	瀝青含油量試驗	次	2	-	-	-	-	-	
5	高壓連鎖磚	高壓連鎖磚抗壓試驗	次	12	-	-	-	-	-	
6	仿枕木磚	仿枕木磚抗壓試驗	次	8						
7	混凝土緣石	預鑄混凝土緣石檢驗法	次	8						

合格率
100%



五、材料試驗及施工抽查情形

主要項目試驗相關照片



圓柱試體製作、坍度試驗及
氯離子含量檢測作業



五、材料試驗及施工抽查情形

施工抽查成果表

項次	抽查項目	檢抽查次數	抽查結果		備註
			合格	不合格	
1	土方工程施工抽查	2	2	0	
2	鋼筋工程施工抽查	-			
3	模板工程施工抽查	17	17	0	
4	混凝土工程施工抽查	9	9	0	
5	碎石級配工程施工抽查	-			
6	漿(鋪)排石護岸工程施工抽查	3	3	0	
7	高壓透水磚鋪面工程施工抽查	-			
8	高壓梯形磚鋪面(崗石地坪)工程施工抽查	-			
9	PC地坪(彩繪地坪)工程施工抽查	-			
10	瀝青混凝土施工抽查	-			
11	人型鋼橋施工抽查	-			
12	圓形花架施工抽查	-			
13	植栽工程施工抽查	-			

抽查次數

合格次數

不合格次數

30次

30次

0次
