


濁水溪流域疏濬計畫



編號	疏濬計畫	規劃量 (萬方)	備註
1	濁水溪與清水溪匯流口	100	已開工，預計4/1出料
2	中二高下游段	100	審查疏濬計畫
3	集鹿橋上下游段	100	出料中，進度29.4%
4	濁水溪與水里溪匯流口	100	收入標流標，3/18第二次開標
5	陳有蘭溪與濁水溪匯流口	80	規劃中
6	愛國橋上游段	50	出料中，進度19.63%
7	農富坪段採售合一	40	出料中，進度79.32%
8	桐林橋上游段採售合一	50	審查疏濬計畫
9	清水溪與阿里山溪採售合一	30	出料中，進度25.91%
10	廬山緊急疏濬採售合一(第二期)	15	7次流標，檢討預算中
A	東埔蚋溪與濁水溪匯流口段	70	出料中，進度11.57%
B	番仔寮段	60	2/18出料完成
C	玉峰橋下游段	100	已核定，待發包
D	寶石橋下游段	50	出料中，進度60.07%
E	愛國橋下游段	70	出料中，進度95.63%
F	松泉橋下游段	20	疏濬計畫審查中
G	清水溪斷面(3~9)(20~24)	80	3/10開工

濁水溪流域疏濬計畫

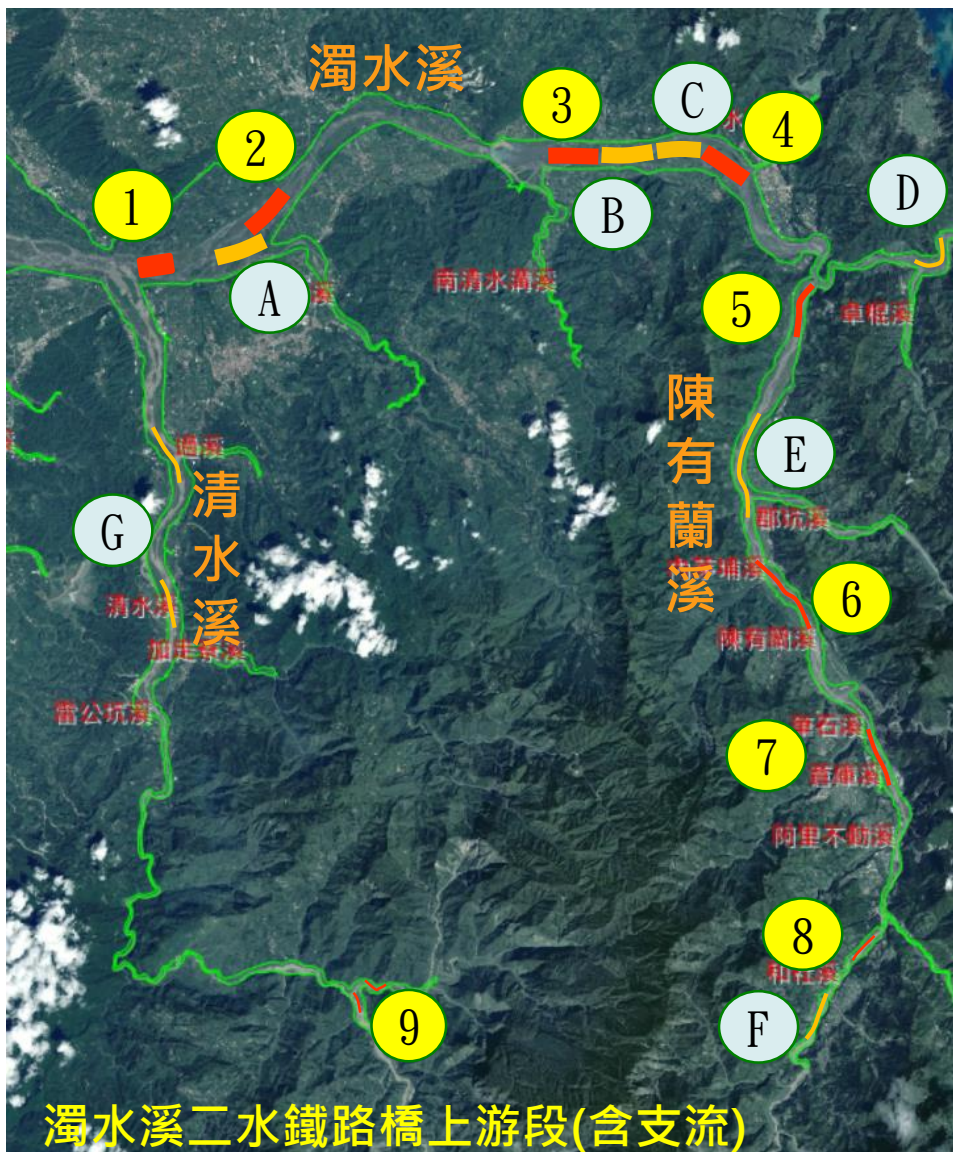

編號	疏濬計畫	規劃量(萬方)	備註
1	出海口段	50	規劃中
2	西濱大橋上游段	100	出料中，進度23.84%
3	自強大橋上游段	50	規劃中
4	新虎尾橫堤(北岸)	40	出料中，進度60.94%
4	新虎尾橫堤(南岸)	60	出料中，進度40.21%
