


柒、施工預定進度管制

一、預定進度之依據及相關理由

依據前述各項工程內容、施工計畫及人力需求，編擬主要工程項目施工日程，以要徑法作為基礎，建立預定進度表及施工網狀圖，作為工程執行與考核依據。

二、施工預定進度桿狀圖(含 S-Curve)

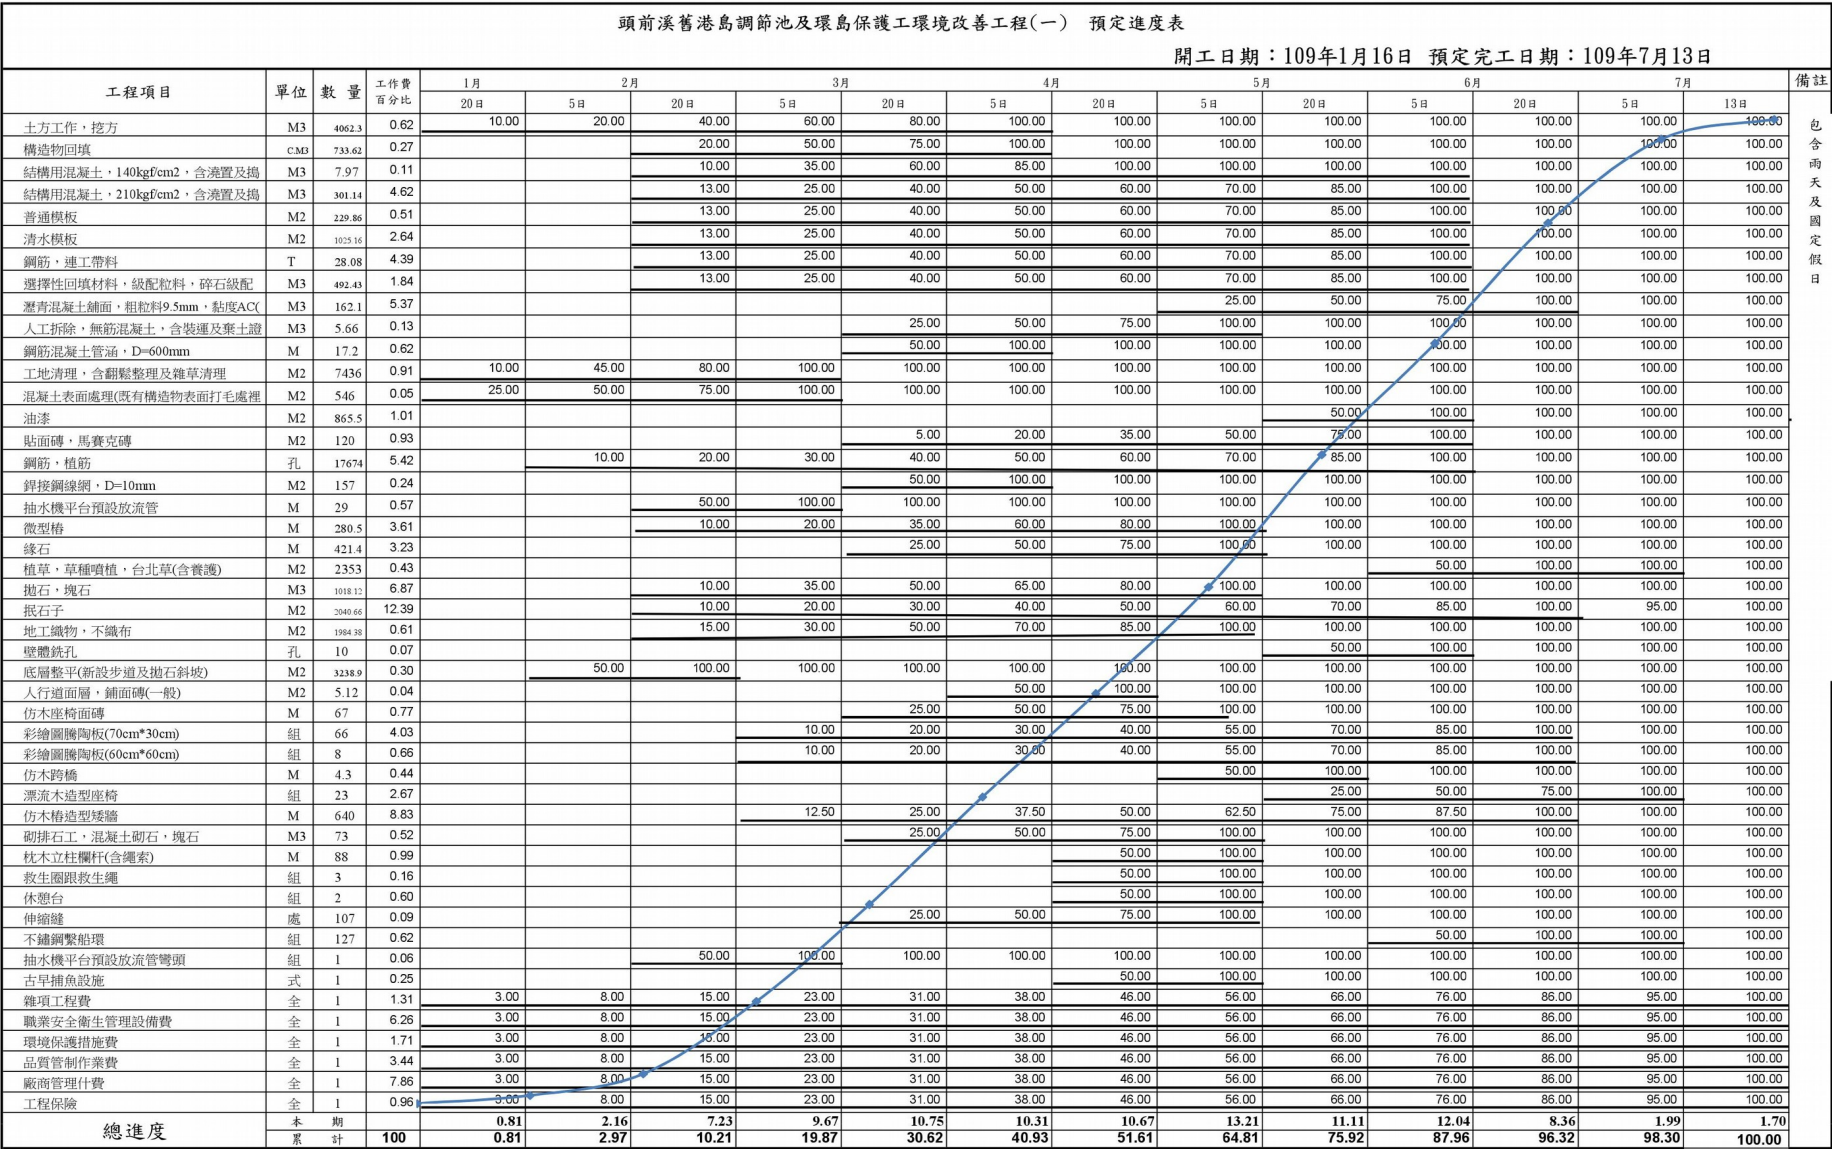

承包廠商：朝勝營造事業股份有限公司
廠商：

主辦機關：經濟部水利署第二河川局
工務所主任：


課長：

副局長：

局長：

三、施工預定進度網狀圖(含 S-curve)

施工預定進度網狀圖

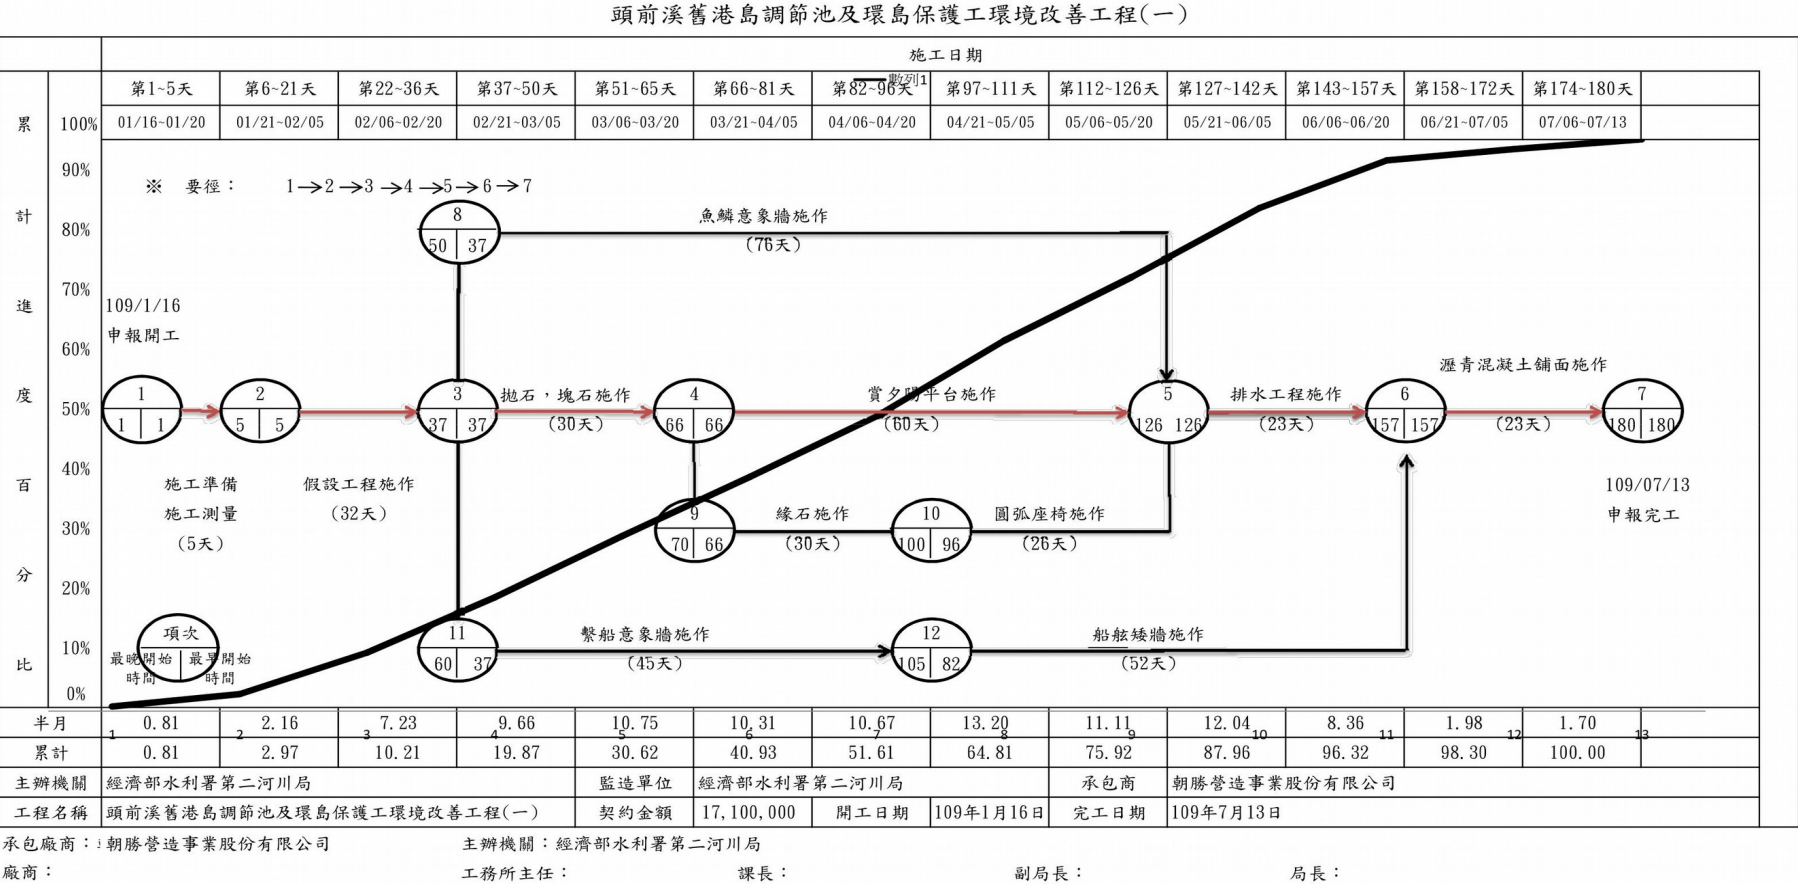

四、施工日誌

公共工程施工日誌															
本日天氣：上午		晴		下午		晴		填報日期：民國一〇九年一月十六日		星期四 表報編號：		GD- 1			
工程名稱				顏前溪舊港島調節池及環島保護環境改善工程(一)				承攬廠商名稱				朝勝營造事業股份有限公司			
契約工期		180天		累計工期		1天		剩餘工期		179天		開工日期		109年1月16日	
進度控制		預定進度		本日累計		0.16%		實際進度		本日累計		0.42%		超前/落後	
														契約金額	
														\$17,100,000	
一、施工項目及數量															
施工項目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註		
土方工作、挖方		M3	4082.30	0.00	0.00		拋石、塊石		M3	1018.12	0.00	0.00			
構造物回填		C.M3	733.82	0.00	0.00		振石子		M2	2040.86	0.00	0.00			
結構用混凝土，140kgf/cm ²		M3	7.97	0.00	0.00		土工織物、不織布		M2	1984.38	0.00	0.00			
結構用混凝土，210kgf/cm ²		M3	301.14	0.00	0.00		壁體銃孔		孔	10.00	0.00	0.00			
普通模板		M2	229.88	0.00	0.00		底層整平(新設步道及拋		M2	3238.90	0.00	0.00			
清水模板		M2	1025.16	0.00	0.00		人行連面層、鋪面磚(一		M2	5.12	0.00	0.00			
鋼筋、連工帶料		T	28.08	0.00	0.00		竹木座椅面磚		M	87.00	0.00	0.00			
選擇性回填材料，級配粒料		M3	492.43	0.00	0.00		彩繪圓騰陶板		組	86.00	0.00	0.00			
瀝青混凝土鋪面，粗粒料9		M3	182.10	0.00	0.00		彩繪圓騰陶板		組	8.00	0.00	0.00			
人工拆除，無筋混凝土，含		M3	5.88	0.00	0.00		竹木跨橋		M	4.30	0.00	0.00			
鋼筋混凝土管涵，D=600mm		M	17.20	0.00	0.00		漂流木造型座椅		組	23.00	0.00	0.00			
工地清理，含翻鬆整理及鋪		M2	7436.00	3000.00	3000.00		竹木格造型矮牆		M	640.00	0.00	0.00			
混凝土表面處理(既有構造		M2	546.00	200.00	200.00		砌排石工，混凝土砌石		M3	73.00	0.00	0.00			
油漆		M2	865.50	0.00	0.00		枕木立柱欄杆(含繩索)		M	88.00	0.00	0.00			
貼面磚，馬賽克磚		M2	120.00	0.00	0.00		救生圈跟救生繩		組	3.00	0.00	0.00			
鋼筋、植筋		孔	17874.00	0.00	0.00		休憩台		組	2.00	0.00	0.00			
銲接鋼線網，D=10mm		M2	157.00	0.00	0.00		伸縮縫		處	107.00	0.00	0.00			
抽水機平台預設放流管		M	29.00	0.00	0.00		不鏽鋼繫船環		組	127.00	0.00	0.00			
微型格		M	280.50	0.00	0.00		抽水機平台預設放流管		組	1.00	0.00	0.00			
煉石		M	421.40	0.00	0.00		古早捕魚設施		式	1.00	0.00	0.00			
植草，草噴噴植，台北草(		M2	2353.00	0.00	0.00										
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：															
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
結構用混凝土，210kgf/cm ²		M3	301.14	0.00	0.00										
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：															
出工人數						機具使用量									
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	機具	本日使用量	累計使用量	機具	本日使用量	累計使用量				
技工	-		普通工	-		挖土機	-								
半技工	-					卡車	-								
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☐ 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽名表」)															
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施動前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無(二)其他事項：															
六、施工取樣試驗紀錄：															
試驗項目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	試驗項目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註		
檢驗，A3045混凝土圓柱試		組	1	-	0		檢驗，A3005粗細粒料篩分		件	1	-	0			
檢驗，A3051混凝土鑽心試		組	1	-	0		檢驗，瀝青含油量試驗		次	1	-	0			
檢驗，A3343新拌混凝土中		組	1	-	0		檢驗，A3288瀝青路面壓實		次	1	-	0			
檢驗，A2008鋼筋混凝土用		組	1	-	0		檢驗，A3147瀝青鋪面混合		次	1	-	0			
檢驗，植筋拉拔試驗		組	38	-	0		檢驗，碎石級配粒料篩分		次	1	-	0			
檢驗，普羅克達芬實試驗或		組	2	-	0		檢驗，碎石級配磨損試驗		次	1	-	0			
檢驗，工地密度試驗		孔	2	-	0		檢驗，碎石級配壓實度試		次	1	-	0			
七、廠商辦理施工事項：本日開工。1、混凝土表面處理2、工區雜草清理															
八、重要事項記錄：-															
簽章：【工地主任】：															
