



揚塵防治 週報表

112/09/18~112/09/24




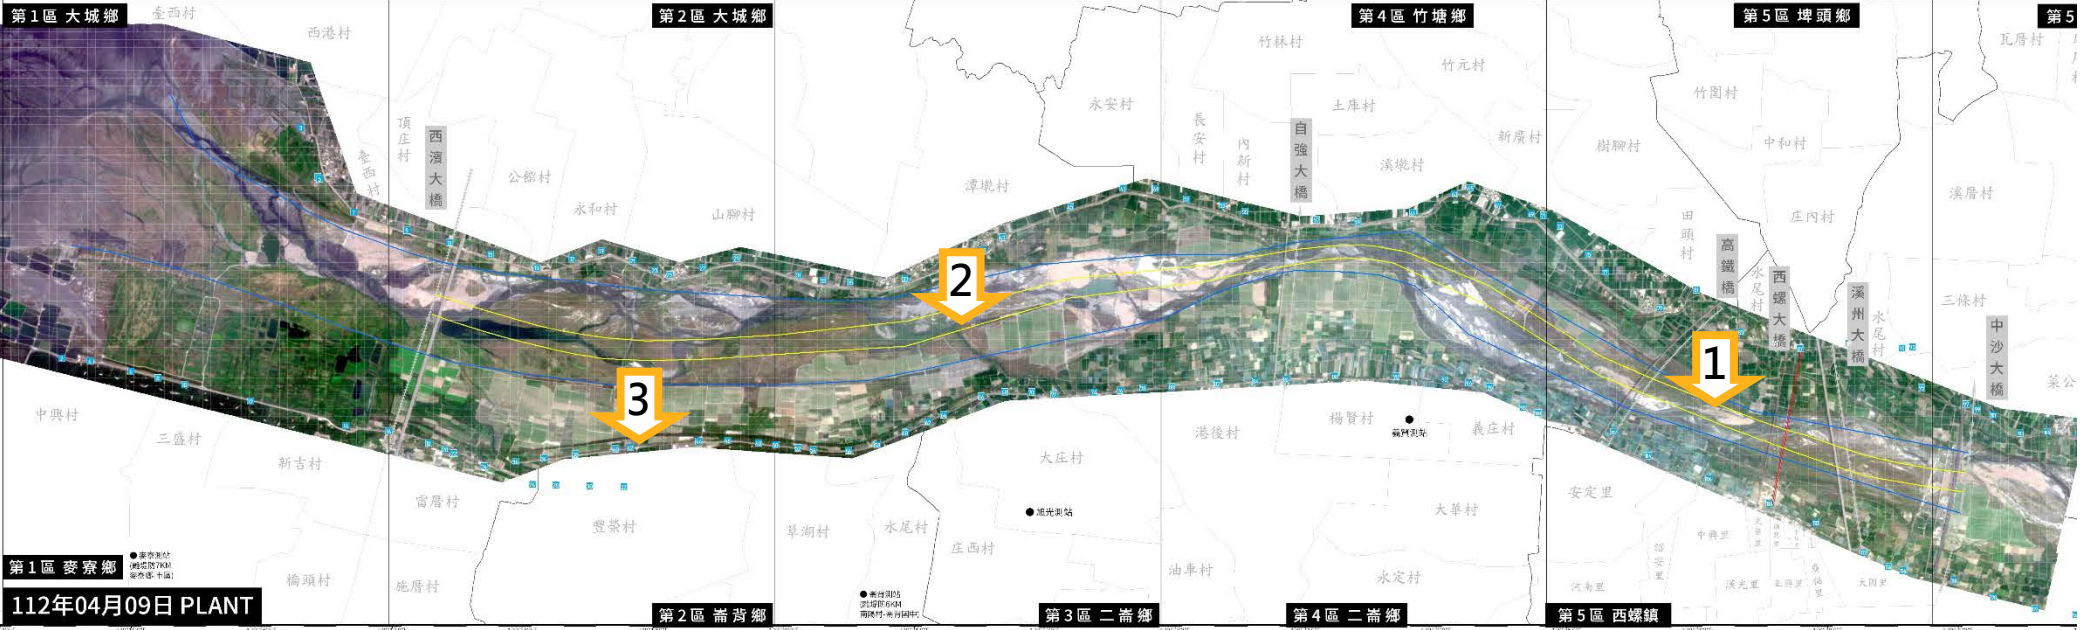


3 大庄堤防44-54號越堤_水防道路植栽

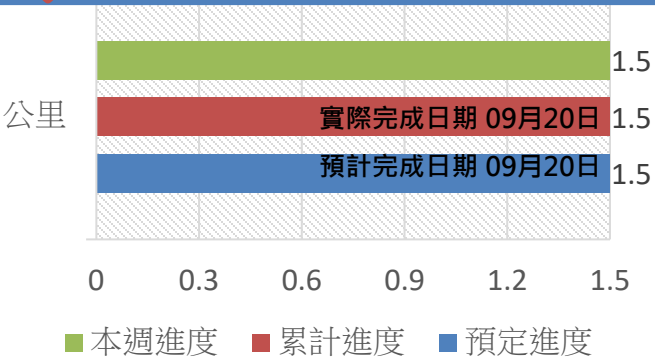

2 大義崙上游低灘地_鋪設稻草蓆

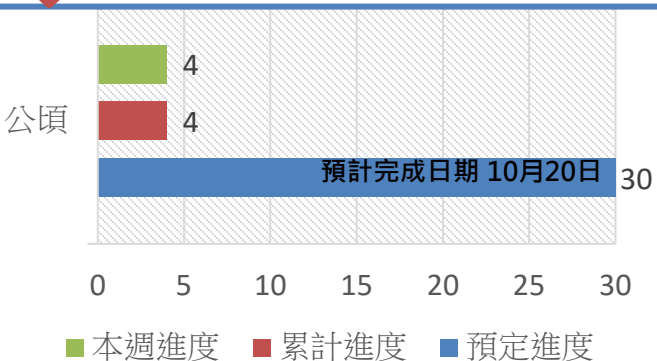

1 高鐵橋上游(北岸)_河道整理

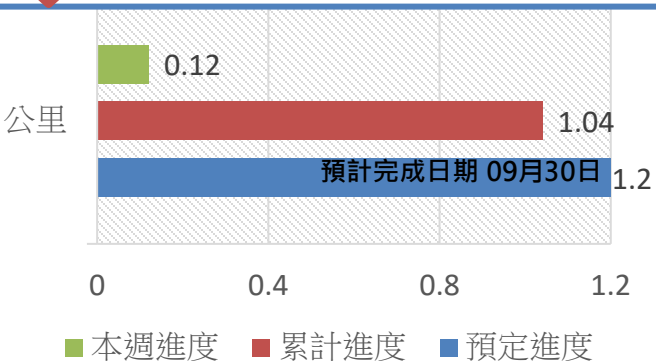

各區 空拍現況

第一區

出海口 0號井



第二區

西濱大橋 下游



第1區 大城鄉

第2區 大城鄉

第3區 竹塘鄉

第4區 竹塘鄉

第5區 溪州鄉



第1區 麥寮鄉

第2區 崙背鄉

第3區 二崙鄉


第4區 西螺鎮

第5區 西螺鎮

衛星空照(20230801)

第四區

自強大橋 下游

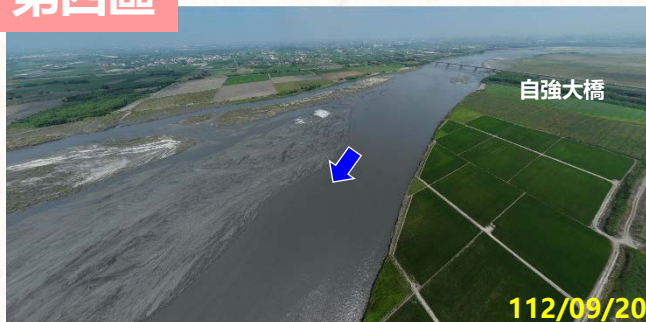

第五區

西螺大橋 上下游



第三區

大義崙排水 上游



112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 10 公頃
- 達成率 : 2.2 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 1.78 公里
- 達成率 : 71.2 %



防洪植栽

- 目標值 : 6 公里
- 已完成 : 2.7 公里
- 達成率 : 45 %



綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 222公頃
- 達成率 : 444 %

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	6.05	1.2	17.38



112年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 1.2 km


達成率/ 30 %

➤ 執行進度說明：

- 1、自強大橋下游南岸已於112年7月12日完成1.2公里複式斷面。
- 2、高鐵橋下游北岸(規劃1.6公里)，目前河道水位豐沛，將俟水位下降後，進場辦理便道修復事宜。土方培厚作業依112年8月22日工作小組會議，調整延至112年10月30日完成。
- 3、高鐵橋上游北岸(規劃1.2公里)，本週完成0.12公里，累計已施作1.04公里。河道水位高漲取淹沒作業便道，影響取土作業，故土方培厚作業預計延至112年10月15日完成。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	-	-	-	3.8

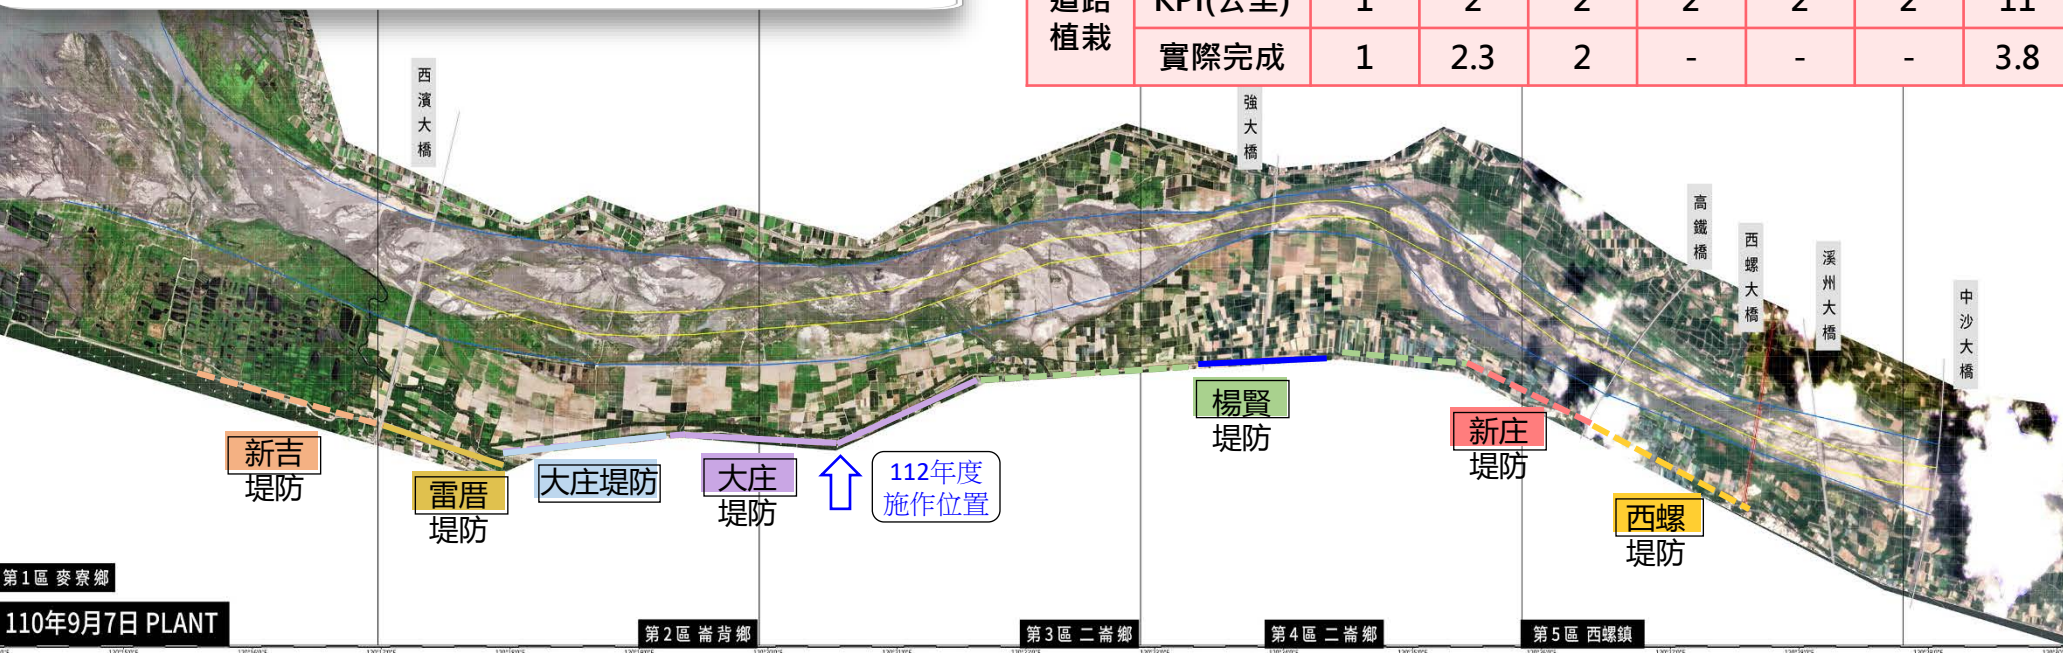

• 112年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里

已完成 / 2公里

達成率/ 100 %

➤ 執行進度說明：

- 1、大庄堤防規劃施作0.5公里，已於112年8月25日完成。
- 2、大庄堤防42至54號越堤段規劃1.5公里，已於112年9月20日完成。



