


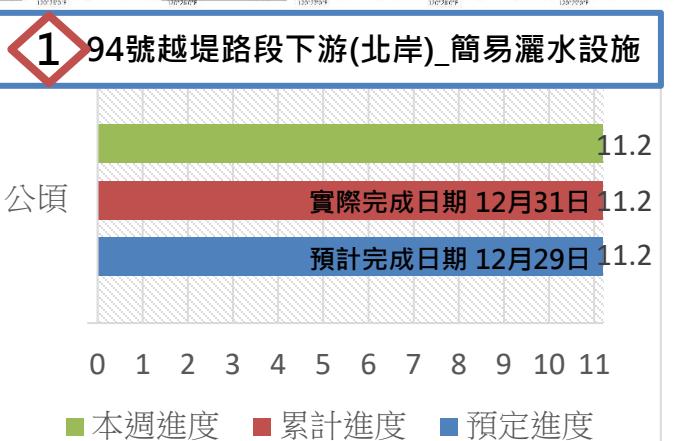
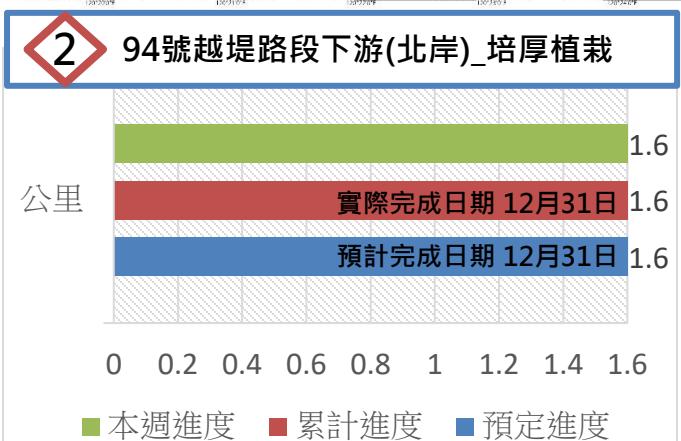
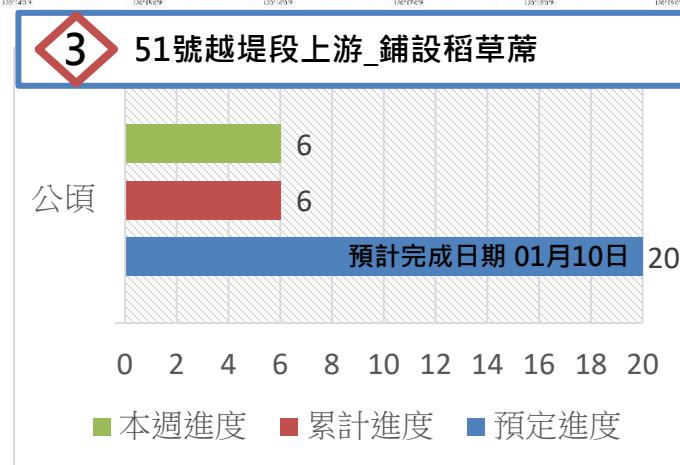
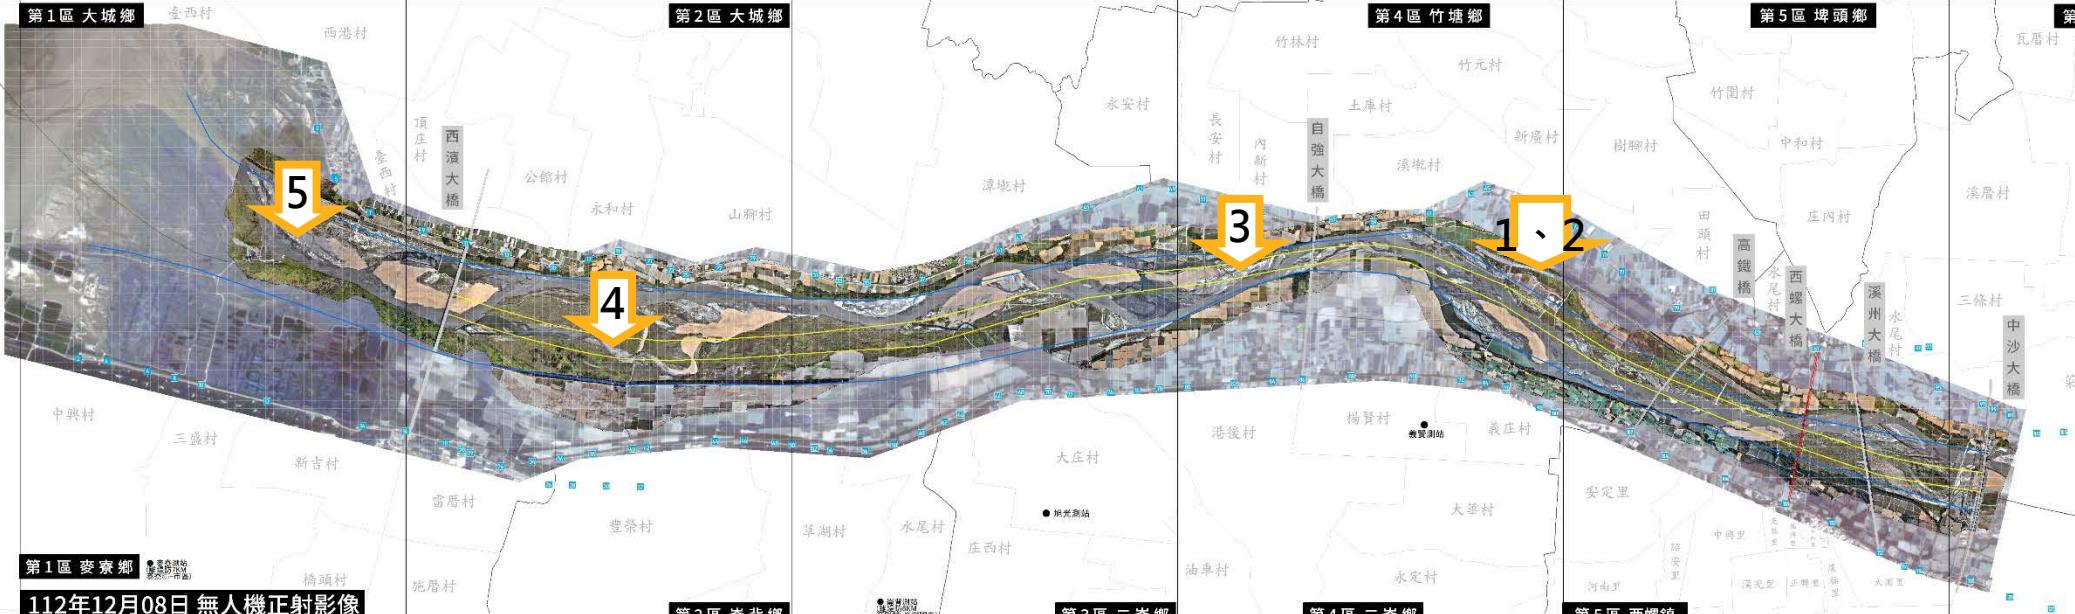


# 揚塵防治 週報表

112/12/25~113/12/31

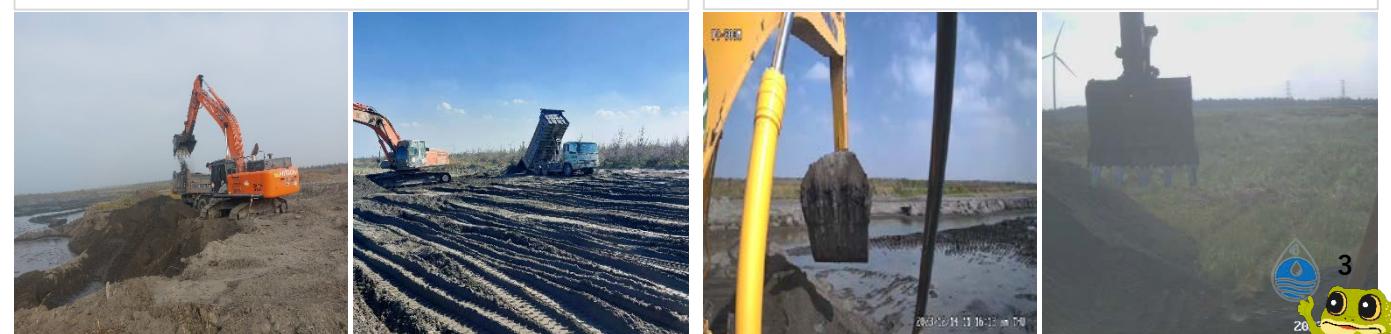


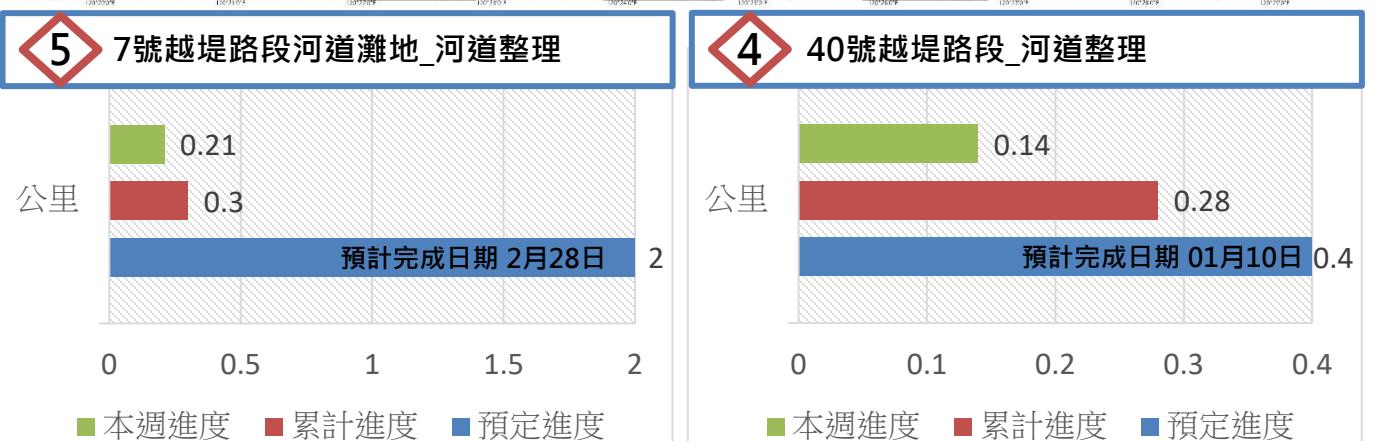

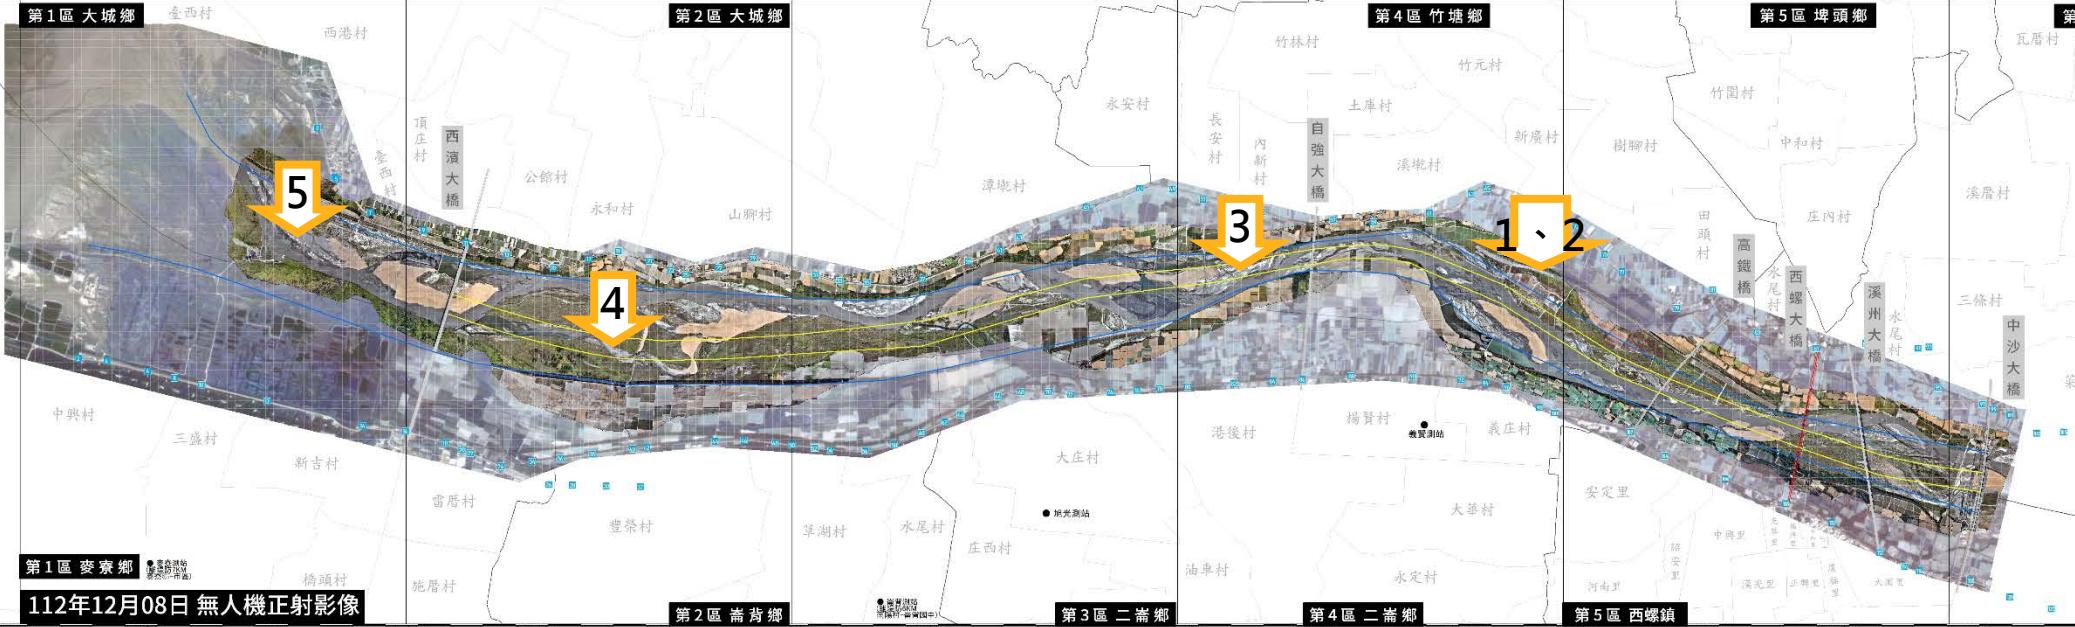

# 各區

# 空拍現況

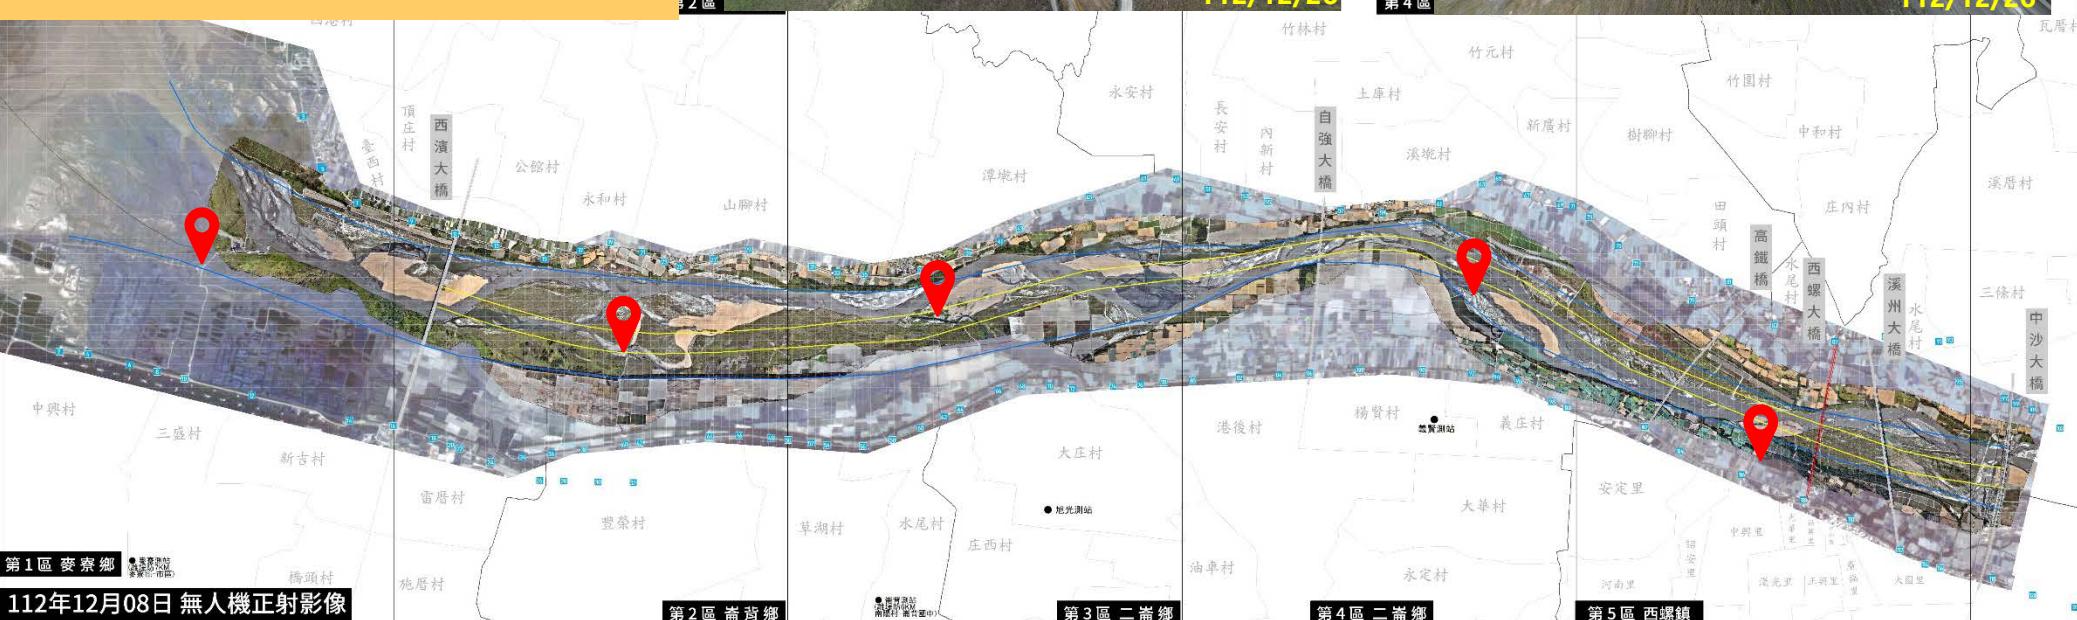

## 大義崙排水 上游



第四區



第五區



# 出海口 0號井

## 40號越堤段 上下游

第一區

第二圖

112年度

## 揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



## 其他覆蓋

- 目標值: 450 公頃
- 已完成: 277.2 公頃
- 達成率: 61.6 %



## 水覆蓋

- 目標值: 400 公頃
- 已完成: 310 公頃
- 達成率: 77.5 %



## 河道整理

- 目標值: 2.5 公里
- 已完成: 2.58 公里
- 達成率: 103.2 %



## 防洪植栽

- 目標值: 6 公里
- 已完成: 6.05 公里
- 達成率: 100.8 %



## 綠覆蓋

- 目標值: 50 公頃
- 已完成: 292 公頃
- 達成率: 584 %

# 營造複式斷面規劃圖

複式 斷面	年度	107-109	110	111	112	合計
	KPI(公里)	8	2	6	4	20
	實際完成	8	2.13	6.05	4.05	20.23



## • 112年營造複式斷面進度管控

**KPI / 4公里**


已完成 / 4.05 km

達成率 / 100.1 %

### ➤ 執行進度說明：

- 1、自強大橋下游南岸已於112年7月12日完成1.2公里複式斷面。
- 2、高鐵橋上游北岸已於10月31日完成1.25公里複式斷面。
- 3、高鐵橋下游北岸已於12月31日完成1.6公里複式斷面。

# 水防道路植栽規劃圖

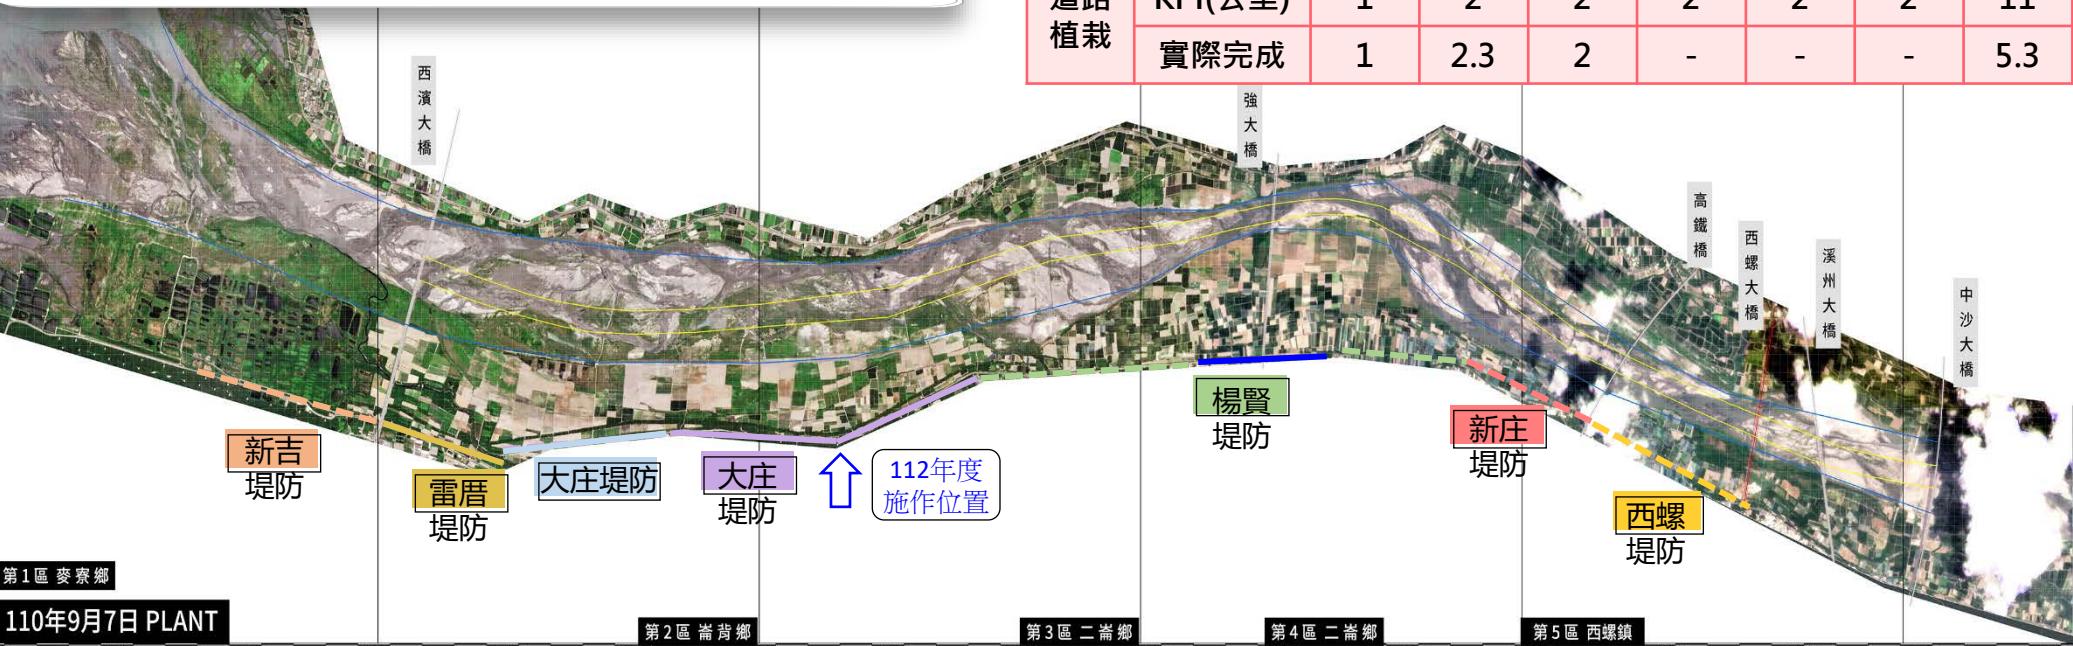

## • 112年水防道路植栽進度管控


**KPI / 2公里**

已完成 / 2公里  
達成率 / 100 %

➤ 執行進度說明：

- 1、大庄堤防規劃施作0.5公里，已於112年8月25日完成。
- 2、大庄堤防42至54號越堤段規劃1.5公里，已於112年9月20日完成。

# 揚 塵 抑 制 措 施

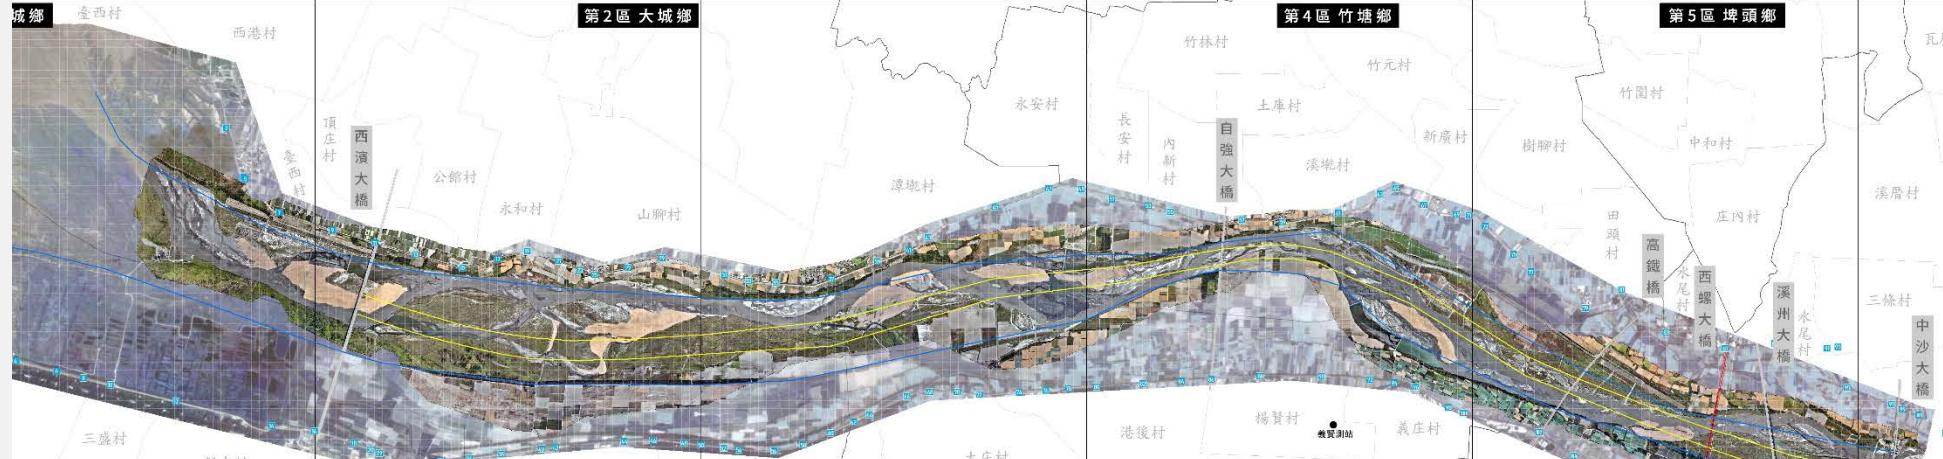

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
1) 西濱橋下游段(北岸)_蓄水池50公頃 2) 西濱橋上游南岸_蓄水池60公頃	1) 跨河電塔上游_蓄水池40公頃	1) 51號越堤段_蓄水池80公頃 2) 94號越堤段_蓄水池50公頃	1) 溪州大橋上游_蓄水池30公頃	
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
7號越堤路段河道灘地_河道整理0.3公里	1) 40號越堤路段_河道整理0.28公里	1) 跨河電塔下游0.74公里		1) 高鐵橋上游(北岸)1.26公里
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 出海口 23口井灘地_空灘草籽52公頃 2) 西濱大橋下游至7號越堤路_空灘草籽45公頃	1) 跨河電塔上下游低灘地_空灘草籽40公頃	1) 94號越堤段北側河道灘地_空灘草籽55公頃	1) 中沙大橋至溪洲大橋灘地_空灘草籽70公頃 2) 西螺大橋上下游河中低灘地_空灘草籽30公頃	
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
	1) 大庄堤防44-54號越堤_水防道路植栽1.5公里。	1) 自強大橋下游南岸_培厚區植栽1.2公里 2) 大庄堤防62-66號越堤_水防道路植栽0.5公里。	1) 94號越堤路段下游(北岸)_培厚植栽1.6公里	1) 高鐵橋上游(北岸)_培厚植栽1.25公里
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤路段_鋪設稻草蓆9公頃 2) 7號越堤路段低灘地B_鋪設稻草蓆5公頃	1) 40-44號越堤路段_鋪設稻草蓆38公頃 2) 西濱橋下河中島_鋪設稻草蓆47公頃	1) 自強大橋下游南岸_培厚區簡易灑水系統6公頃 2) 大義崙上游低灘地_稻草蓆30公頃 3) 跨河電塔上游(北岸)_稻草蓆鋪13公頃 4) 跨河電塔下游(北岸)_稻草蓆鋪18公頃 5) 跨河電塔上下游低灘地_防塵網鋪20公頃 6) 大義崙排水口上游河道灘地_稻草11公頃	1) 94號越堤路段_鋪設稻草蓆18公頃 2) 51號越堤段上游_鋪設稻草蓆6公頃 3) 94號越堤路段下游(北岸)_簡易灑水設施11.2公頃	1) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆鋪設20公頃 2) 高鐵橋上游(北岸)_簡易灑水系統10公頃 3) 西螺大橋下游_鋪設稻草蓆15公頃
