

# 臺東深層海水試驗管工程辦理情形說明

## 壹、 契約主要履約內容：

- 一、 海域勘測許可、路線劃設許可、水下文化資產調查許可等申請。
- 二、 現地調查，包括海域及陸域地形勘測、地質調查等。
- 三、 基本設計。
- 四、 細部設計及施工。
- 五、 工程完工後一定期間巡檢及調查。
- 六、 其他契約規定之履約項目。

## 貳、 執行進度及辦理情形：

執行進度：統計至 108 年 9 月 30 日止


預定進度：11.66%

實際進度：11.67%

- 一、107 年 4 月 4 日申報開工。
- 二、107 年 4 月 20 日提送工作執行計畫、水下文化資產調查計畫、路線勘測申請書及計畫書。
- 三、107 年 5 月 1 日水下文化資產調查計畫報文化部審查。
- 四、107 年 5 月 7 日路線勘測申請書及計畫書報內政部審查。
- 五、107 年 5 月 28 日召開工作執行計畫書審查會議。
- 六、107 年 7 月 5 日內政部同意勘測計畫。
- 七、107 年 8 月 16 日文化部同意水下文化資產調查計畫。
- 八、107 年 9 月 14 日工作執行計畫書核定。
- 九、107 年 10 月 12 日路線勘測申請及計畫書核定。
- 十、108 年 1 月 15 日辦理設計前現場會勘
- 十一、 108 年 7 月 29 日核定現地調查總成果報告書(含底質調查與分析)
- 十二、 108 年 7 月 30 日廠商提送基本設計圖冊
- 十三、 108 年 9 月 6 日辦理設計階段生態檢核民眾參與說明會
- 十四、 108 年 9 月核定基本設計圖冊
- 十五、 108 年 10 月 3 日舉行基本設計說明會

## 參、 相關照片或紀錄

### 一、 海域調查儀器投放照片

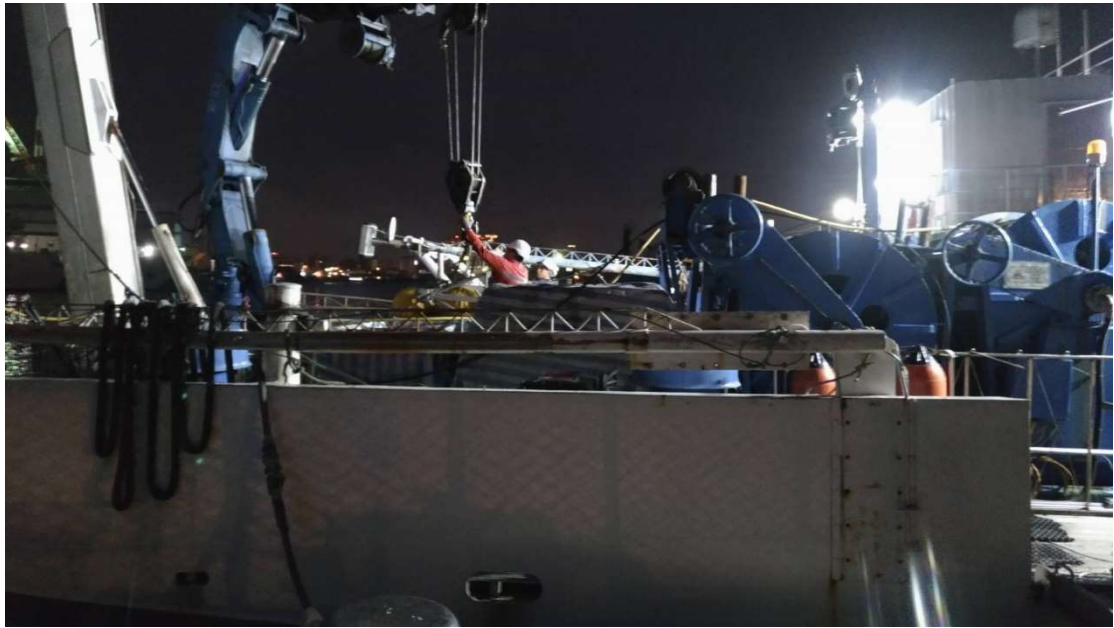

夜間出海



清晨至作業區

