


揚塵防治 週報表


114/12/01~114/12/07



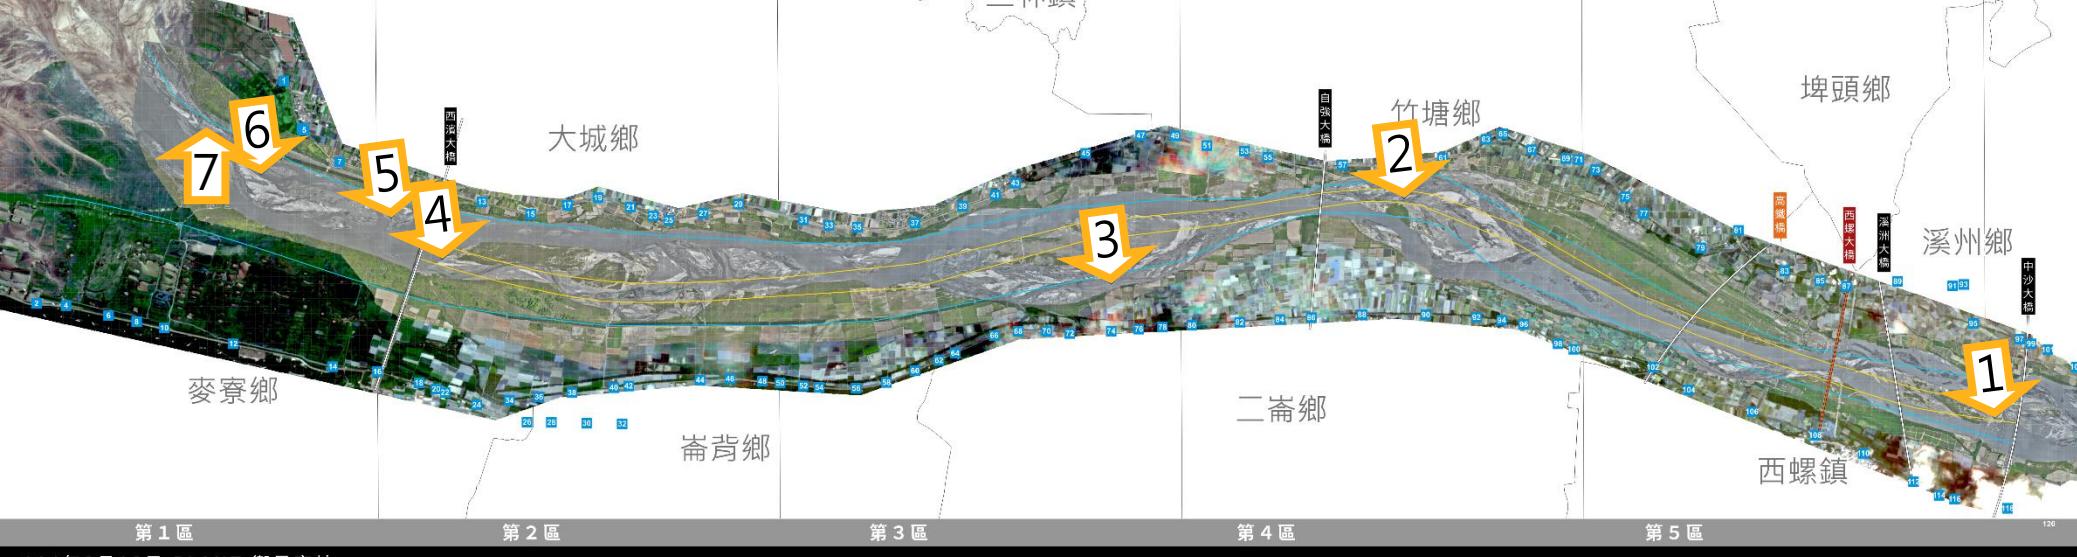

114年8月18日 PLANT 衛星空拍


3 74號越堤下游培厚區_簡易灑水

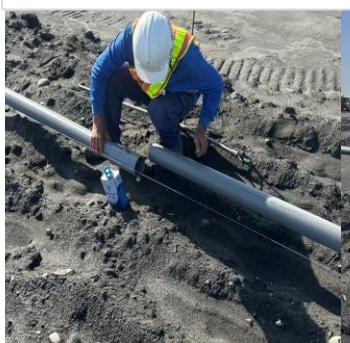


2 59號越堤路段低灘地_鋪設防塵網







1 中沙至天然氣管橋_稻草蓆鋪設

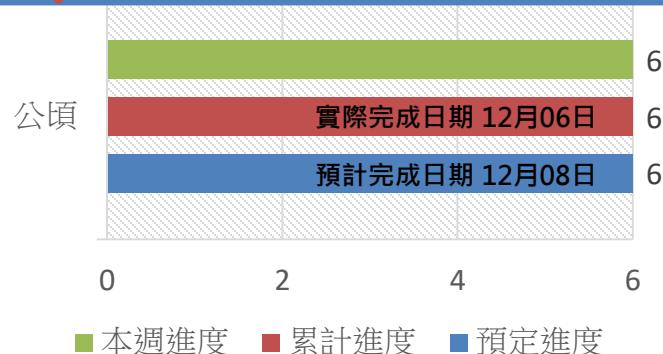

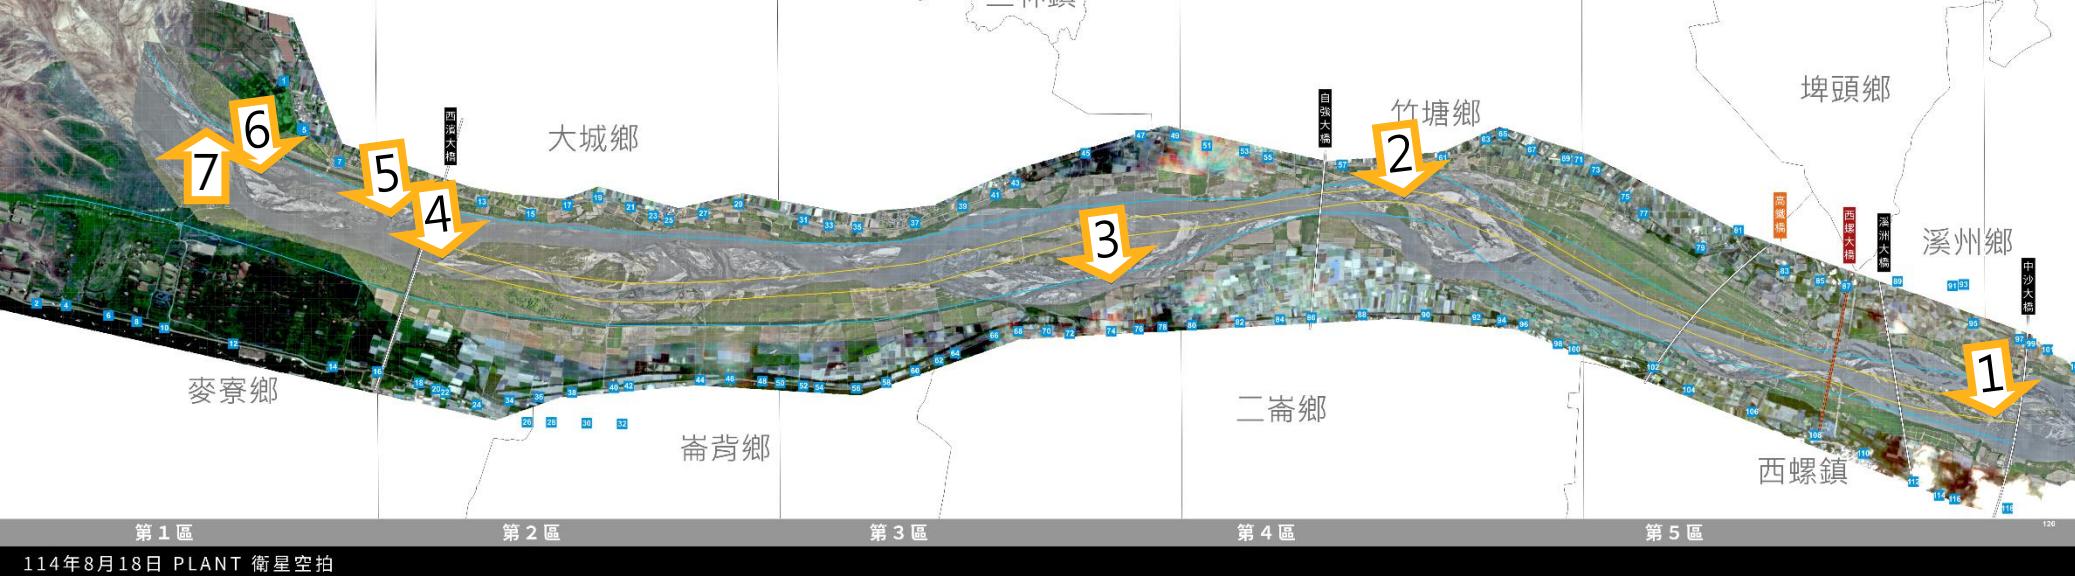


114年8月18日 PLANT 衛星空拍

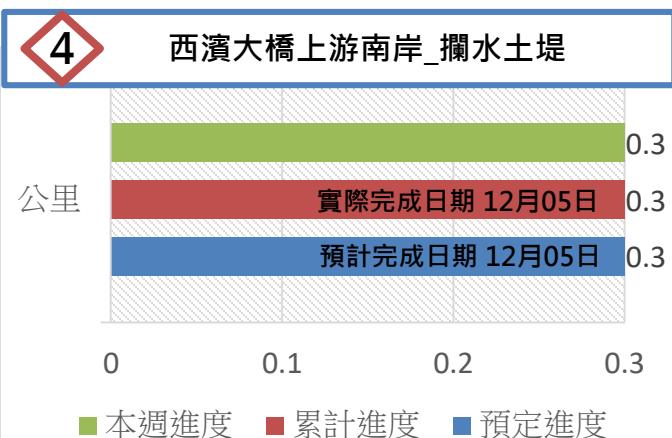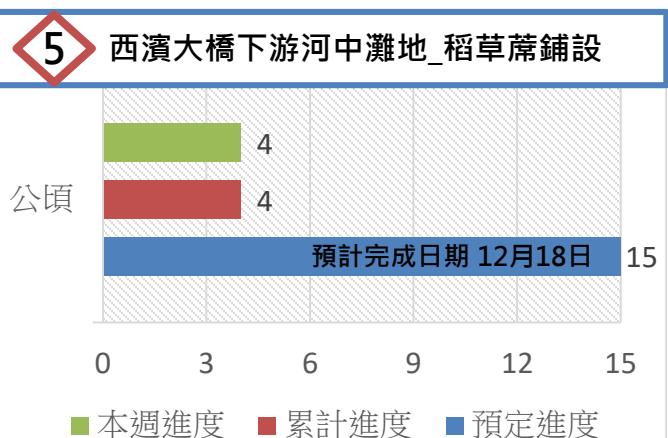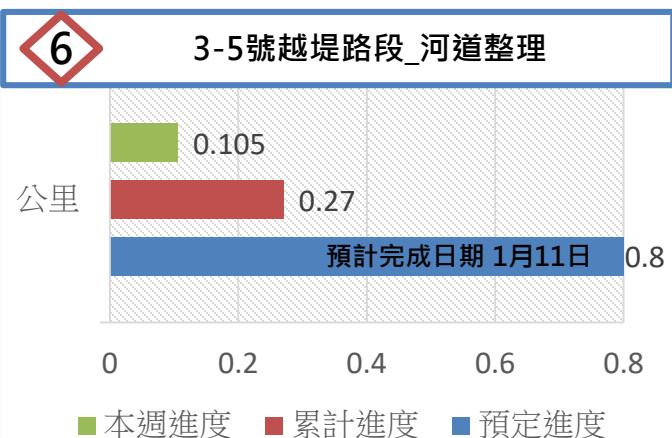

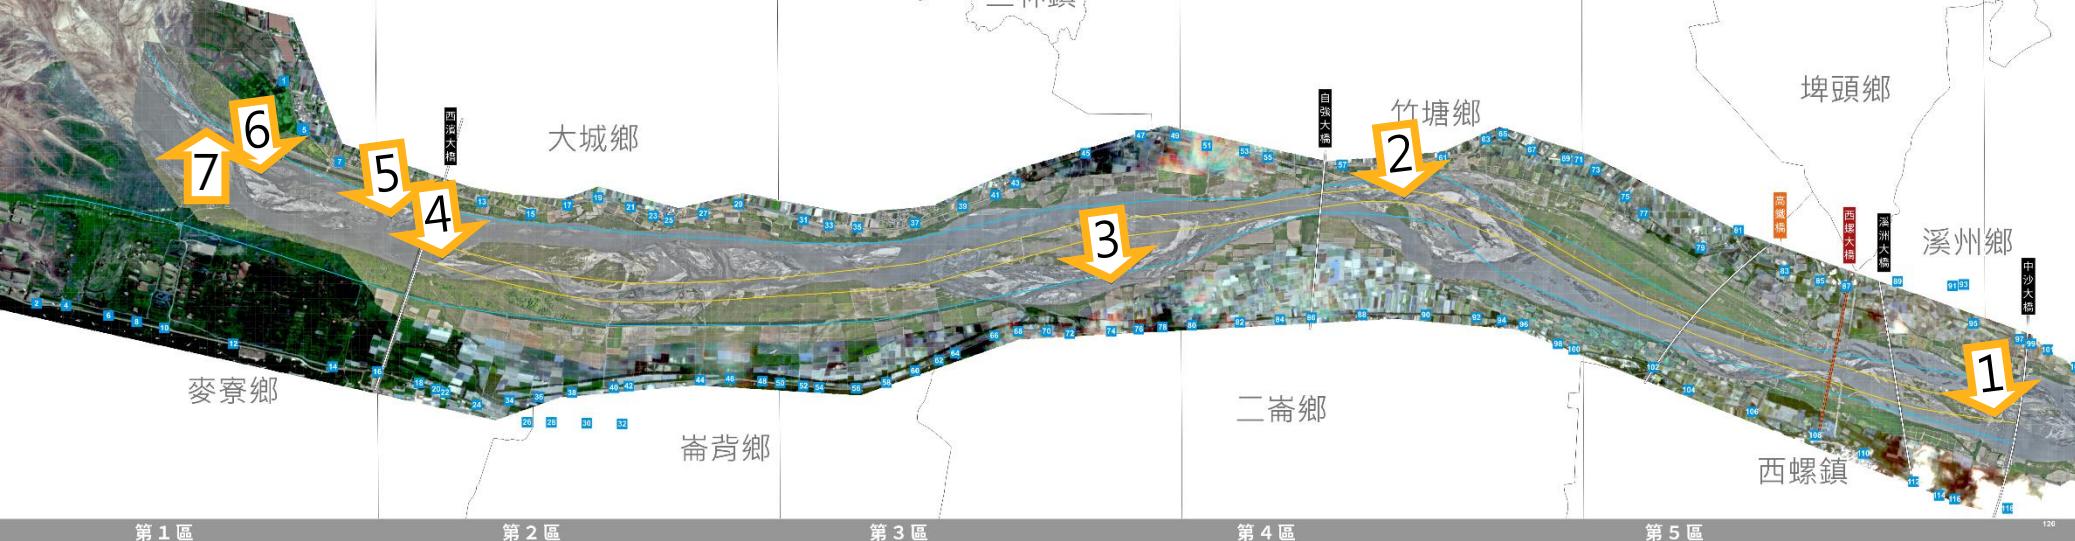

114年8月18日 PLANT 衛星空拍

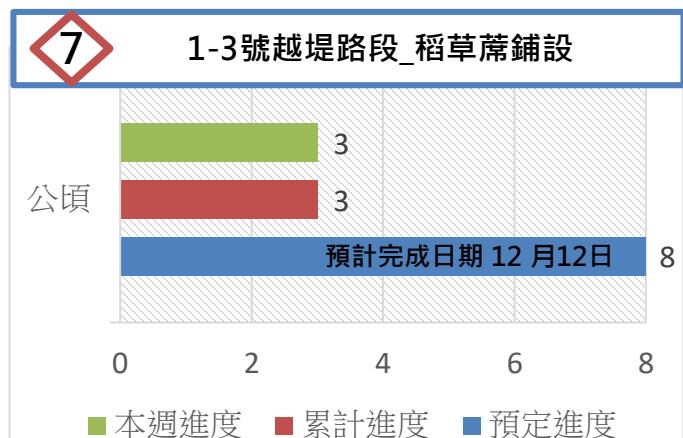



各區 空拍現況

第三區 跨河電塔 下游



第一區 麥寮0號井 下游



第二區 40號越堤下游



第四區 自強大橋 下游



第五區 西螺大橋 上下游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 469.5 公頃
- 達成率 : 156.5%



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 455 公頃
- 達成率 : 113.7 %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 2.17 公里
- 達成率 : 54.3%



防洪植栽


- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 5.2 公里
- 達成率 : 130 %



綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 357 公頃
- 達成率 : 142.8%



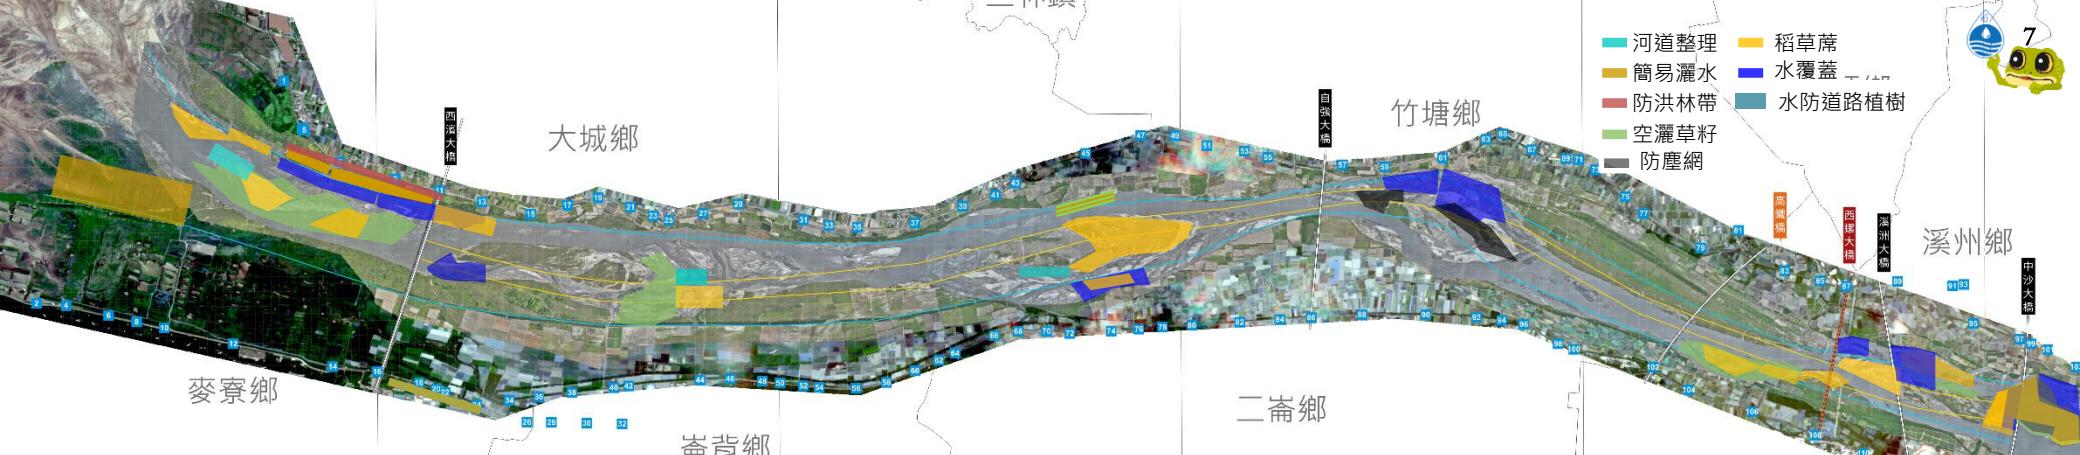

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
1) 西濱下游北岸(9號至13號越堤)_蓄水池60公頃 2) 西濱下游北岸7號越堤_蓄水池40公頃 3) 西濱下游北岸5號越堤_蓄水池40公頃	1) 西濱大橋上游南岸_蓄水池50公頃	1) 74號越堤路段_蓄水池30公頃	1) 61號越堤路段_蓄水池60公頃 2) 59號越堤路段_蓄水池30公頃	1) 中沙大橋上游_蓄水池50公頃 2) 中沙大橋下游_蓄水池30公頃 3) 溪州大橋上游北岸_蓄水池45公頃 4) 西螺大橋上游北岸_蓄水池20公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
1) 3-5號越堤路段_河道整理0.27公里	1) 40號越堤_河道整理1.5公里	1) 74號越堤下游河中低灘地_河道整理0.4公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱大橋下游_空灘草籽80公頃	1) 44號越堤路段_空灘草籽60公頃			1) 中沙大橋上游至高鐵橋上游_空灘草籽217公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 5-11號越堤_防洪林帶2公里	1) 雷厝堤防_水防道路植栽2公里	1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灘水設施6.4公頃 2) 5-11號越堤_簡易灘水設施9.6公頃 3) 0-22號水線更換11公頃 4) 7號越堤路段上下游_鋪設稻草蓆40公頃 5) 5號越堤路段下游低灘地_鋪設稻草36.5公頃 6) 西濱大橋下游河中灘地_稻草蓆鋪設4公頃 7) 1-3號越堤路段_稻草蓆鋪設3公頃	1) 40號越堤路上游低灘地_鋪設稻草蓆20公頃 2) 西濱上游北岸(13號越堤)_鋪設稻草蓆10公頃	1) 43-45號越堤_簡易灘水設施9.6公頃 2) 74號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆90公頃 3) 76號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆10公頃 4) 74號越堤下游培厚區_簡易灘水1.4公頃	1) 61號越堤路段低灘地_鋪設防塵網60公頃 2) 59號越堤路段低灘地_鋪設防塵網2公頃	1) 西螺大橋下游南岸低灘地_鋪設稻草蓆6公頃 2) 高鐵大橋上游南岸低灘地鋪設稻草蓆20公頃 3) 中沙大橋上游河中低灘地鋪設防塵網20公頃 4) 溪州大橋下游北岸低灘地_鋪設稻草蓆10公頃 5) 西螺大橋上游低灘地_鋪設稻草蓆24公頃 6) 中沙大橋上游低灘地_鋪設稻草蓆40公頃 7) 高鐵橋上游低灘地_鋪設稻草蓆20公頃 8) 西螺大橋下游南岸_鋪設稻草蓆10公頃 9) 中沙至天然氣管橋_鋪設稻草蓆6公頃
