

# 揚塵防治 週報表

114/12/08~114/12/14





114年11月23日 PLANT 螢幕擷圖

3

74號越堤下游\_河道整理

公里



■ 本週進度 ■ 累計進度 ■ 預定進度



2

自強大橋上游南岸灘地\_稻草蓆鋪設

公頃



■ 本週進度 ■ 累計進度 ■ 預定進度



1




59號越堤路段低灘地\_鋪設防塵網

公頃




■ 本週進度 ■ 累計進度 ■ 預定進度



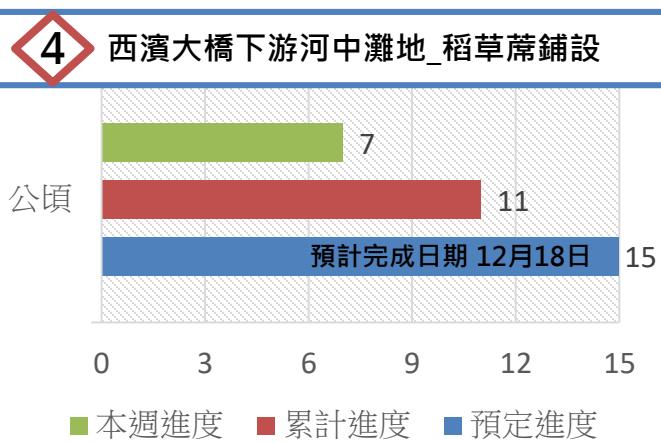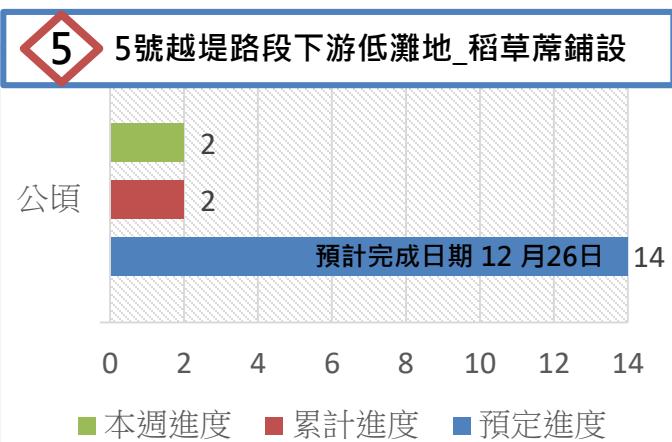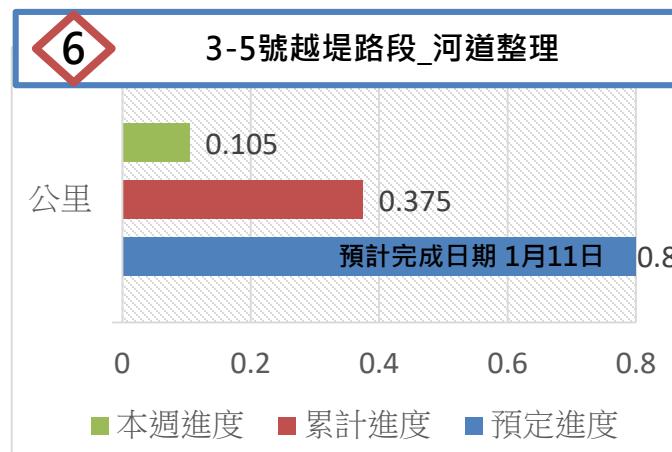



114年11月23日 PLANT 螢幕擷圖

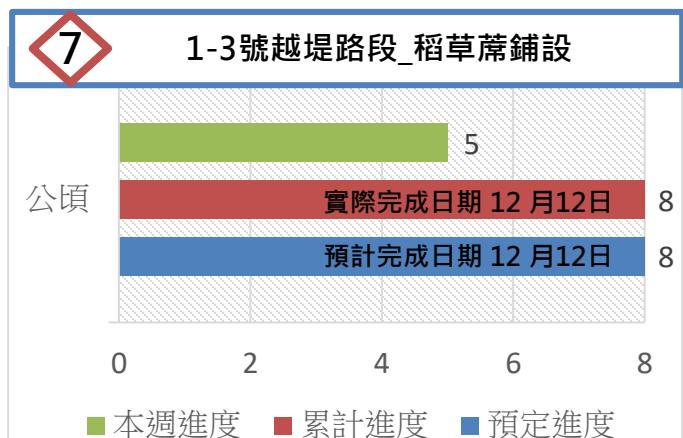



# 各區 空拍現況

第三區 跨河電塔 下游



第一區 麥寮0號井 下游



第二區 40號越堤下游



第四區 自強大橋上游



第五區 西螺大橋 下游



114年度

## 揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



## 其他覆蓋

- 目標值: 300 公頃
- 已完成: 495.5 公頃
- 達成率: 165.2%



## 水覆蓋

- 目標值: 400 公頃
- 已完成: 455 公頃
- 達成率: 113.7 %



## 河道整理

- 目標值: 4 公里
- 已完成: 2.365 公里
- 達成率: 59.1%




## 防洪植栽

- 目標值: 4 公里
- 已完成: 5.2 公里
- 達成率: 130 %



## 綠覆蓋

- 目標值: 250 公頃
- 已完成: 357 公頃
- 達成率: 142.8%

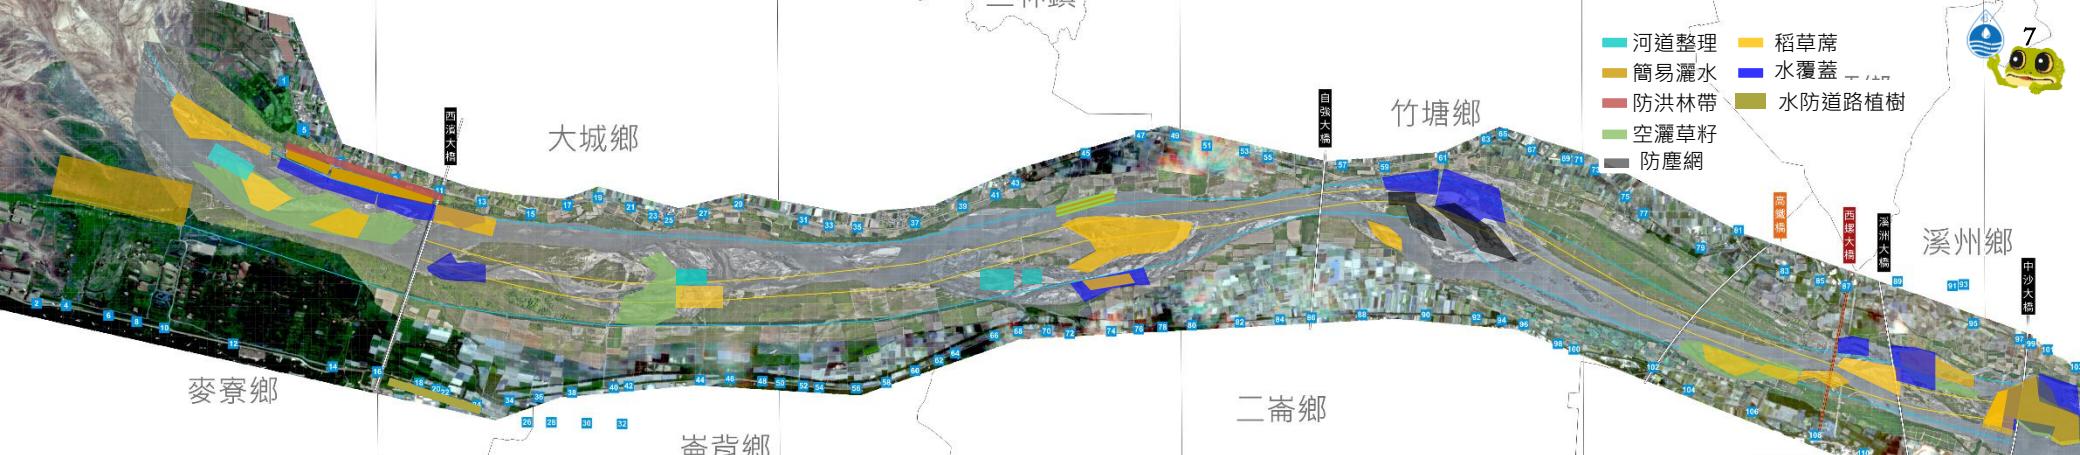

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
1) 西濱下游北岸(9號至13號越堤)_蓄水池60公頃 2) 西濱下游北岸7號越堤_蓄水池40公頃 3) 西濱下游北岸5號越堤_蓄水池40公頃	1) 西濱大橋上游南岸_蓄水池50公頃	1) 74號越堤路段_蓄水池30公頃	1) 61號越堤路段_蓄水池60公頃 2) 59號越堤路段_蓄水池30公頃	1) 中沙大橋上游_蓄水池50公頃 2) 中沙大橋下游_蓄水池30公頃 3) 溪州大橋上游北岸_蓄水池45公頃 4) 西螺大橋上游北岸_蓄水池20公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
1) 3-5號越堤路段_河道整理0.375公里	1) 40號越堤_河道整理1.5公里	1) 74號越堤下游河中低灘地_河道整理0.4公里 2) 74號越堤下游_河道整理0.09公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱大橋下游_空灘草籽80公頃	1) 44號越堤路段_空灘草籽60公頃			1) 中沙大橋上游至高鐵橋上游_空灘草籽217公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 5-11號越堤_防洪林帶2公里	1) 雷厝堤防_水防道路植栽2公里	1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灘水設施6.4公頃 2) 5-11號越堤_簡易灘水設施9.6公頃 3) 0-22號水線更換11公頃 4) 7號越堤路段上下游_鋪設稻草蓆40公頃 5) 5號越堤路段下游低灘地_鋪設稻草36.5公頃 6) 西濱大橋下游河中灘地_稻草蓆鋪設11公頃 7) 1-3號越堤路段_稻草蓆鋪設8公頃 8) 5號越堤路段下游低灘地_稻草蓆鋪設2公頃	1) 40號越堤路上游低灘地_鋪設稻草蓆20公頃 2) 西濱上游北岸(13號越堤)_鋪設稻草蓆10公頃	1) 43-45號越堤_簡易灘水設施9.6公頃 2) 74號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆90公頃 3) 76號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆10公頃 4) 74號越堤下游培厚區_簡易灘水1.4公頃	1) 61號越堤路段低灘地_鋪設防塵網60公頃 2) 59號越堤路段低灘地_鋪設防塵網8公頃 3) 自強大橋上游南岸低灘地_鋪設稻草蓆6公頃	1) 西螺大橋下游南岸低灘地_鋪設稻草蓆6公頃 2) 高鐵大橋上游南岸低灘地鋪設稻草蓆20公頃 3) 中沙大橋上游河中低灘地鋪設防塵網20公頃 4) 溪州大橋下游北岸低灘地_鋪設稻草蓆10公頃 5) 西螺大橋上游低灘地_鋪設稻草蓆24公頃 6) 中沙大橋上游低灘地_鋪設稻草蓆40公頃 7) 高鐵橋上游低灘地_鋪設稻草蓆20公頃 8) 西螺大橋下游南岸_鋪設稻草蓆10公頃 9) 中沙至天然氣管橋_鋪設稻草蓆6公頃
