


揚塵防治 週報表

114/06/23~114/06/29





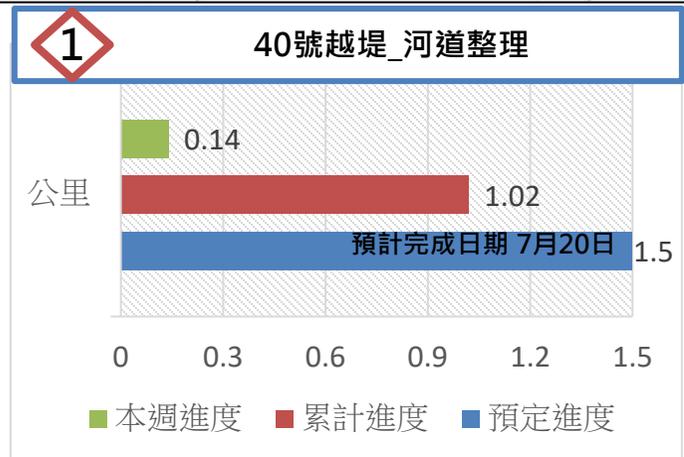

各區 空拍現況

第一區 麥寮出海口 下游



第二區 40號越堤路段 下游



第三區 跨河電塔 下游



第四區 自強大橋 上下游



第五區 西螺大橋 上下游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 16 公頃
- 達成率 : 5.3 %



水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : - 公頃
- 達成率 : - %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.02公里
- 達成率 : 25.5%



防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.2 公里
- 達成率 : 30%




綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : -公頃
- 達成率 : -%

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
KPI(公里)	8	12	4	4	4	32
實際完成	8	12.23	4	1.2	-	25.43

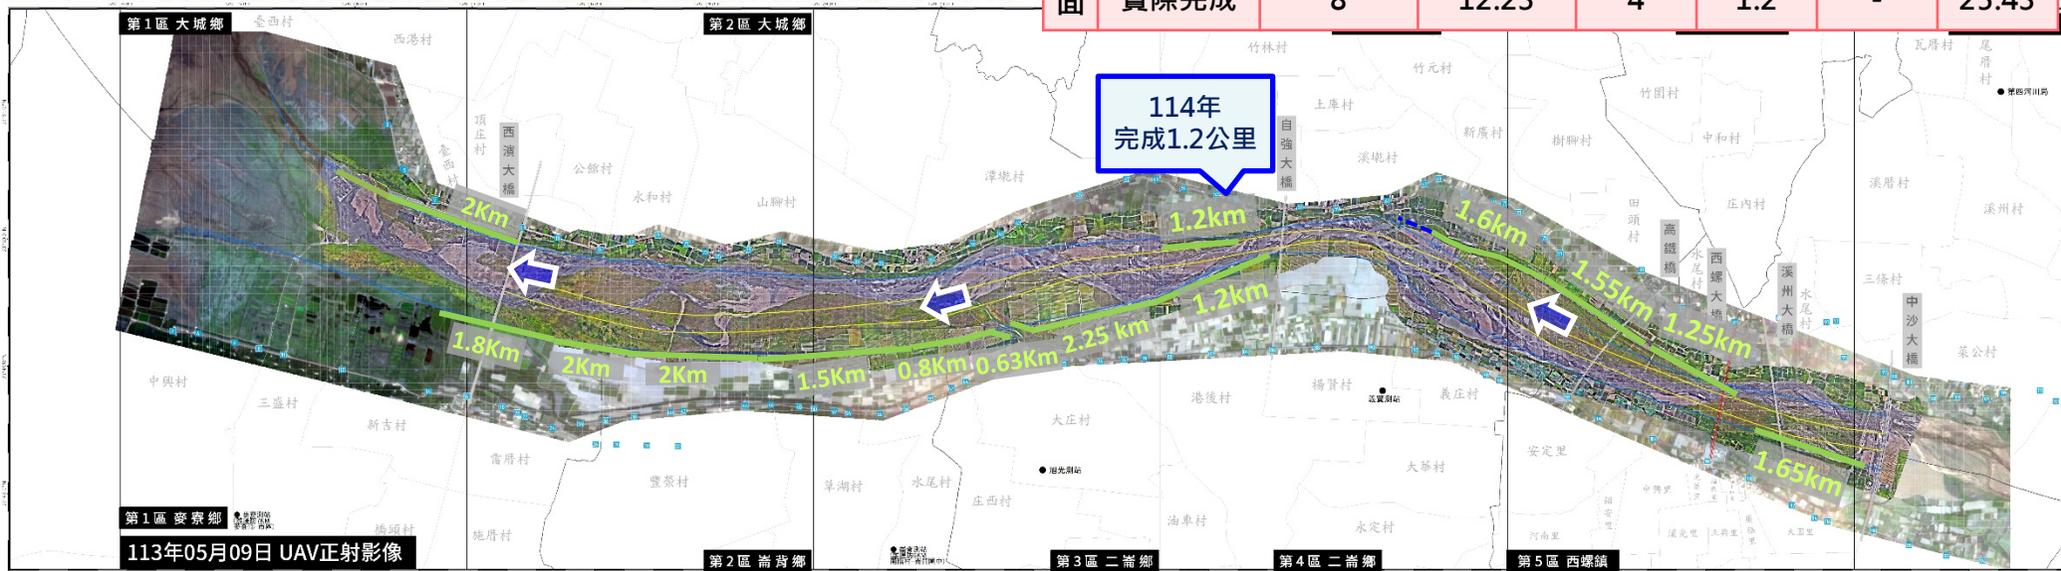

114年營造複式斷面進度管控

KPI / 4.0 公里

已完成 / 1.2 公里


達成率 / 30 %

執行進度說明：

1. 第三區：43-45號越堤路段(規劃1.2公里)，已於06月08日已完成1.2公里。
2. 將訂於7月1日召開工作會議研商營造複式斷面施作位置與施作期程。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	2	2	-	-	7.3

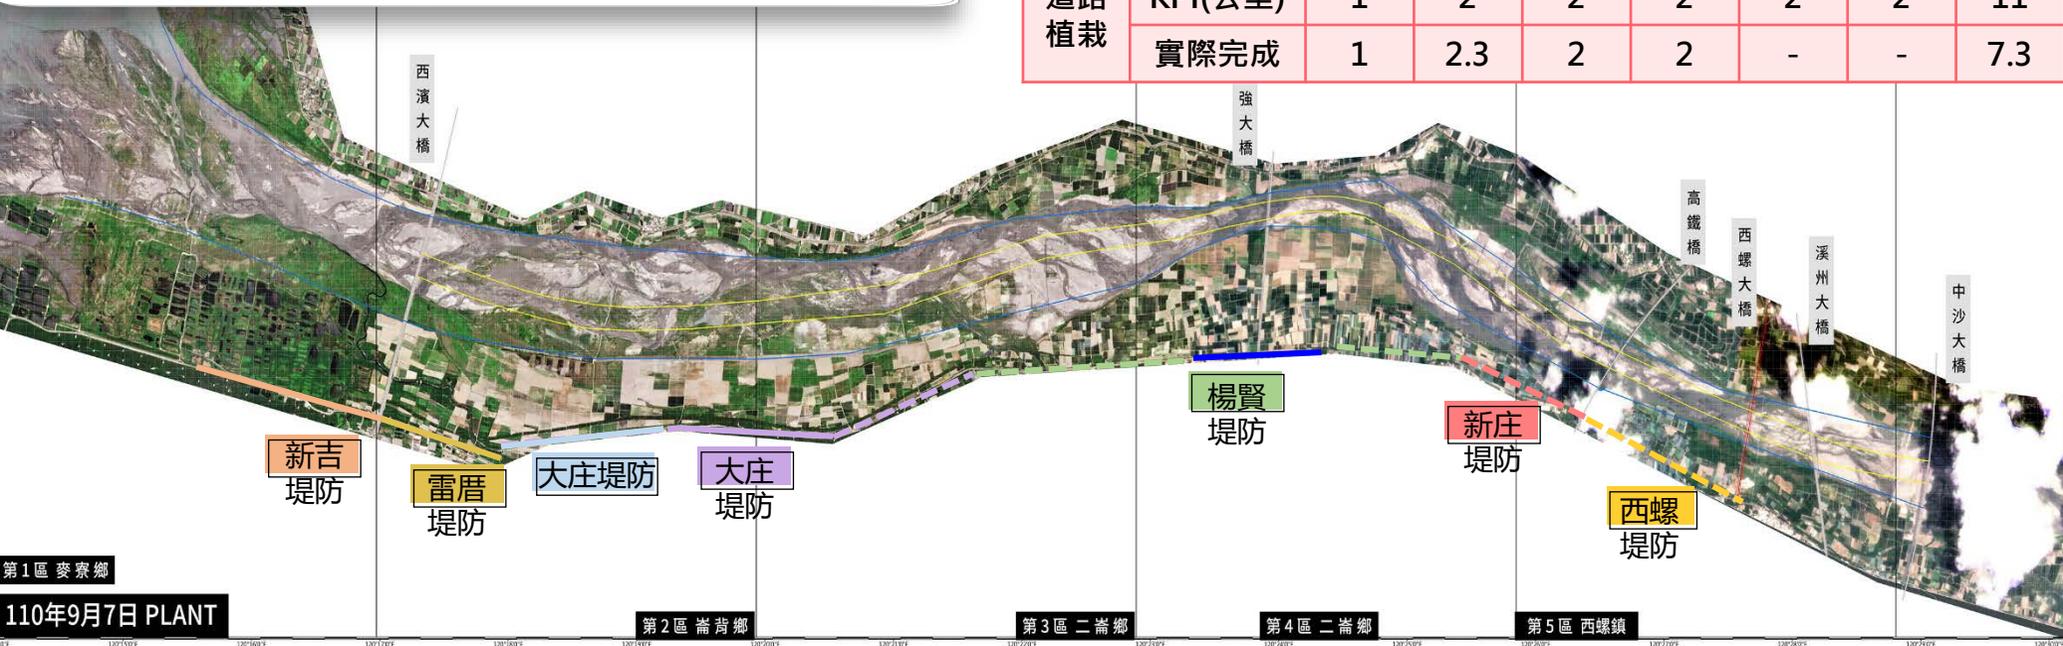


114年水防道路植栽進度管控

KPI **1** / 2公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0公里
達成率 / 0%

- 本(114)年度計畫相關案件已陸續辦理決標與簽約作業中，將訂於7月1日召開工作會議研商水防道路植栽與施作期程。



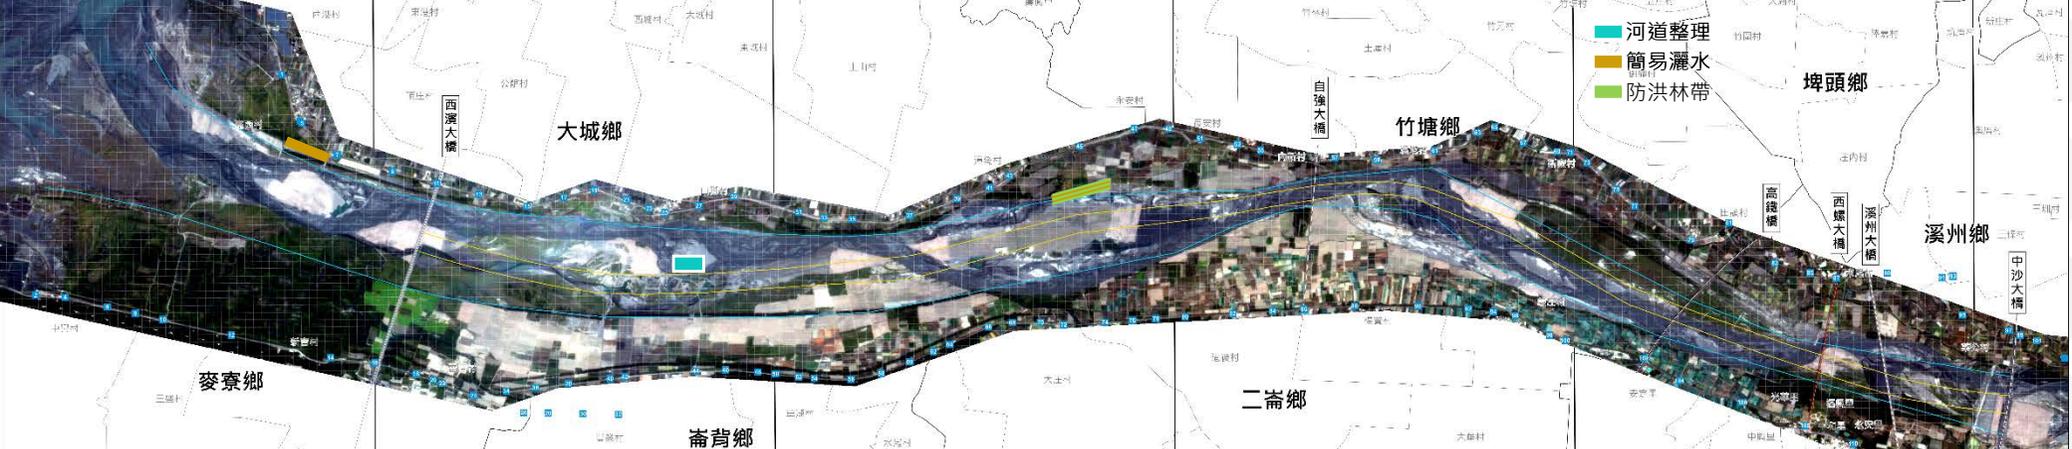

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃	1) 40號越堤_河道整理1.02公里	1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里	1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃	
