



揚塵防治 週報表

114/06/30~114/07/06



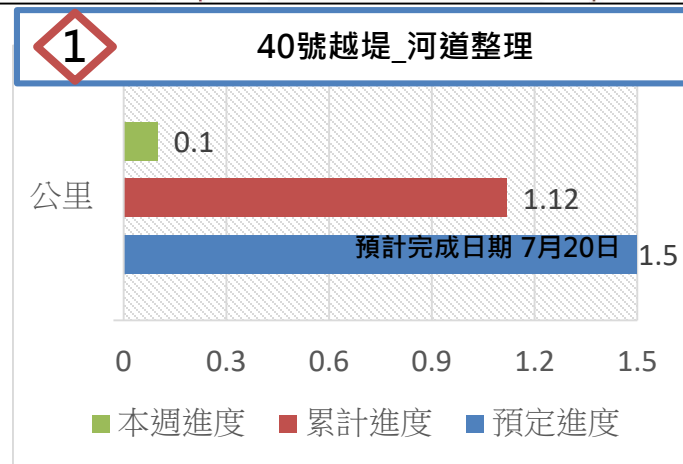

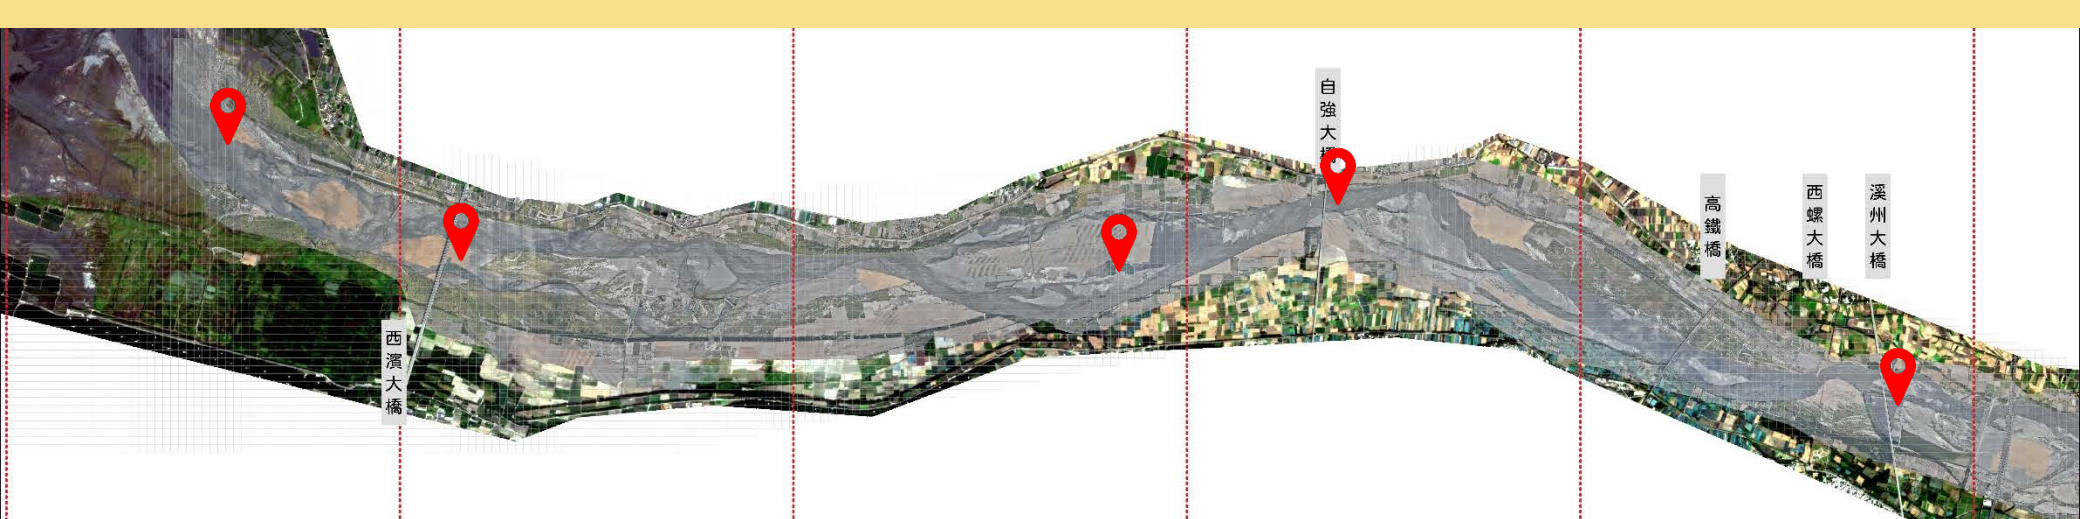

各區 空拍現況

第一區 7號越堤路段 下游



第二區 西濱大橋 上游



第三區 74號越堤路段 上下游



第四區 自強大橋 上游



第五區 溪州大橋 上下游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 16 公頃
- 達成率 : 5.3 %



水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : - 公頃
- 達成率 : - %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.12公里
- 達成率 : 28%



防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.2 公里
- 達成率 : 30%




綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : -公頃
- 達成率 : -%



營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	8	12	4	4	4	32
	實際完成	8	12.23	4	1.2	-	25.43

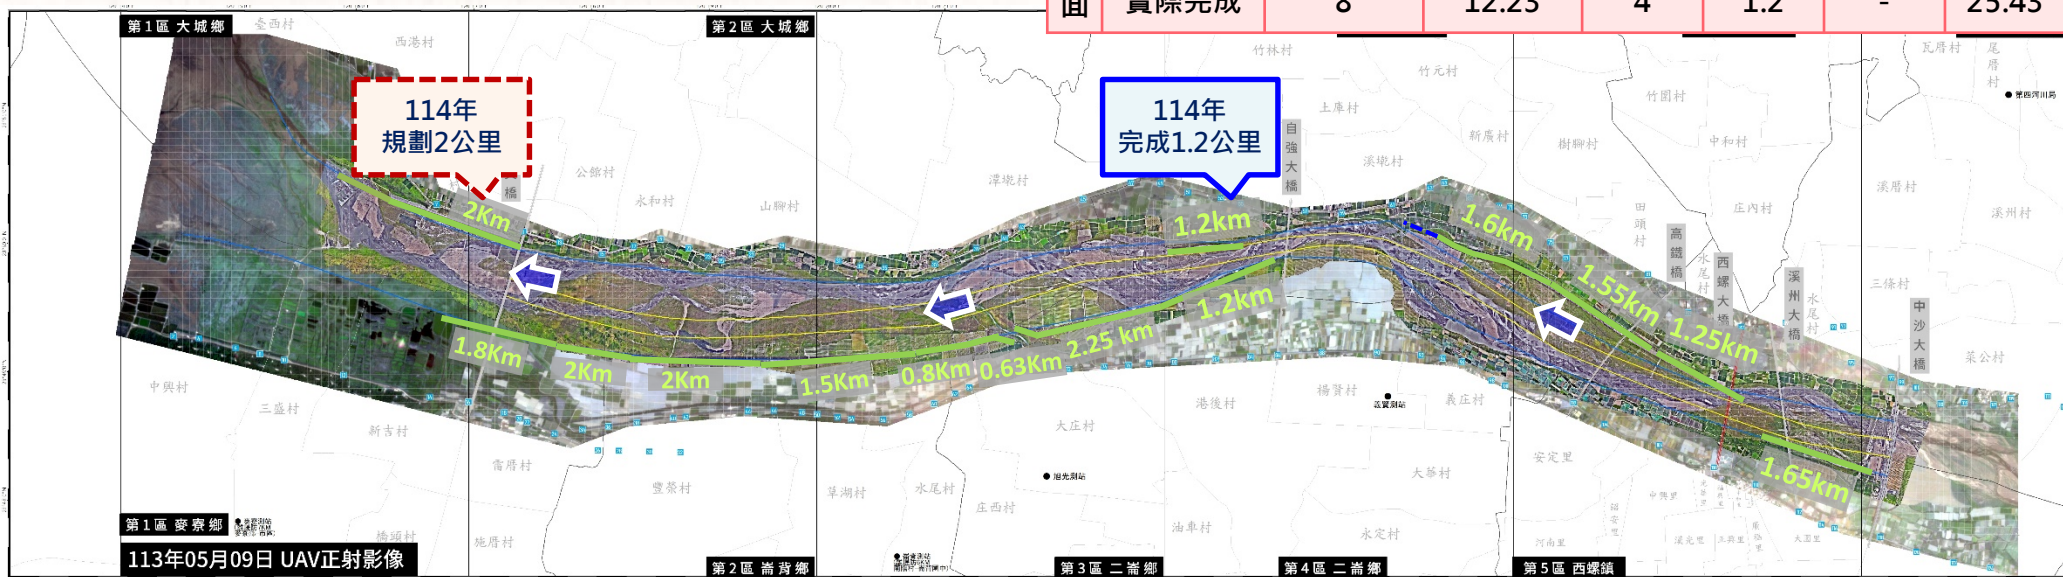

114年營造複式斷面進度管控

KPI / 4.0 公里

已完成 / 1.2 公里


達成率 / 30 %

➤ 執行進度說明：

1. 第三區：43-45號越堤路段(規劃1.2公里)，
已於06月08日已完成1.2公里。
2. 依114年7月1日工作小組會議討論，將規劃於下海墘堤防5-11號越堤段已培厚灘地栽植林帶2公里，預估於114年7月底完成。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	2	2	-	-	7.3

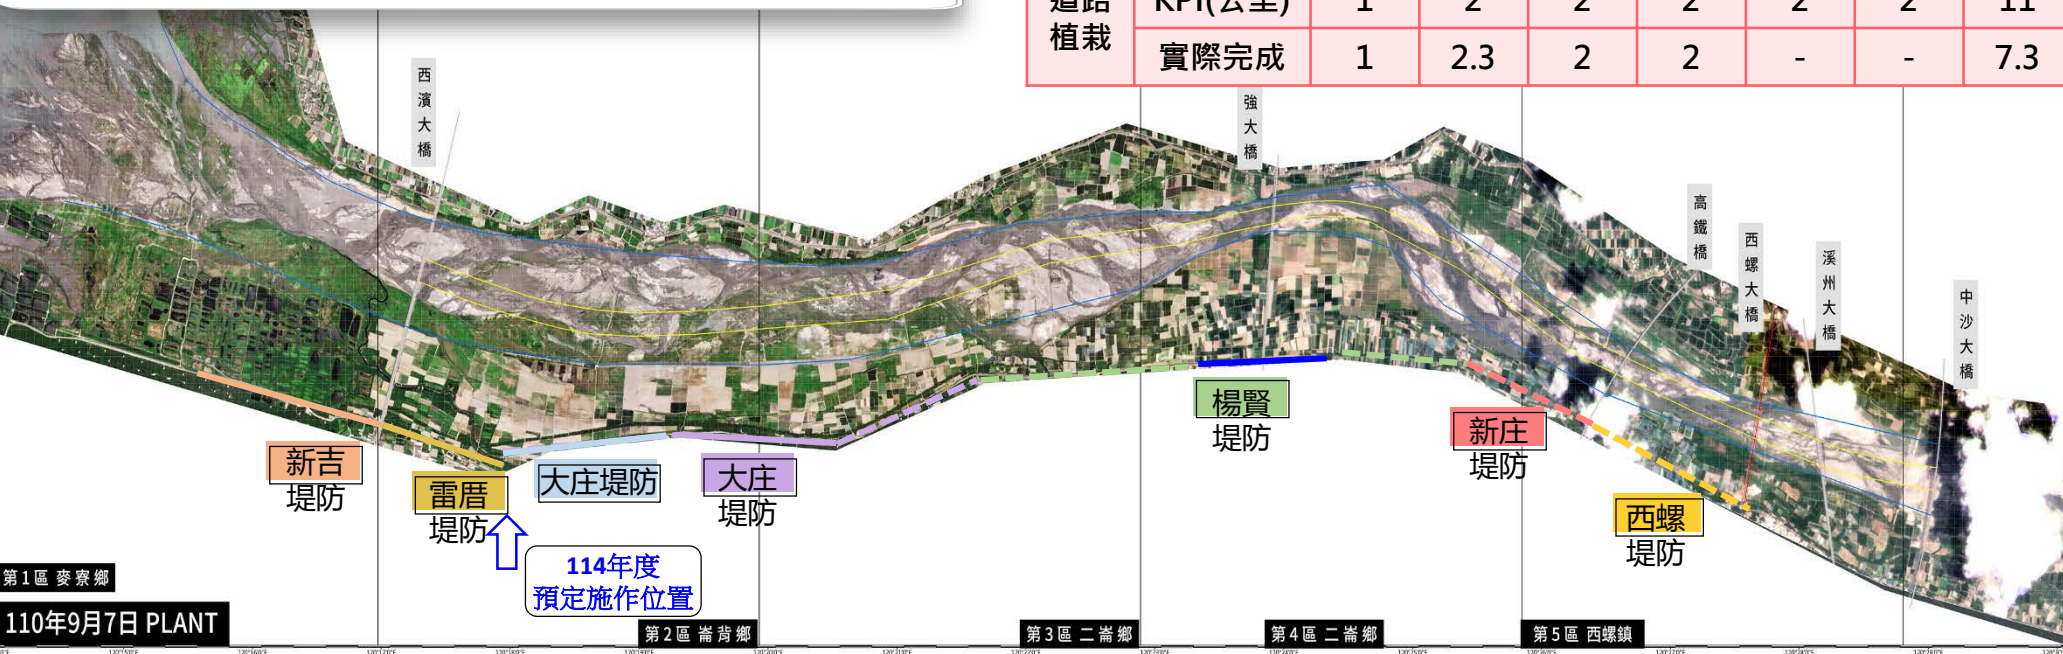


• 114年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0公里
達成率/ 0 %

- 水防道路:依114年7月1日工作小組會議討論，將規劃於雷厝堤防施作2公里，將擇期辦理現地會勘，預估於114年10月底完成。



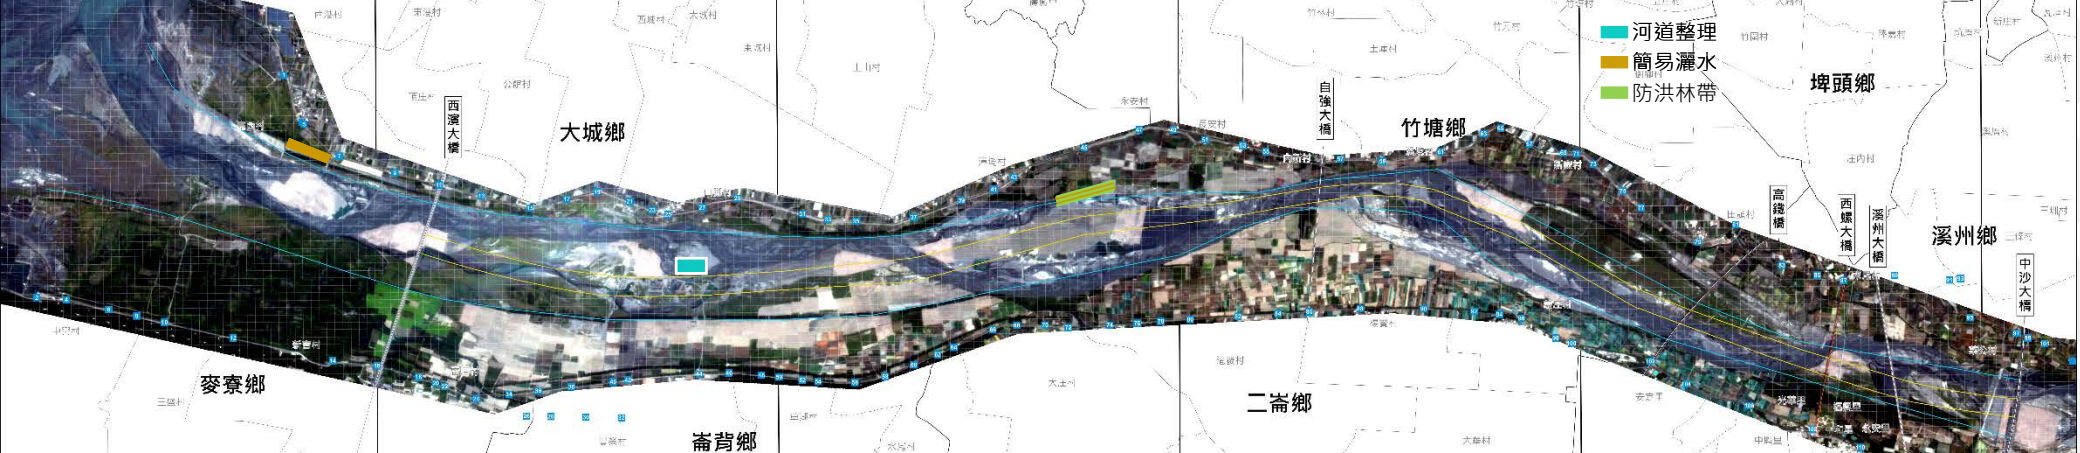

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理1.12公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
			1	
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
		1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃		1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃		
