


揚塵防治 週報表


114/10/13~114/10/19



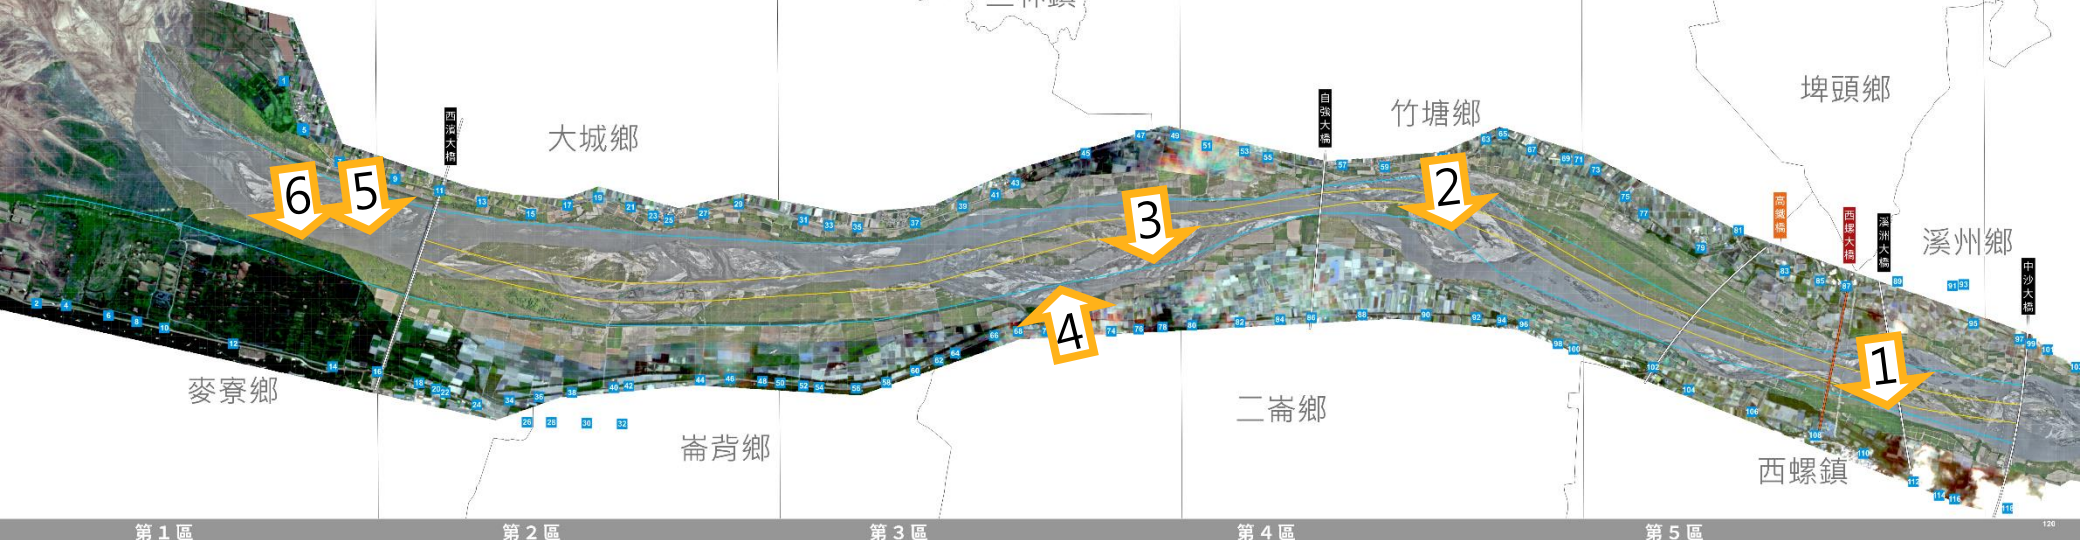


114年8月18日 PLANT 衛星空拍


3 74號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆

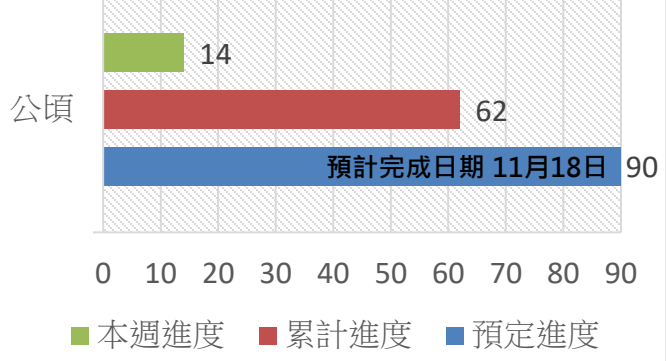


2 61號越堤路段低灘地_鋪設防塵網

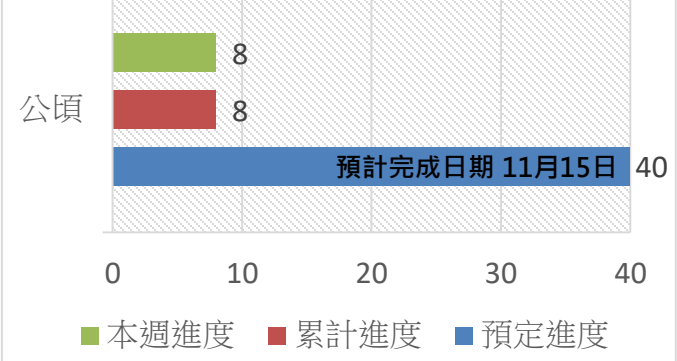


1 西螺大橋上游低灘地_鋪設稻草蓆

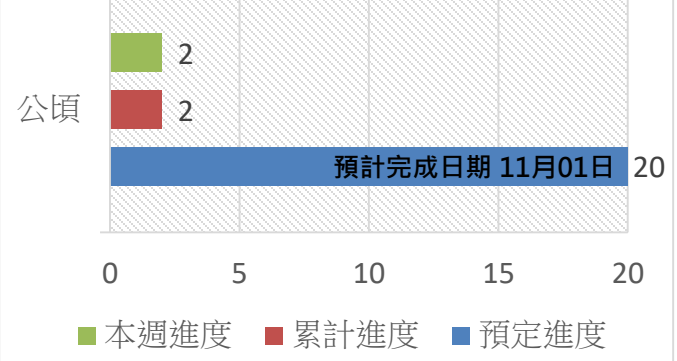

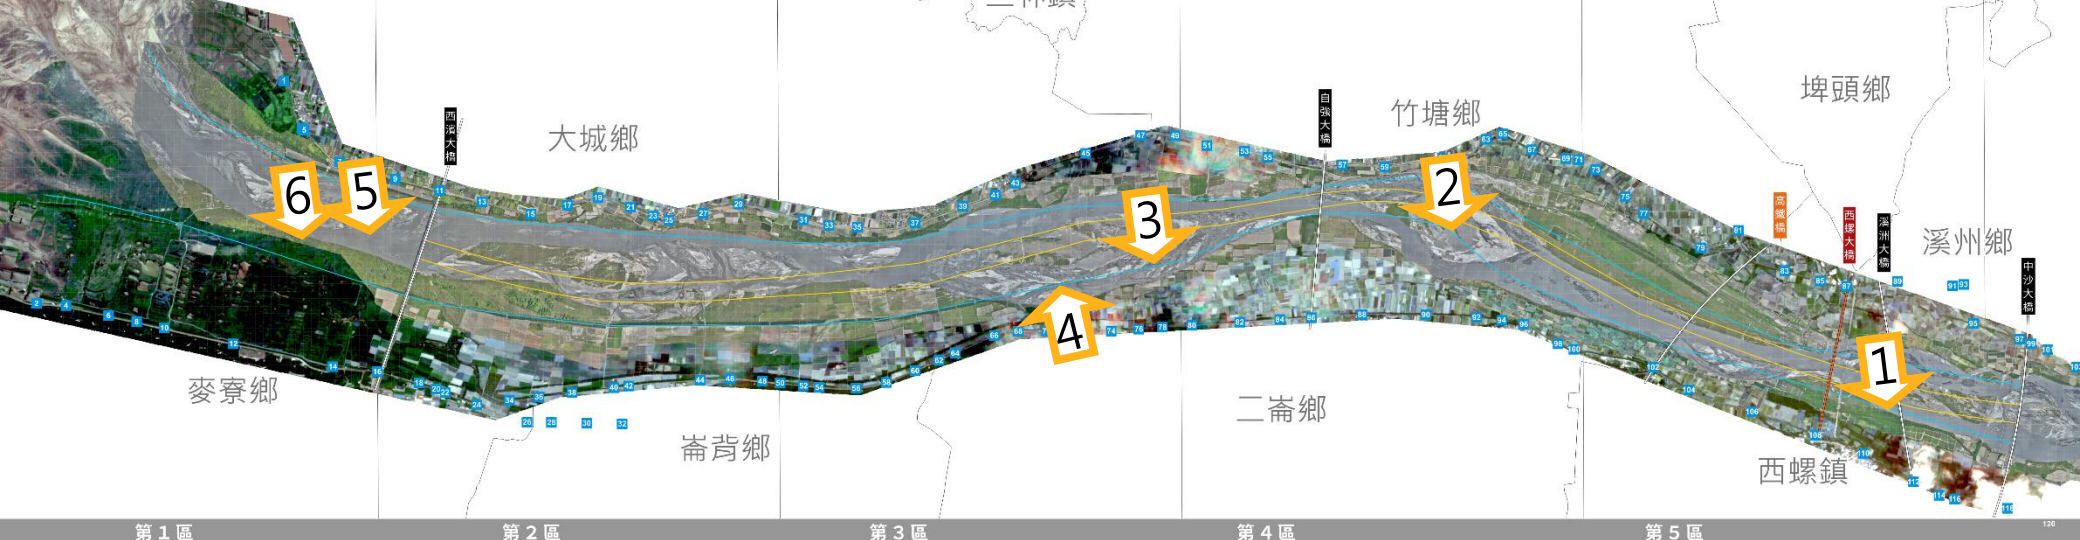


114年8月18日 PLANT 衛星空拍


6 7號越堤路段上下游_鋪設稻草蓆

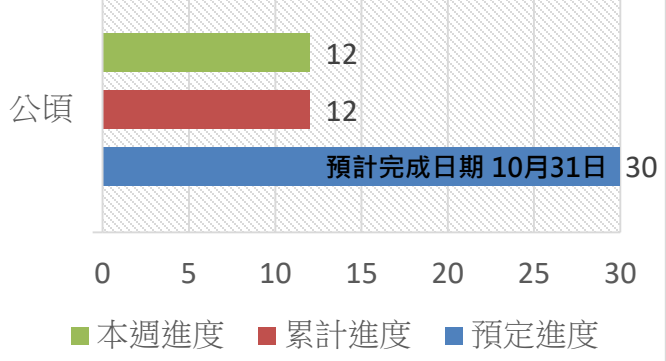

5 西濱下游北岸(9號至13號越堤)_攔水土堤

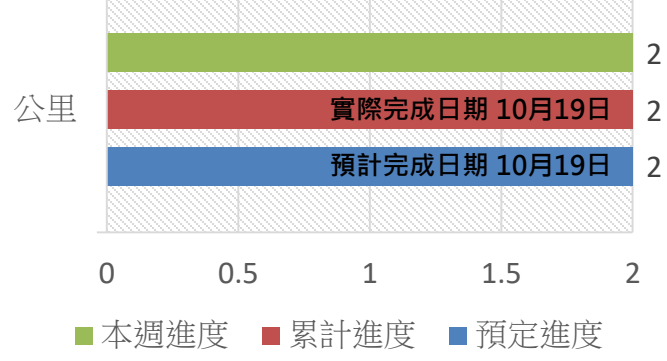

4 74號越堤下游河中低灘地_河道整理

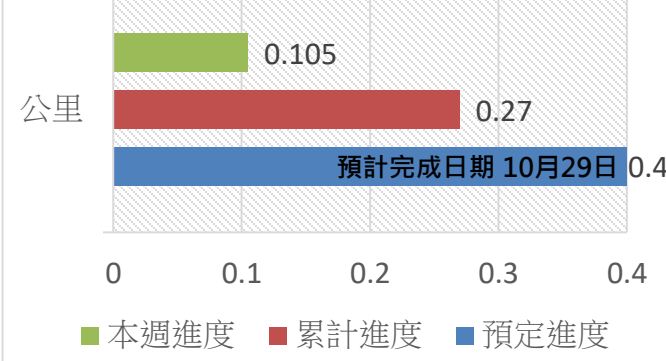



各區 空拍現況

第一區

麥寮 出海口



第二區

40號越堤路段 上下游



第三區

跨河電塔 下游



第四區

自強大橋 上游



第五區

溪州大橋 上游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 196.6公頃
- 達成率 : 65.5%



水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : 230 公頃
- 達成率 : 57.5 %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.77公里
- 達成率 : 44.3%



防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 5.2公里
- 達成率 : 130 %



綠覆蓋


- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 357公頃
- 達成率 : 142.8%



水防道路植栽規劃圖

水防
道路
植栽

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	2	2	2	-	9.3

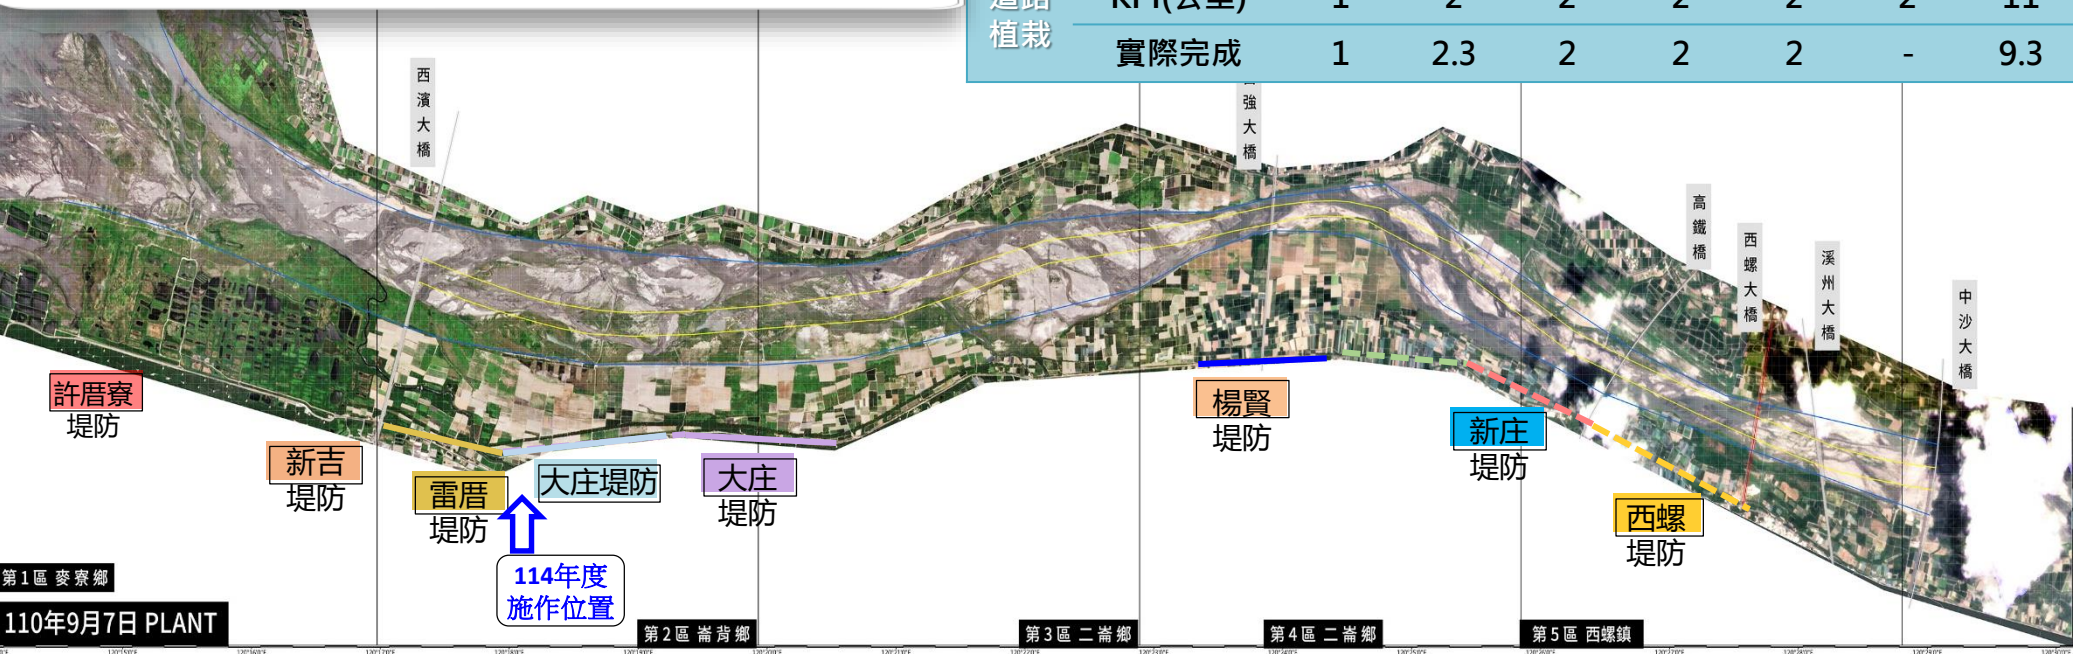

114年水防道路植栽進度管控

KPI / 2.0公里


已完成 / 2.0公里

達成率 / 100 %

已完成

第二區：

雷厝堤防往貓兒干堤防區段，
已於09月19日完成2公里。

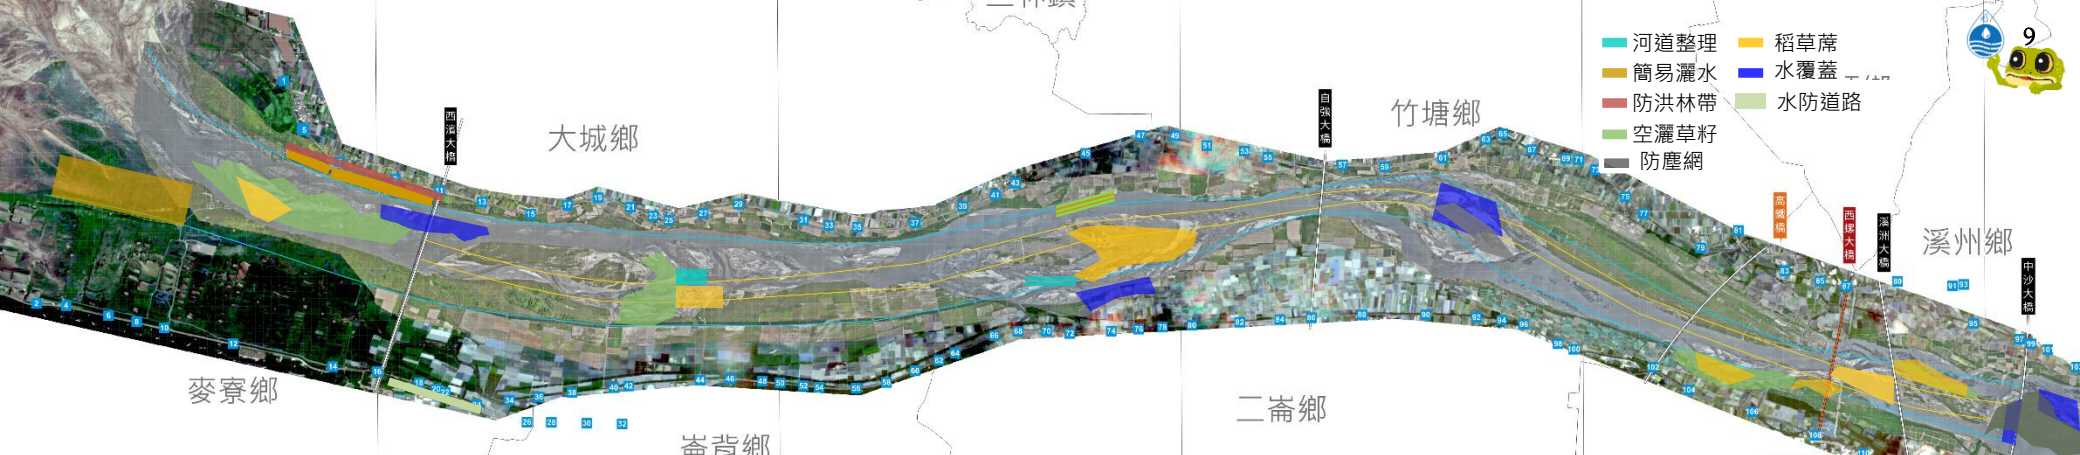

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
1) 西濱下游北岸(9號至13號越堤)_蓄水池60公頃		1) 74號越堤路段_蓄水池30公頃	1)61號越堤路段_蓄水池60公頃	1) 中沙大橋上游_蓄水池50公頃 2) 中沙大橋下游_蓄水池30公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理1.5公里	1) 74號越堤下游河中低灘地_河道整理0.27公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱大橋下游_空灑草籽80公頃	1) 44號越堤路段_空灑草籽60公頃			1) 中沙大橋上游至高鐵橋上游_空灑草籽217公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 5-11號越堤_防洪林帶2公里	1) 雷厝堤防_水防道路植栽2公里	1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃 2) 5-11號越堤_簡易灑水設施9.6公頃 3) 0-22號水線更換11公頃 4) 7號越堤路段上下游_鋪設稻草蓆12公頃	1) 40號越堤路上游低灘地_鋪設稻草蓆20公頃	1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃 2) 74號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆62公頃	1) 61號越堤路段低灘地_鋪設防塵網8公頃	1)西螺大橋下游南岸低灘地_鋪設稻草蓆6公頃 2)高鐵大橋上游南岸低灘地鋪設稻草蓆20公頃 3)中沙大橋上游河中低灘地鋪設防塵網20公頃 4) 溪州大橋下游北岸低灘地_鋪設稻草蓆10公頃 5)西螺大橋上游低灘地_鋪設稻草蓆2公頃
