

經濟部水利署第十河川局

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程
(第一期第二標)

工期展延申請書

主辦機關：經濟部水利署第十河川局

監造單位：經濟部水利署第十河川局浮洲橋工務所

承攬廠商：川祥營造有限公司

中 華 民 國 1 1 2 年 1 月

正 本

川祥營造有限公司 函

公司地址：新北市萬里區瑪鍊路2號之13

聯絡人：李玟萱 0983-660-093

受文者：經濟部水利署第十河川局

發文日期：112年01月18日

發文字號：川祥(浮洲橋)字第1120118-01號

速 別：

附 件：

主 旨：檢送「大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)」
因配合新北市環保局完成契約擴充…等因素工期，申辦本工程工期
展延，請 查照。

說 明：

- 一、 依據附錄6、經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項辦理。
- 二、 隨函檢附展延工期申請書乙式三份，謹請 鑒核。

正本：經濟部水利署第十河川局

副本：

代表人 劉 川



切 結 書

本公司承攬 貴局「大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)」因配合其他單位辦理之工程施工…等因素影響工期，按契約「工程工期核算注意事項」相關規定申辦工期展延；本次經核算可展延工期計 61 天，應展延至 112 年 4 月 10 日完工報竣；本公司於展延期間依合約規定全力配合趕工，並於該期限內完工，否則一切依相關合約規定辦理，絕無異議。特立此書，以為憑證。

此 致

經濟部水利署第十河川局

廠 商：川祥營造有限公司

負 責 人：劉川

聯絡地址：新北市萬里區瑪鋉路 2 號之 13



中 華 民 國 1 1 2 年 1 月

經濟部水利署第十河川局
大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)-申請展延工期分析表

一・工期:365日曆天	開工日期:111年2月9日	完工日期:112年2月8日
二・工程費	上次核定展延期限:無	
	1・承包工作費:156,000,000元	
	2・第一次變更設計後工作費:	

三・申請展延工期理由與天數分析:〈依據經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項辦理〉

項次	影響工期理由	分 析 計 算						可展延 天數	附註																																
1	為配合本署或其他單位辦理之工程施作，致影響本工程主要經作業業者。	1 因本工程廢棄物運至新北市環保局委託嘉益土質場有限公司代為處理，惟新北市議會尚未完成擴充契約增加經費之審議，且無法確認審議完成時間；按附錄6、經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項、八.2.(3)：「影響工期原因仍未消除，且有下開情形者，執行機關應預估影響原因消除時間並通知廠商…」，工程主辦機關預定新北市環保局完成契約擴充時間為112年3月15日，因已逾原契約核定完工日期，影響期間計：35日曆天(112.2.9-112.3.15)。(附件一、工程主辦機關預估工期函、水十工字第112010003180號函)						35	依據工程工期核算 注意事項"第五章 附則、附表三、 (十)。																																
2	為配合本署或其他單位辦理之工程施作，致影響本工程主要經作業業者。	1 再經工程主辦機關核算剩餘廢棄物數量計：3,247噸，以每日載運750噸計算：影響天數計：5工作天。 2 按原核定網狀圖完成剩餘廢棄物清運後尚有排定進行管制站拆除、施工便道復原…等工地復原整理項目計：(112.1.18-112.2.8)22日曆天需接續辦理(附件二、原核定網狀圖)，換算工作天如下： <table><tr><th>月份 (112年)</th><th>原編列 日曆天數</th><th>國定 例假日</th><th>施工期間 預估降雨天數</th><th>影響 工作天</th><th>備註</th></tr><tr><td>1</td><td>14</td><td>10</td><td>$6\text{天} \times (14-10) / (31-15) = 1.50 \approx 2\text{天}$</td><td>2</td><td>1/18-1/31</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>1</td><td>$5\text{天} \times (8-1) / (28-8) = 1.75 \approx 2\text{天}$</td><td>5</td><td>2/1-2/8</td></tr><tr><td>小計</td><td>22</td><td>11</td><td>4</td><td>7</td><td></td></tr></table>						月份 (112年)	原編列 日曆天數	國定 例假日	施工期間 預估降雨天數	影響 工作天	備註	1	14	10	$6\text{天} \times (14-10) / (31-15) = 1.50 \approx 2\text{天}$	2	1/18-1/31	2	8	1	$5\text{天} \times (8-1) / (28-8) = 1.75 \approx 2\text{天}$	5	2/1-2/8	小計	22	11	4	7		12	依據工程工期核算 注意事項"第五章 附則、附表三、 (十)。								
月份 (112年)	原編列 日曆天數	國定 例假日	施工期間 預估降雨天數	影響 工作天	備註																																				
1	14	10	$6\text{天} \times (14-10) / (31-15) = 1.50 \approx 2\text{天}$	2	1/18-1/31																																				
2	8	1	$5\text{天} \times (8-1) / (28-8) = 1.75 \approx 2\text{天}$	5	2/1-2/8																																				
小計	22	11	4	7																																					
	經核算新北市環保局完成契約擴充後尚應施作計：5+7=12工作天。																																								
	經核算可期間依習俗不計工作天及轄區降雨併計為可展延天數	1 前揭新北市環保局完成契約擴充後尚需施作12工作天自環保局完成擴充程序之次日(112.3.16)起核算，依規定習俗及國定假日(附件三)及轄區內預估降雨可展延天數(附件四)核算如下： <table><tr><th>日期</th><th>112.3(16-31)</th><th>112.4(1-10)</th><th>合計</th></tr><tr><th>日曆天</th><td>16</td><td>10</td><td>16+10=26 (展延日曆天)</td></tr><tr><th>非工作天</th><td>預估降雨天 $6\text{天} \times (16-3) / (31-7) = 1.50 \approx 3.25 = 3\text{天}$</td><td>$2 / (30-13-6) \times 6 \approx 1.09 = 1$</td><td>3+1=4</td></tr><tr><td>星期例、休假日</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>民俗節日</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>國定假日</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>工作天</td><td>$16-3-3=10$</td><td>$10-1-7=2$</td><td>12</td></tr><tr><td>累計工作天</td><td>10</td><td>12</td><td></td></tr></table>						日期	112.3(16-31)	112.4(1-10)	合計	日曆天	16	10	16+10=26 (展延日曆天)	非工作天	預估降雨天 $6\text{天} \times (16-3) / (31-7) = 1.50 \approx 3.25 = 3\text{天}$	$2 / (30-13-6) \times 6 \approx 1.09 = 1$	3+1=4	星期例、休假日	3	4	7	民俗節日	0	1	1	國定假日	0	2	2	工作天	$16-3-3=10$	$10-1-7=2$	12	累計工作天	10	12		14	1.依據工程工期核算 注意事項"第五章 附則、附表三、 (廿六)。 2.以該月增加之施工 日數與全月之施 工日數比例乘以該 月份之預估降雨天 數(採四捨五入法)即 為該月之預估降雨 天。
日期	112.3(16-31)	112.4(1-10)	合計																																						
日曆天	16	10	16+10=26 (展延日曆天)																																						
非工作天	預估降雨天 $6\text{天} \times (16-3) / (31-7) = 1.50 \approx 3.25 = 3\text{天}$	$2 / (30-13-6) \times 6 \approx 1.09 = 1$	3+1=4																																						
星期例、休假日	3	4	7																																						
民俗節日	0	1	1																																						
國定假日	0	2	2																																						
工作天	$16-3-3=10$	$10-1-7=2$	12																																						
累計工作天	10	12																																							
2		2 因前項因素施工影響12工作期間，施工期間遇有轄區內預估降雨及國定例假日…等、計：4+7+1+2=14天																																							
	合計	工期展延35+12+14=61日曆天，展延至112年4月10日						61																																	

四、檢附文件:	1.廠商申請書影本 1份。 2.廠商切結書影印本 1份。 3.展延工期預定進度表及網狀圖各 1份。 4.其他相關證明文件 4份。
五、簽章:	工務所主任: 廠商: 技師:
	副工程師 洪漢昌 工程師 鍾昇財

六、審查意見:經核展延工期理由屬實,且申請展延日數自原核定竣工日之次日(112.2.9)起算61天,擬同意展延工期至112年4月10日報竣。			
審查人員	工務課長	簡任正工程司	副局長
	正工程師 余彥陞 1/30	正工程師 吳瑞祥	副局長 楊連洲 楊連洲 楊連洲
			局長 鍾昇財

正本

檔 號：
保存年限：

經濟部水利署第十河川局 函

機關地址：22061新北市板橋區四川路2段
橋頭1號

聯絡人：洪漢昌

連絡電話：02-89669870#2215

電子信箱：wra10082@wra10.gov.tw

傳 真：02-89668572

207

新北市萬里區瑪鍊路2號之13

受文者：川祥營造有限公司

發文日期：中華民國112年1月17日

發文字號：水十工字第11201003180號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：「大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)」為配合新北市政府環境保護局廢棄物處理，請依說明事項辦理工期展延，請查照。


說明：

- 一、依據新北市政府環境保護局111年11月16日新北環處字第1112205637號函續辦。
- 二、旨案工程廢棄物運至新北市政府環境保護局(以下簡稱新北市環保局)委託嘉益土資場有限公司代為處理，依據新北市環保局來函說明，補助經費墊付案須經新北市議會審查同意，後始得辦理後續擴充契約變更，惟目前議會審查時間尚未確認，無法確認完成契約擴充可完成日期，因本案工程將屆預定完工日期(112年2月8日)，依契約附錄6「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」第八條第3項(略以)，須於完工前15日曆天申請展延工期，合先敘明。
- 三、承上，僅先預估新北市環保局契約擴充完成日期為112年3月15日，本案尚有廢棄物3,247噸，依先前已外運數量估算，每日載運量約750噸，影響天數計5工作日，據以辦理工期展延事宜，並於112年1月19日前將工期展延申資料送局審查，後續依新北市環保局實際完成契約變更後再調整

8.3 施工預定進度網狀圖

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 網狀圖

網狀圖

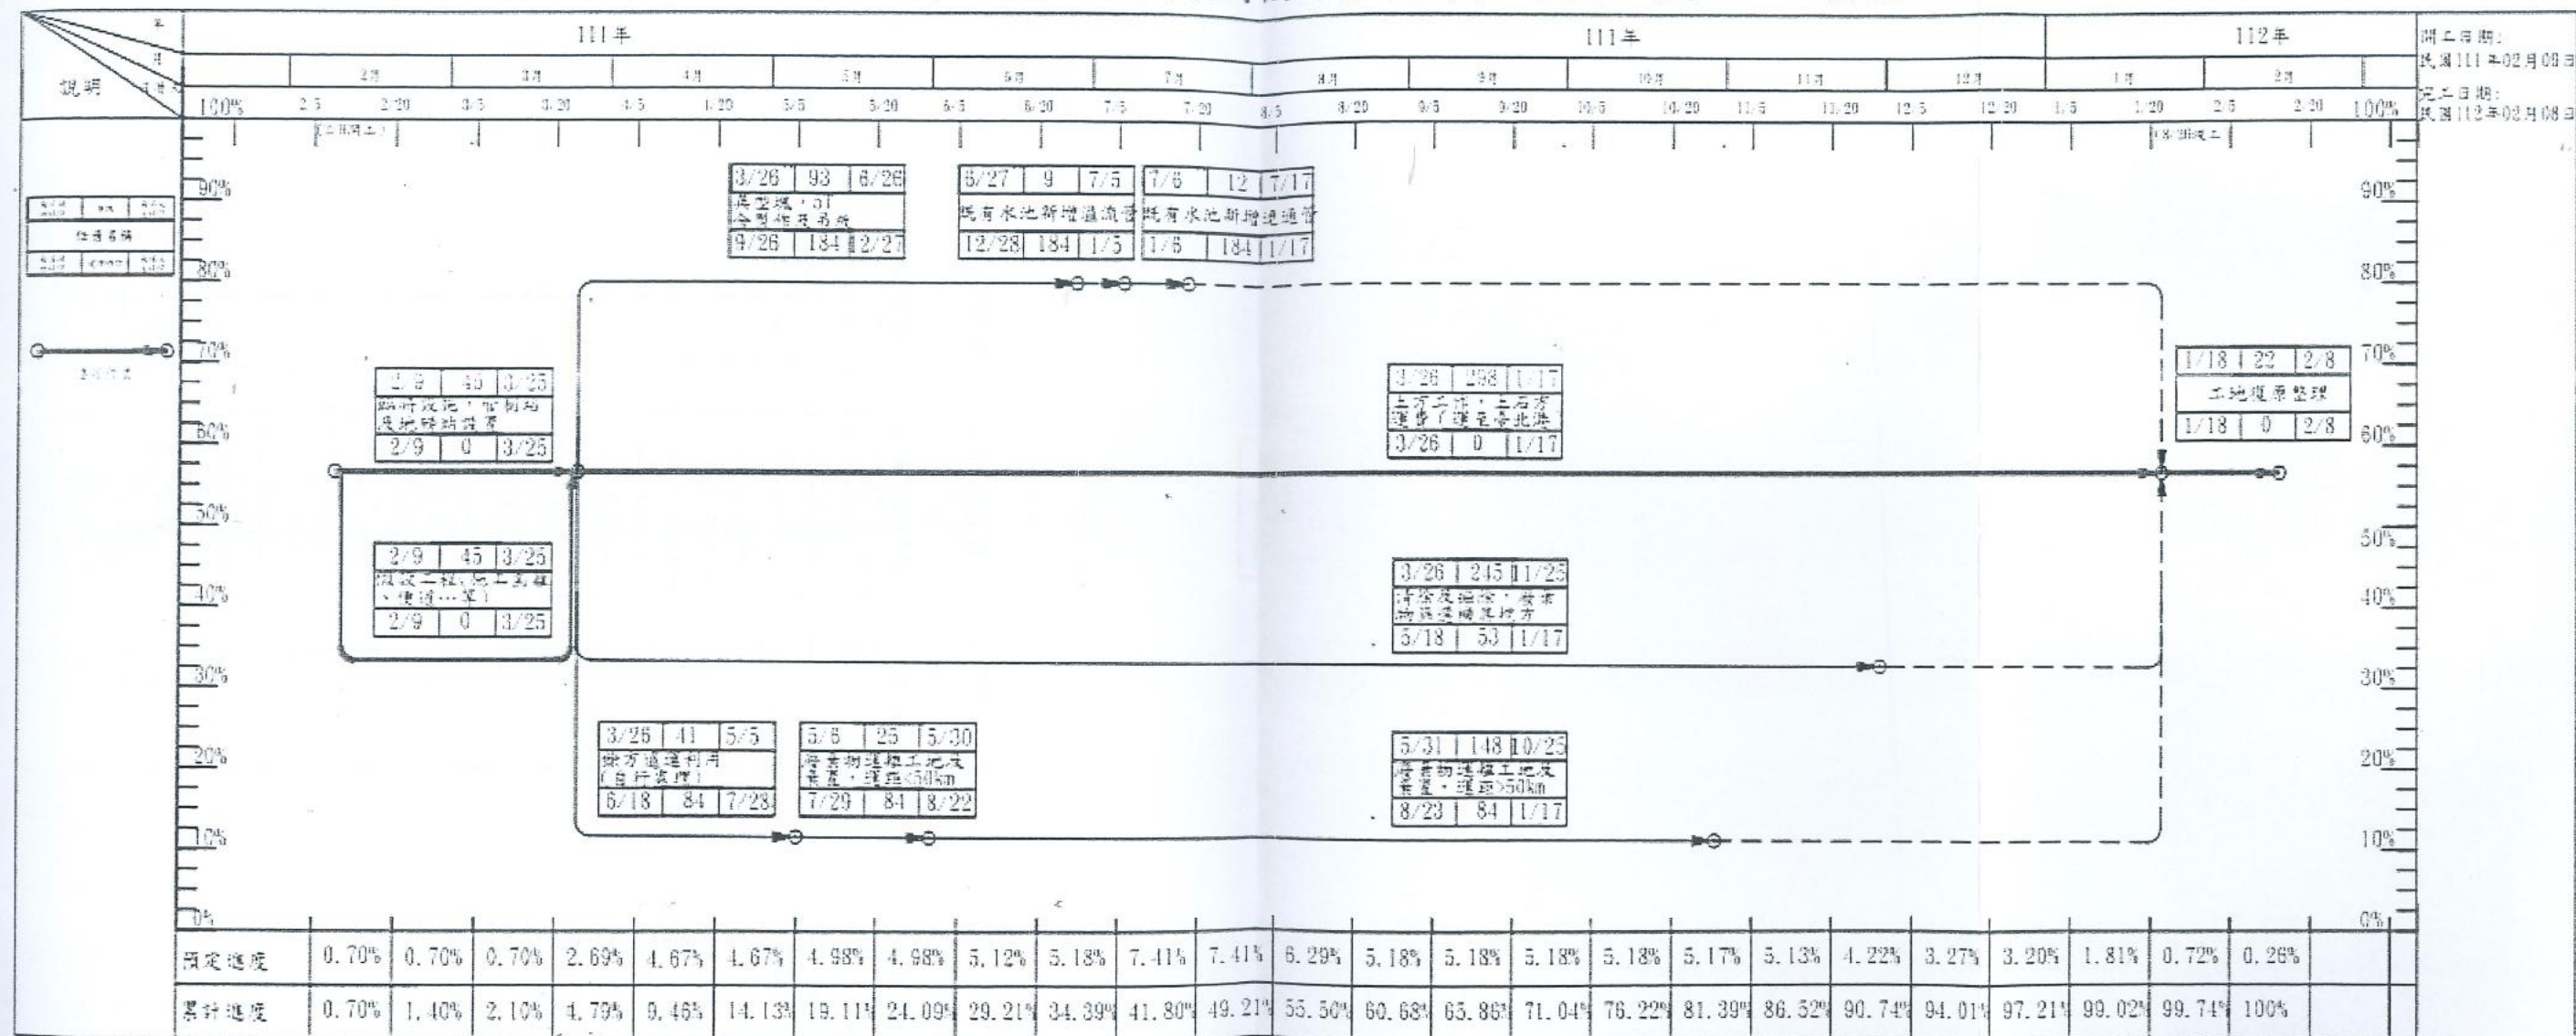

廠商:

監造單位:



工務課長:

簡任正工程司:

副局長:

局長:

經濟部水利署
第十河川局局長 陳健豐



正工程司 余文雄

圖 8-2 施工預定進度網狀圖

附表一：近十年各月份中央管河川每日降雨量超過5mm為基準。(二月份以二十八天計算)

序號	水系別	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
1	淡水河水系	6	5	6	6	8	8	5	7	6	5	5	6
2	蘭陽溪水系	5	5	5	5	7	7	5	6	6	7	7	6
3	鳳山溪水系	3	4	5	6	6	6	5	5	4	2	3	3
4	頭前溪水系	3	4	5	6	7	8	6	7	5	2	3	3
5	中港溪水系	2	4	5	5	5	6	4	5	4	1	2	3
6	後龍溪水系	2	4	4	6	7	7	5	6	4	1	2	2
7	大安溪水系	3	4	4	5	8	9	6	7	4	1	2	3
8	大甲溪水系	2	3	2	5	6	9	7	7	5	2	3	2
9	烏溪水系	2	3	4	5	7	8	7	7	4	1	2	2
10	濁水溪水系	2	2	3	5	9	9	8	9	5	2	2	2
11	北港溪水系	1	2	2	3	5	7	7	9	5	1	1	1
12	朴子溪水系	1	2	2	4	7	8	9	12	7	2	1	1
13	八掌溪水系	1	2	3	4	9	9	9	12	8	2	2	2
14	急水溪水系	1	2	2	4	6	9	9	12	7	2	1	1
15	曾文溪水系	1	1	2	4	7	9	8	11	7	1	1	1
16	鹽水溪水系	1	1	1	4	4	8	7	9	5	1	1	1
17	二仁溪水系	0	1	1	4	5	8	8	10	6	1	1	1
18	阿公店溪水系	0	1	1	4	4	7	7	8	5	1	1	1
19	高屏溪水系	1	1	2	4	7	9	8	10	7	3	2	1
20	東港溪水系	0	1	1	4	5	8	8	10	8	2	1	1
21	四重溪水系	2	2	2	4	4	8	8	10	7	3	2	2
22	卑南溪水系	1	2	2	4	5	6	5	6	6	3	3	2
23	秀姑巒溪水系	3	3	3	4	7	6	5	6	7	5	4	4
24	花蓮溪水系	6	6	5	4	8	8	6	6	8	6	6	6
25	和平溪水系	4	4	4	4	8	8	6	6	7	7	6	5

一、本表統計自93年至103年各中央管河川每日降雨量超過5mm為基準。(二月份以二十八天計算)

二、本表所統計日數已依比例原則扣除相關週休假日。

三、各所屬機關辦理水資源及非屬中央管河川之工程，得參考鄰近中央管河川水系降雨統計資料。

中華民國112年（西元2023年）政府行政機關辦公日曆表

一 月							二 月							三 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4				1	2	3	4
初十	十一	十二	十三	小寒	十五	十六			十一	十二	十三	立春				初十	十一	十二	十三	
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	十四	驚蟄	十六	十七	十八	十九	二十
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	大寒	三十	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
正月小	初二	初三	初四	初五	初六	初七	雨水	二月大	初二	初三	初四	初五	初六	廿八	廿九	春分	閏二月	初二	初三	初四
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31	
初八	初九	初十					初七	初八	初九					初五	初六	初七	初八	初九	初十	

1月份例假日10天，預估
降雨2天

2月份例假日1天，預估
降雨2天

六 月							六 月							六 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
						1							6					1	2	3
						十一							立夏					十四	十五	十六
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
十二	十三	兒童節	清明	十六	十七	十八	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	十七	十八	芒種	二十	廿一	廿二	廿三
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	四月大	初二	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
廿六	廿七	廿八	廿九	穀雨	初二	初三	小滿	初四	初五	初六	初七	初八	初九	五月大	初二	初三	夏至	初五 端午節	初六	初七
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	
初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	初十	十一	十二	十三				初八	初九	初十	十一	十二	十三	
30						十一														

七 月							八 月							九 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
						1							5						1	2
						十四							十九						十七	十八
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
十五	十六	十七	十八	十九	小暑	廿一	二十	廿一	立秋	廿三	廿四	廿五	廿六	十九	二十	廿一	廿二	廿三	白露	廿五
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿七	廿八	廿九	七月大	初二	初三	初四	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	八月大	初二
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
廿九	三十	六月小	初二	初三	初四	初五	初五	初六	初七	處暑	初九	初十	十一	初三	初四	初五	初六	初七	初八	秋分
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
大暑	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十二	十三	十四	十五	十六			初十	十一	十二	十三	十四	十五 中元節	十六
30	31																			
十三	十四																			

十 月							十 一 月							十 二 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7							4						1	2
十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三							廿一						十九	二十
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
寒露	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	廿二	廿三	廿四	立冬	廿六	廿七	廿八	廿一	廿二	廿三	廿四	大雪	廿六	廿七
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
九月小	初二	初三	初四	初五	初六	初七	廿九	十月大	初二	初三	初四	初五	初六	廿八	廿九	三十	十一月小	初二	初三	初四
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
初八	初九	霜降	十一	十二	十三	十四	初七	初八	初九	小雪	十一	十二	十三	初五	初六	初七	初八	初九	冬至	十一
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
十五	十六	十七					十四	十五	十六	十七	十八			十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八
														31						
														十九						

中華民國112年(西元2023年)政府行政機關辦公日曆表


一 月							二 月							三 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4				1	2	3	4
初十	十一	十二	十三	小寒	十五	十六				十一	十二	十三	立春				初十	十一	十二	十三
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	十四	驚蟄	十六	十七	十八	十九	二十
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	大寒	三十	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
正月小	初二	初三	初四	初五	初六	初七	雨水	二月大	初二	初三	初四	初五	初六	廿八	廿九	春分	閏二月	初二	初三	初四
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31	
初八	初九	初十					初七	初八	初九					初五	初六	初七	初八	初九	初十	
4月份例假日7天，預估 降雨1天							五 月							3月份例假日3天，預估 降雨3天						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
						1		1	2	3	4	5	6					1	2	3
						十一		十二	十三	十四	十五	十六	立夏					十四	十五	十六
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
十二	十三	兒童節	清明	十六	十七	十八	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	十七	十八	芒種	二十	廿一	廿二	廿三
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	四月大	初二	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
廿六	廿七	廿八	廿九	穀雨	初二	初三	小滿	初四	初五	初六	初七	初八	初九	五月大	初二	初三	夏至	初五 端午節	初六	初七
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	
初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	初十	十一	十二	十三				初八	初九	初十	十一	十二	十三	
30																				
十一																				
七 月							八 月							九 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
						1		1	2	3	4	5							1	2
						十四		十五	十六	十七	十八	十九							十七	十八
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
十五	十六	十七	十八	十九	小暑	廿一	二十	廿一	立秋	廿三	廿四	廿五	廿六	十九	二十	廿一	廿二	廿三	白露	廿五
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿七	廿八	廿九	七月大	初二	初三	初四	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	八月大	初二
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
廿九	三十	六月小	初二	初三	初四	初五	初五	初六	初七	處暑	初九	初十	十一	初三	初四	初五	初六	初七	初八	秋分
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
大暑	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十二	十三	十四	十五	十六			初十	十一	十二	十三	十四	十五 中秋節	十六
30	31																			
十三	十四																			
十 月							十 一 月							十 二 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2
十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三				十八	十九	二十	廿一						十九	二十
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
寒露	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	廿二	廿三	廿四	立冬	廿六	廿七	廿八	廿一	廿二	廿三	廿四	大霧	廿六	廿七
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
九月小	初二	初三	初四	初五	初六	初七	廿九	十月大	初二	初三	初四	初五	初六	廿八	廿九	三十	十一月小	初二	初三	初四
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
初八	初九	霜降	十一	十二	十三	十四	初七	初八	初九	小雪	十一	十二	十三	初五	初六	初七	初八	初九	冬至	十一
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
十五	十六	十七					十四	十五	十六	十七	十八			十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八
														31						
														十九						

上班日

放假日

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

展延工期網狀圖

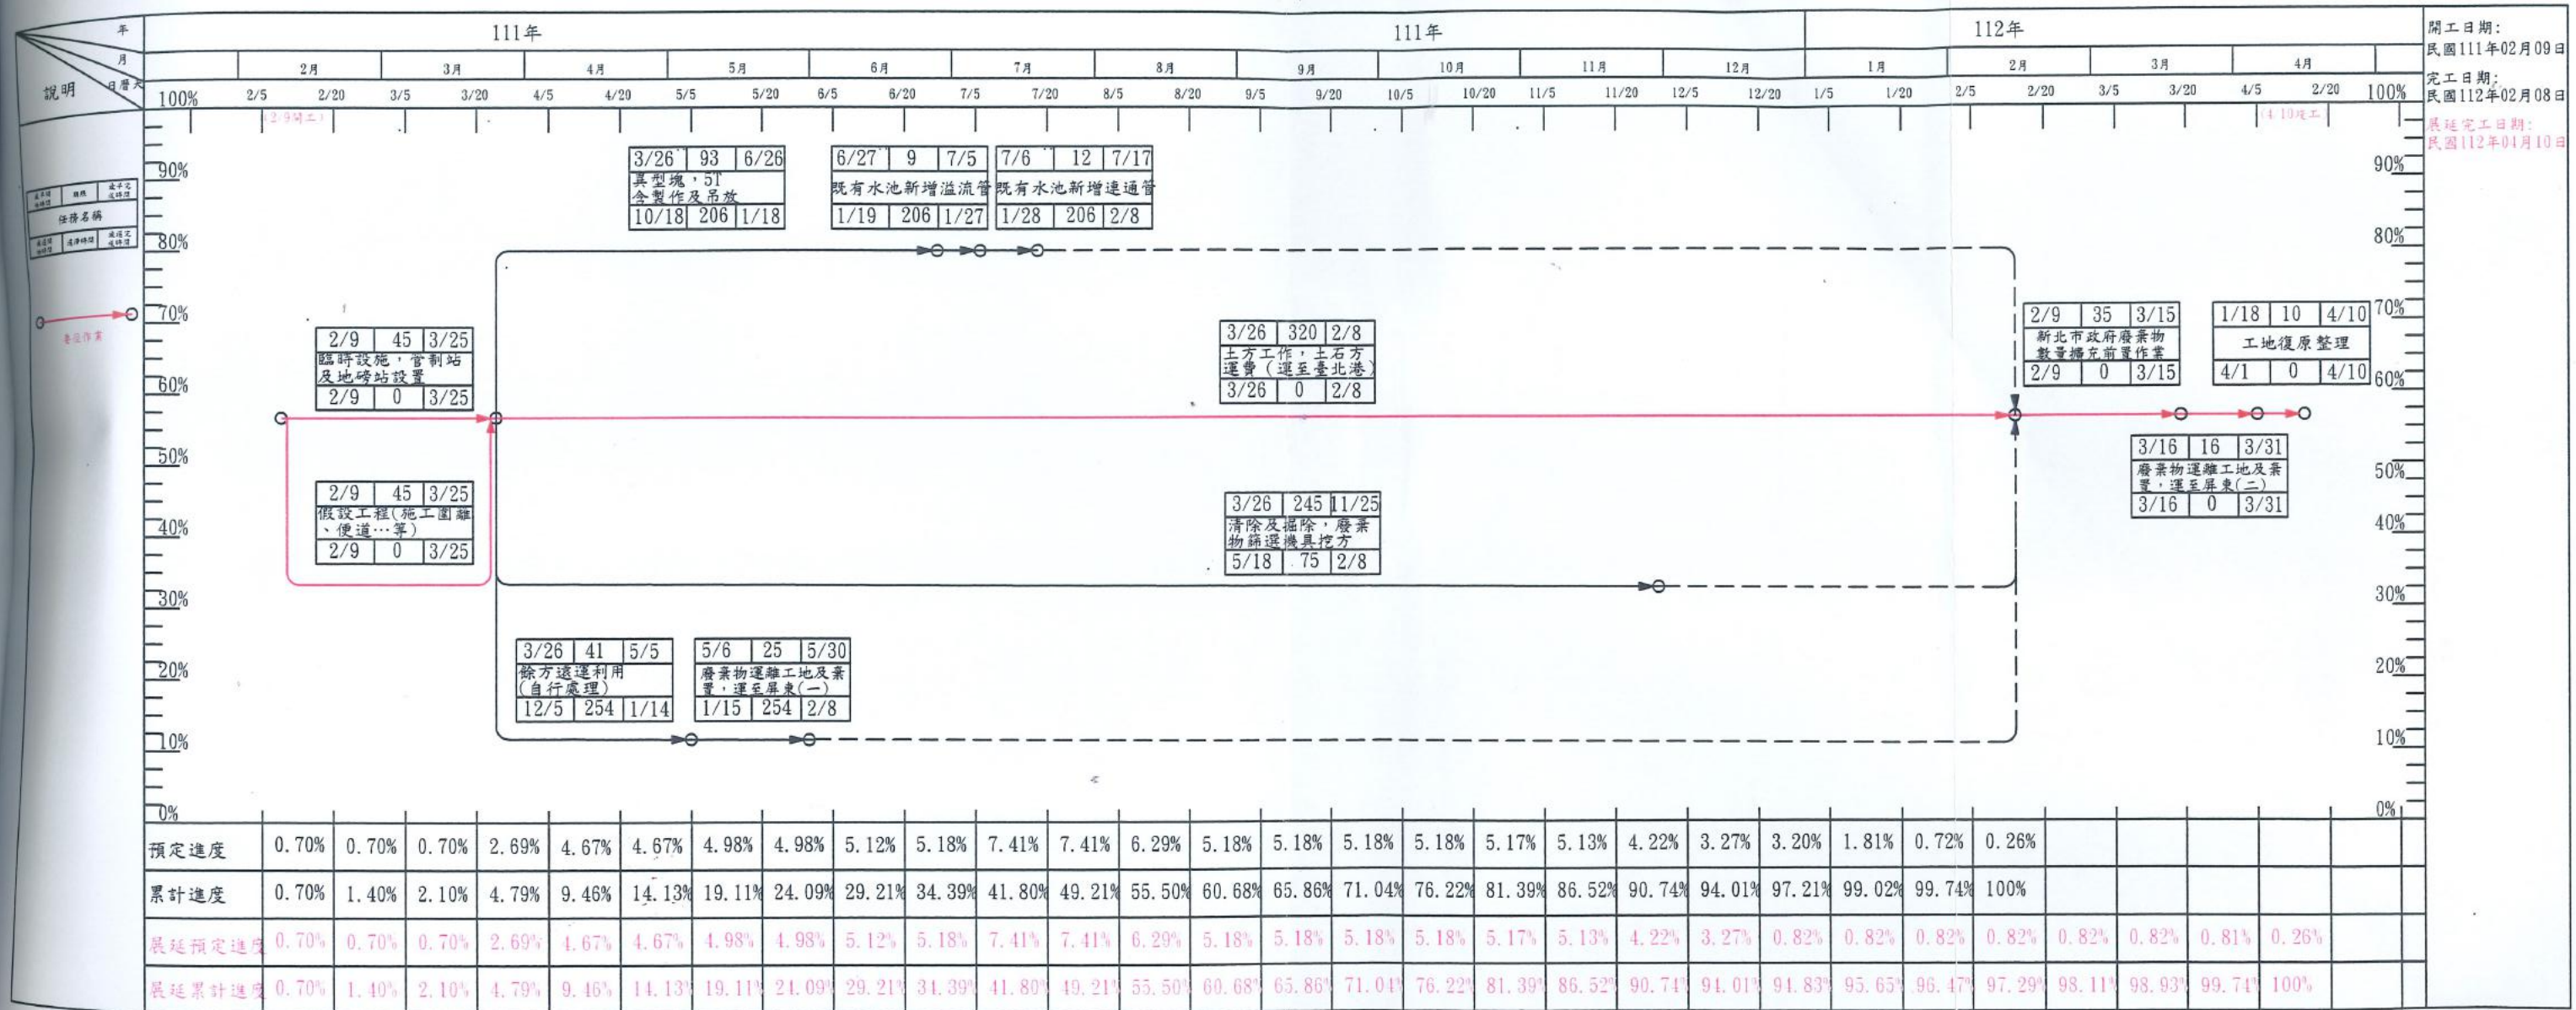

廠商:



監造單位:

副工程司 洪漢昌

正工程司 余文雄

工務課長:

正工程司兼
工務課課長 曹榮顯

簡任正工程司:

正工程司 吳瑞祥

副局長

經濟部水利署
第十河川局局長 楊連洲

局長:

經濟部水利署
第十河川局局長 陳健豐
