





揚塵防治 週報表





114/09/08~114/09/14




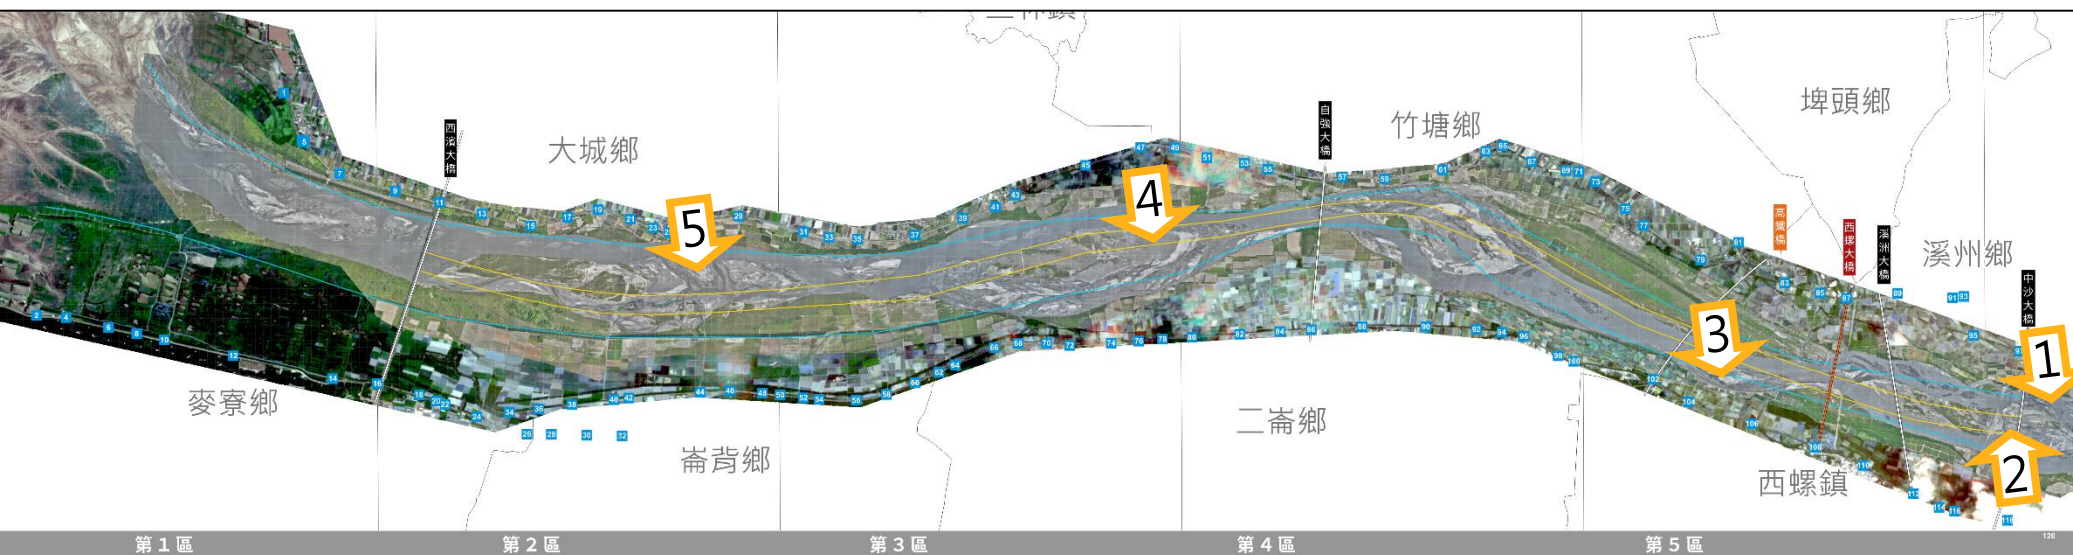



114年8月18日 PLANT 衛星空拍

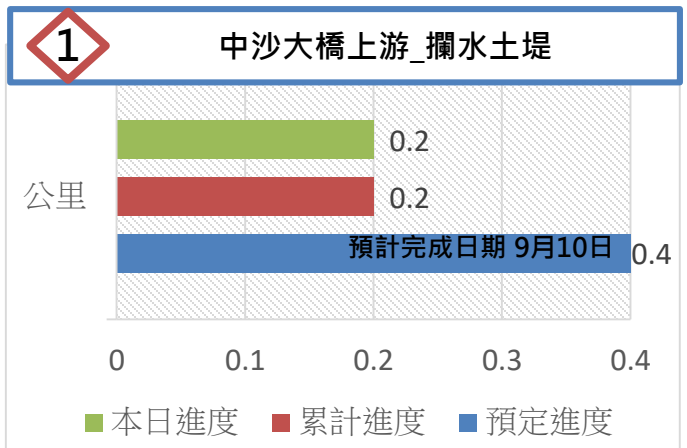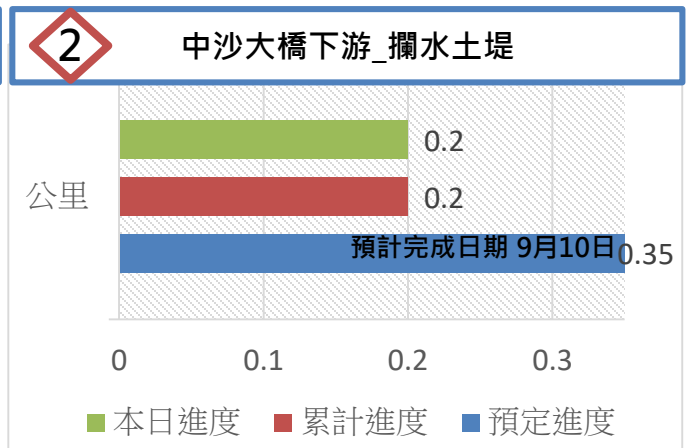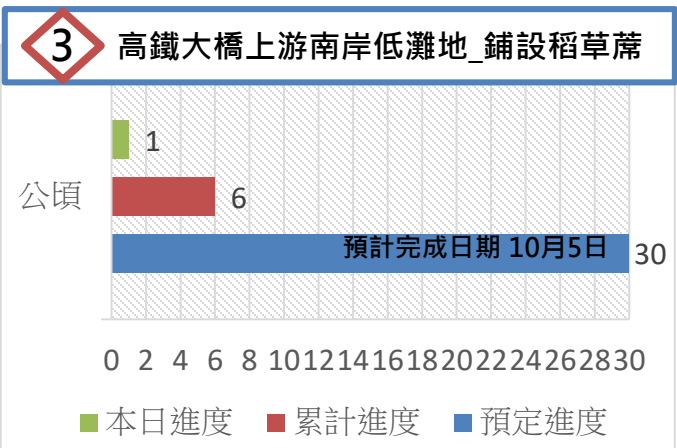

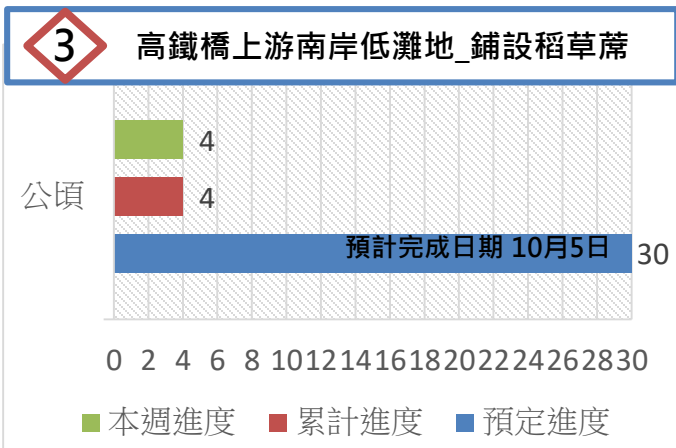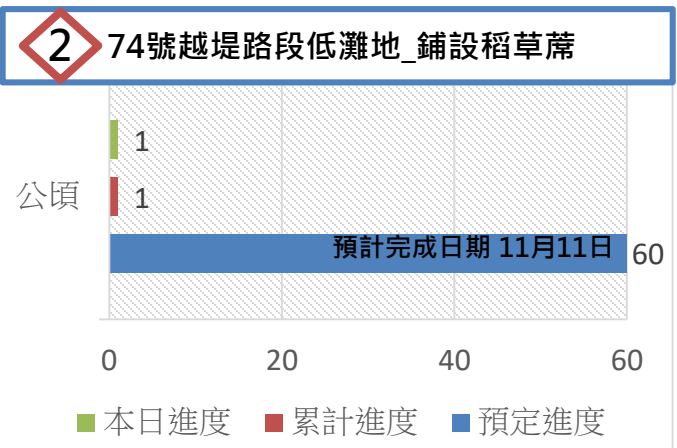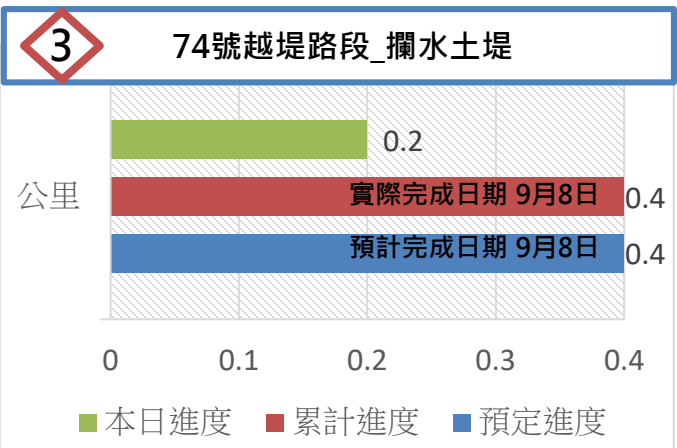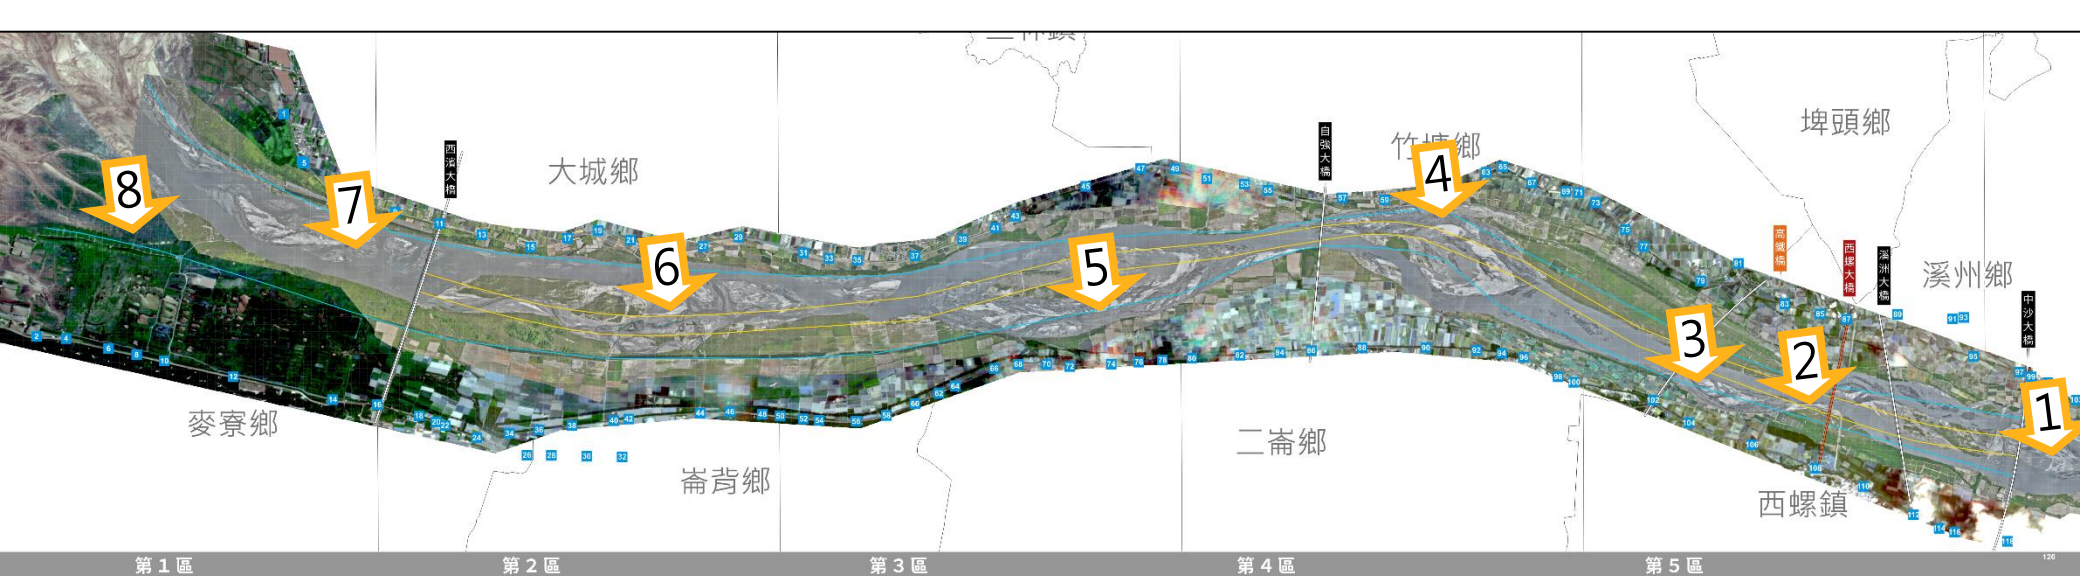

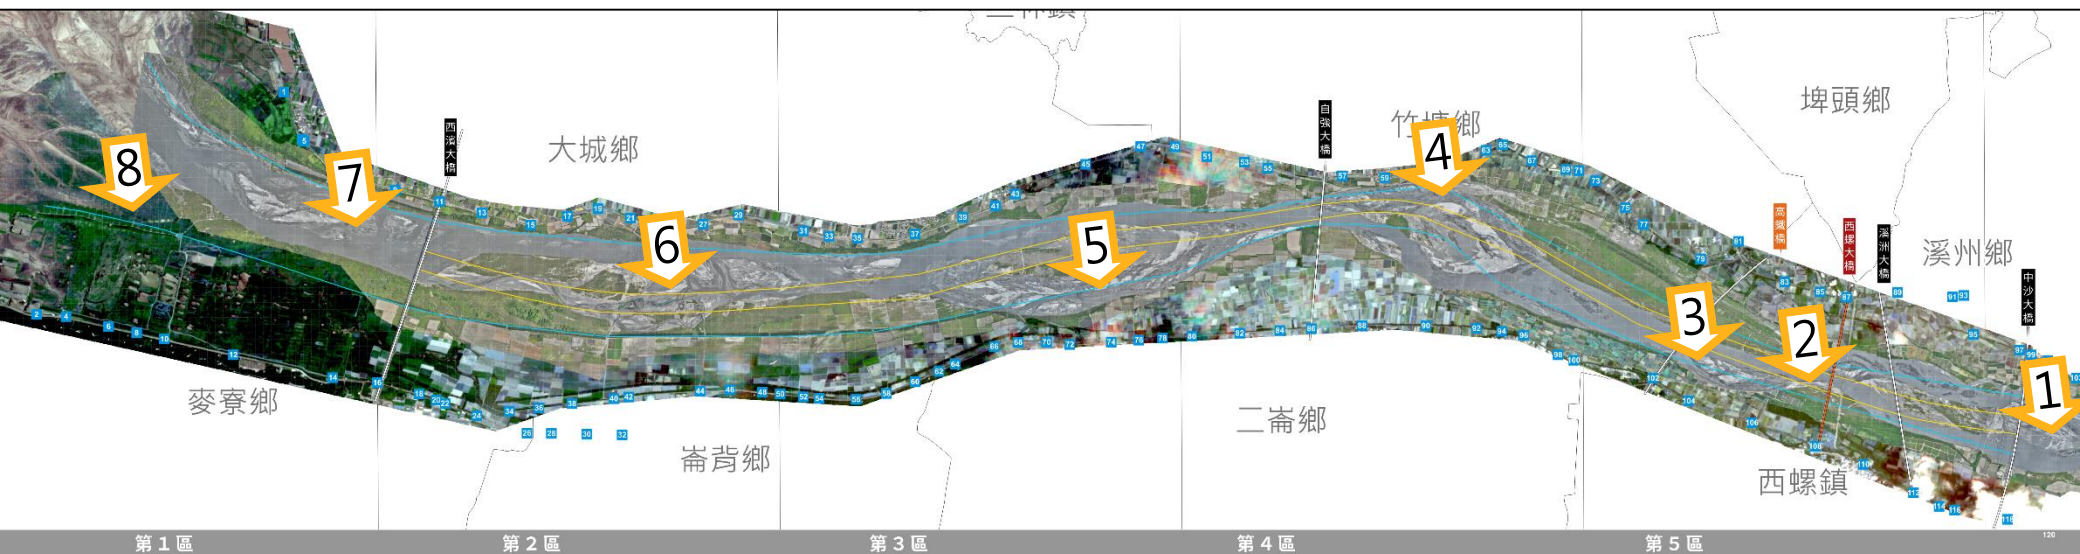

114年8月18日 PLANT 衛星空拍

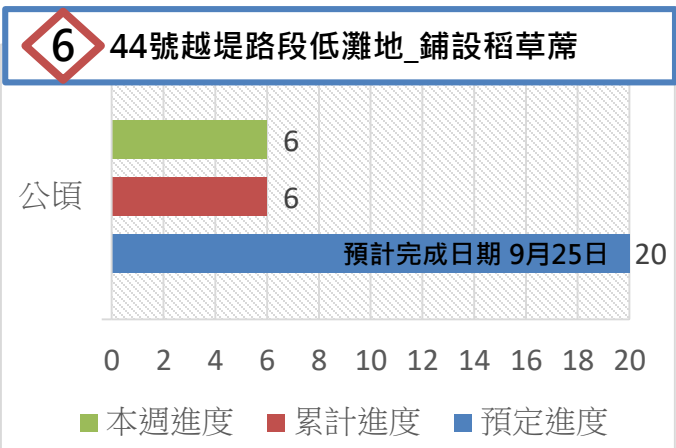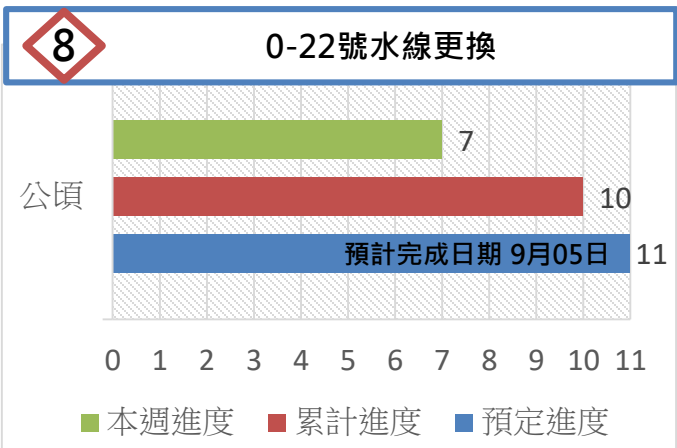



各區 空拍現況

第一區 7號越堤路段 上下游



第二區 40號越堤路段 上游



第三區 跨河電塔 下游



第四區 自強大橋 上下游



第五區 西螺大橋 上游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 78.6公頃
- 達成率 : 26.2%



水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : 170 公頃
- 達成率 : 42.5 %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.5公里
- 達成率 : 37.5%



防洪植栽


- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 3.2公里
- 達成率 : 80 %



綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 357 公頃
- 達成率 : 142.8%



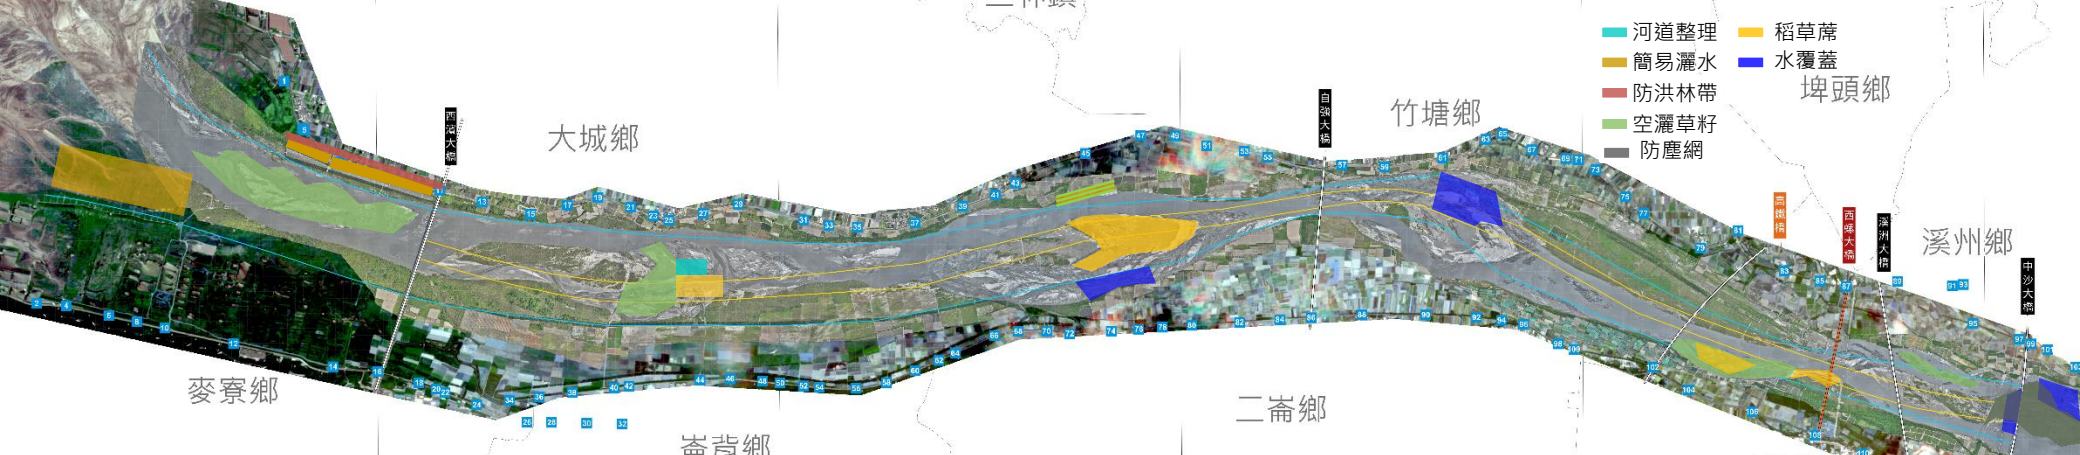

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
		1) 74號越堤路段_蓄水池30公頃	1)61號越堤路段_蓄水池60公頃	1) 中沙大橋上游_蓄水池50公頃 2) 中沙大橋下游_蓄水池30公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理1.5公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱大橋下游_空灑草籽80公頃	1) 44號越堤路段_空灑草籽60公頃			1) 中沙大橋上游至高鐵橋上游_空灑草籽217公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 5-11號越堤_防洪林帶2公里		1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃 2) 5-11號越堤_簡易灑水設施9.6公頃 3) 0-22號水線更換11公頃	1) 44號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆14公頃	1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃 2) 74號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆8公頃		1)西螺大橋下游南岸低灘地_鋪設稻草蓆6公頃 2)高鐵大橋上游南岸低灘地鋪設稻草蓆12公頃 3)中沙大橋上游河中低灘地鋪設防塵網2公頃
