

# 濁水溪揚塵抑制1081209~1081215周報表


➔ 崙背大庄培厚作業

➔ 溪州大橋上游平舖防塵網

各區緊急應變作為



## 本周施作項目及位置

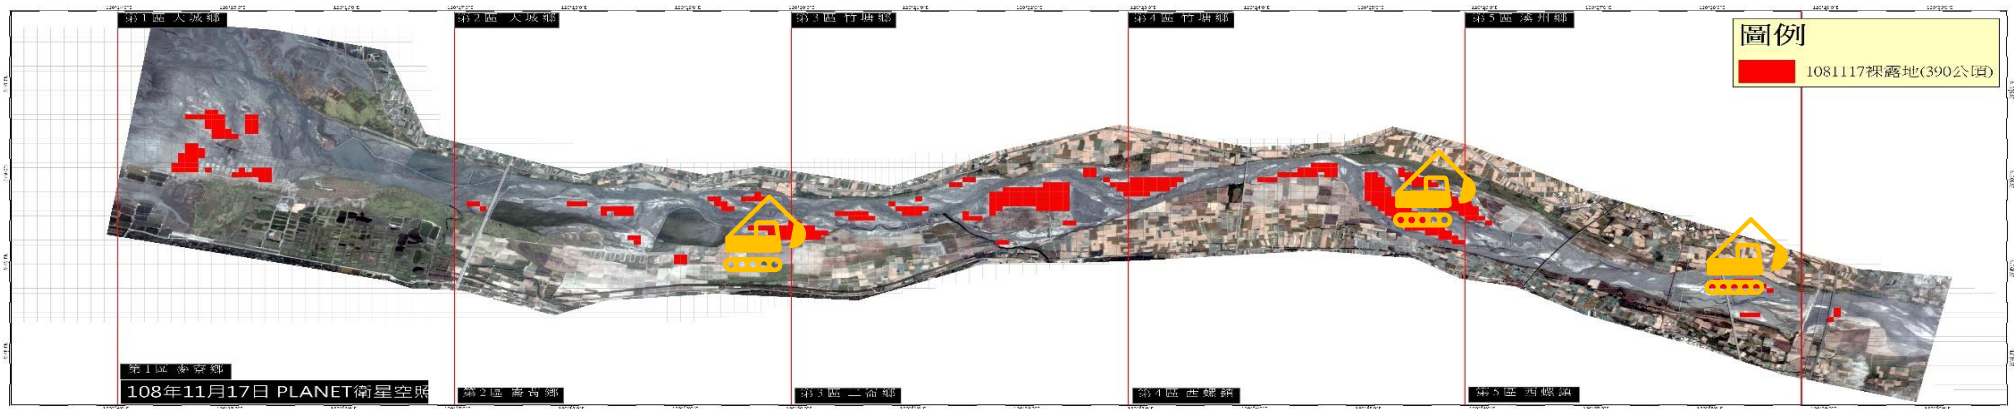

區域	施工位置	施工內容	目前進度
二	崙背大庄	培厚	14.2萬方
五	溪州大橋	平鋪防塵網	8.3公頃

# 108年度改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		108年度												實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)			50%											562公頃
		187%													
	河道整 理 (2.5KM)			50%											2300公尺
	92%														
	河道疏濬及去 化土砂 (405萬方)(視 實際情形檢 討)			50%											164.62萬方
	40.6														
防災應 變	其他覆 蓋(500 公頃)					40%								468.82公頃	
		93.8													
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)						10%							137.5公頃	
		275%													
		防洪林帶 及行道樹 (15公里)					100%								25公里
167%															



# 各區空拍現況(更新至1208)

第一區

蓄水池塘施作完畢



第二區

蓄水池塘施作完畢



第三區

防塵網鋪設完畢



第四區


蓄水池塘施作完畢



第五區

蓄水池塘施作完畢



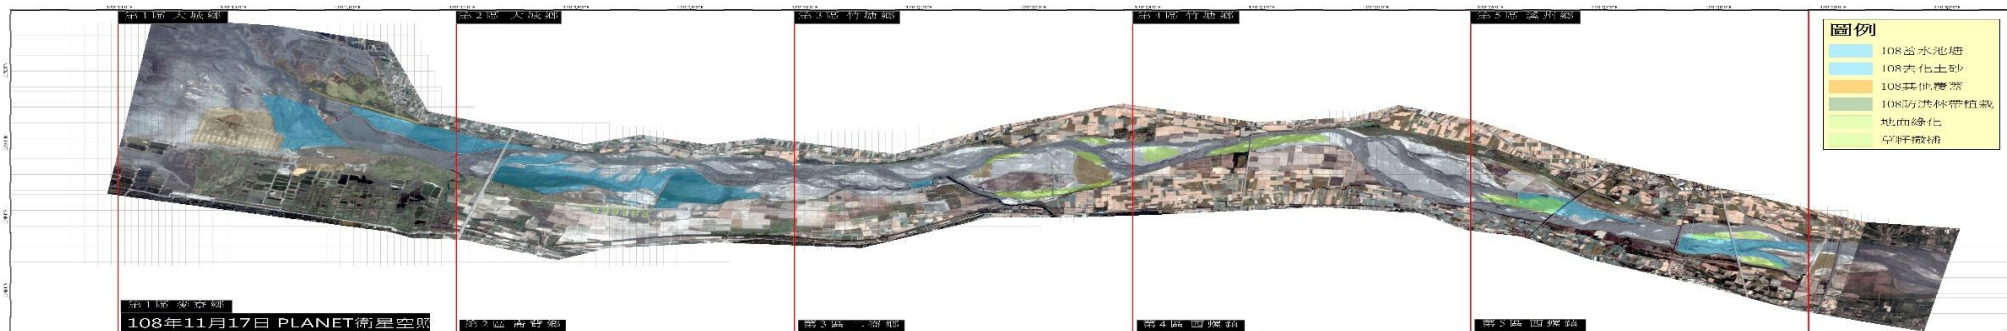

第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)	140	蓄水池塘(公頃)	192	蓄水池塘(公頃)	10	蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)	180
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
北岸林帶植栽(公里)	6	防洪植栽(公里)	7.2	草籽撒播(公頃)	61	草籽撒播(公頃)	10	防洪植栽(公里)	11.8
大沙丘植栽(公里)	1.5	綠覆蓋(公頃)	4					草籽撒播(公頃)	61
疏濬填池綠覆(公頃)	2.5								
大沙丘綠覆(公頃)	2								
林帶植栽(公頃)	4.2								
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	68.62	去化土砂(萬方)	14	去化土砂(萬方)	82	三仙膠(公頃)	26.1	三仙膠(公頃)	53.9
大沙丘水線(公頃)	20	河道整理(M)	300	河道整理(M)	2000			灑水系統(公頃)	7.5
200公頃灑水系統(公頃)	200	灑水系統(公頃)	18	平鋪防塵網	35			便道鋪設級配(公頃)	0.5
		牡蠣殼鋪灑(公頃)	11.91	便道鋪設級配	0.2			平鋪防塵網(公頃)	19.3
三仙膠(公頃)	2	三仙膠(公頃)	20	三仙膠(公頃)	6.23				
稻草鋪設(公頃)	0.4								
疏濬填池鋪設稻草(公頃)	2.5								
便道鋪設級配(公頃)	2.3								
平鋪防塵網(公頃)	1.3								
直立式防塵網(公頃)	8								
三仙膠(公頃)	47.68								
牡蠣殼鋪灑(公頃)	11.21								
碎石級配(公頃)	7.12								
其他覆蓋總計	302.51	其他覆蓋總計	49.91	其他覆蓋總計	35.2	其他覆蓋總計	26.1	其他覆蓋總計	81.2
