



揚塵防治 週報表

114/06/09~114/06/15



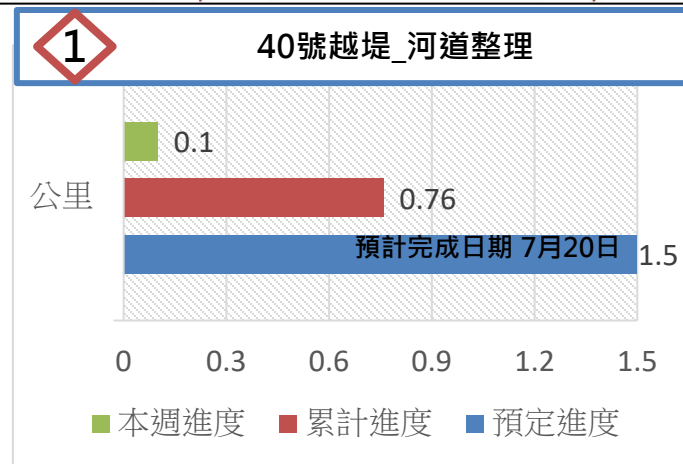

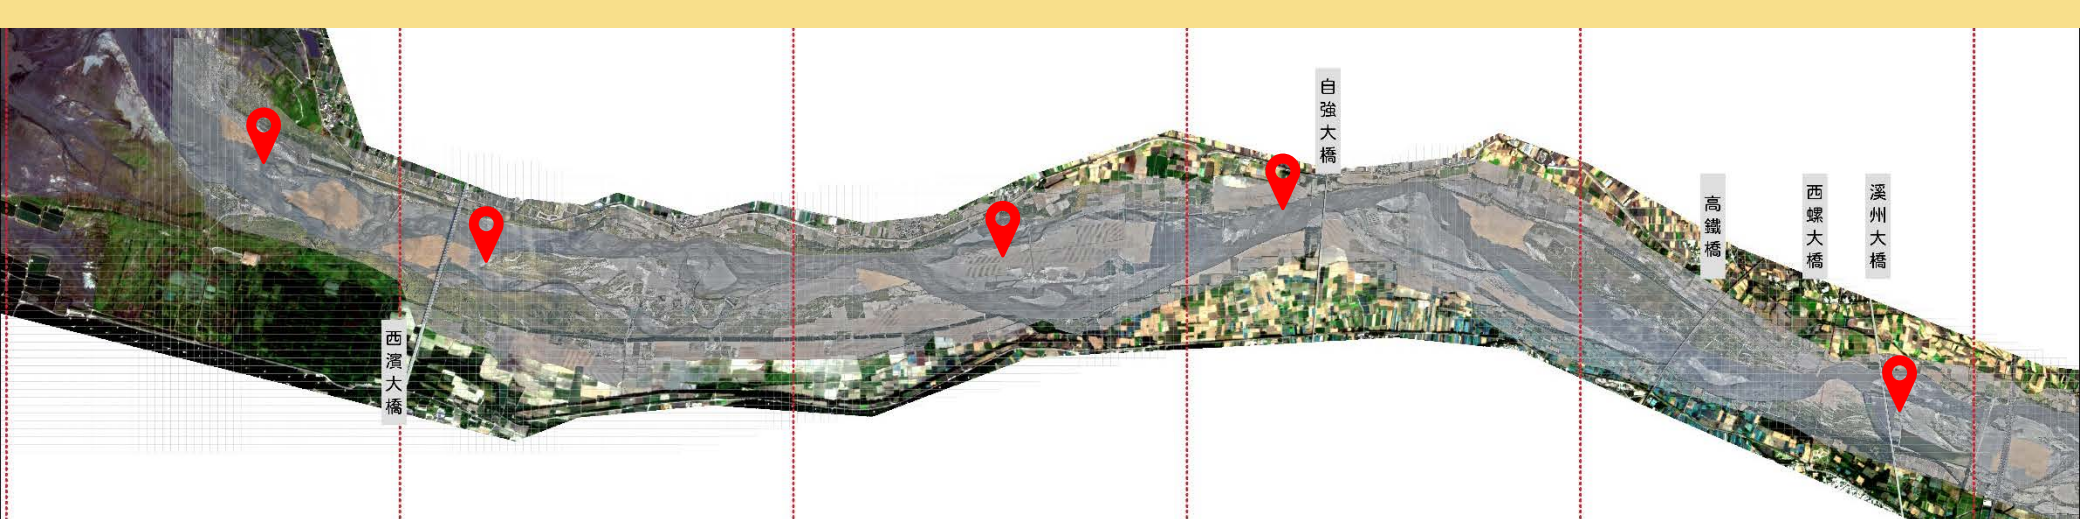

各區 空拍現況

第一區

7號越堤路 下游



第二區

西濱大橋 上游



第三區

大義崙排水 上游



第四區

自強大橋 下游



第五區

溪州大橋 上下游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 16 公頃
- 達成率 : 5.3 %



水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : - 公頃
- 達成率 : - %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0.76公里
- 達成率 : 19%



防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.2 公里
- 達成率 : 30%




綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : -公頃
- 達成率 : -%

營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	8	12	4	4	4	32
	實際完成	8	12.23	4	-	-	24.23

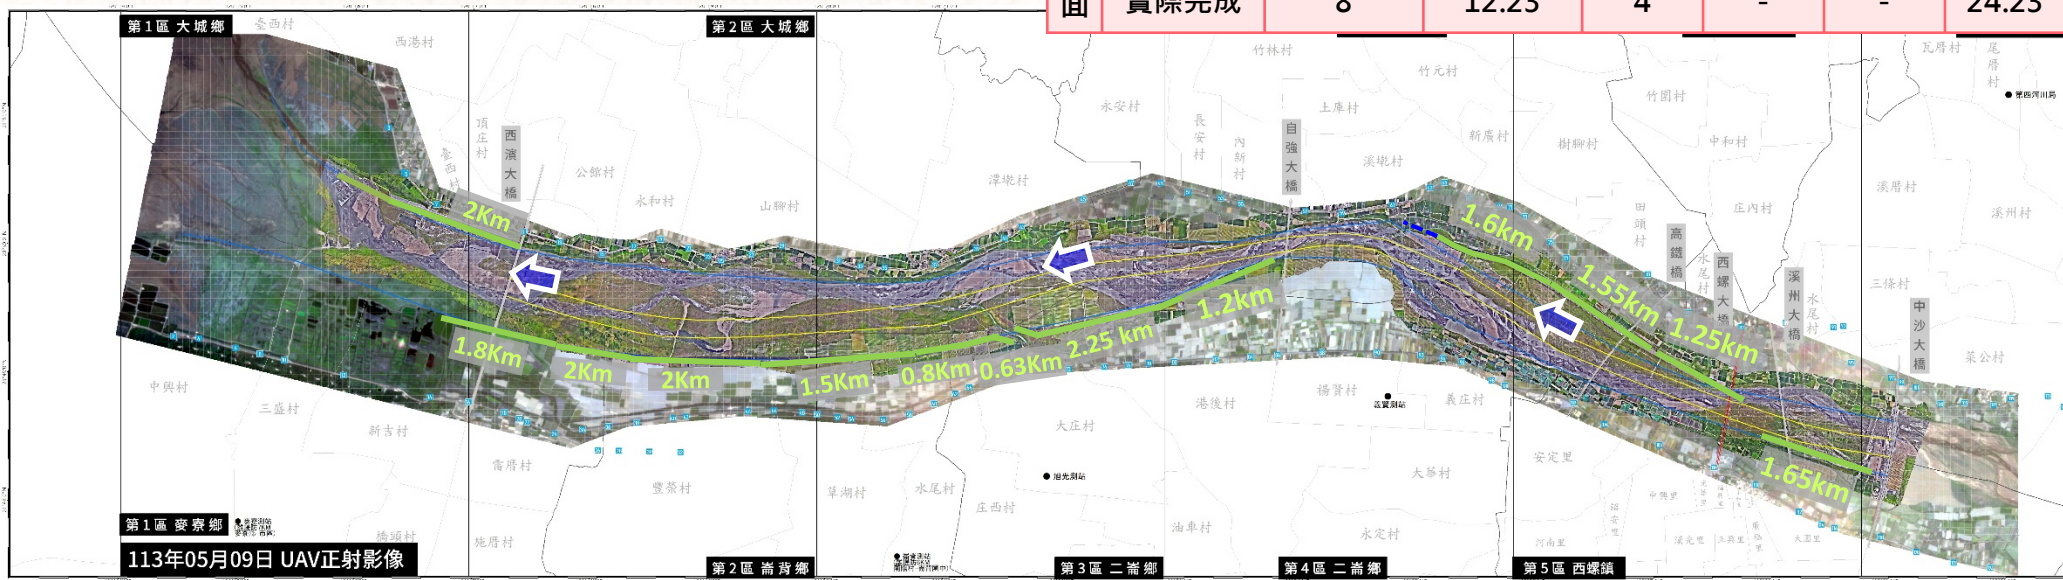

114年營造複式斷面進度管控 ➤ 執行進度說明：

KPI / 4.0 公里


已完成 / 0 公里

達成率 / 0 %

- 本(114)年度計畫相關案件目前正陸續辦理公告上網與簽約作業中，本分署將擬訂於6月中召開工作會議初步討論複式斷面規劃與施作期程，並俟契約簽訂完成後，依進度辦理複式斷面營造作業。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	2	-	-	7.3

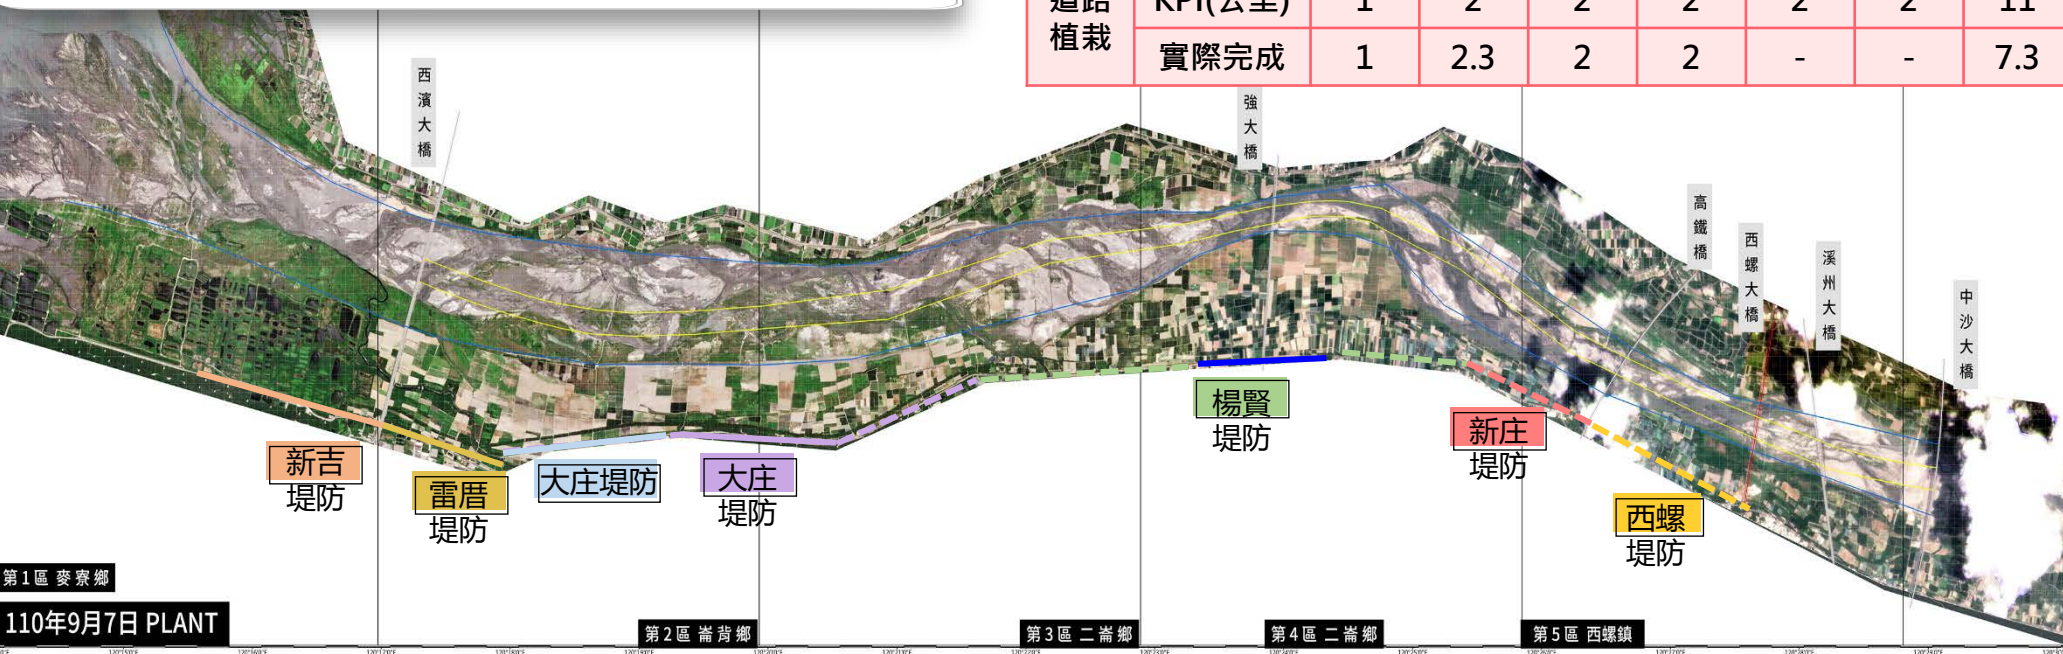


• 114年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0公里
達成率/ 0 %

- 本(114)年度計畫相關案件目前正陸續辦理公告上網與簽約作業中，本分署將擬訂於6月中召開工作會議初步討論水防道路植栽與施作期程，並俟契約簽訂完成後，依進度辦理水防道路植栽作業。



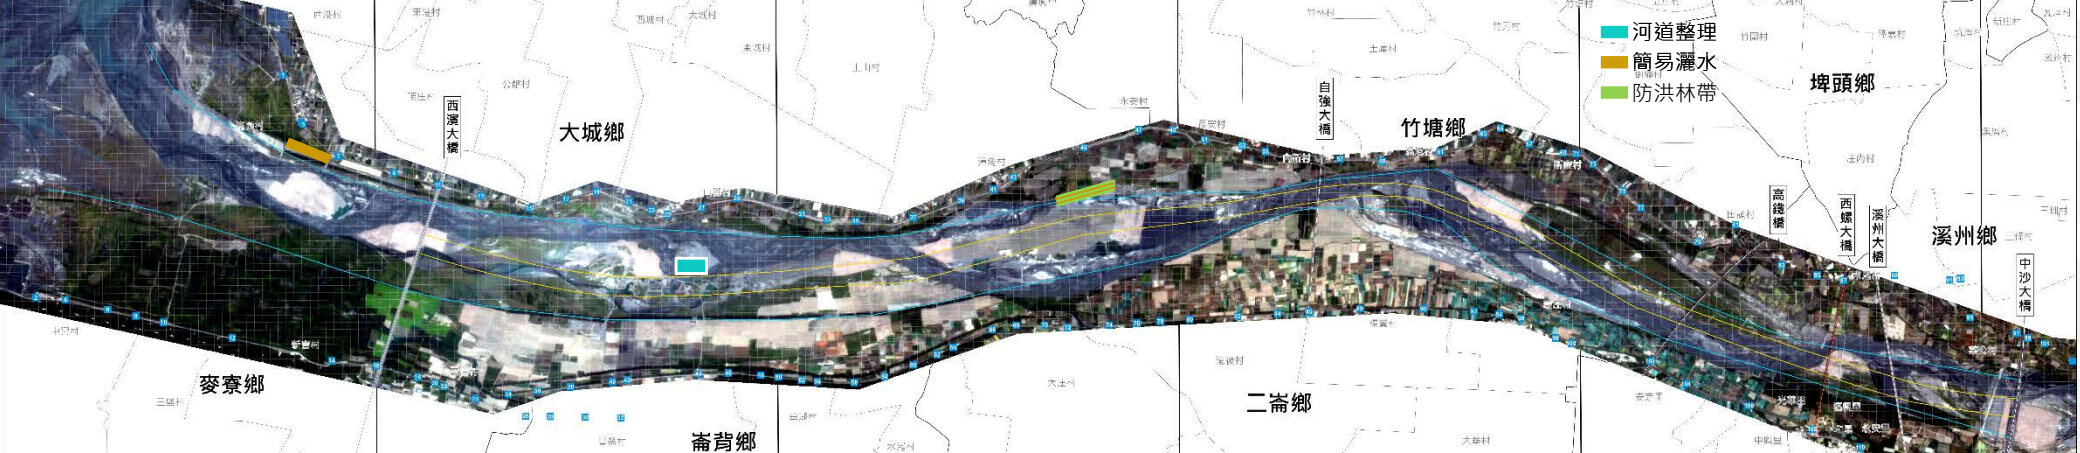

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理0.76公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
		1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃		1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃		
