



揚塵防治 週報表

114/06/16~114/06/22



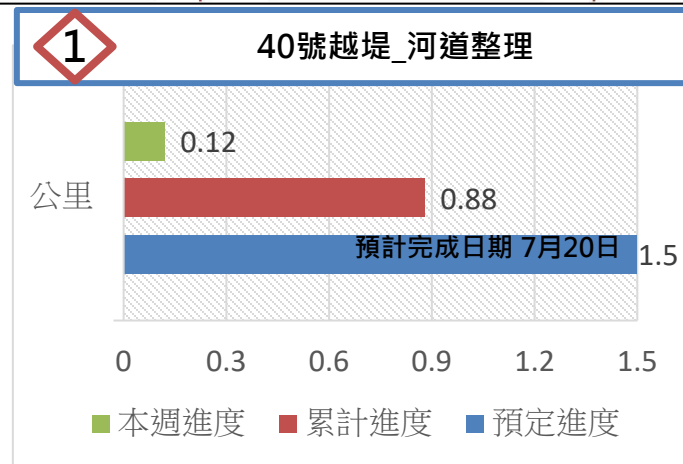

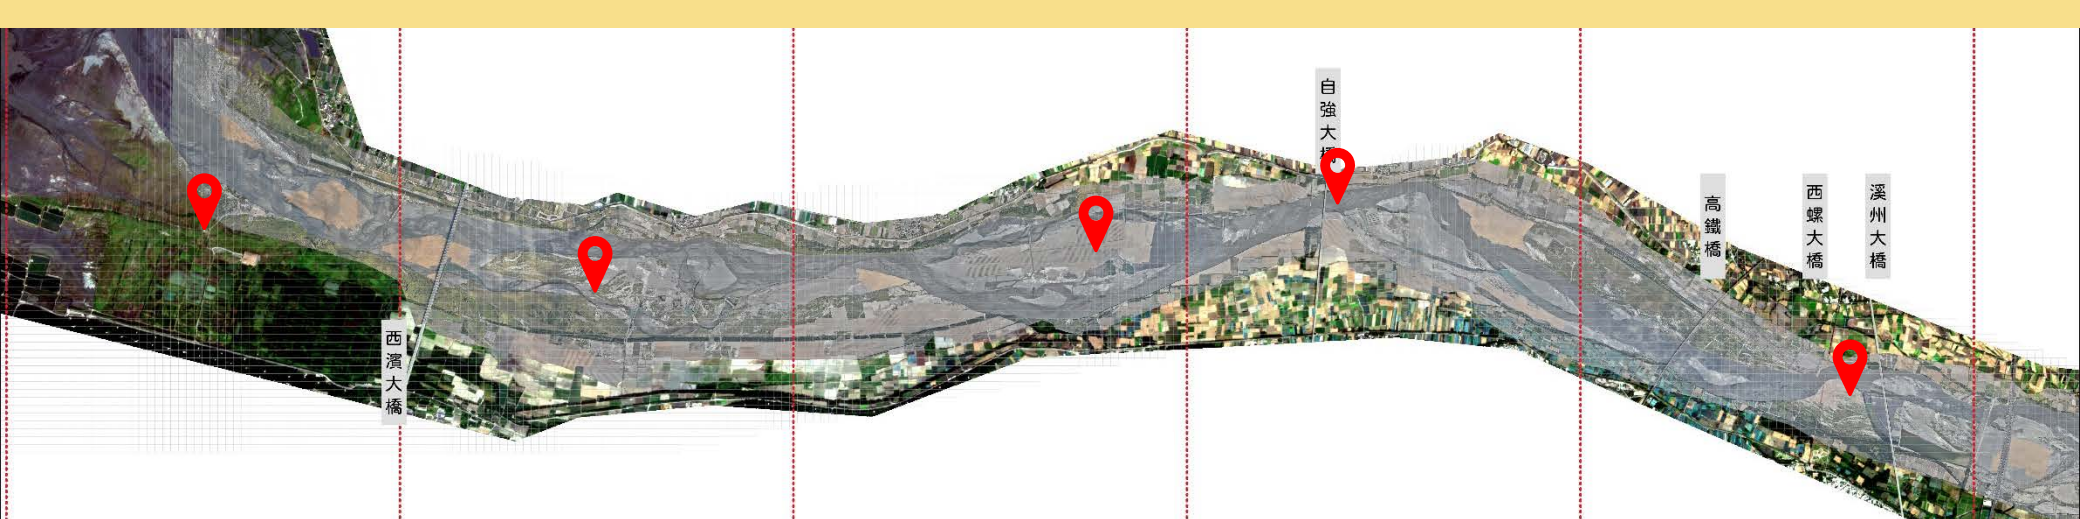

各區 空拍現況

第一區

麥寮出海口 下游



第二區

40號越堤路段 下游



第三區

跨河電塔 下游



第四區

自強大橋 上游



第五區

西螺大橋 上游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值：300 公頃
- 已完成：16 公頃
- 達成率：5.3 %



水覆蓋

- 目標值：400公頃
- 已完成：- 公頃
- 達成率：- %



河道整理

- 目標值：4 公里
- 已完成：0.88公里
- 達成率：22%



防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：1.2 公里
- 達成率：30%




綠覆蓋

- 目標值：250 公頃
- 已完成：-公頃
- 達成率：-%

營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	8	12	4	4	4	32
	實際完成	8	12.23	4	1.2	-	25.43

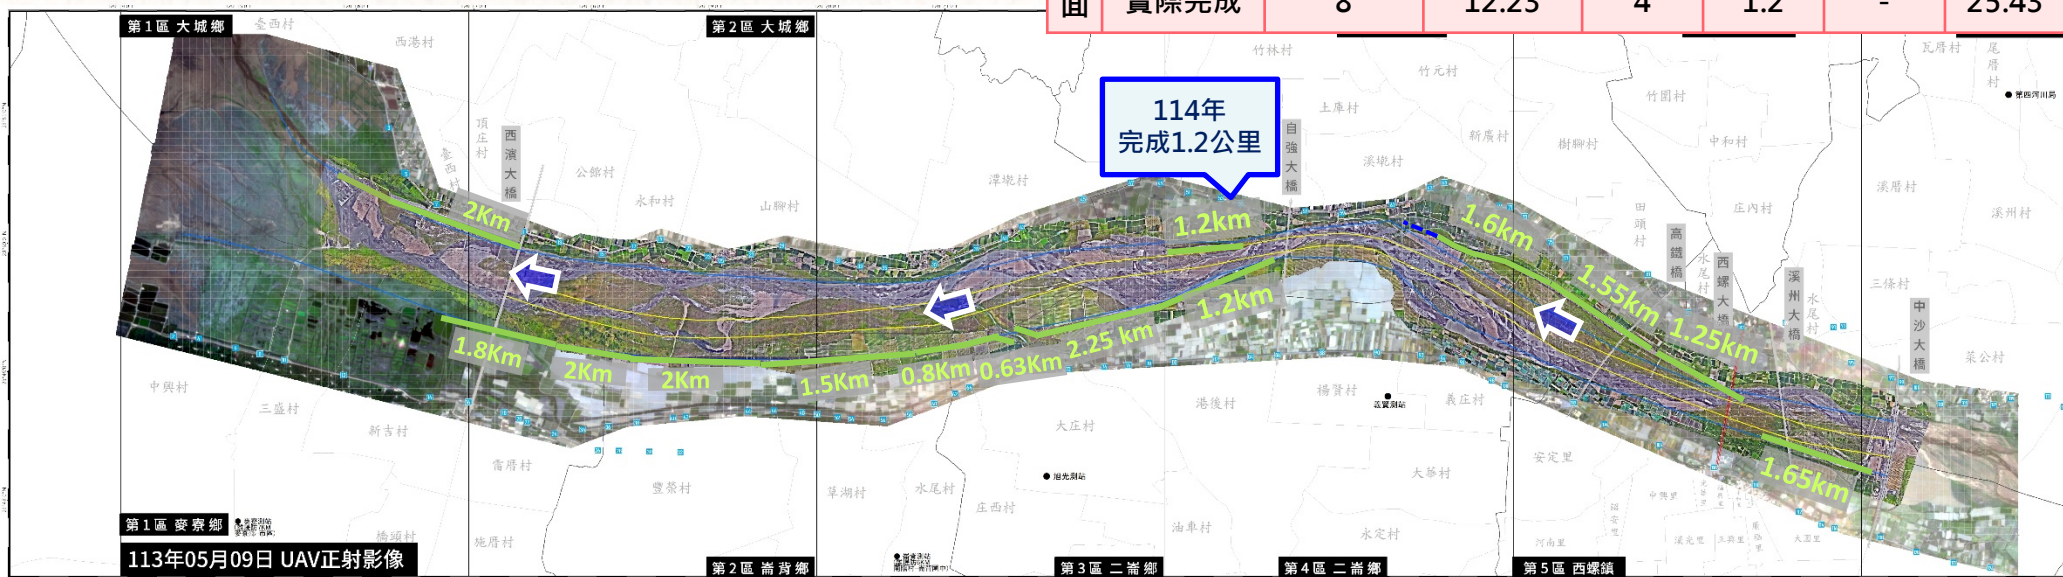

114年營造複式斷面進度管控

KPI / 4.0 公里

已完成 / 1.2 公里


達成率 / 30 %

執行進度說明：

1. 第三區：43-45號越堤路段(規劃1.2公里)，
已於06月08日已完成1.2公里新植造林。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	2	-	-	7.3

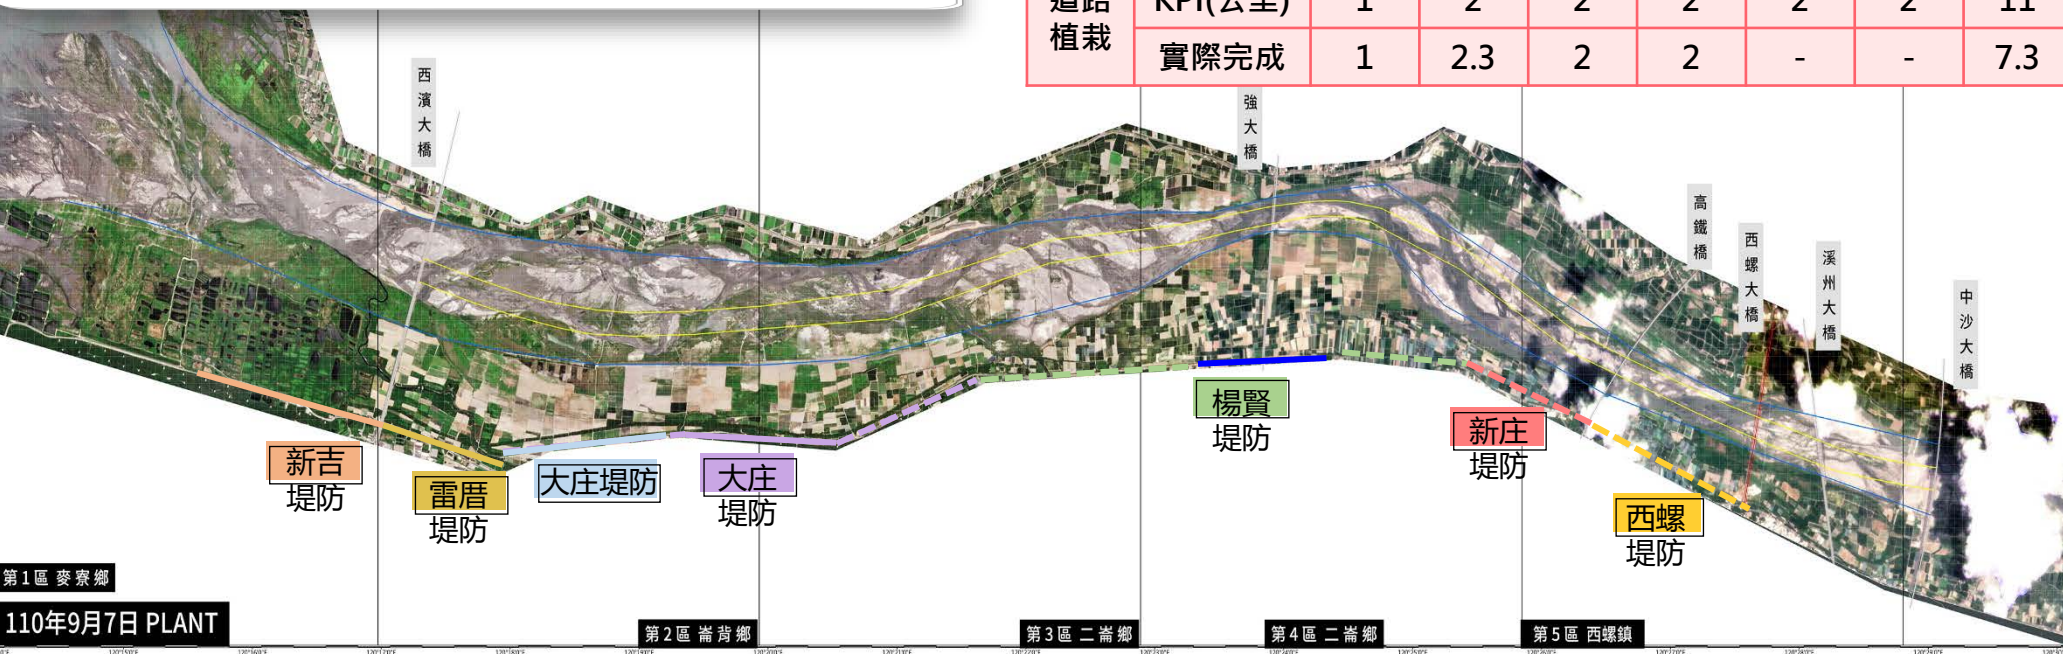


• 114年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0公里
達成率/ 0 %

- 本(114)年度計畫相關案件已陸續辦理決標與簽約作業中，將訂於7月底召開工作會議研商水防道路植栽與施作期程。



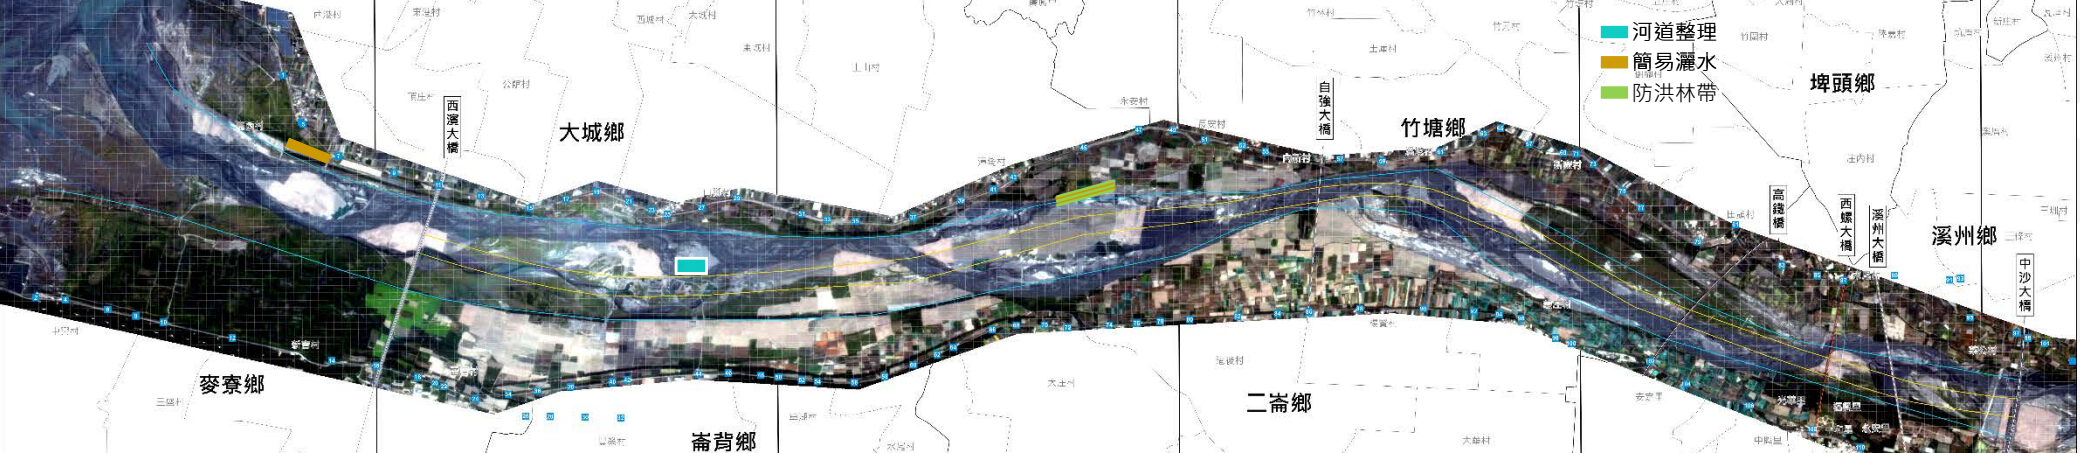

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理0.88公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
		1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃		1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃		
