


揚塵防治 週報表


113/05/13~113/05/19



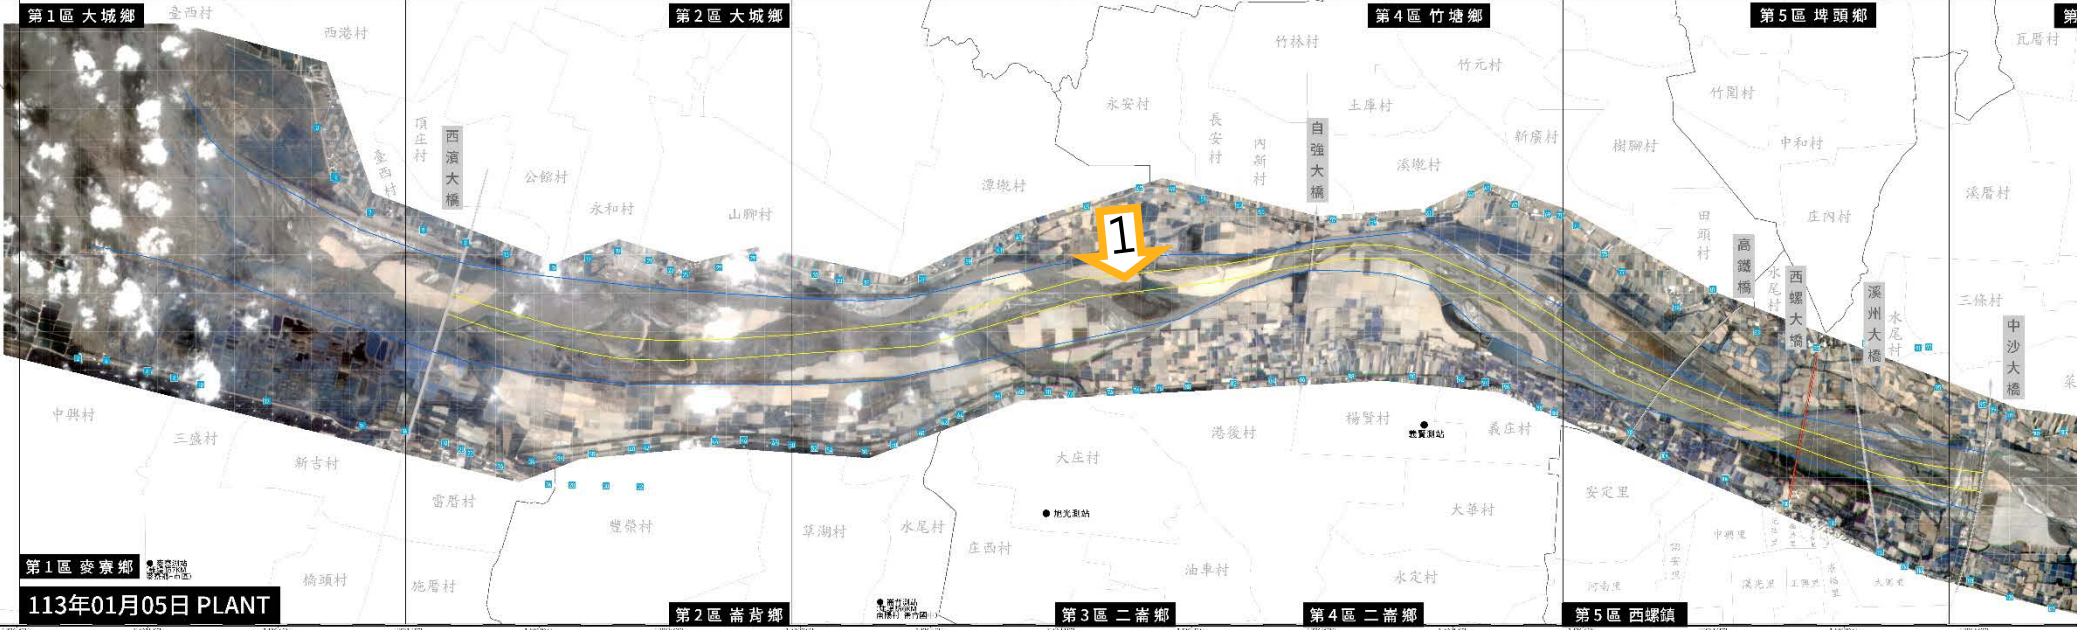

1

跨河電塔北岸_河道整理



0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

■ 本日進度 ■ 累計進度 ■ 預定進度



各區 空拍現況


第一區

西濱大橋下游



第二區

40號越堤路 下游

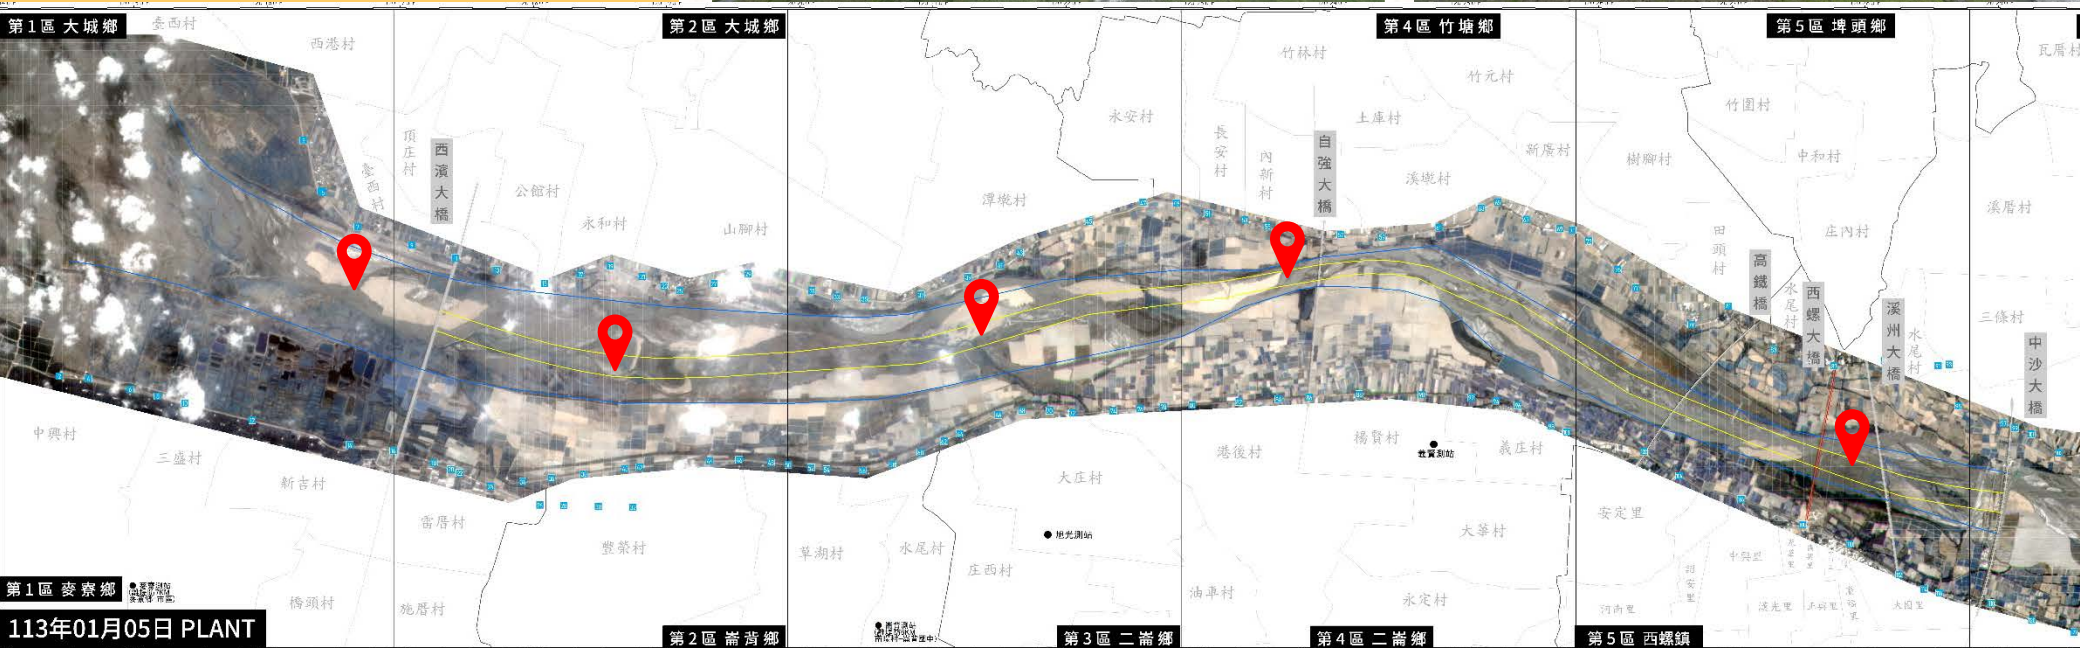

第三區

跨河電塔 上下游



第四區

自強大橋 下游



第五區

溪州大橋 下游



113年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0.54 公里
- 達成率 : 13.5%



防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0 公里
- 達成率 : 0%



綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 0公頃
- 達成率 : 0 %

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23



113年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 0 km


達成率 / 0 %

執行進度說明：

- 本(113)年度計畫執行自113年5月開始，相關案件目前正陸續辦理公告上網與簽約作業中，本分署將擬訂於5月底召開工作會議初步討論複式斷面規劃與施作期程，並俟契約簽訂完成後，依進度辦理複式斷面營造作業。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

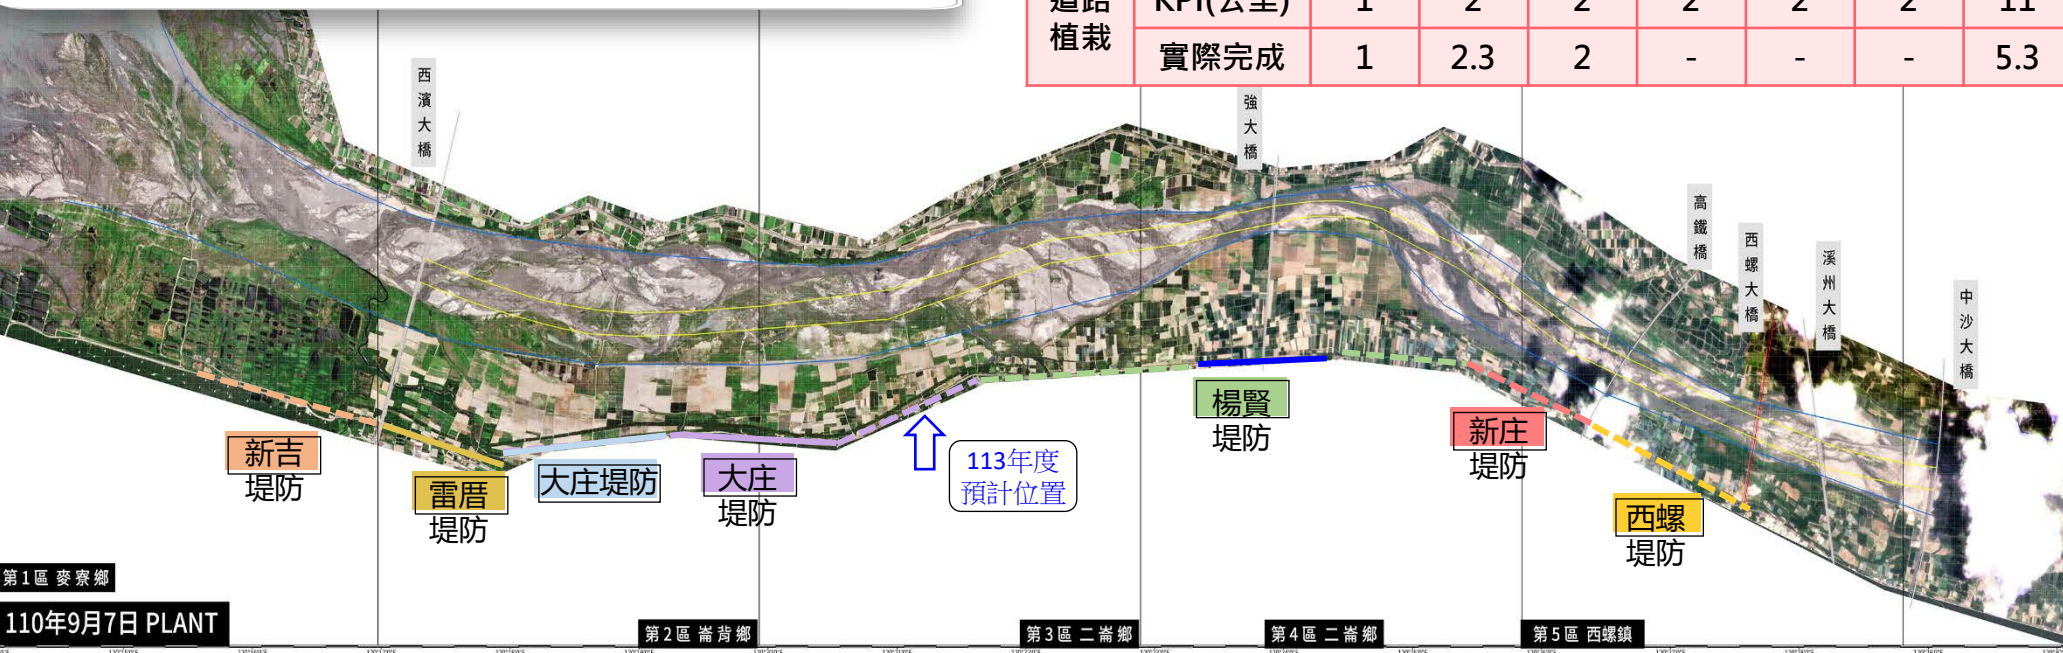

113年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0公里

達成率/ 0 %

本(113)年度計畫執行自113年5月開始，相關案件目前正陸續辦理公告上網與簽約作業中，本分署將擬訂於5月底召開工作會議討論水防道路植樹規劃與施作期程，並俟契約簽訂完成後，依進度辦理水防道路植樹作業。





水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 跨河電塔北岸_河道整理0.54公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
