

揚塵防治 週報表

113/05/20~113/05/26



各區 空拍現況

第一區

麥寮 出海口



第二區

西濱大橋上下游



第三區

跨河電塔 游



第四區

自強大橋 上下游



第五區

西螺大橋 下游



113年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0.75 公里
- 達成率 : 18.75 %



防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0 公里
- 達成率 : 0 %



綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23



113年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 0 km


達成率/ 0 %

執行進度說明：

- 本案預定於5月30日召開工作會議討論河道複式斷面規劃與施作期程，後續依工作會議決議辦理河道複式斷面作業。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

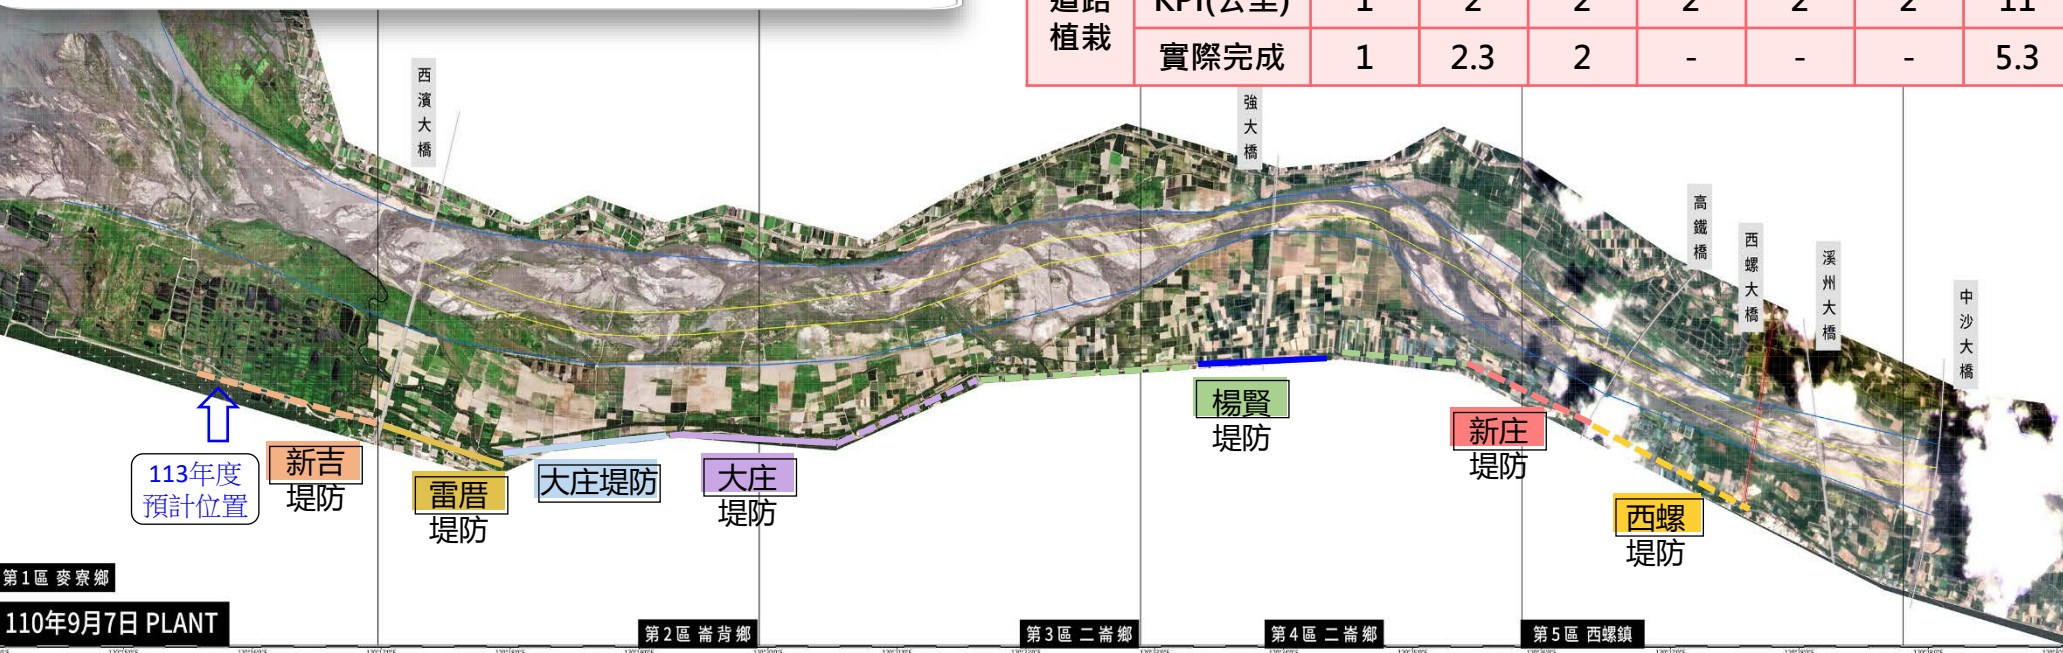

113年水防道路植栽進度管控


KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0公里

達成率/ 0 %

- 本案預定於5月30日召開工作會議討論水防道路植栽規劃與施作期程，後續依工作會議決議辦理水防道路植栽作業。



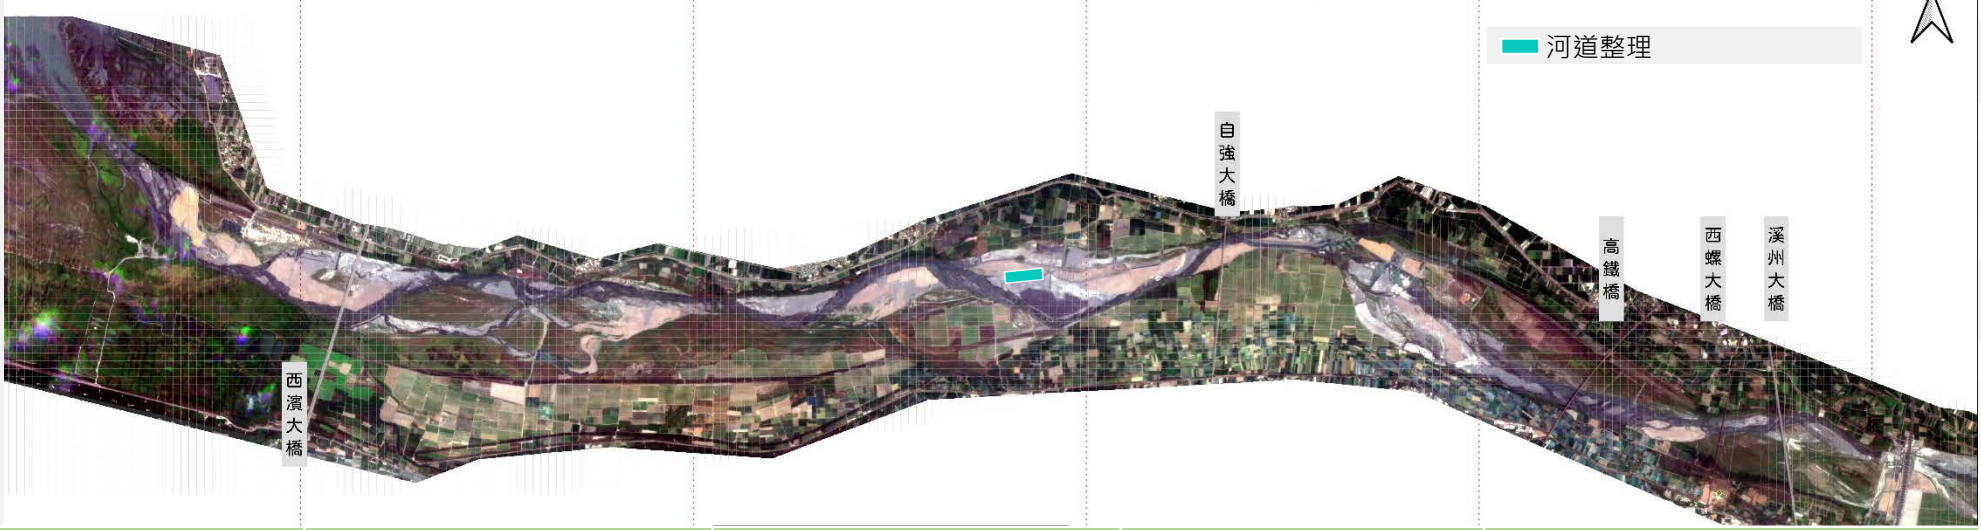

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 跨河電塔北岸_河道整理0.75公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
