


# 揚塵防治 週報表


113/05/27~113/06/02



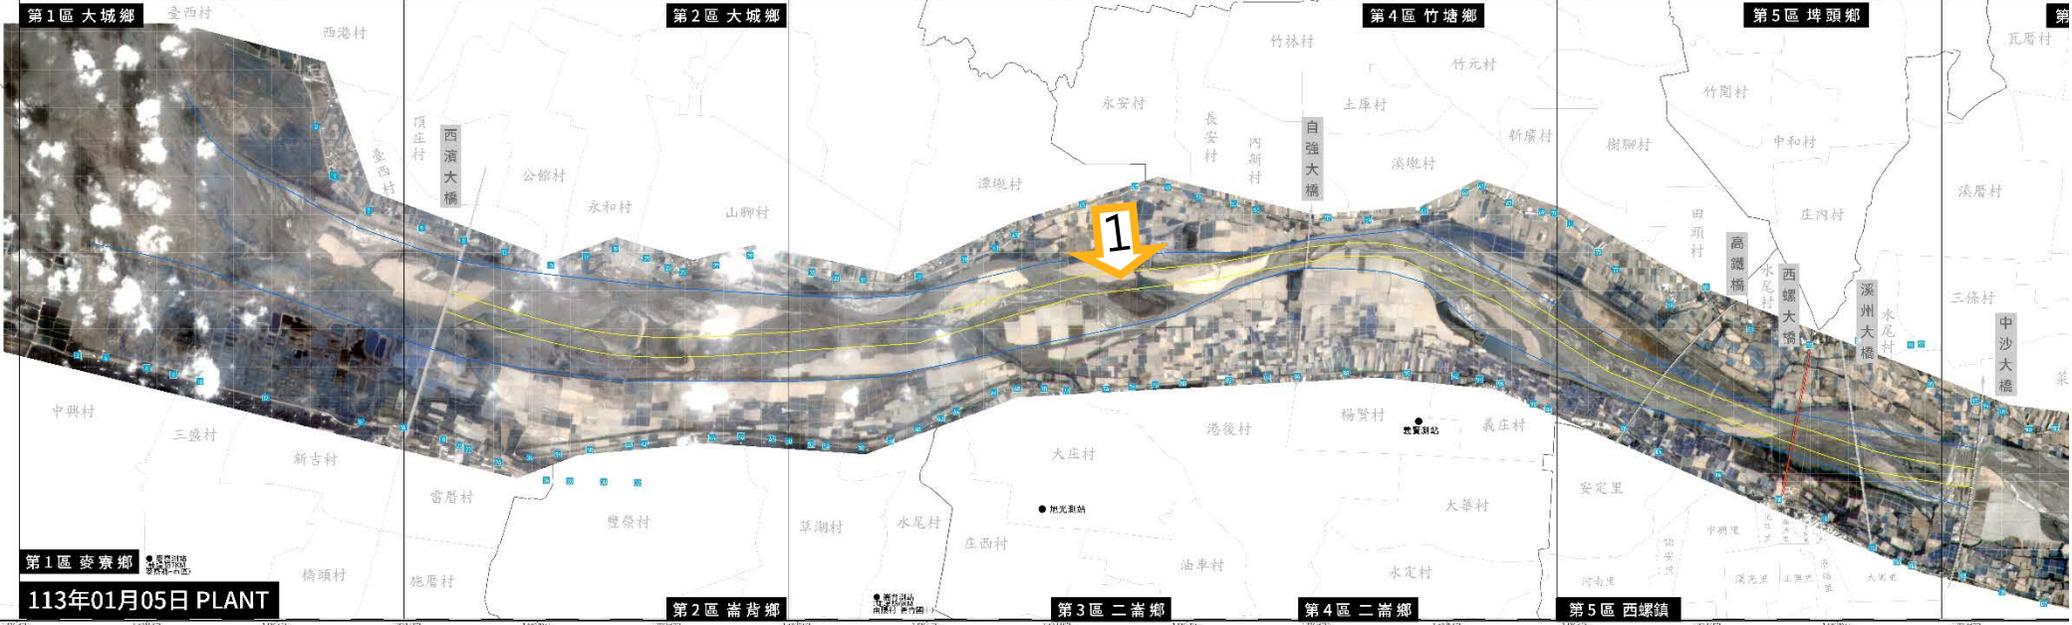

113年01月05日 PLANT

### 1 跨河電塔北岸\_河道整理

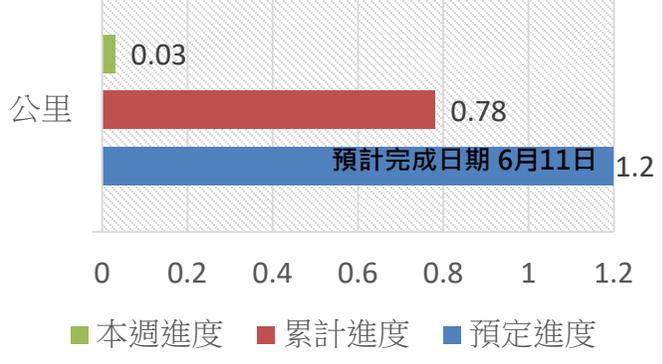



# 113年度

## 揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度



### 其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



### 水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



### 河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0.78 公里
- 達成率 : 19.5%



### 防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0 公里
- 達成率 : 0%




### 綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 0公頃
- 達成率 : 0 %

# 營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23

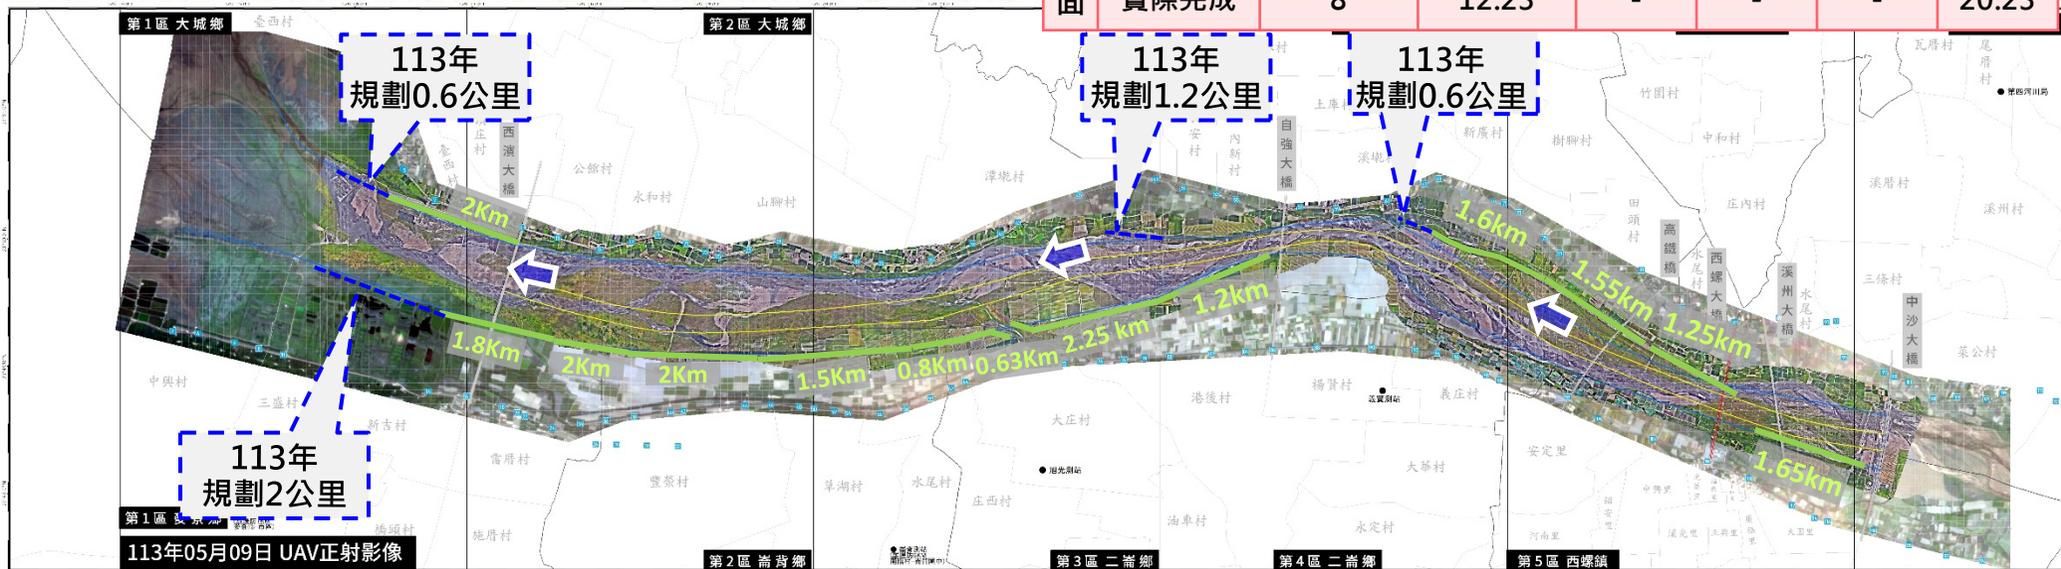

## 113年營造複式斷面進度管控

### ➤ 執行進度說明：

KPI / 4公里


已完成 / 0 km

達成率 / 0 %

- 依5月30日工作小組會議討論，考量河道主流路、河道灘地分佈現況與經費支用量能分配，本(113)年度複式斷面營造規劃於第1區西濱大橋下游南北岸、第3區電塔上游北岸與第4區高鐵橋下游北岸等處，總計初步規劃為4.4公里。
- 第3區電塔上游北岸現正辦理培厚作業中(預計於6月11日完成，完成後接續辦理造林)，餘後續規劃點位將依現況辦理複式斷面營造措施，並納入後續揚塵案件據以執行。

# 水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

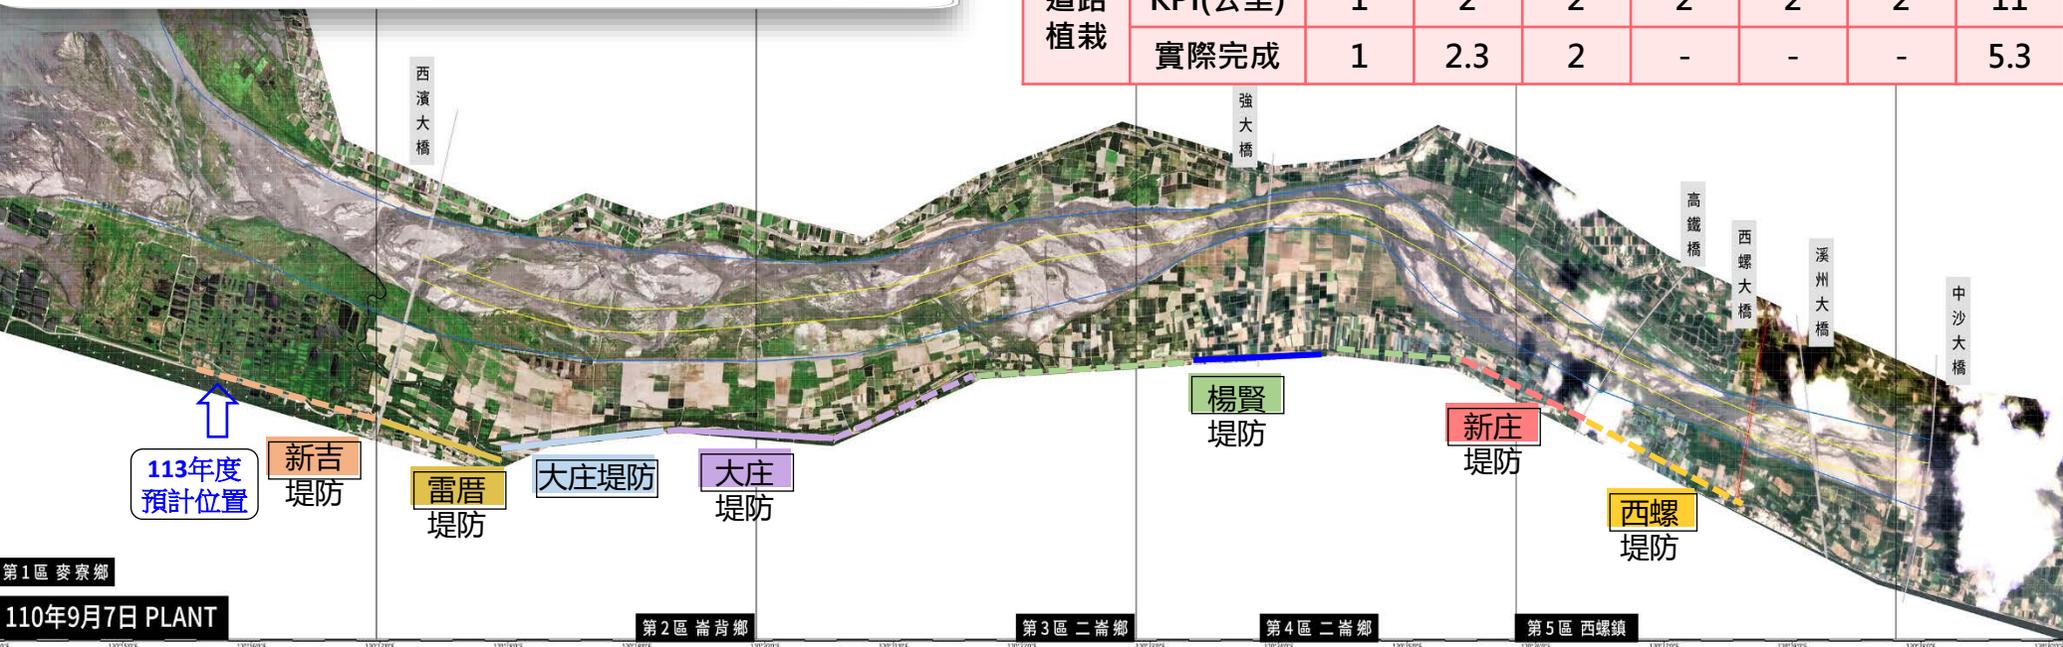

## 113年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：


已完成 / 0公里

達成率 / 0 %

- 依5月30日工作小組會議討論，考量整體水防道路營造與施做期程，本(113)年度水防道路植樹規劃於第1區許厝寮堤防，長度為2公里。
- 後續將俟揚塵案件決標後(預計為6月底)，據以辦理執行。(規劃完成時間為10月底前)



揚塵抑制措施

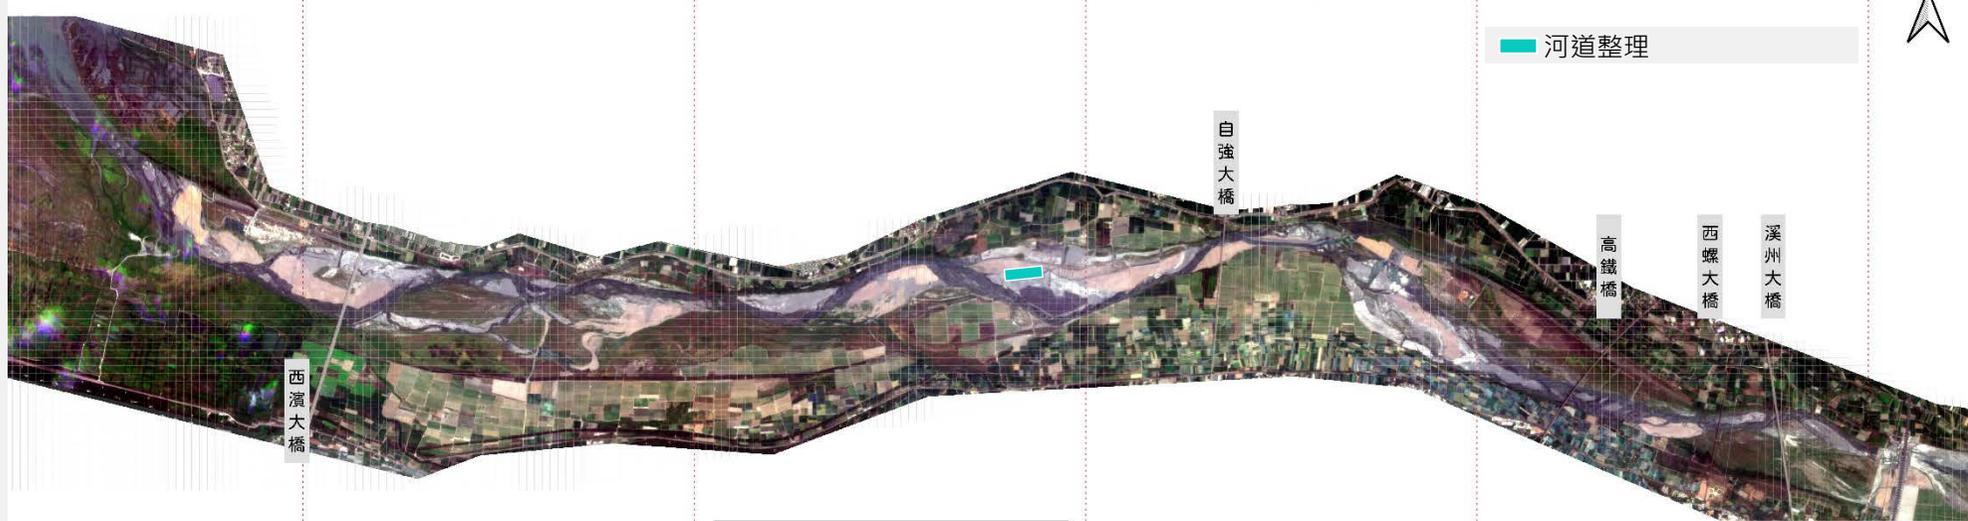

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
綠覆蓋	綠覆蓋	1) 跨河電塔北岸_河道整理0.78公里	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
