

揚塵防治 週報表

113/06/03~113/06/09



各區 空拍現況


第一區

7號越堤路 上下游



第二區

西濱大橋 上下游

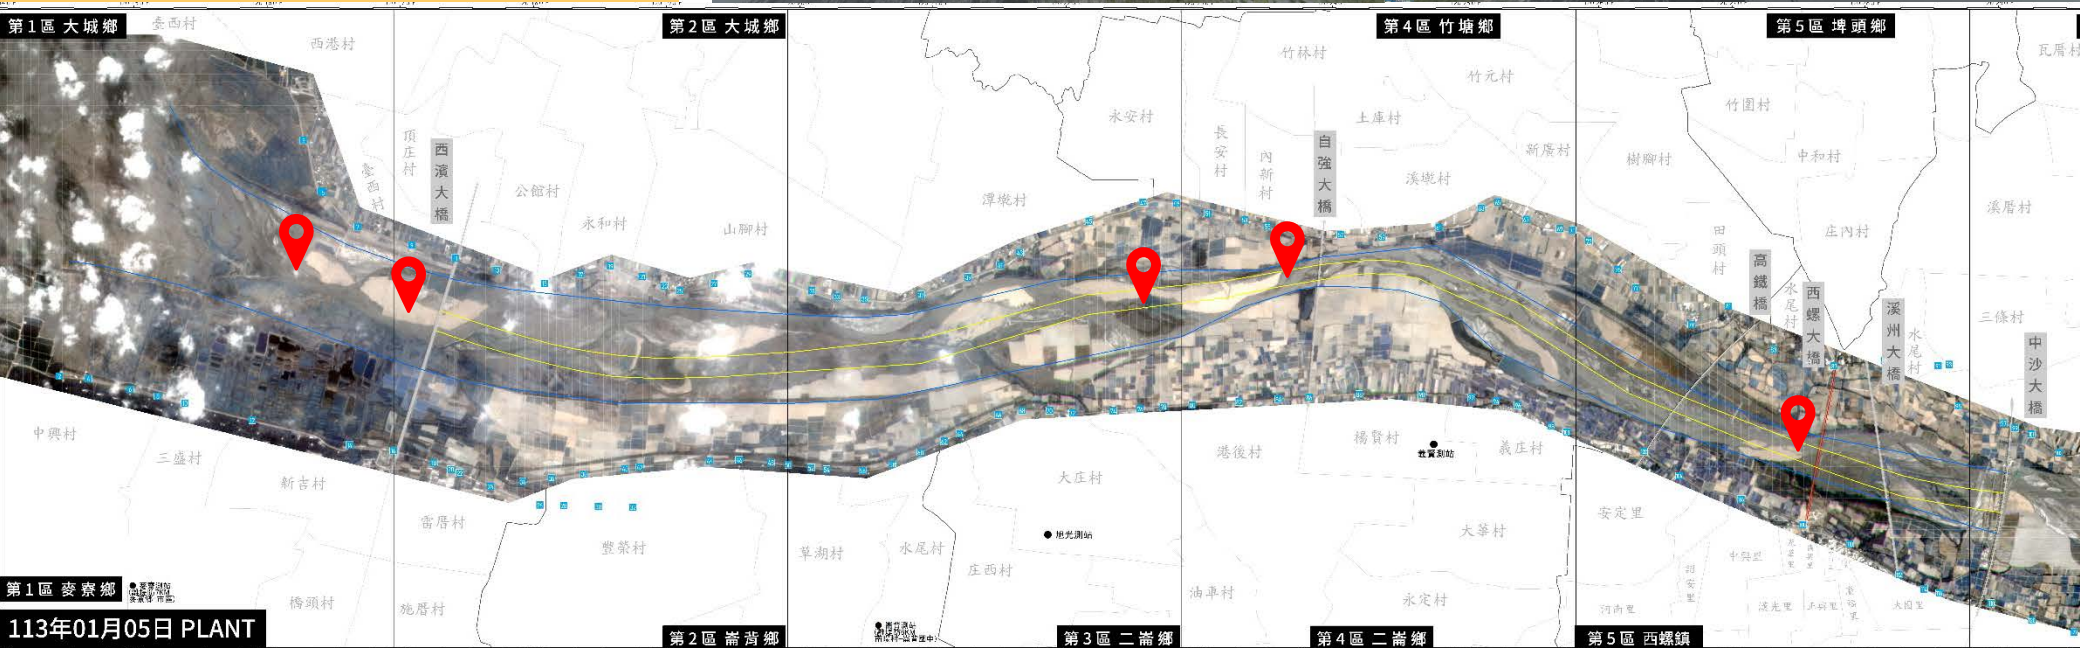

第三區

跨河電塔 下游



第四區

自強大橋 下游



第五區

西螺大橋 上下游



113年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0.96 公里
- 達成率 : 24%



防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0 公里
- 達成率 : 0%




綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 0公頃
- 達成率 : 0 %

營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
	實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23

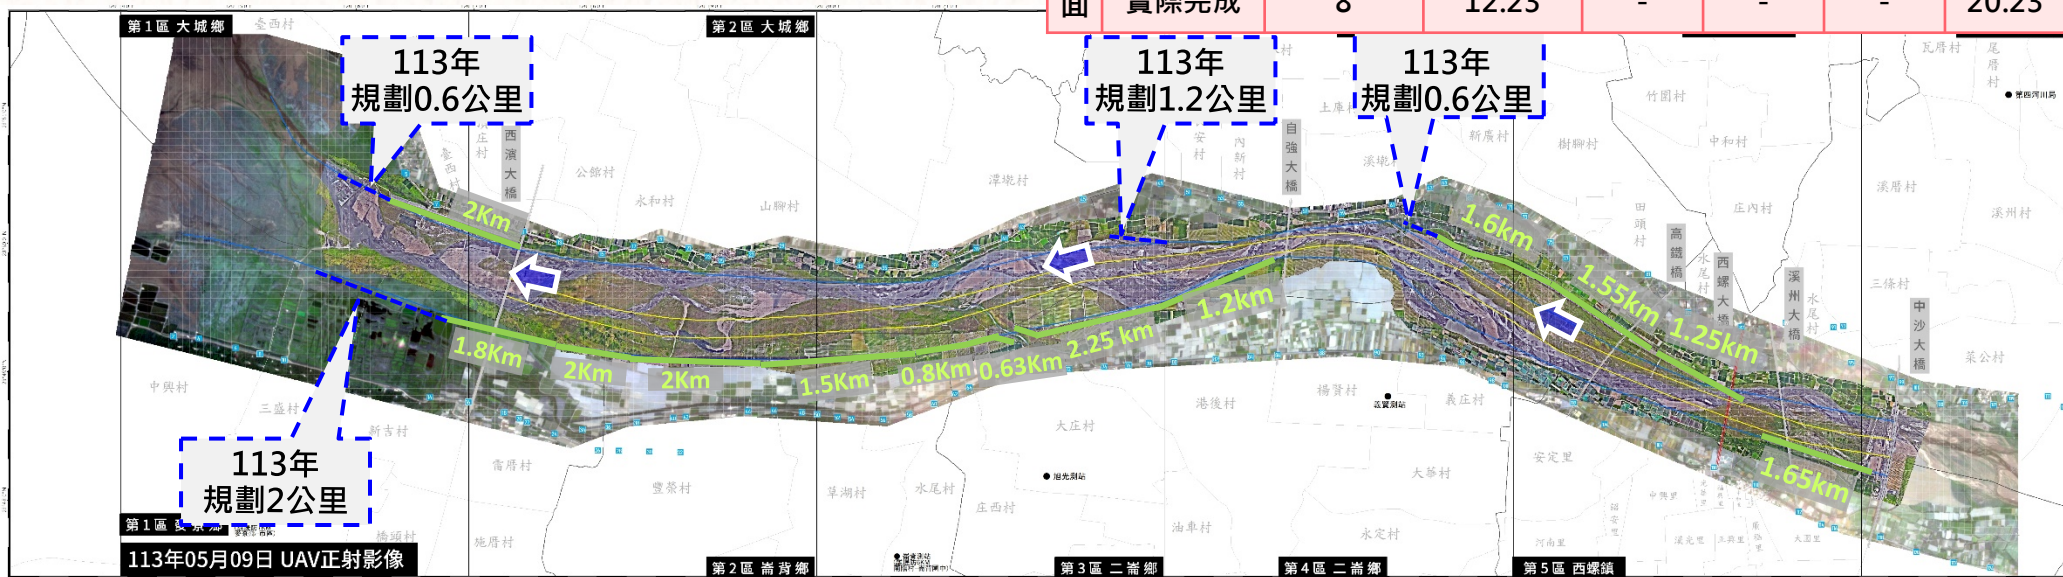

113年營造複式斷面進度管控 ➤ 執行進度說明：

KPI / 4公里


已完成 / 0 km

達成率/ 0 %

- 依5月30日工作小組會議討論，考量河道主流路、河道灘地分佈現況與經費支用量能分配，本(113)年度複式斷面營造規劃於第1區西濱大橋下游南北岸、第3區電塔上游北岸與第4區高鐵橋下游北岸等處，總計初步規劃為4.4公里。
- 第3區電塔上游北岸現正辦理培厚作業中(預計於6月11日完成，完成後接續辦理造林)，餘後續規劃點位將依現況辦理複式斷面營造措施，並納入後續揚塵案件據以執行。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

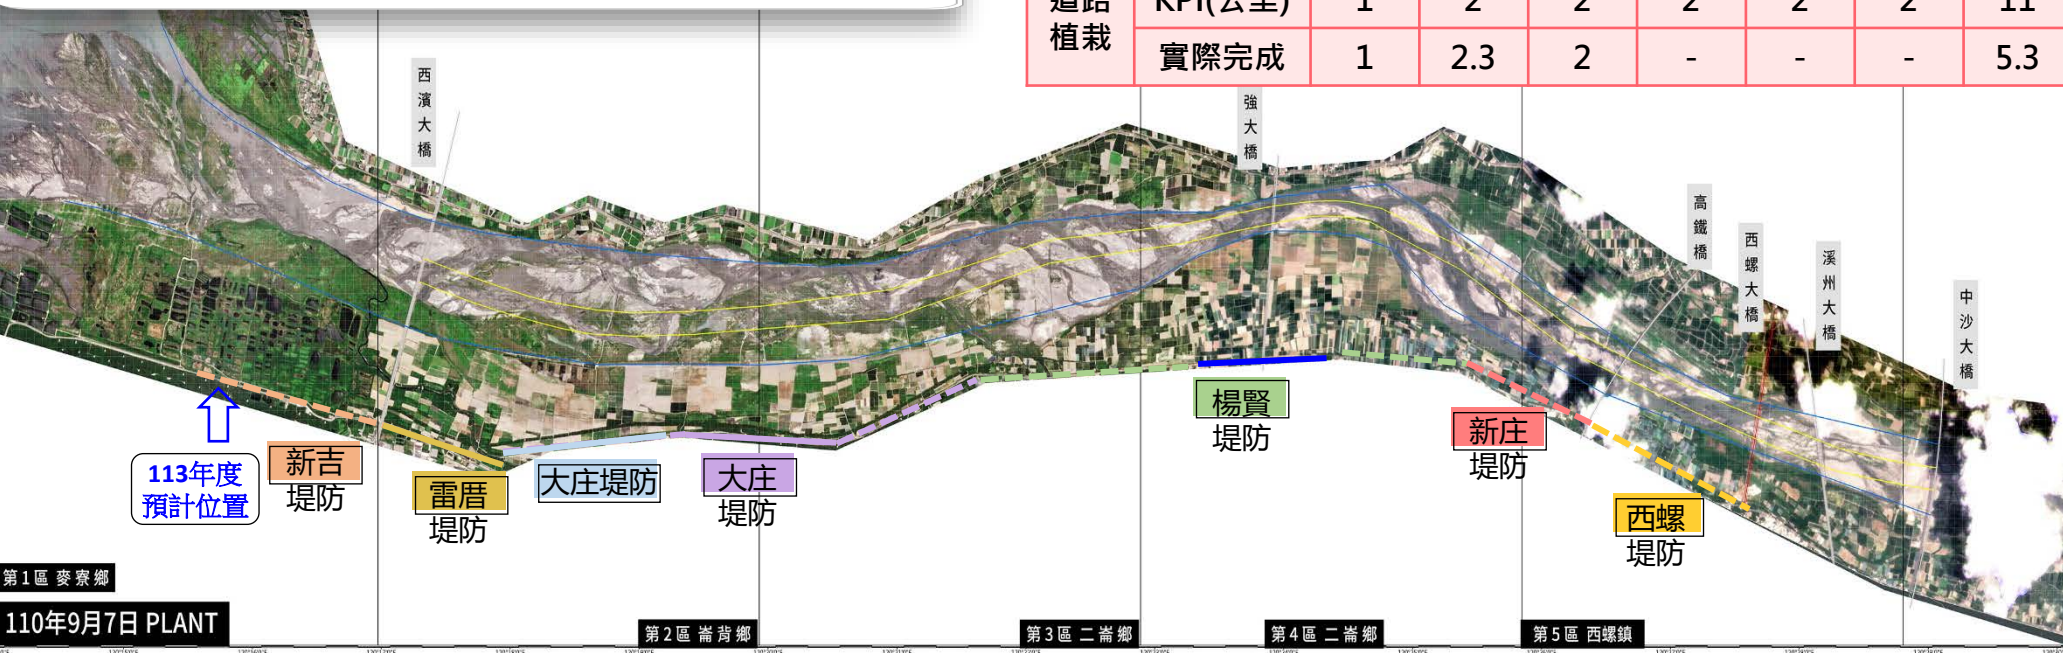

113年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0公里

達成率/ 0 %

- 依5月30日工作小組會議討論，考量整體水防道路營造與施做期程，本(113)年度水防道路植樹規劃於第1區許厝寮堤防，長度為2公里。
- 後續將俟揚塵案件決標後(預計為6月底)，據以辦理執行。(規劃完成時間為10月底前)





水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 跨河電塔北岸_河道整理0.96公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
