


揚塵防治 週報表

113/06/23~113/06/30



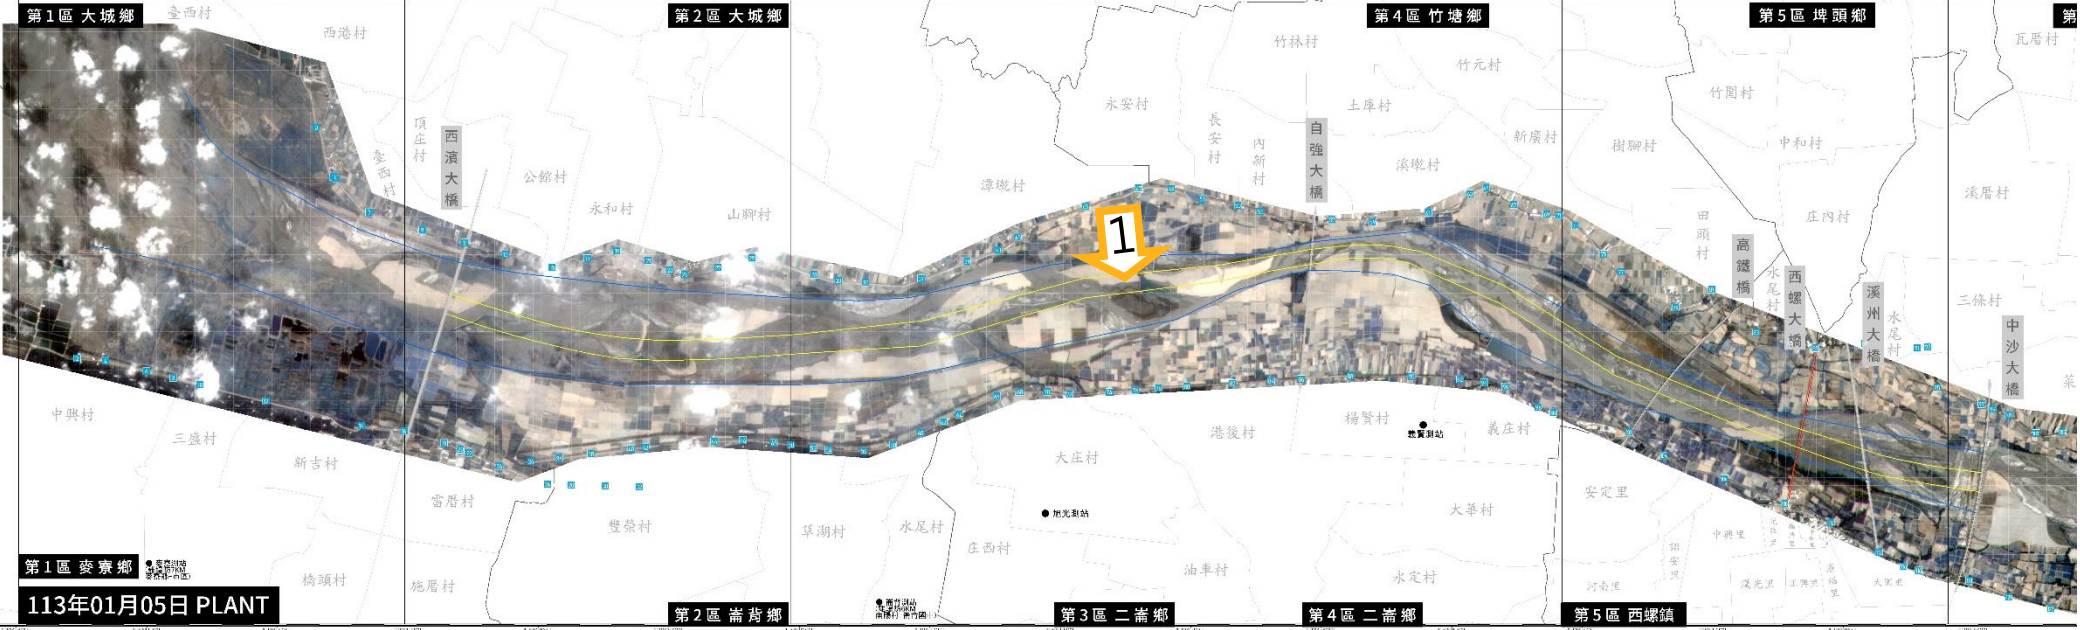

1

跨河電塔北岸_河道整理



0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

■ 本週進度 ■ 累計進度 ■ 預定進度



各區 空拍現況

第一區

麥寮 出海口

第二區

40號越堤路 下游



第三區

74號越堤路 下游

第四區

自強大橋 下游

第五區

西螺大橋 下游



113年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.2 公里
- 達成率 : 30%



防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0 公里
- 達成率 : 0%




綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 0公頃
- 達成率 : 0 %

營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
	實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23

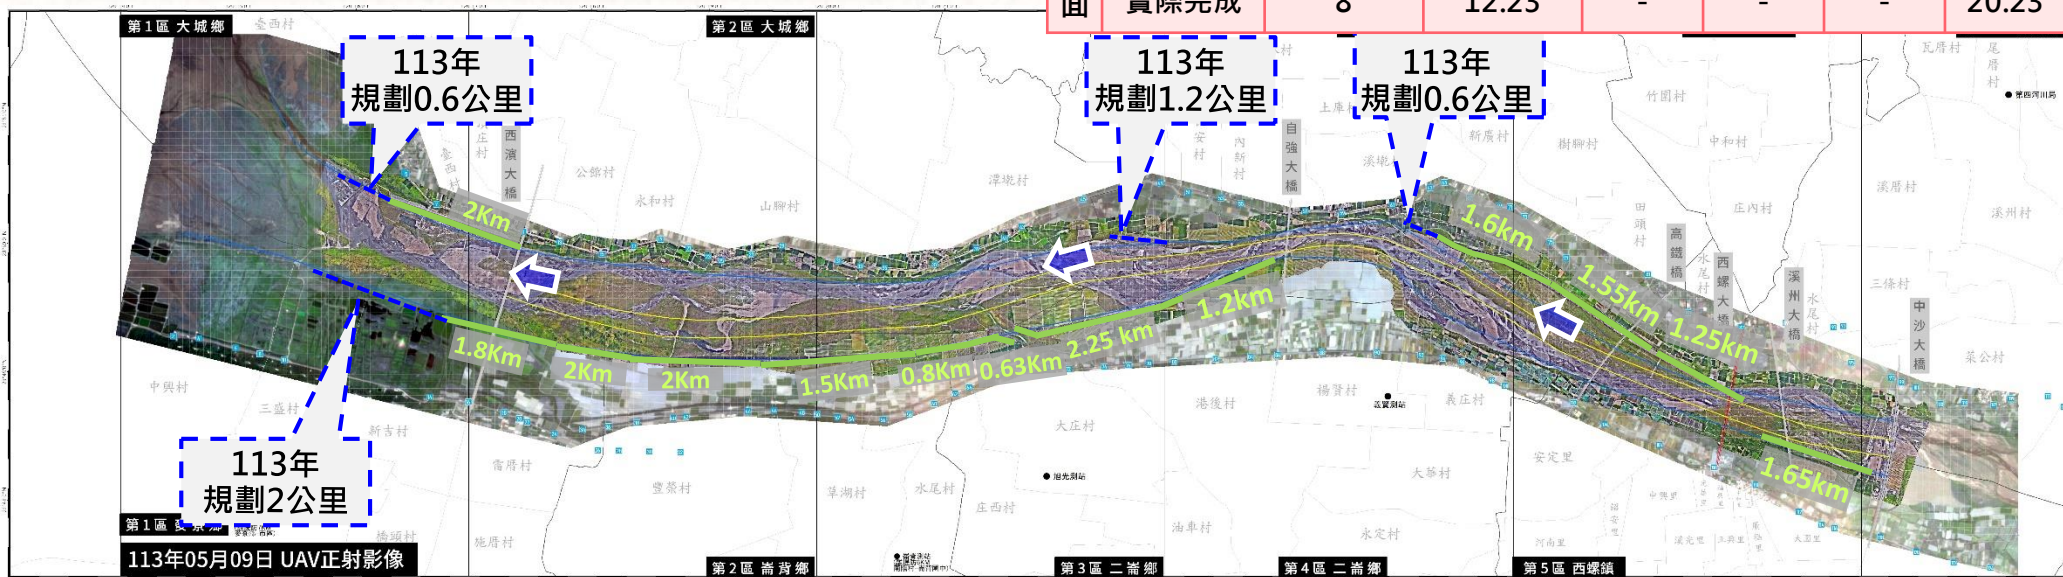

113年營造複式斷面進度管控 ➤ 執行進度說明：

KPI / 4公里


已完成 / 0 km

達成率/ 0 %

- 第三區：電塔上游北岸(規劃1.2公里)，已於6/24日完成1.2公里培厚作業，相關案件業於6月底完成決標作業，預計於7/16日分署工作會議討論後續新植造林分工與施作期程。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

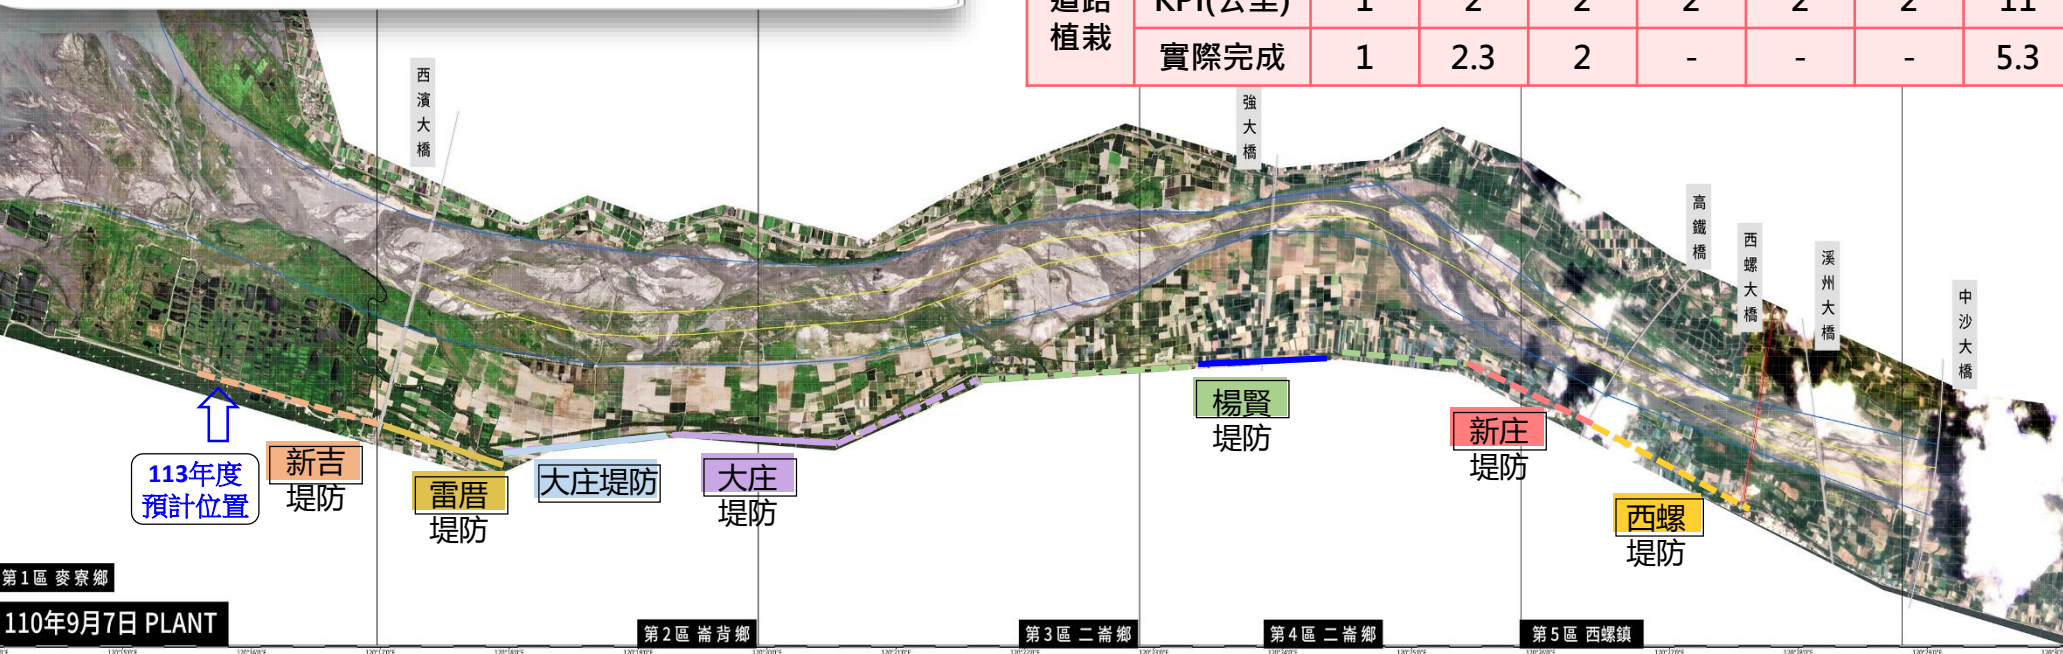

113年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0公里
達成率/ 0 %

- 依5月30日工作小組會議討論，預計於第一區許厝寮堤防辦理植樹長度為2公里。
- 相關案件業於6月底完成決標作業，預計於7/16日分署工作會議討論後續施作期程。



