

濁水溪揚塵抑制1090928~1091004周報表



空灑草籽



二崙稻草蓆鋪設



二崙稻草蓆鋪設




高鐵橋下攔水土堤



西濱橋上攔水土堤



本周施作項目及位置

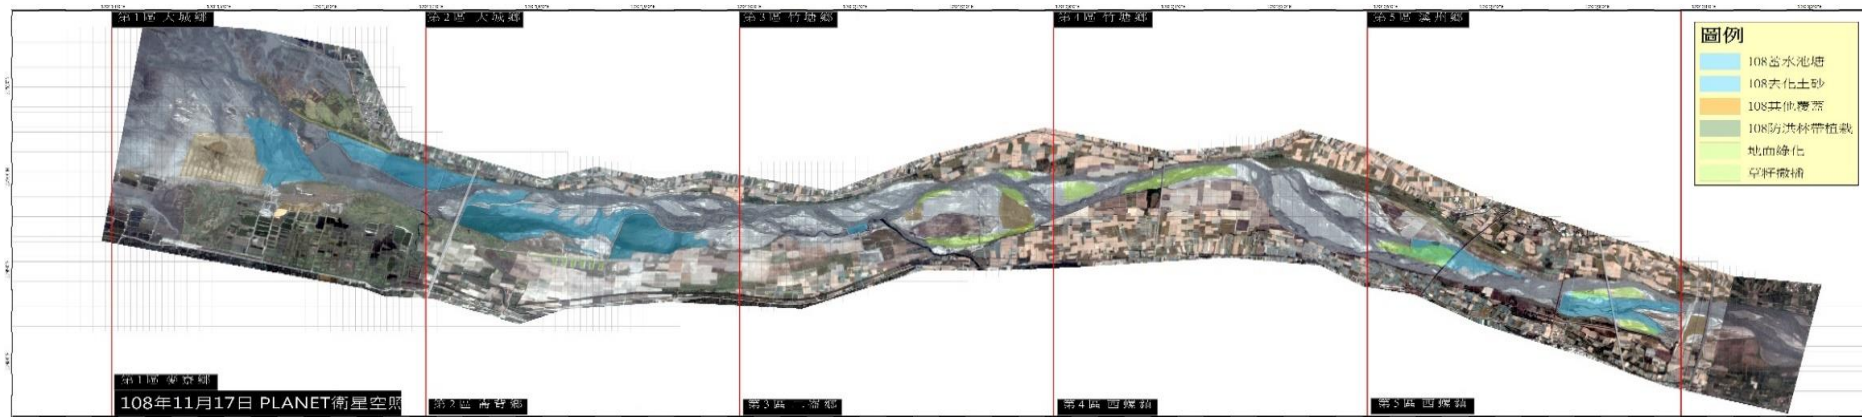

區域	施工位置	施工內容	目前進度
三	74號越堤路	稻草蓆鋪設(20公頃)	17公頃(85%)
五	中沙大橋下	稻草蓆鋪設(15公頃)	15公頃(100%)
二	西濱大橋上游	攔水土堤(2500米)	2500米(100%)
四	自強大橋上游	攔水土堤(3200米)	3200米(100%)
三	二崙低灘地	空灑草籽(60公頃)	60公頃(100%)
一	20公頃大沙洲	灑水線(20公頃)	16公頃(80%)
五	高鐵下	灑水線(6公頃)	2.5公頃(41.7%)

各區空拍現況(更新至0904)

第一區

裸露地濕潤，稻草覆蓋無沖失



第二區

40號越堤蓄水池塘



第三區

74號越堤河道現況



第四區


高鐵上下游河道複式斷面營造



第五區

西螺橋上游綠覆良好



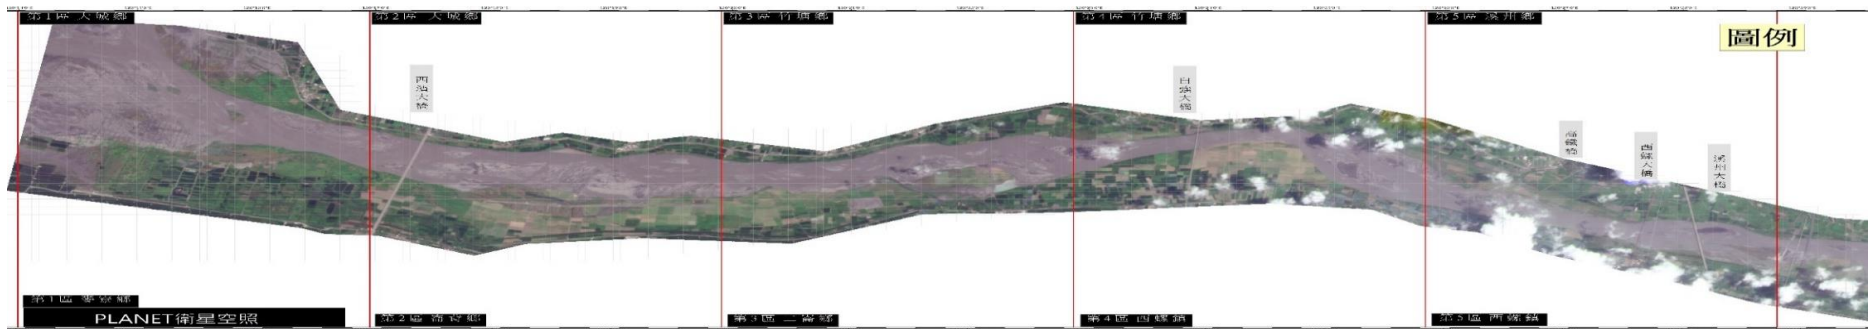

第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)	36
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
防洪植栽(公里)	2	防洪植栽(公里)	18	草籽撒播(公頃)	60	草籽撒播(公頃)		防洪植栽(公里)	
大沙丘植栽(公里)		綠覆蓋(公頃)	10					草籽撒播(公頃)	8
疏濬填池綠覆(公頃)									
大沙丘綠覆(公頃)									
林帶植栽(公頃)									
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	44.54	去化土砂(萬方)		去化土砂(萬方)	51.37	三仙膠(公頃)		去化土砂(萬方)	16
灑水線(公頃)	2	河道整理(公里)		河道整理(公里)	1.2	稻草鋪設(農民)公頃		灑水系統(公頃)	2.5
200公頃灑水系統(公頃)		灑水系統(公頃)	10	稻草蓆鋪設	34			便道鋪設級配(公頃)	
		牡蠣殼鋪灑(公頃)		便道鋪設級配				稻草蓆鋪設(公頃)	15
三仙膠(公頃)		三仙膠(公頃)		灑水線佈設(公頃)	3			稻草鋪設(農民)公頃	
稻草鋪設(公頃)	11.1	稻草鋪設(公頃)	0.1	稻草鋪設(農民)公頃					
便道鋪設級配(公頃)	1.3	碎石級配鋪設(NO.40越堤路下)	1.3						
疏濬簡易灑水佈設(公頃)									
平鋪防塵網(公頃)	3								
直立式防塵網(公頃)									
三仙膠(公頃)									
牡蠣殼鋪灑(公頃)									
碎石級配(公頃)									
其他覆蓋總計	17.4	其他覆蓋總計	11.4	其他覆蓋總計	37	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	17.5

濁水溪揚塵改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		109年							110年				實際完成		
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4	
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)			10%											136公頃
		45.3%													
	河道整 理 (2.5KM)			15%											1.2公里
	48.0%														
	河道疏濬及 去化土砂 (85萬方)(視 實際情形檢 討)	92%												111.91萬 方	
	131.7%														
防災應 變	其他覆 蓋(500 公頃)					10%								83.3公頃	
	16.7%														
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)					156%								78公頃	
		507%													
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)	100%												76公里	
	507%														

