


濁水溪揚塵抑制1091109~1091115周報表



第二區大庄培厚填
方



本周施作項目及位置

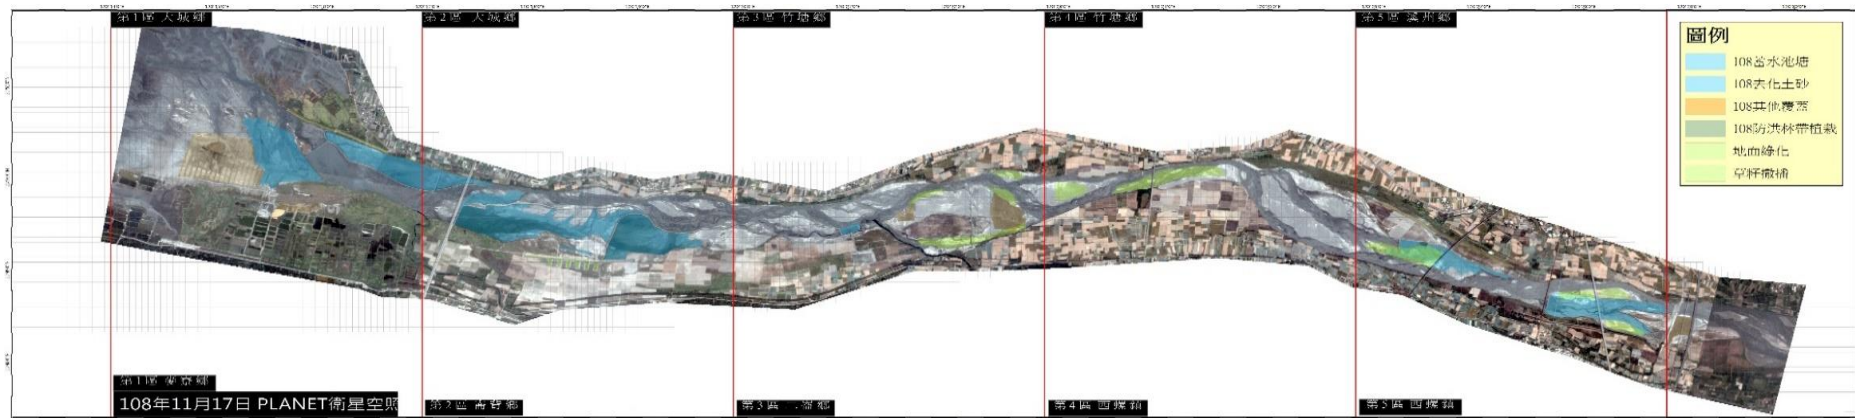

區域	施工位置	施工內容	目前進度
二	大庄42號	培厚填方	2.8萬方(28%)

各區空拍現況(更新至1020)

第一區

灑水線開啟



第二區

西濱大橋上游蓄水池塘



第三區

74號越堤稻草蓆鋪設



第四區

高鐵橋下游蓄水池塘



第五區

中沙橋下稻草蓆覆蓋



濁水溪揚塵改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		109年							110年				實際完成
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)												302公頃
	河道整 理 (2.5KM)												1.8公里
	河道疏濬及 去化土砂 (85萬方)(視 實際情形檢 討)												120.61萬 方
防災應 變	其他覆 蓋(500 公頃)												125.4公頃
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)												78公頃
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)												27.5公里



第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)	150	蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)	102
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
防洪植栽(公里)	2	防洪植栽(公里)	14	草籽撒播(公頃)	60	草籽撒播(公頃)		防洪植栽(公里)	7.5
大沙丘植栽(公里)		綠覆蓋(公頃)	10	防洪植栽(公里)	6	防洪植栽(公里)		草籽撒播(公頃)	8
疏濬填池綠覆(公頃)									
大沙丘綠覆(公頃)									
林帶植栽(公頃)									
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	47.84	去化土砂(萬方)	2.8	去化土砂(萬方)	51.37	三仙膠(公頃)		去化土砂(萬方)	18.6
灑水線(公頃)	2	河道整理(公里)		河道整理(公里)	1.2	稻草鋪設(農民)公頃		灑水系統(公頃)	6
200公頃灑水系統(公頃)	20	灑水系統(公頃)	10	稻草蓆鋪設	42			便道鋪設級配(公頃)	
		牡蠣殼鋪灑(公頃)		便道鋪設級配				稻草蓆鋪設(公頃)	15
三仙膠(公頃)		三仙膠(公頃)		灑水線佈設(公頃)	3			稻草鋪設(農民)公頃	
稻草鋪設(公頃)	11.1	稻草鋪設(公頃)	0.1	稻草鋪設(農民)公頃				河道整理(公里)	0.6
便道鋪設級配(公頃)	1.3	碎石級配鋪設(NO.40越堤路下)	1.3						
疏濬簡易灑水佈設(公頃)									
平鋪防塵網(公頃)	13								
直立式防塵網(公頃)									
三仙膠(公頃)									
牡蠣殼鋪灑(公頃)									
碎石級配(公頃)									
其他覆蓋總計	47.4	其他覆蓋總計	11.4	其他覆蓋總計	45	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	21.6
