

# 濁水溪揚塵抑制1100426~1100502周報表

本周無施工工項





## 各區空拍現況(更新至0412)

第一區

西濱大橋下游稻草席鋪設



第二區

西濱大橋上游蓄水池塘



第三區

北岸稻草席鋪設



第四區

高鐵橋下游疏濬作業




第五區

西螺橋下水覆蓋、綠覆蓋



# 施作中項目及位置

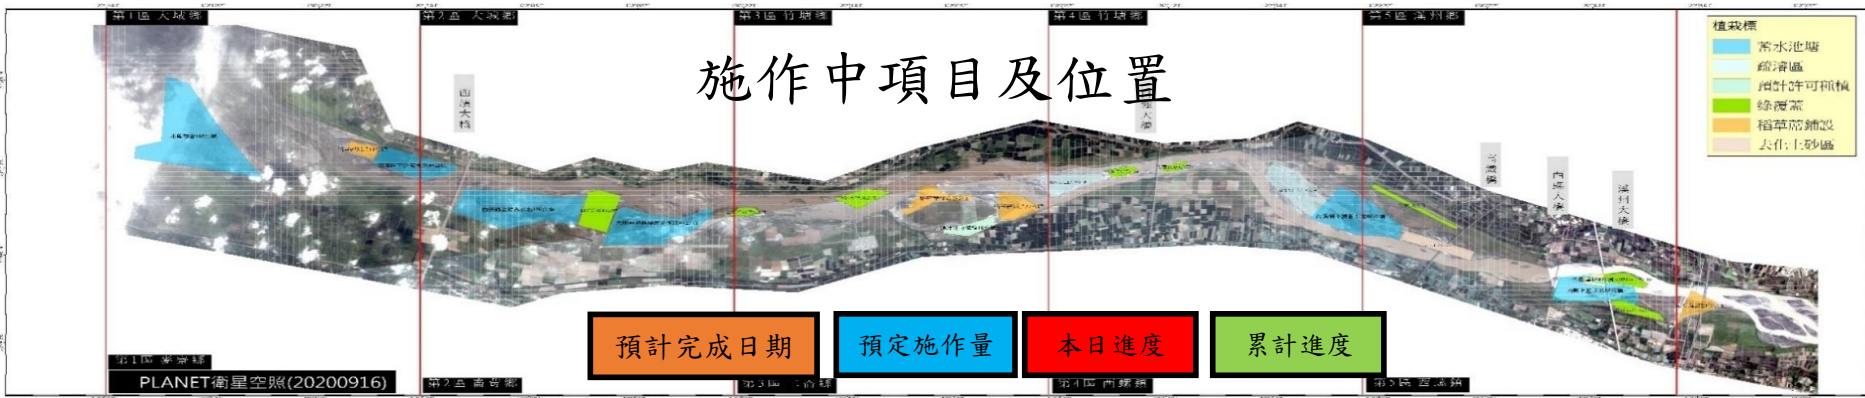


# 濁水溪揚塵改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		110年							111年				實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
裸露地改善	水覆蓋 (400公頃)			5%		10%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	0公頃
	河道整理 (2.5KM)			5%		10%	30%	50%	60%	80%	80%	90%	100%	
	灘地綠覆蓋 (50公頃)						15%	30%	60%	70%	80%	90%	100%	0公頃
	其他覆蓋 (400公頃)					10%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
造林新植與撫育	防洪林帶及行道樹 (15公里)	80%	100%											0公里
應變	灑水	20%			25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	0公頃



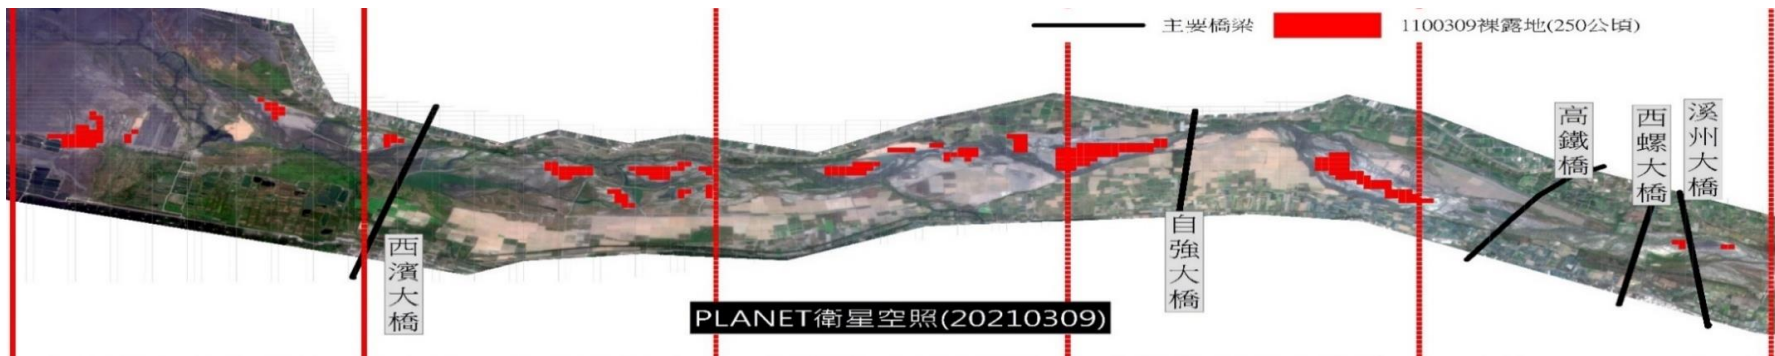

第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)	
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
防洪植栽(公里)		防洪植栽(公里)		防洪植栽(公里)		草籽撒播(公頃)		防洪植栽(公里)	
大沙丘植栽(公里)		綠覆蓋(公頃)		草籽撒播(公頃)		防洪植栽(公里)		草籽撒播(公頃)	
疏濬填池綠覆(公頃)									
大沙丘綠覆(公頃)									
林帶植栽(公頃)									
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	0.00	去化土砂(萬方)		去化土砂(萬方)	0.0	三仙膠(公頃)		去化土砂(萬方)	0.00
河道整理(公里)	0	河道整理(公里)		河道整理(公里)		稻草鋪設(農民)公頃		河道整理(公里)	
200公頃灑水系統(公頃)		灑水系統(公頃)		稻草蓆鋪設		稻草蓆鋪設		便道鋪設級配(公頃)	
三仙膠(公頃)		牡蠣殼鋪灑(公頃)		便道鋪設級配				稻草蓆鋪設(公頃)	
稻草鋪設(公頃)		三仙膠(公頃)		灑水線佈設(公頃)				灑水系統(公頃)	
便道鋪設級配(公頃)		稻草鋪設(公頃)		稻草鋪設(農民)公頃				稻草鋪設(農民)公頃	
疏濬簡易灑水佈設(公頃)		碎石級配鋪設(NO.40越堤路下)							
平鋪防塵網(公頃)									
灑水線(公頃)									
其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	0
