

# 濁水溪揚塵抑制1100510~1100516周報表




西濱橋下游稻草蓆鋪設



自強橋上游河道整理作業



## 本周施作項目及位置

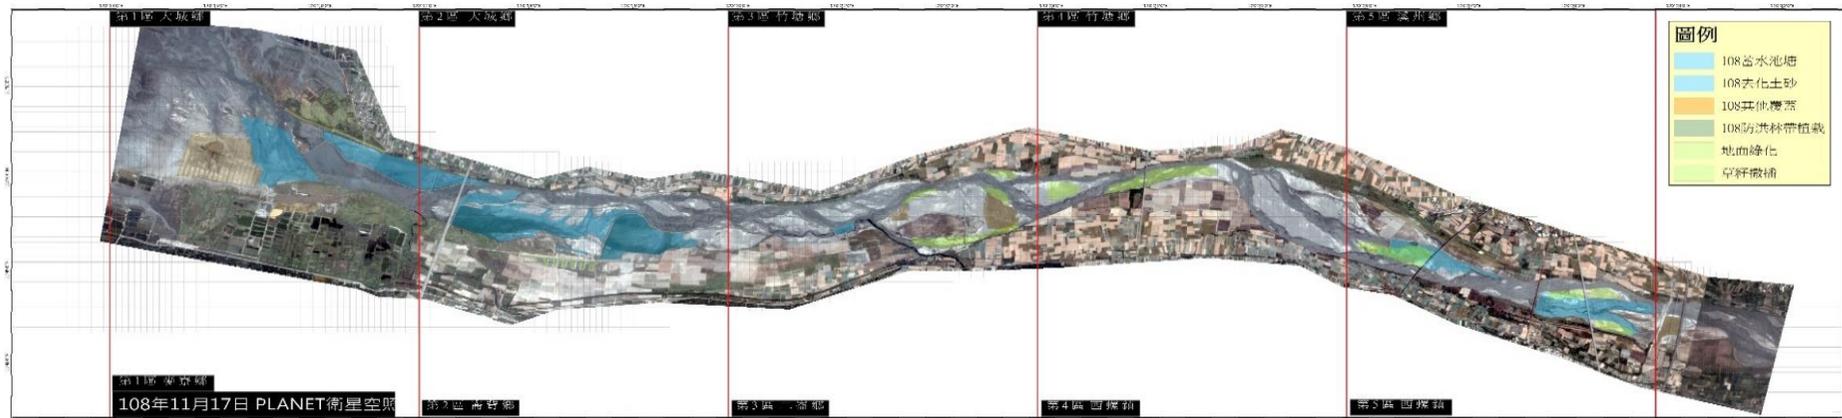

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	西濱橋下裸露地	稻草蓆鋪設	14公頃(56%)
四	自強橋上游裸露地	河道整理	0.08公里(8%)

## 各區空拍現況(更新至0509)

第一區

西濱大橋下游稻草席鋪設



第二區

西濱大橋上游蓄水池塘



第三區

60號越堤路培厚複式斷面



第四區

高鐵橋下游疏濬作業



第五區

西螺橋下水覆蓋、綠覆蓋




# 濁水溪揚塵改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		110年							111年				實際完成		
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4	
裸露地改善	水覆蓋 (400公頃)			5%		10%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	0公頃	
	河道整理 (2.5KM)			5%		10%	30%	50%	60%	80%	80%	90%	100%		0.084公里
	灘地綠覆蓋 (50公頃)							15%	30%	60%	70%	80%	90%	100%	
	其他覆蓋 (400公頃)					10%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	14公頃	
造林新植與撫育	防洪林帶及行道樹 (4公里)	80%	100%												0公里
應變	灑水	20%			25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	0公頃	



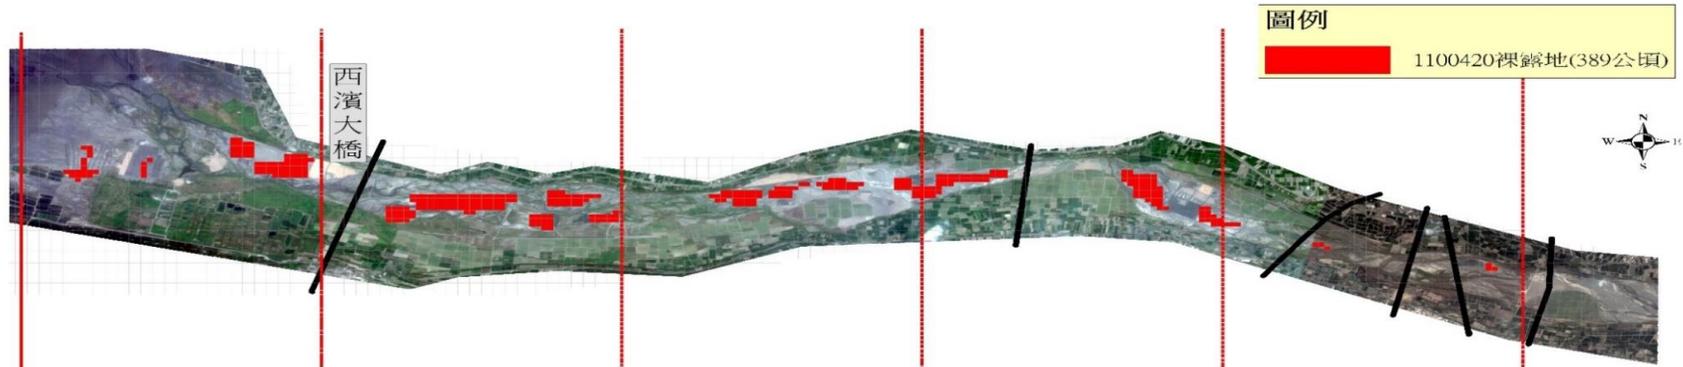

第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
<b>水覆蓋</b>									
蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)	
<b>綠覆蓋</b>									
防洪植栽(公里)		防洪植栽(公里)		防洪植栽(公里)		防洪植栽(公里)		防洪植栽(公里)	
綠覆蓋(公頃)		綠覆蓋(公頃)		綠覆蓋(公頃)		綠覆蓋(公頃)		綠覆蓋(公頃)	
<b>河道整理</b>									
河道整理(公里)		河道整理(公里)		河道整理(公里)		河道整理(公里)		河道整理(公里)	
<b>其他覆蓋</b>									
200公頃灑水系統(公頃)		稻草蓆鋪設(公頃)		稻草蓆鋪設(公頃)		稻草蓆鋪設		稻草蓆鋪設(公頃)	
		灑水系統(公頃)		灑水系統(公頃)		灑水系統(公頃)		稻草蓆鋪設(公頃)	
稻草蓆鋪設(公頃) 14		便道鋪設級配(公頃)		便道鋪設級配(公頃)		便道鋪設級配(公頃)		灑水系統(公頃)	
灑水系統(公頃)		平鋪防塵網(公頃)		平鋪防塵網(公頃)		平鋪防塵網(公頃)		平鋪防塵網(公頃)	
便道鋪設級配(公頃)									
平鋪防塵網(公頃)									
小計 14		小計 0		小計 0		小計 0		小計 0	
<b>緊急應變措施</b>									
小計 0		小計 0		小計 0		小計 0		小計 0	
