



揚塵防治 週報表

110/10/04~110/10/10



每日施工項目及位置

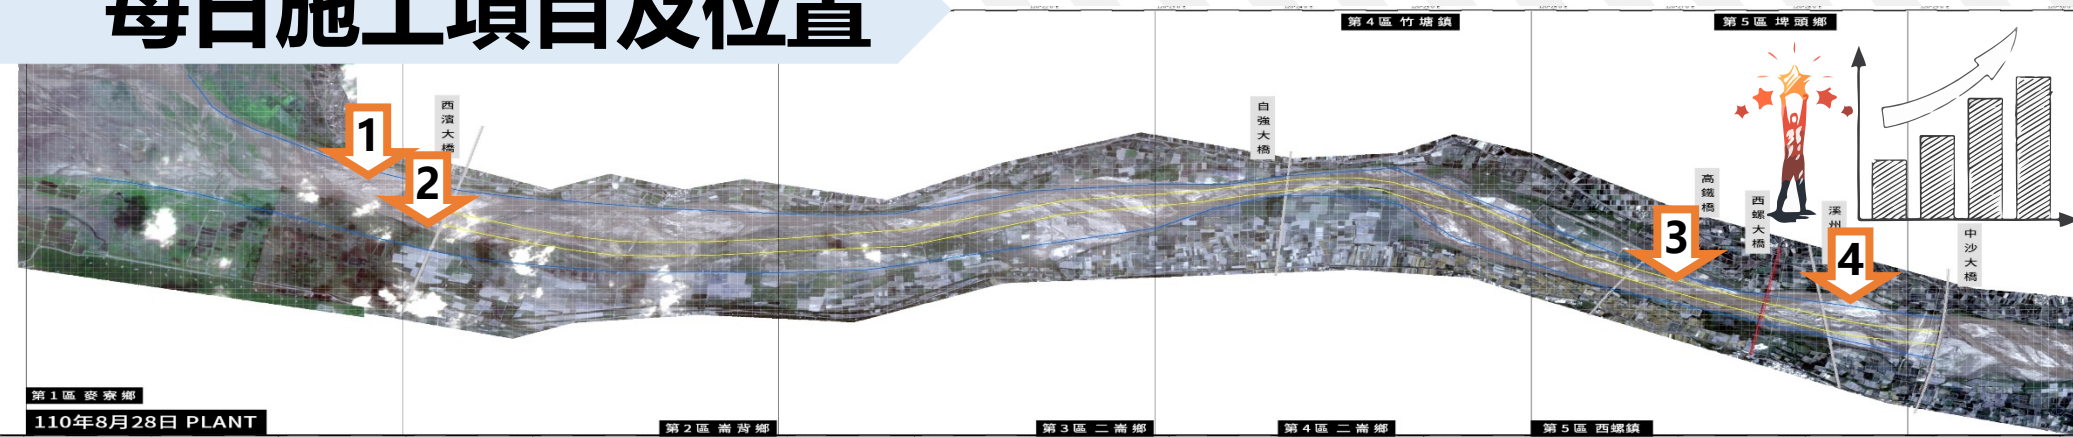


西濱大橋下游北岸裸露地_稻草蓆鋪設

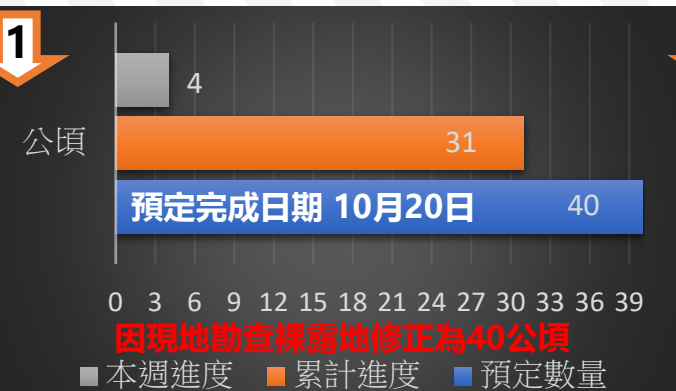


西濱大橋下方裸露地_稻草蓆鋪設

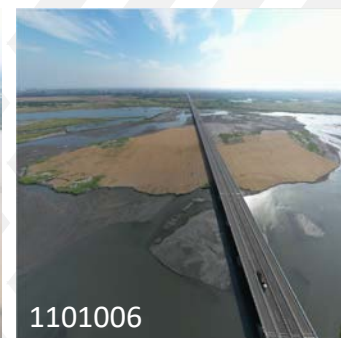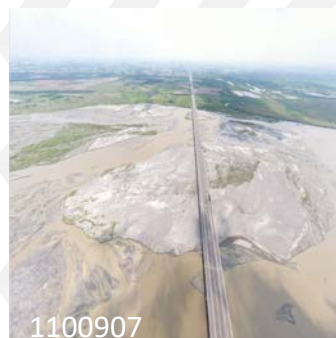



高鐵橋下游_攔水土堤

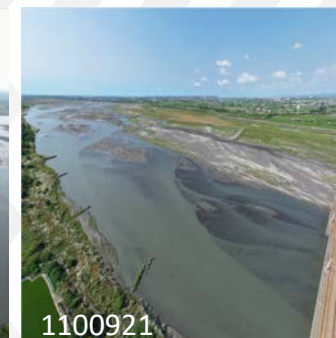

每日施工項目及位置

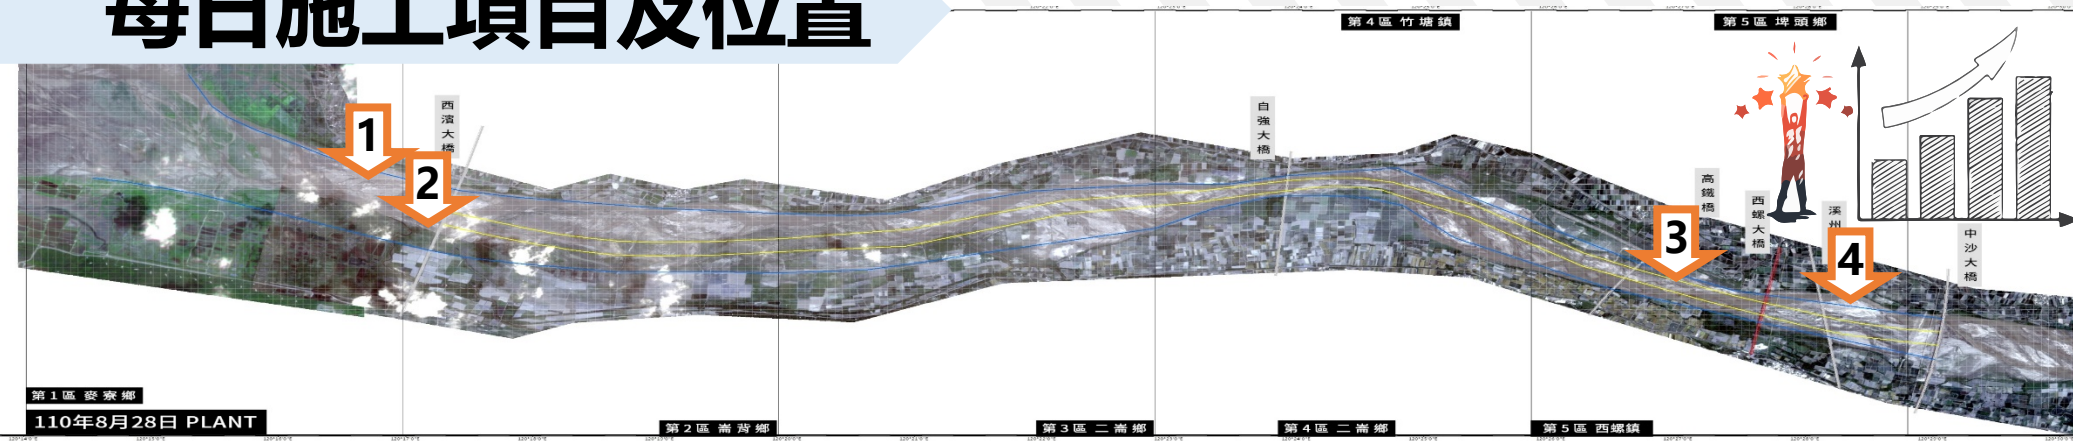


溪洲大橋上游北岸裸露地_稻草蓆鋪設

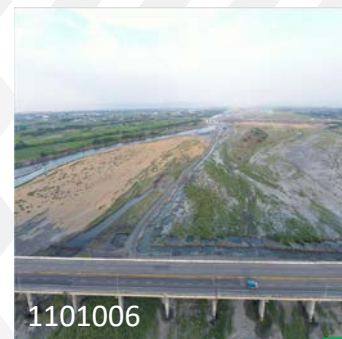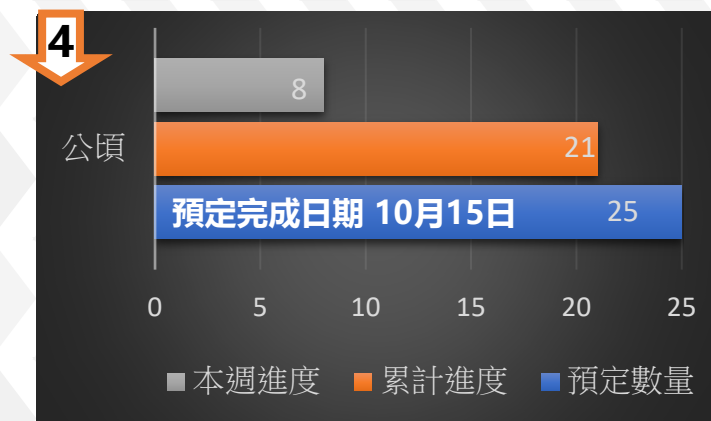



各區空拍現況



第一區

西濱大橋下游



第二區

40號越堤路



第三區

電塔下游



第四區

高鐵橋下游



第五區

中沙大橋下游



110年辦理情形：抑制面積及進度



水覆蓋

達成率 **42%**

KPI	已完成
400 公頃	168公頃



河道整理

達成率 **67.2%**

KPI	已完成
2.5 公里	1.68公里



綠覆蓋

達成率 **541.4%**

KPI	已完成
50 公頃	270.7公頃



其他覆蓋

達成率 **44.8%**

KPI	已完成
450公頃	201.6公頃



防洪植栽

達成率 **77.5%**

KPI	已完成
4公里	3.1公里

營造複式斷面規圖

107-109 完成複式斷面

110 執行中複式斷面

111-112 規劃複式斷面



110
1.5Km 已完成

110
0.5km


複式斷面

達成率 75%


KPI	已完成
2公里	1.5公里

➤ 未完成數量及期程：

- 1) 目前尚未完成0.5公里，預計10/15開始培厚，12/15開始植栽，12月底完成0.5公里複式斷面。

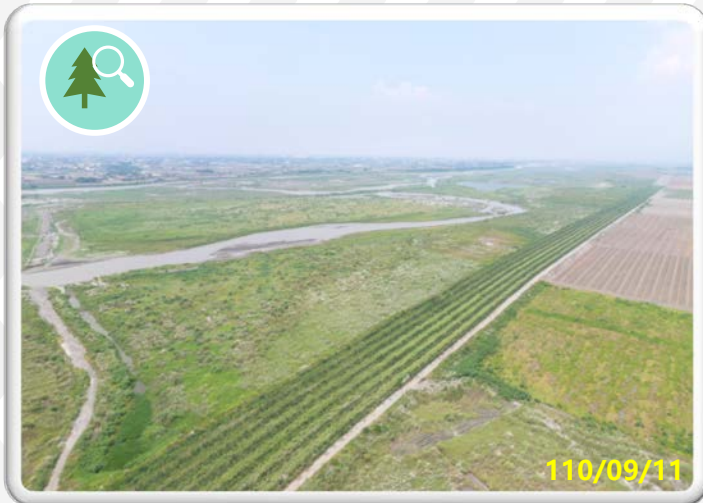

堤防兩岸植樹

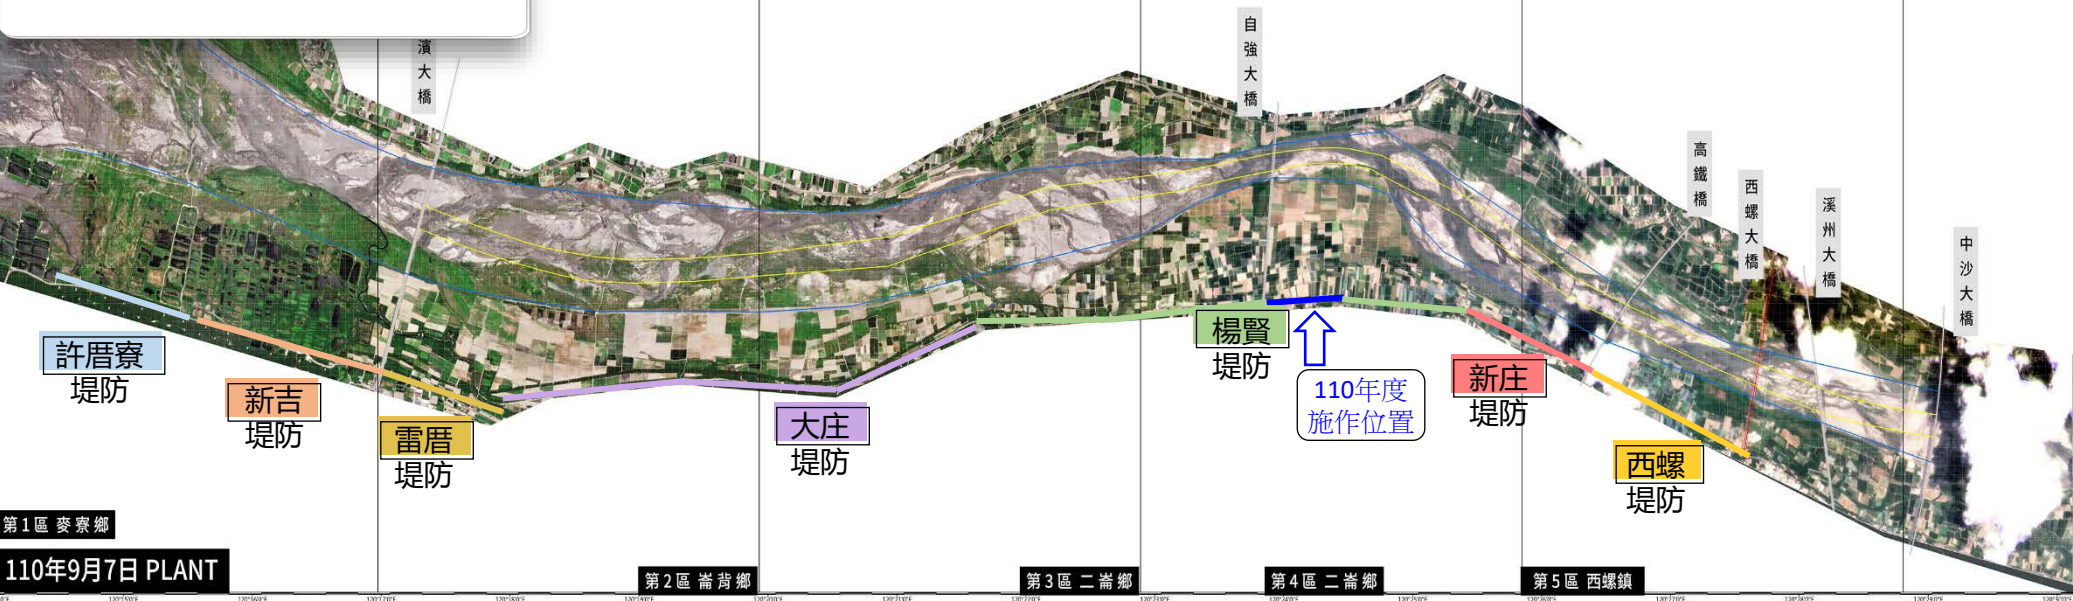

堤防兩岸植樹

達成率 0%

KPI 2公里 | 已完成 0公里

➤ 未完成數量及期程:


1) 110年10月底完成植栽1公里。

09/22已確認苗木數量

預計10/13進場整地，10/15領苗種植，10月底完成水防道路植栽1公里。



揚塵抑制措施

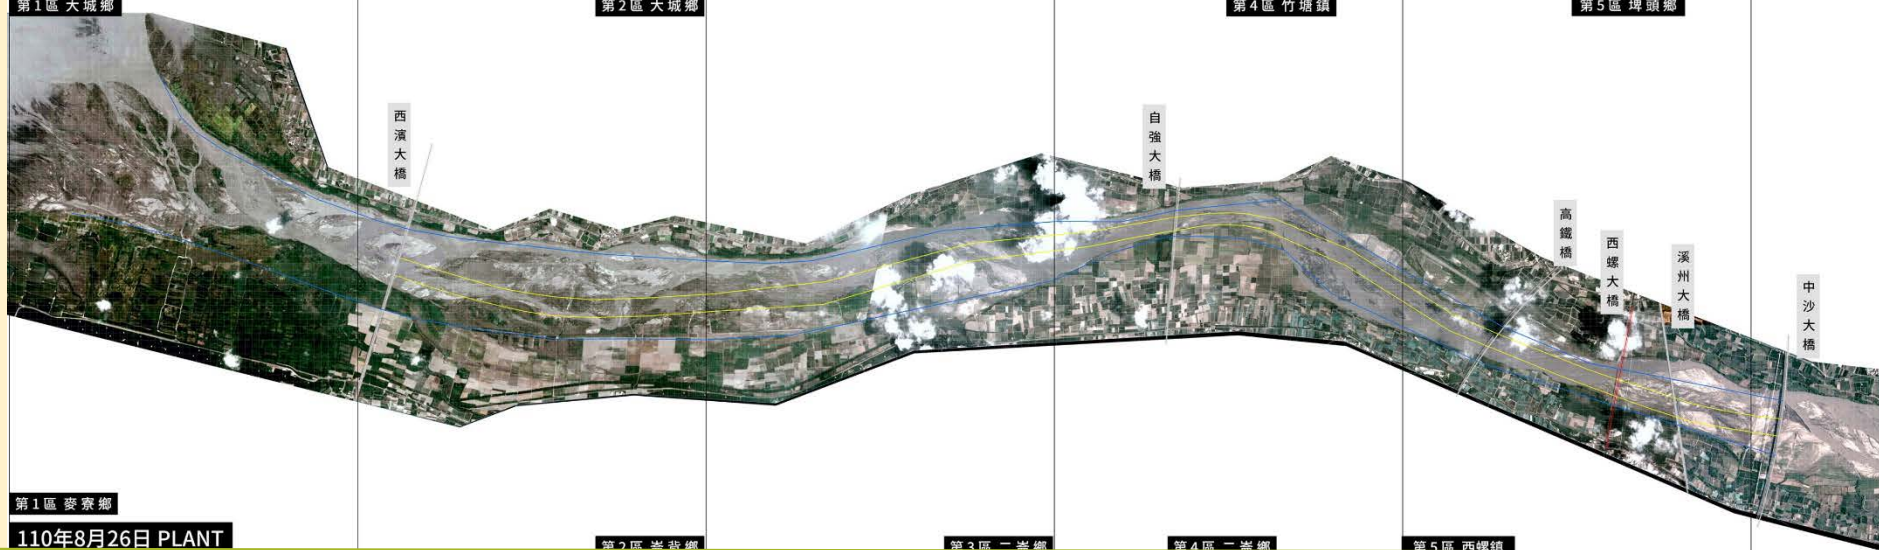

水覆蓋

1) 水覆蓋100公頃

1) 水覆蓋30公頃

1) 水覆蓋20公頃
2) 水覆蓋18公頃

河道整理

1) 河道整理培厚0.9公里

1) 河道整理0.78公里

綠覆蓋

1) 防洪林帶0.6公里
2) 200公頃空灑草籽53公頃
3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
4) 綠覆蓋1.2公頃

1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
2) 44號越堤路空灑草籽33公頃
1) 防洪林帶1.5公里
2) 自強大橋上下游空灑草籽60公頃
3) 39號灘地林地植生1公里

1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃

其他覆蓋

1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
2) 簡易灑水設施0.9公頃
3) 碎石級配0.9公頃
4) 防塵網鋪設1.5公頃
5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設31公頃
6) 防塵網鋪設10公頃
7) 簡易灑水1.7公頃

1) 西濱下方_稻草蓆鋪設19公頃

1) 58號複式斷面水線12公頃
2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃

1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆21公頃
