


揚塵防治 週報表

111/07/04~111/07/10

每日施工項目及位置

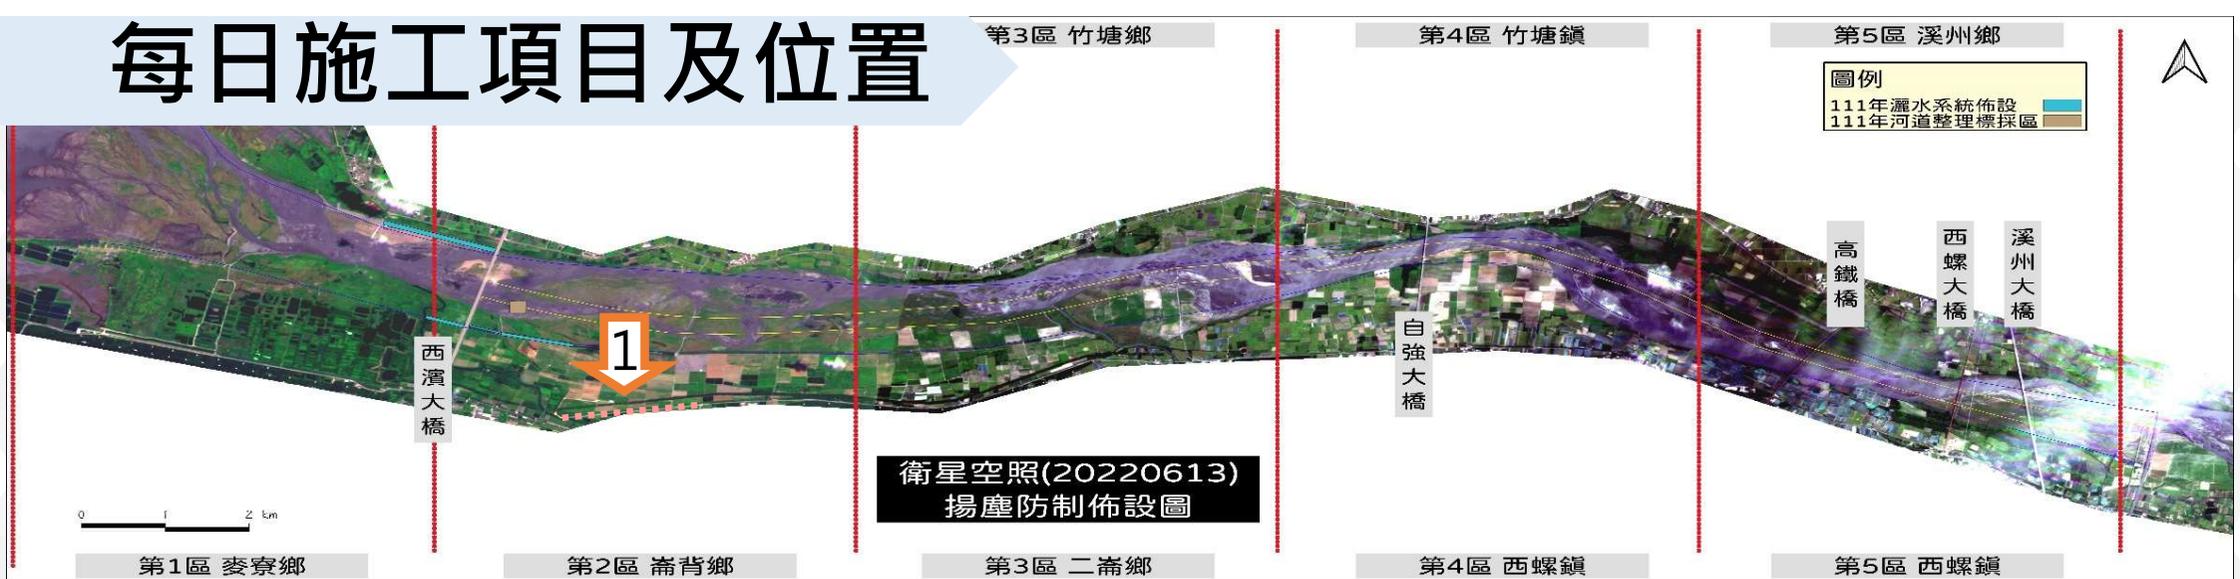

大庄堤防堤段水防道路側植樹






各區空拍現況



第一區
西濱大橋下游



第二區
大庄堤防(40號越堤路)下游

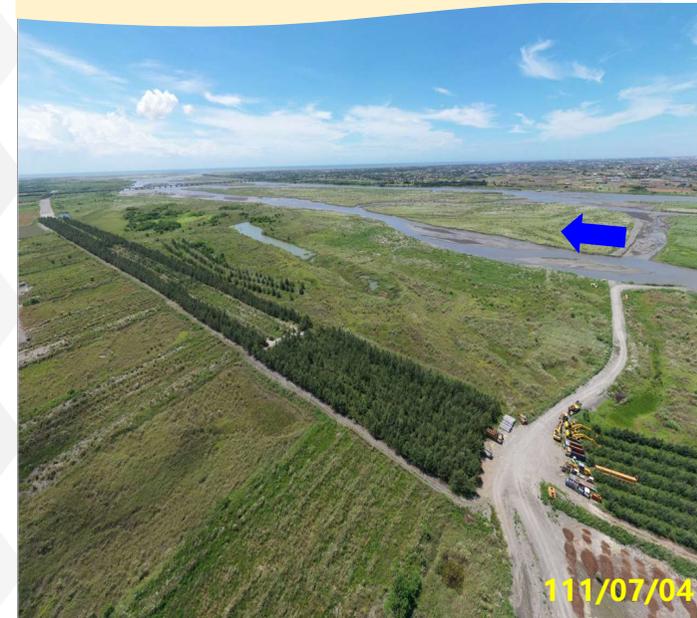

第三區
楊賢堤防(74號越堤路)下游



第四區
自強大橋上游



第五區
溪州大橋上下游



111年

揚塵KPI進度管控

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



防洪植栽

KPI / 4 公里
已完成 / 2.05公里
達成率/ 51.3%



水覆蓋

KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



綠覆蓋

KPI / 50公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



河道整理

KPI / 2.5公里
已完成 / 0.56公里
達成率/ 22.4%



其他覆蓋

KPI / 450公頃
已完成 / 27.2公頃
達成率/ 6%

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	1.45	-	-



第1區 麥寮鄉

110年07月25日



111年營造複式斷面KPI進度管控


KPI / 6公里
 已完成 / 1.45km
 達成率 / 24.2%

➤ 執行進度說明：

- (1) 西濱大橋下游北岸已於6/29日完成1.45公里。
- (2) 西濱大橋下游南岸已完成土堤培厚1.8公里，簡易灑水系統設置，已於6/6日完成，預計7月底完成植栽作業。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	1.6	-	-	-	-	-

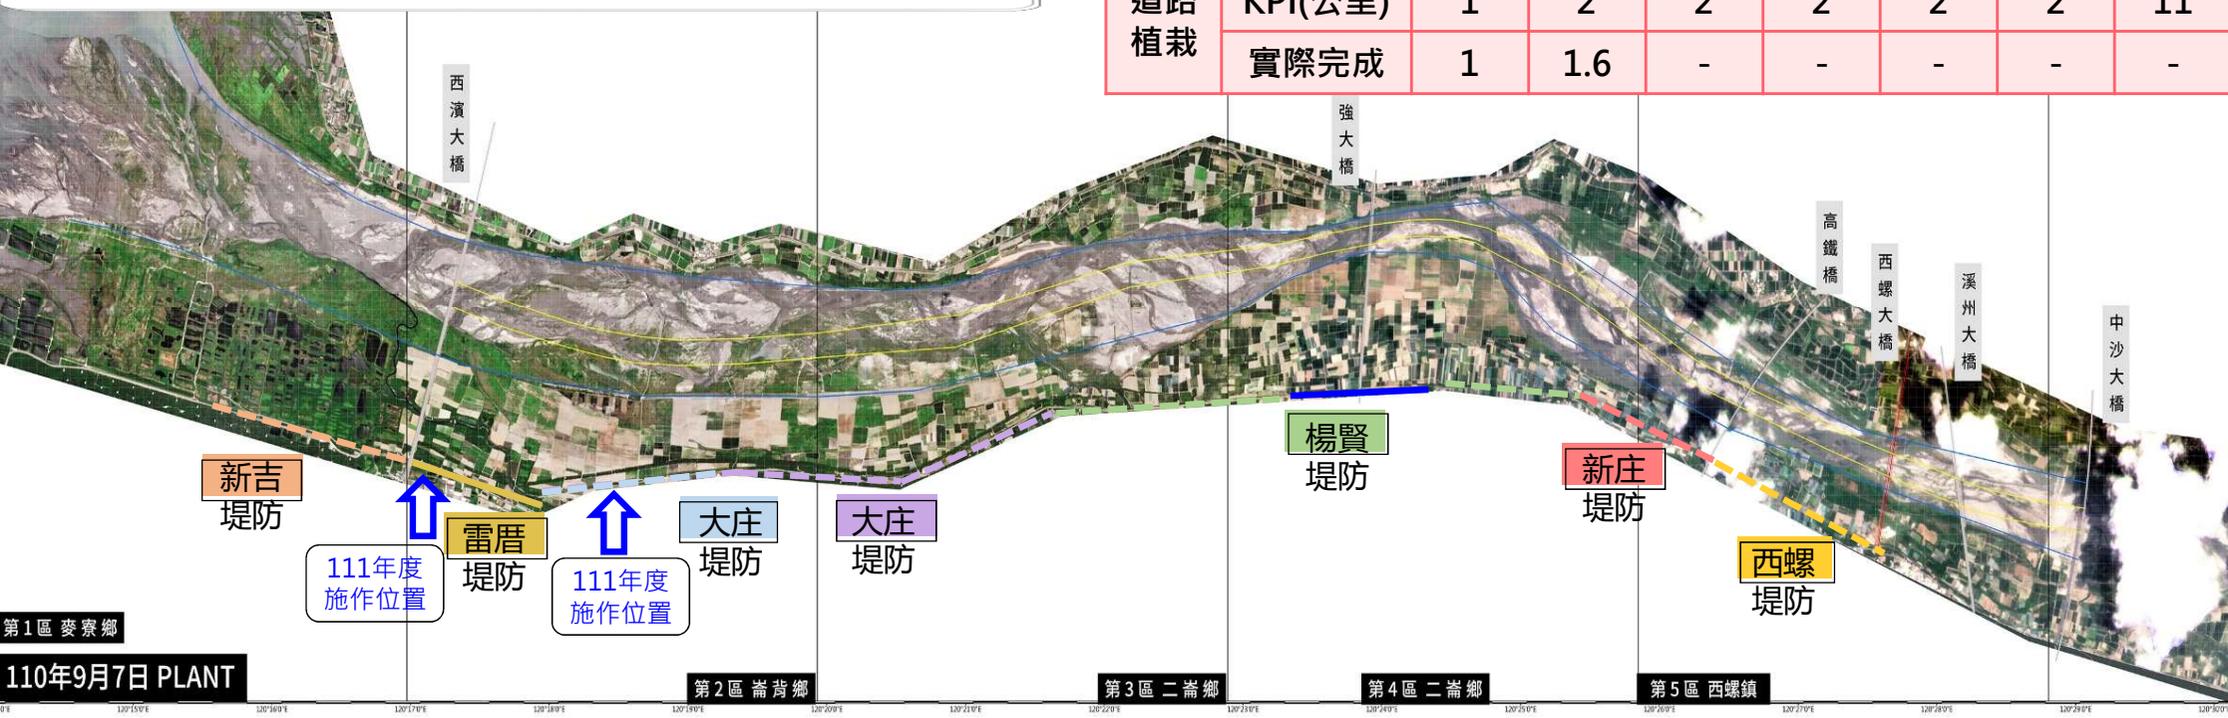


• 111年水防道路植栽KPI進度管控

KPI / 2公里
 已完成 / 1.6公里
 達成率 / 80%

➤ 執行進度說明：

- (1) 雷厝堤防堤段水防道路側植樹1公里：道路改善工程已於110年4月施工完成，水防道路側植樹部分，林務局已於5/12日辦理完成。
- (2) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里：花台設施作業已於6/8日完成，填土植栽作業於7/5日進場施作，已完成0.6公里，預計7/15日完成。

揚塵抑制措施

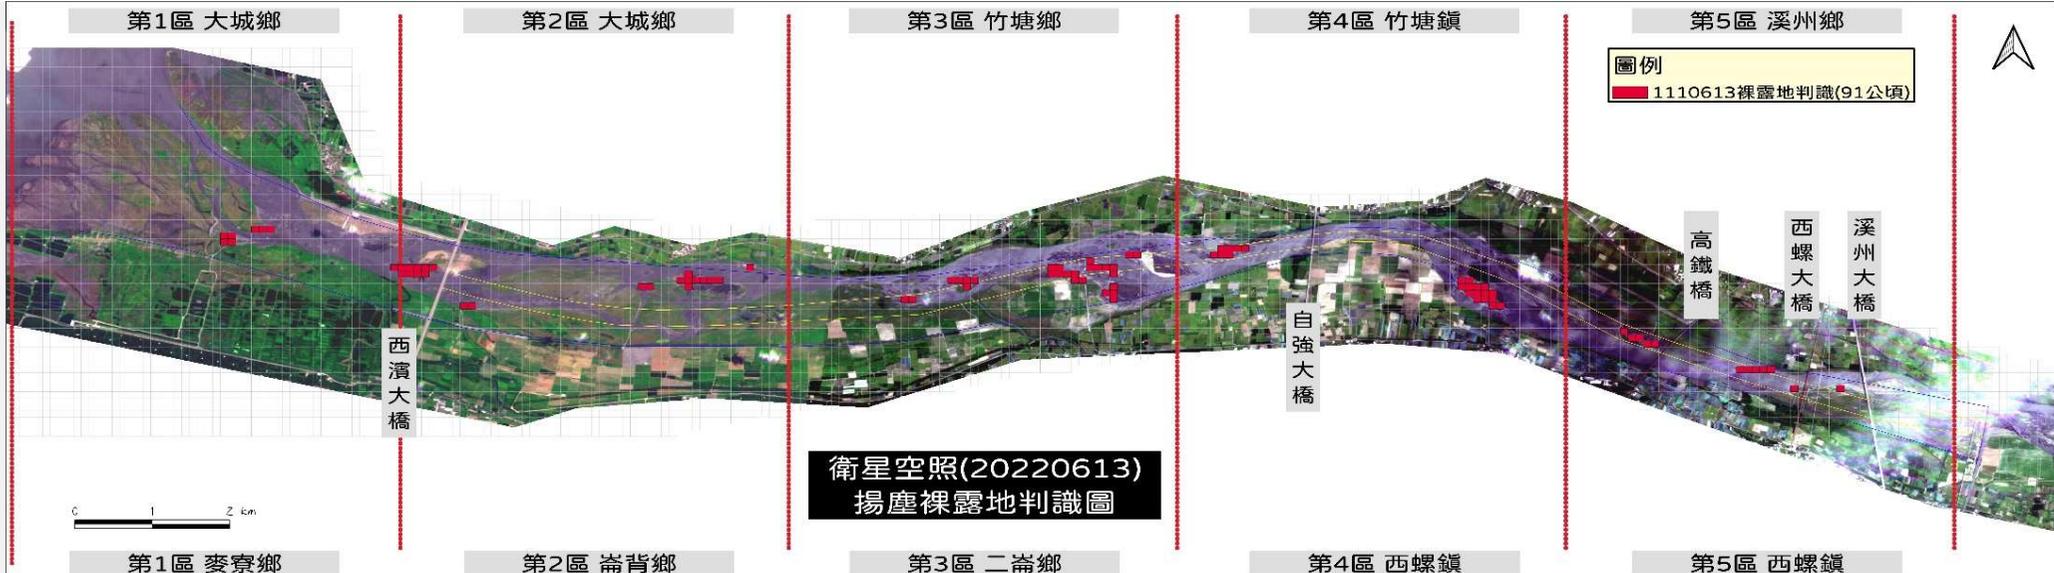

第1區 麥寮鄉	第2區 崙背鄉	第3區 二崙鄉	第4區 西螺鎮	第5區 西螺鎮
水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理 1) 河道整理0.56公里	河道整理	河道整理	河道整理
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽 1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里	防洪植栽 1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹0.6公里	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
其他覆蓋 1) 22號井旁_防塵網7公頃 2) 西濱下北岸_水線10.5公頃 3) 20公頃_水線0.8公頃 4) 西濱下南岸_水線7.4公頃 5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
