
濁水溪流域111-112年疏濬辦理情形

- 一、111年濁水溪南投縣境內疏濬計畫共10件,總計354萬立方公尺(690萬噸),其中第四河川局自辦6件計183萬立方公尺(354萬噸),許可南投縣政府5件171萬立方公尺(336萬噸)。
- 二、112年濁水溪南投縣境內疏濬計畫共9件,總計355萬立方公尺(684萬噸),其中第四河川局自辦5件計225萬立方公尺(434萬噸),許可南投縣政府預計4件130萬立方公尺(250萬噸)。
- 三、濁水溪上游段及陳有蘭溪疏濬計如下圖所示:



四、濁水溪中游段及清水溪疏濬計如下圖所示:

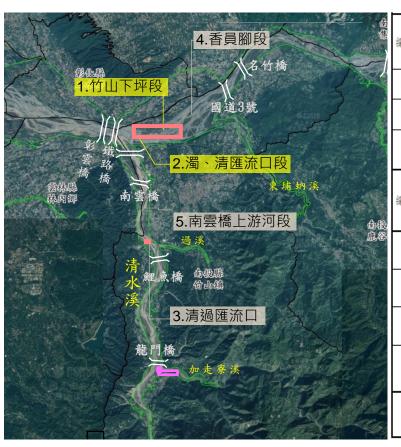

編號	工程簡稱	規劃疏濬總量		111出料量		出料	辦理情形	112規劃出料量	
		萬方	萬噸	萬方	萬噸	進度	班垤1月/12	萬方	萬噸
1	109下坪段	92	179.4	67.16	130.96	73.00%	中禁田	1	-
2	109濁清匯	30	58.5	-	-		設計中	30.00	58.50
四局小計				67	131			30	59
编號	工程簡稱	規劃疏濬總量		111實際出料量		出料	がかまままま	112規劃出料量	
		萬方	萬噸	萬方	萬噸	進度	辦理情形	萬方	萬噸
3	清過匯流口	40	84.00	20.14	42.29	100.00%	完成出料	,	-
4	111香員腳	70	136.50	1	-		申請中	60.00	117.00
5	111南雲橋	50	95.00	-	-		申請中	40.00	76.00
縣府小計				20	42			100.0	193
中游段總計		87	173			130	252		

111出料量

萬方

0.74

10.81

54.00

50.00

0.03

116

萬方

46.02

66,58

31.32

6.92

151

266

萬噸

1.41

21.08

102.60

97.50

0.06

223

並随

89.74

129.83

61.07

13.15

294

516

111實際出料量

出料

進度

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.009

出料

進度

100.00%

95.11%

78.30%

10.98%

辦理情形

完成出料

完成出料

完成出料

完成出料

完成出料

設計中

設計中

設計中

辦理情形

完成出料

出料中

出料中

出料中

設計中

112規劃出料量

萬噸

19.50

28.50

142.50

185.25

376

萬噸

38.00

19.00

57

433

112規劃出料量

萬方

10.00

15.00

75.00

95.00

萬方

20.00

10.00

30.0

225
