



揚塵防治 週報表

111/09/26~111/10/02

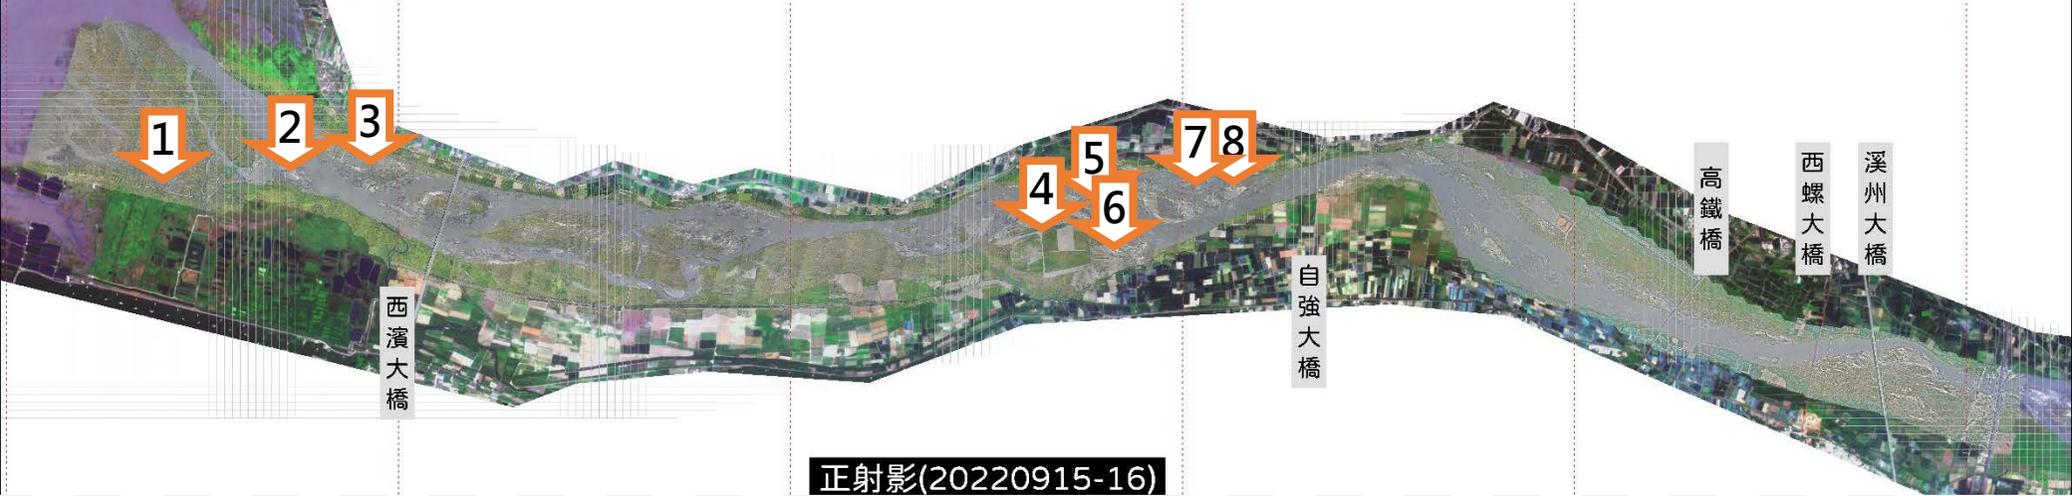

正射影(20220915-16)


200公頃_站體6號至12號北側灘地_防塵網

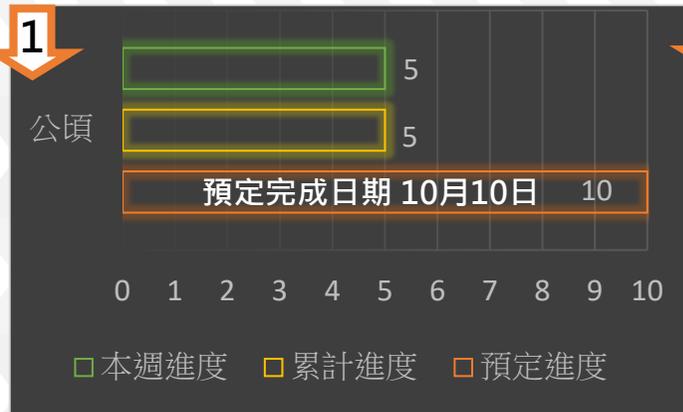


200公頃大沙洲東北側低灘地_稻草蓆



西濱大橋北岸(9號越堤)_稻草蓆

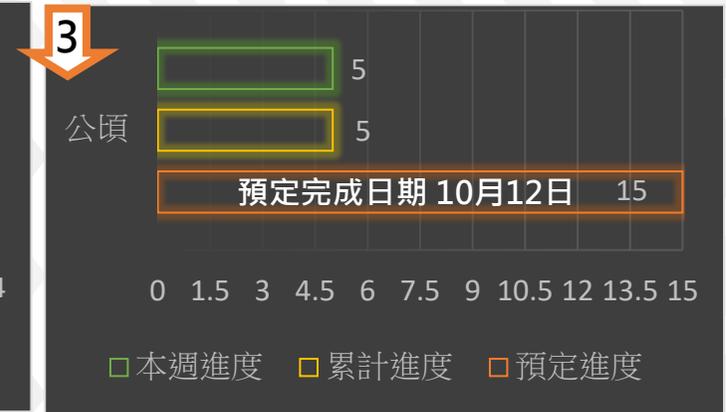

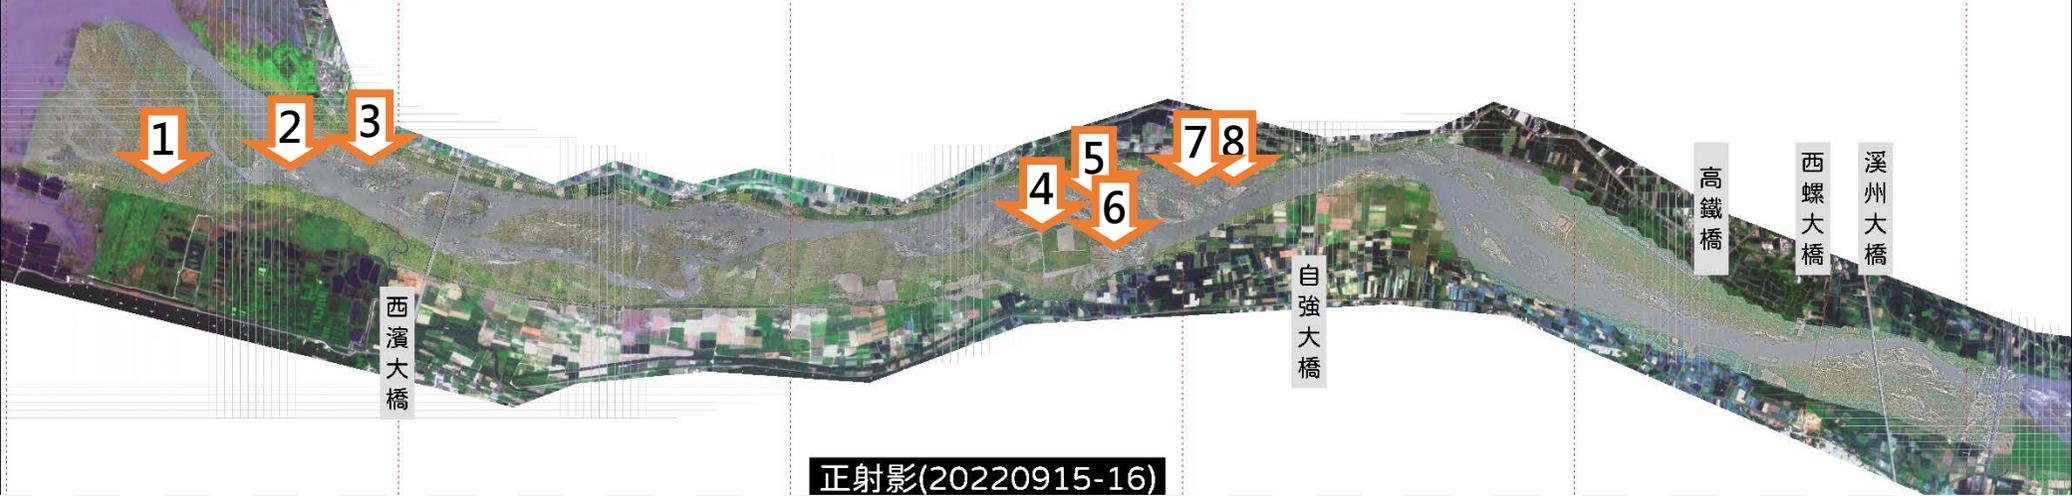



正射影(20220915-16)

大義崙排水上游_河道整理_去化土砂_培厚

74號越堤段下游南岸_稻草蓆

74號越堤段上游南岸_稻草蓆

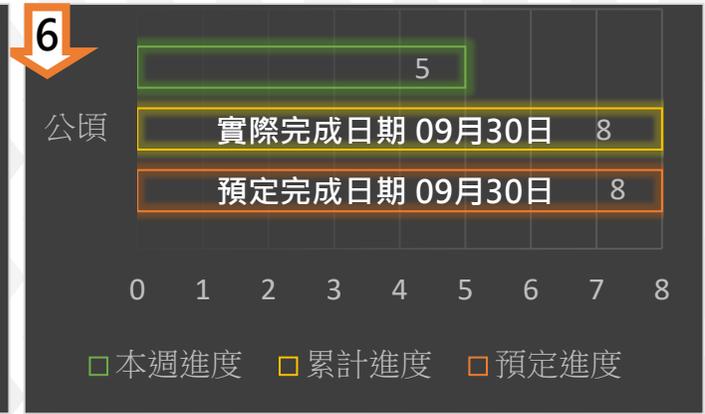

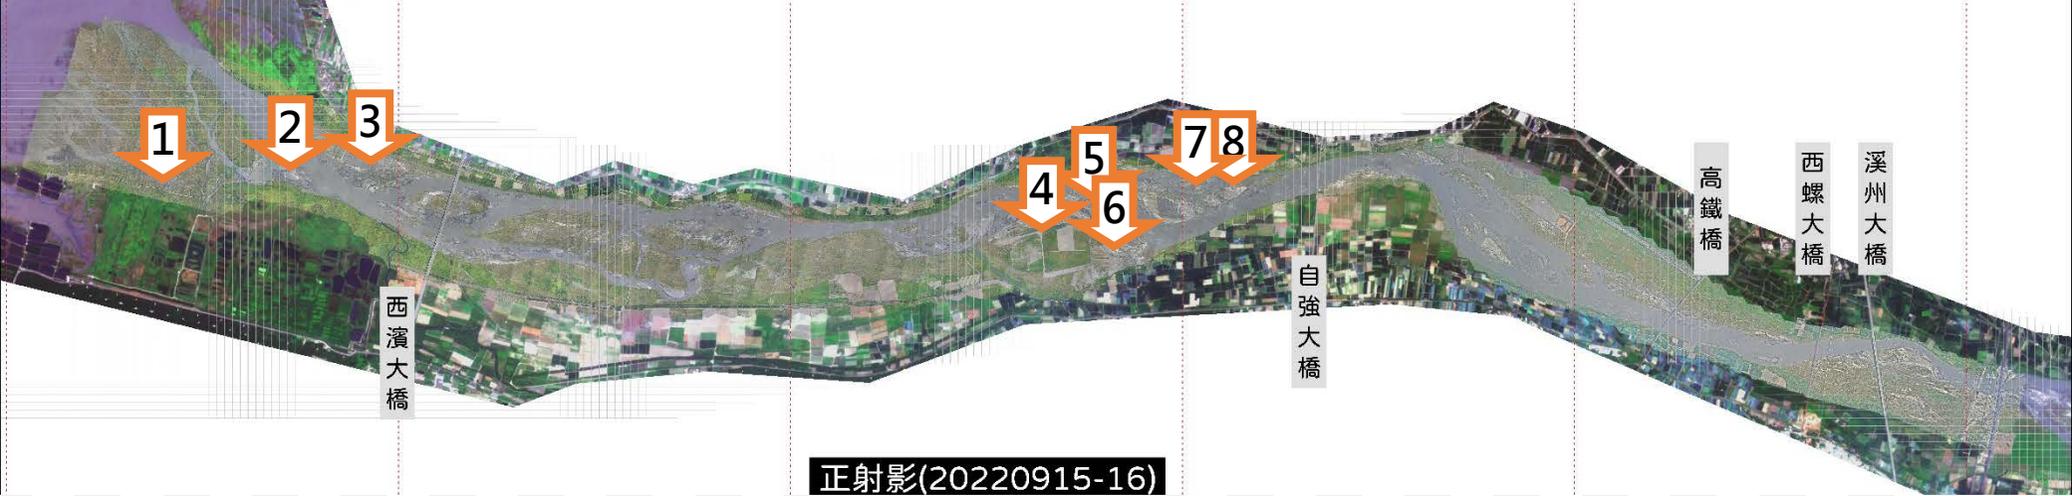

九塊厝堤防51號越堤段B_攔水土堤

九塊厝堤防51號越堤段A_攔水土堤



各區空拍現況



第一區

麥寮出海口



第二區

大庄堤防(40號越堤路)下游



第三區

楊賢堤防(74號越堤路)下游



第四區

跨河電塔上游



第五區

西螺大橋上游




111年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度

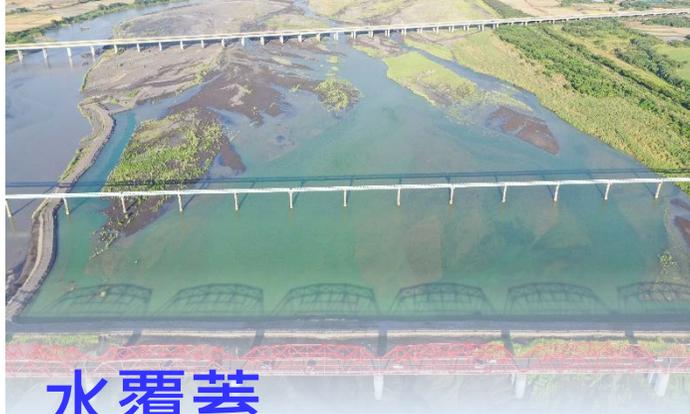

水覆蓋

- 目標值：400 公頃
- 已完成：20 公頃
- 達成率：5 %



防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：4.55 公里
- 達成率：113.8 %



其他覆蓋

- 目標值：450 公頃
- 已完成：62.4 公頃
- 達成率：13.8 %



河道整理

- 目標值：2.5 公里
- 已完成：1.74公里
- 達成率：69.6%



綠覆蓋

- 目標值：50 公頃
- 已完成：86 公頃
- 達成率：172 %

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	3.8	-	13.93



第1區 麥寮鄉

110年05月 PLAN5



111年營造複式斷面進度管控


KPI / 6公里
 已完成 / 3.8km
 達成率 / 63.3%

➤ 執行進度說明：

- (1) 西濱大橋下游北岸已於6/29完成2公里。
- (2) 西濱大橋上游南岸已於7/30完成1.8公里。
- (3) 楊賢堤防(74號越堤路):已進場施作，預計12月底完成。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

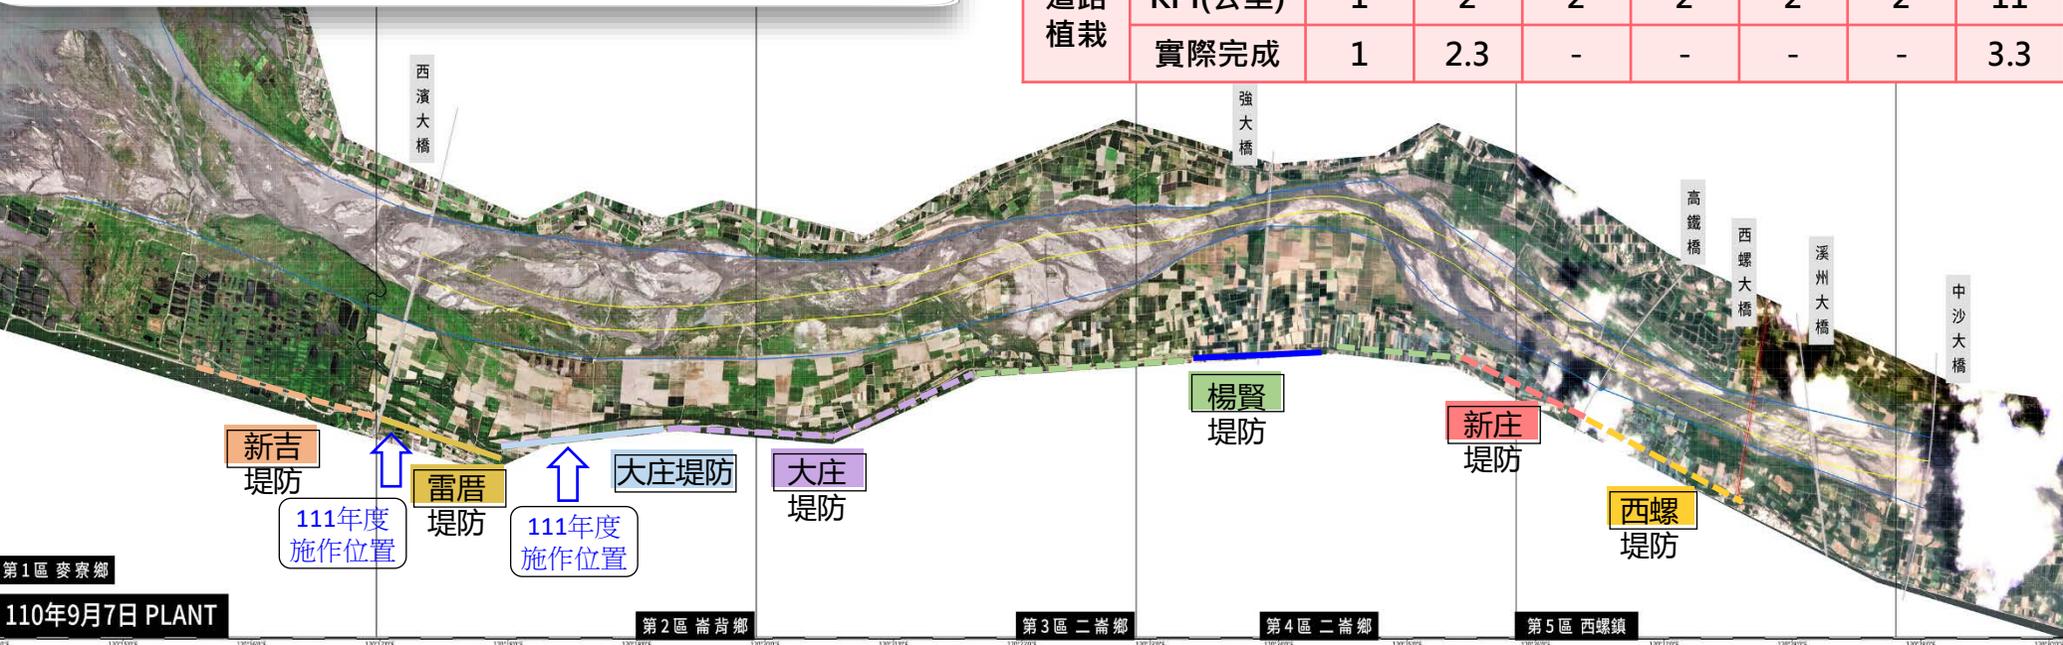

• 111年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里
 已完成 / 2.3公里
 達成率 / 115%

➤ 執行進度說明：

- (1) 雷厝堤防堤段水防道路側植樹1公里：道路改善工程已於110年4月施工完成，水防道路側植樹部分，林務局已於5/12日辦理完成。
- (2) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里：植栽作業已於7/15日辦理施作完成。



揚塵抑制措施


第1區 大城鄉

第2區 大城鄉

第3區 竹塘鄉

第4區 竹塘鎮

第5區 溪州鄉

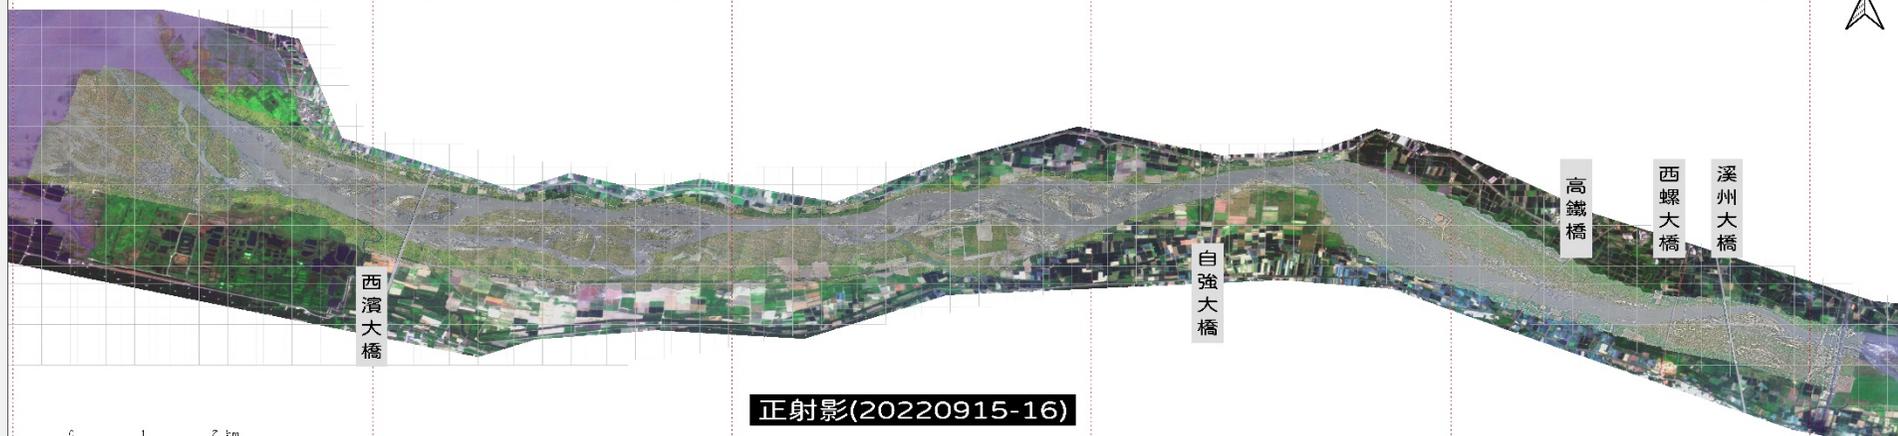

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
			1)九塊厝堤防51號越堤段A_20公頃 2)九塊厝堤防51號越堤段B_攔水土堤_0.6公里	
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 河道整理0.56公里	1) 河道整理1.18公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃 2) 西濱下游至200公頃河中灘地_空灑草籽_80公頃	1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃			
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里	1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里 2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里			
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 22號井旁_防塵網7公頃 2) 西濱下北岸_水線10.5公頃 3) 20公頃_水線0.8公頃 4) 西濱下南岸_水線7.4公頃 5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃 6) 200公頃大沙洲維護便道_碎石級配_1公頃 7) 站體6號至12號北側灘地_防塵網_5公頃 8) 200公頃大沙洲東北側低灘地_稻草蓆_5公頃 9) 西濱大橋北岸(9號越堤)_稻草蓆_5公頃	1) 下山腳堤防27號越堤段_稻草蓆2公頃	1) 74號越堤段上游南岸_稻草蓆8公頃 2) 74號越堤段下游南岸_稻草蓆2公頃	1) 高鐵橋下游北岸_水線4.2公頃 2) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_稻草蓆_3公頃	
