揚塵防治週報表

112/02/20~112/02/26



各區揚塵緊急應變措施

第

킮

第

第

區

四

品

2/20日、2/25日發布揚塵警報 — 水線系統 🔎






高揚程泵浦



- 1.7 號越堤段培厚植栽區水線噴灑(裕昇營造)
- 2.7 號越堤段堤前便道灑水車1台灑水(裕昇營造)
- 3.7 號越堤段低灘地高揚程泵浦1台噴水(裕昇營造)
- 4. 200 公頃大沙洲水線噴灑(大吉昌營造)
- 5. 200 公頃大沙洲與20公頃大沙丘灑水車1 台灑水(大吉昌營造)
- 6. 20 公頃大沙丘水線噴灑(大吉昌營造)
- 7. 10 號越堤段便道水線噴灑(大柱營造)
- 10 號越堤段便道與暫置區灑水車1台灑水(大柱營造)
- 9. 16 號越堤段培厚區水線噴灑(裕昇營造)

- 1. 34 號越堤段培厚植栽區水線噴灑(裕昇營造)
- 2. 40號至68號越堤段堤前便道灑水車1台灑水(裕昇營造)
- 1.74 號越堤段堤前便道灑水車1台灑水(福興營造)
- 2.74 號越堤段堤前便道水線噴灑(福興營造)
- 3.74 號越堤段低灘地高揚程泵浦1台噴水(益揚營造)
- 4. 74 號越堤段培厚灘地(上游)灑水車1 台灑水(益揚營造)
- 74 號越堤段防洪林帶區水線噴灑(益揚營造)
- 6. 74 號越堤段培厚區水線噴灑(裕昇營造)
- 第 1. 51號越堤段低灘地高揚程泵浦1台噴水(益揚營造)
 - 2. 高鐵橋下游北岸疏濬培厚灘地便道灑水車1台灑水(益揚營造)
 - 3. 高鐵橋下游北岸防洪林帶區水線噴灑(益揚營造)

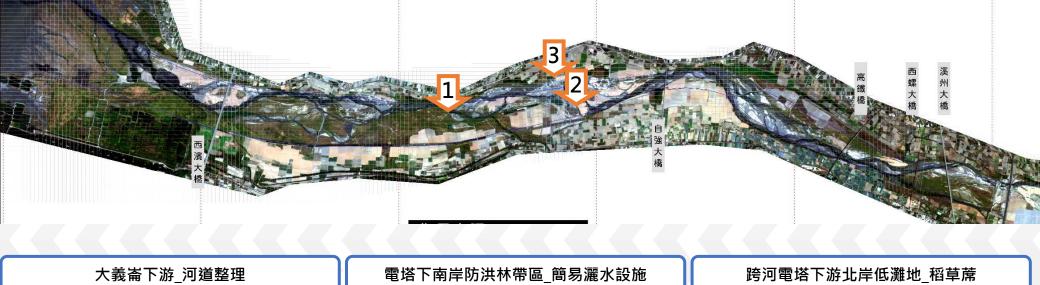



















各區現況











111年度 揚塵KPI進度管制

執行期程:111年5月至112年4月

- > 抑制面積
- > 進度




水覆蓋

- 目標值:400 公頃
- 已完成:470 公頃
- 達成率:117.5%

防洪植栽

- 目標值:4公里
- 已完成: 7.4 公里
- 達成率:185%



其他覆蓋

- 目標值:450 公頃
- 已完成:351.8 公頃
- 達成率: 78.2 %



- 目標值: 2.5 公里
- 已完成:3.28公里
- 達成率:131.2%



- 目標值:50 公頃
- 已完成: 265 公頃
- 達成率:530%



營造複式斷面規劃圖

	複	年度	107-109	110	111	112	合計
	式	KPI(公里)	8	2	6	4	20
	面	實際完成	8	2.13	6.05	-	16.18






112年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里 已完成 / 0km

已完成 / 0km 達成率/ 0% > 執行進度說明:

預計於112年3月1日召開局內工作進度檢討會議,並依會議結論規劃本(112)年度複式斷面項目進場期程。



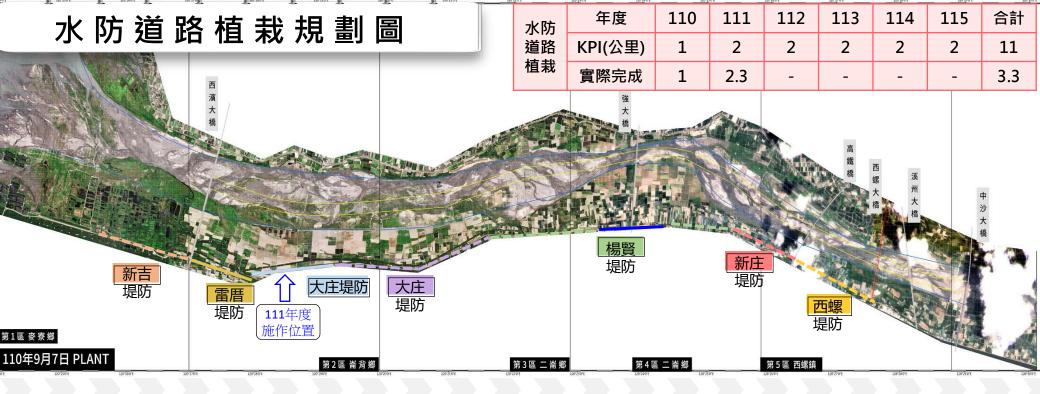



112年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 已完成 / 0公里 達成率/ 0% > 執行進度說明:

預計於112年3月1日召開局內工作進度檢討會議,並依會議結論規劃本(112)年度水防道路植栽項目進場期程。

