



揚塵防治 週報表

112/03/20~112/03/26



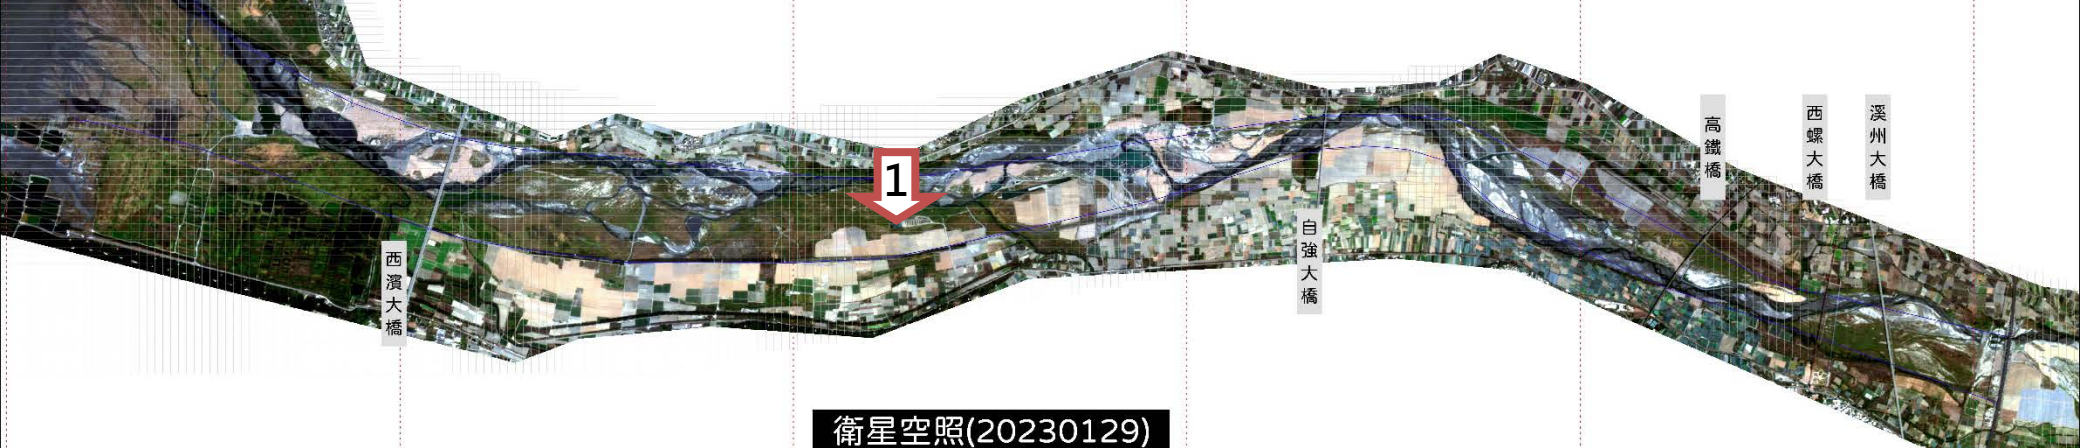

大義崙下游_河道整理

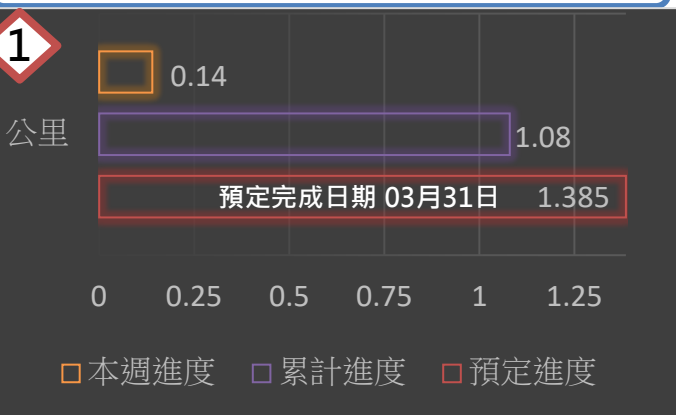

各區 空拍現況



第一區

出海口 下游



第二區

40號越堤段(大庄堤防)下游



第三區

大義崙排水下游



第四區

自強大橋下游



第五區

西螺大橋上下游

111年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



水覆蓋

- 目標值：400 公頃
- 已完成：490 公頃
- 達成率：122.5 %

防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：8.9 公里
- 達成率：222.5 %



其他覆蓋

- 目標值：450 公頃
- 已完成：356.8 公頃
- 達成率：79.3 %

河道整理

- 目標值：2.5 公里
- 已完成：3.84公里
- 達成率：153.6 %

綠覆蓋

- 目標值：50 公頃
- 已完成：265 公頃
- 達成率：530 %

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	6.05	-	16.18



第1區 麥寮鄉

110年05月31日 PLAN5



111/07/19

• 112年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 0 km


達成率/ 0 %

➤ 執行進度說明：

- 1、已於112年3月1日召開112年第1次工作會議。
- 2、112年度複式斷面規劃為自強大橋上下游2公里，預計3月底進場施作自強大橋下游培厚。
- 3、原規劃自強大橋上游2公里部分，經工作會議討論，變更為高鐵橋下游北岸，由疏濬標案先予辦理土方培厚作業，預計3月底前進場施作。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

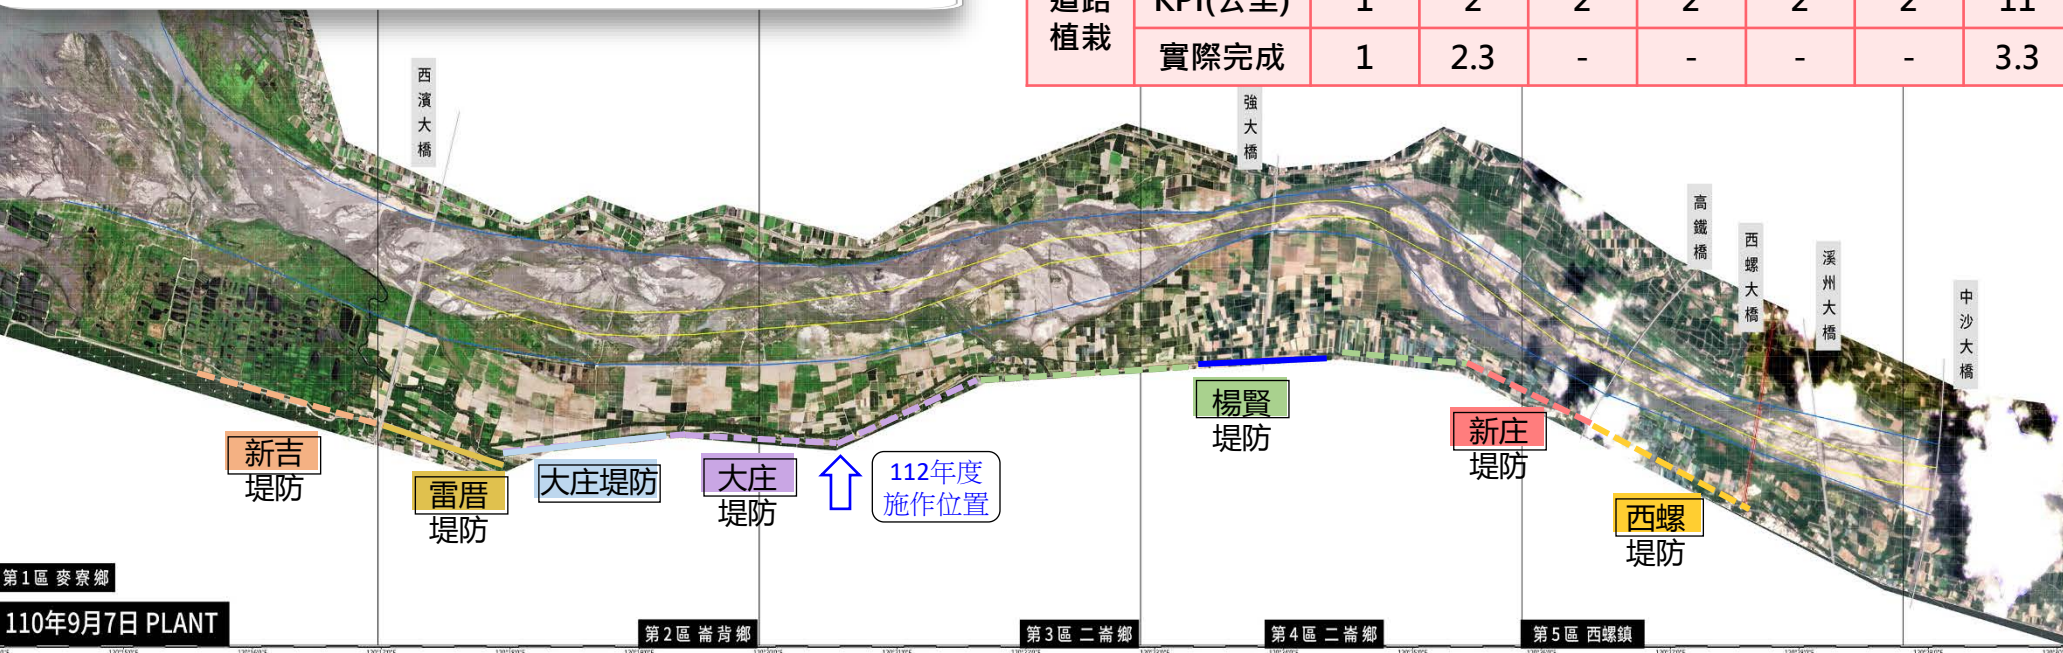

• 112年水防道路植栽進度管控


KPI / 2公里
 已完成 / 0公里
 達成率 / 0%

➤ 執行進度說明：

- 1、已於112年3月1日召開112年第1次工作會議。
- 2、於大庄堤防施作500公尺水防道路植樹，預計112年8月底前完成(工務課案件)。
- 3、後續1.5公里將滾動式檢討，並於112年12月底施作完成。



揚塵抑制措施

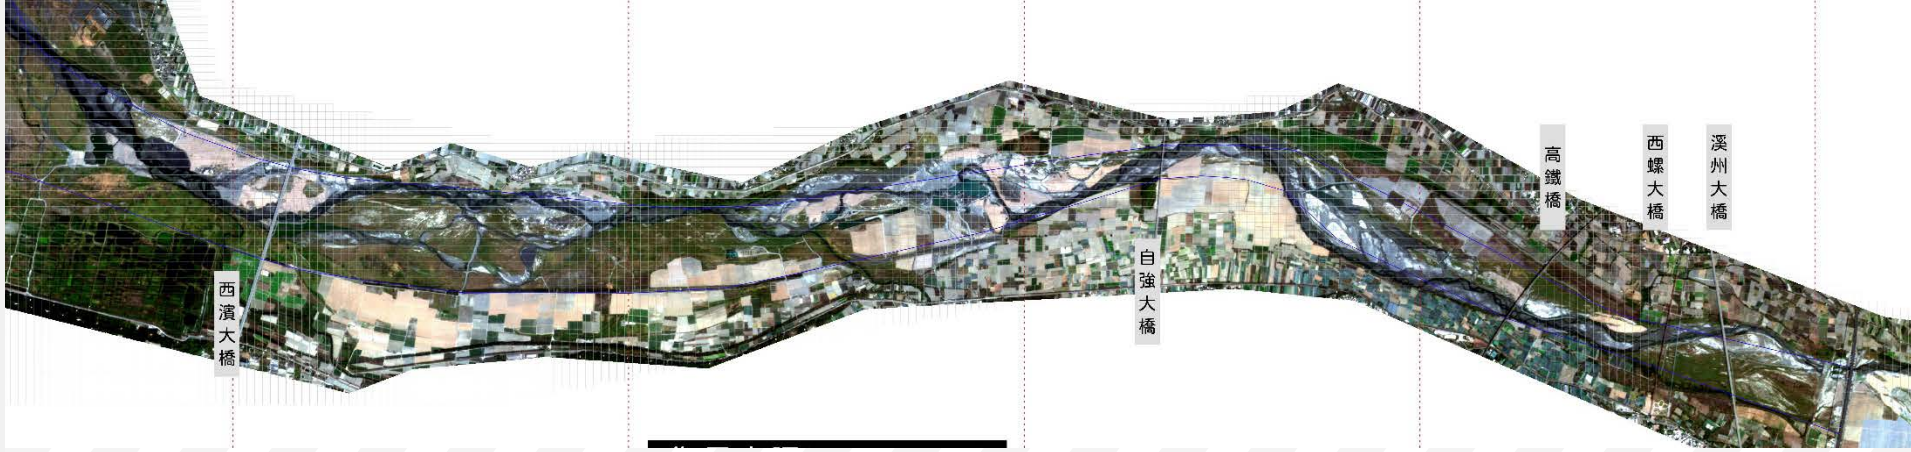

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
	1) 西濱下游北岸_50公頃 2) 西濱大橋上游南岸_180公頃	1) 跨河電塔下游南岸_30公頃 2) 跨河電塔上游南岸_20公頃	1)51號越堤段A_20公頃 2)51號越堤段B_60公頃 3)94號越堤段_100公頃	1) 高鐵橋上游北岸_30公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 河道整理0.56公里	1) 河道整理1.4公里 2) 74號越堤段0.8公里 3) 大義崙排水下游1.08公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃 2) 西濱下游至200公頃河中灘地_空灑草籽_80公頃	1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃	1) 51號越堤段下游北岸至74號越堤段下游南岸_空灑草籽55公頃	1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_地面綠化3公頃 2) 自強大橋上游_空灑草籽50公頃 3) 高鐵下游北岸至51號越堤段上游北岸_空灑草籽20公頃	1) 西螺大橋下游_空灑草籽25公頃 2) 西螺大橋下游北岸至高鐵下游北岸_空灑草籽26公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里	1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里 2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里	1) 74號越堤段下游A_複式斷面植栽0.6公里 2) 74號越堤至跨河電塔_植栽_0.85公里 3) 74號越堤段下游B_複式斷面植栽0.8公里 4) 電塔下南岸疏濬培厚區_防洪林帶1.5公里	1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_防洪林帶0.6公里	
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 防塵網_45公頃 2) 稻草蓆_70.3公頃 3) 施工便道_碎石級配_1公頃 4) 簡易灑水設施_21.1公頃	1) 防塵網_4公頃 2) 稻草蓆_24公頃 3) 施工便道_碎石級配_0.9公頃	1) 稻草蓆_73公頃 2) 簡易灑水設施_19.5公頃 3) 跨河電塔下游北岸低灘地_稻草蓆22公頃	1) 防塵網_6公頃 2) 稻草蓆_18公頃 3) 簡易灑水設施_4.2公頃	1)稻草蓆_47.8公頃
