

揚塵防治 週報表

112/04/17~112/04/23





跨河電塔下游_河道整理



各區 空拍現況



第一區
出海口 0號井



第二區
西濱大橋 上游



第三區
74號越堤段 上下游



第四區
自強大橋 上游



第五區
西螺大橋 上下游

111年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



水覆蓋

- 目標值：400 公頃
- 已完成：490 公頃
- 達成率：122.5 %



防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：8.9 公里
- 達成率：222.5 %



其他覆蓋

- 目標值：450 公頃
- 已完成：356.8 公頃
- 達成率：79.3 %



河道整理

- 目標值：2.5 公里
- 已完成：4.465公里
- 達成率：178.6 %



綠覆蓋

- 目標值：50 公頃
- 已完成：265 公頃
- 達成率：530 %

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	6.05	-	16.18



第1區 麥寮鄉

110年05月25日 PLAN 7



112年營造複式斷面進度管控


KPI / 4公里
 已完成 / 0 km
 達成率 / 0 %

➤ 執行進度說明：

- 1、自強大橋下游規劃1.2公里，刻正辦理土方培厚作業，預計於112年6月完成，後續植栽等設施再交由112年防洪植栽標案接續辦理。
- 2、高鐵橋下游北岸規劃2公里，目前因疏濬標案調整地磅設施位置，故土方培厚作業延至112年4月底進場。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

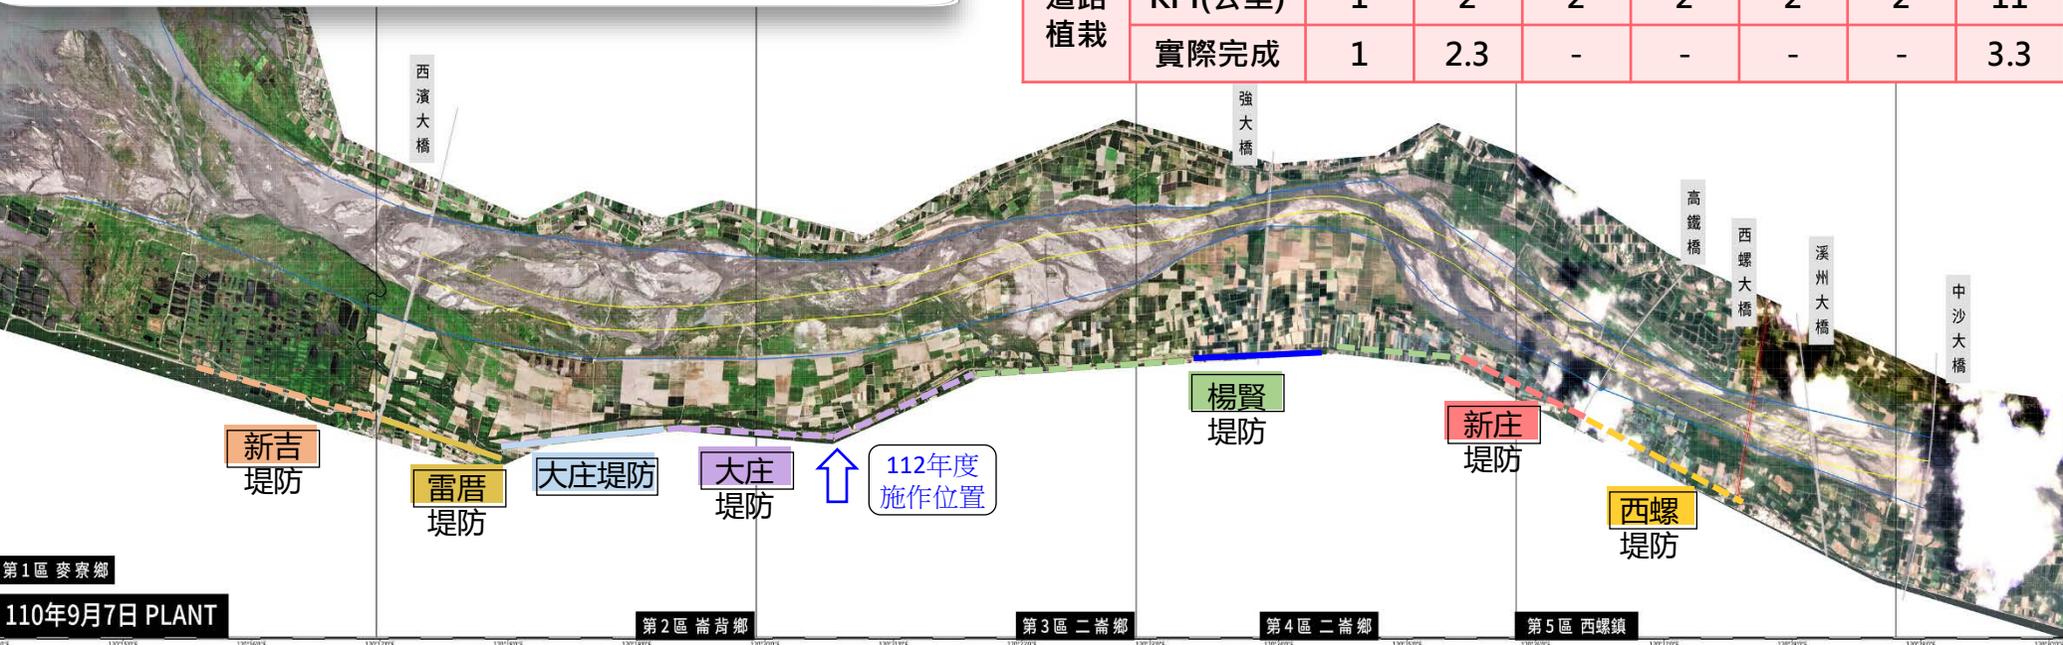

第1區 麥寮鄉

110年9月7日 PLANT

第2區 崙背鄉

第3區 二崙鄉

第4區 二崙鄉

第5區 西螺鎮



• 112年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里
已完成 / 0公里
達成率 / 0%

➤ 執行進度說明：

- 1、大庄堤防規劃施作0.5公里，目前已進場施作堤防構造改善工程作業中，預計**112年8月底前**完成(工務課案件)。
- 2、後續1.5公里將滾動式檢討，並納入**112年度揚塵改善**案件辦理，預計於**112年12月底**施作完成。

