

揚塵防治 週報表

112/05/08~112/05/14



各區 空拍現況



第一區

出海口 0號井



第二區

西濱大橋 上下游



第三區

74號越堤 下游



第四區

自強大橋 下游



第五區

西螺大橋 上下游

112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



水覆蓋

- 目標值：400 公頃
- 已完成：0 公頃
- 達成率：0 %



防洪植栽

- 目標值：6 公里
- 已完成：0 公里
- 達成率：0 %



其他覆蓋

- 目標值：450 公頃
- 已完成：0 公頃
- 達成率：0 %



河道整理

- 目標值：2.5 公里
- 已完成：0.22 公里
- 達成率：8.8%



綠覆蓋

- 目標值：50 公頃
- 已完成：0 公頃
- 達成率：0 %

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	6.05	-	16.18



第1區 麥寮鄉

• 112年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 0 km

達成率 / 0 %

➤ 執行進度說明：

- 1、自強大橋下游規劃1.2公里，目前辦理土方培厚作業中，本週施作進度為0.1公里，累計為0.68公里，預計於112年6月完成，後續植栽等設施再交由112年防洪植栽標案接續辦理。
- 2、高鐵橋下游北岸規劃1.6公里，已於4月底前進場施作施工便道，刻正辦理地磅站設施建置作業中。
- 3、後續不足部分將滾動式檢討，並納入112年度揚塵改善案件辦理，預計於112年12月底施作完成。




111/07/19



水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

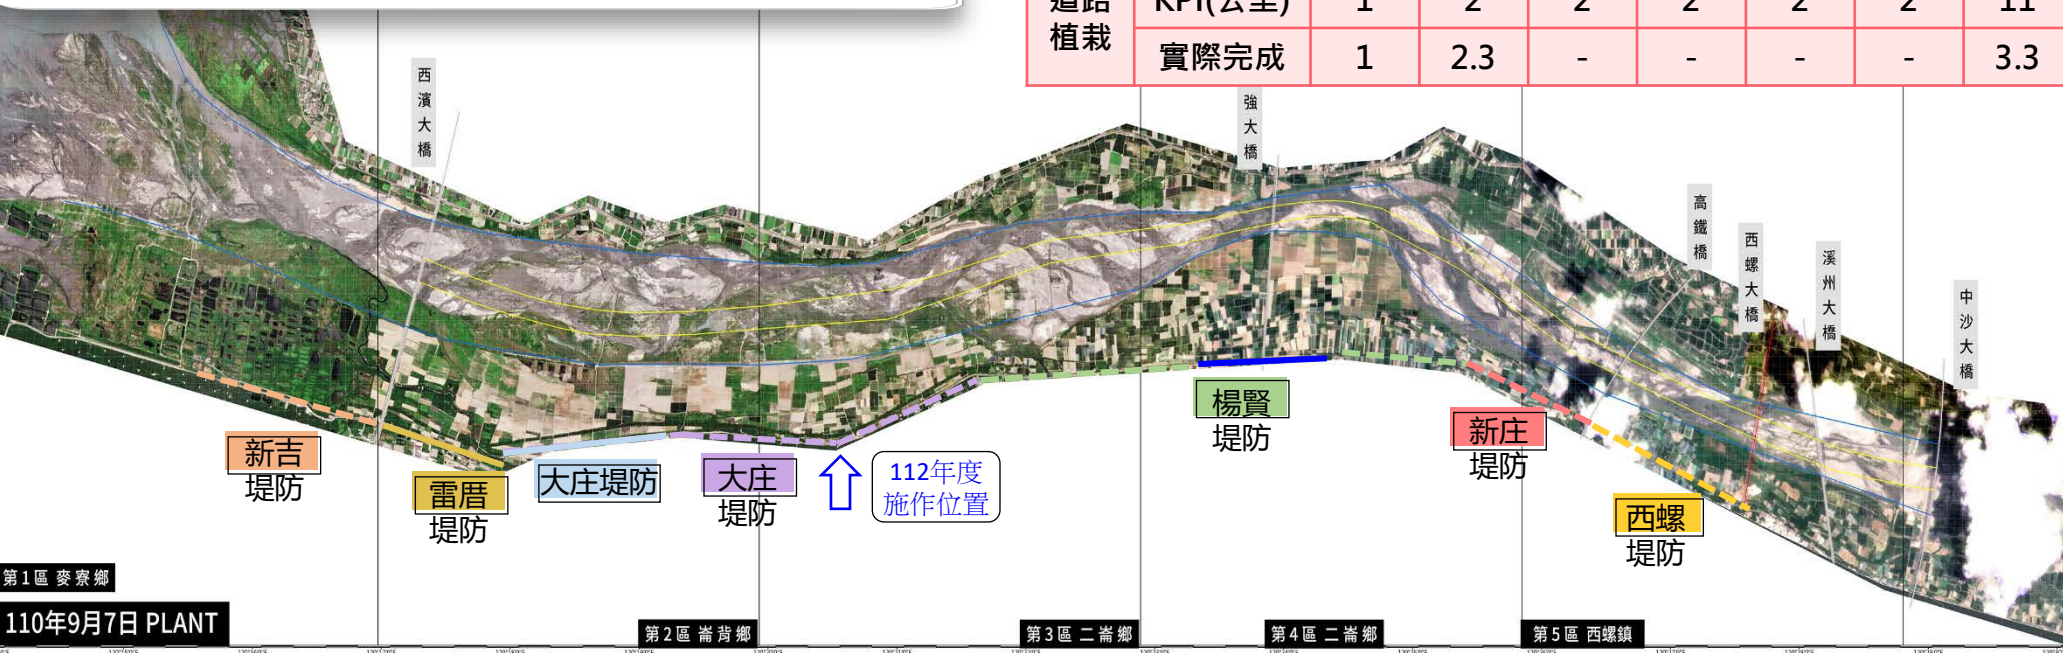


• 112年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

- 已完成 / 0公里 達成率/ 0%
- 1、大庄堤防規劃施作0.5公里，目前已進場施作堤防構造改善工程作業中，截至本日(5/14)進度為7%，預計112年8月底前完成(工務課案件)。
 - 2、後續1.5公里將滾動式檢討，並納入112年度揚塵改善案件辦理，預計於112年12月底施作完成。



揚塵抑制措施

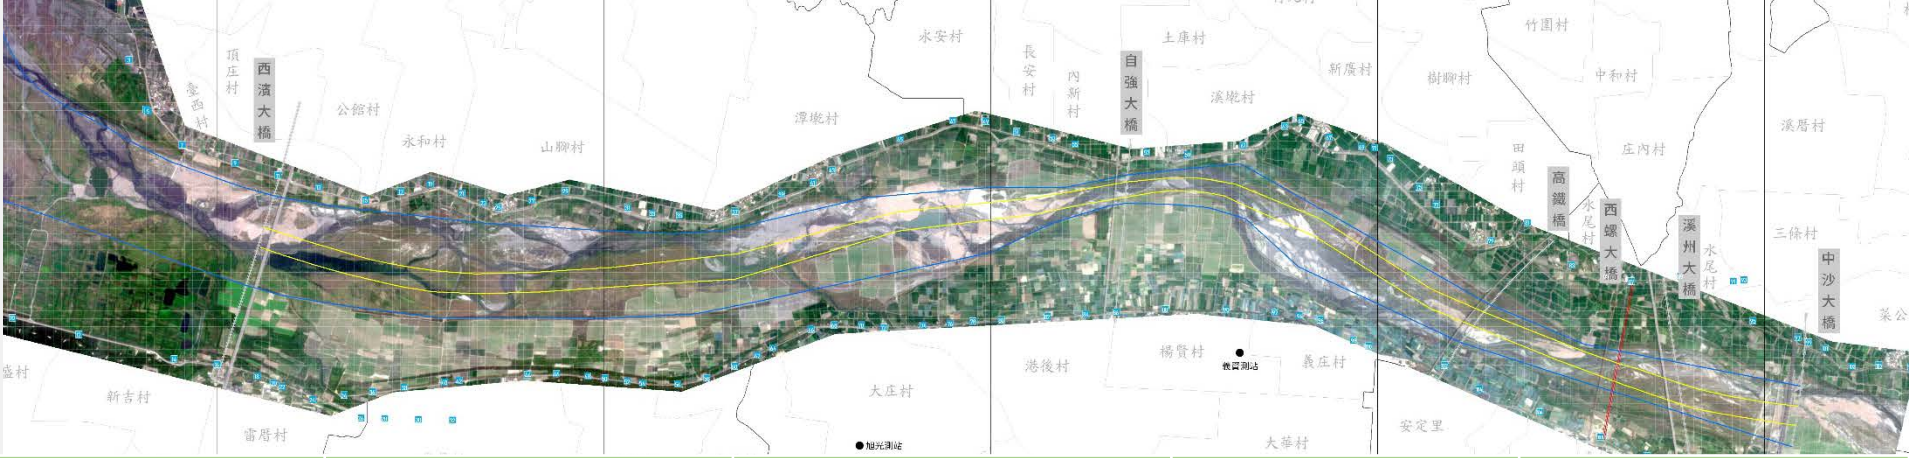

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
		1) 跨河電塔下游0.22公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
