


揚塵防治 週報表


112/06/12~112/06/18



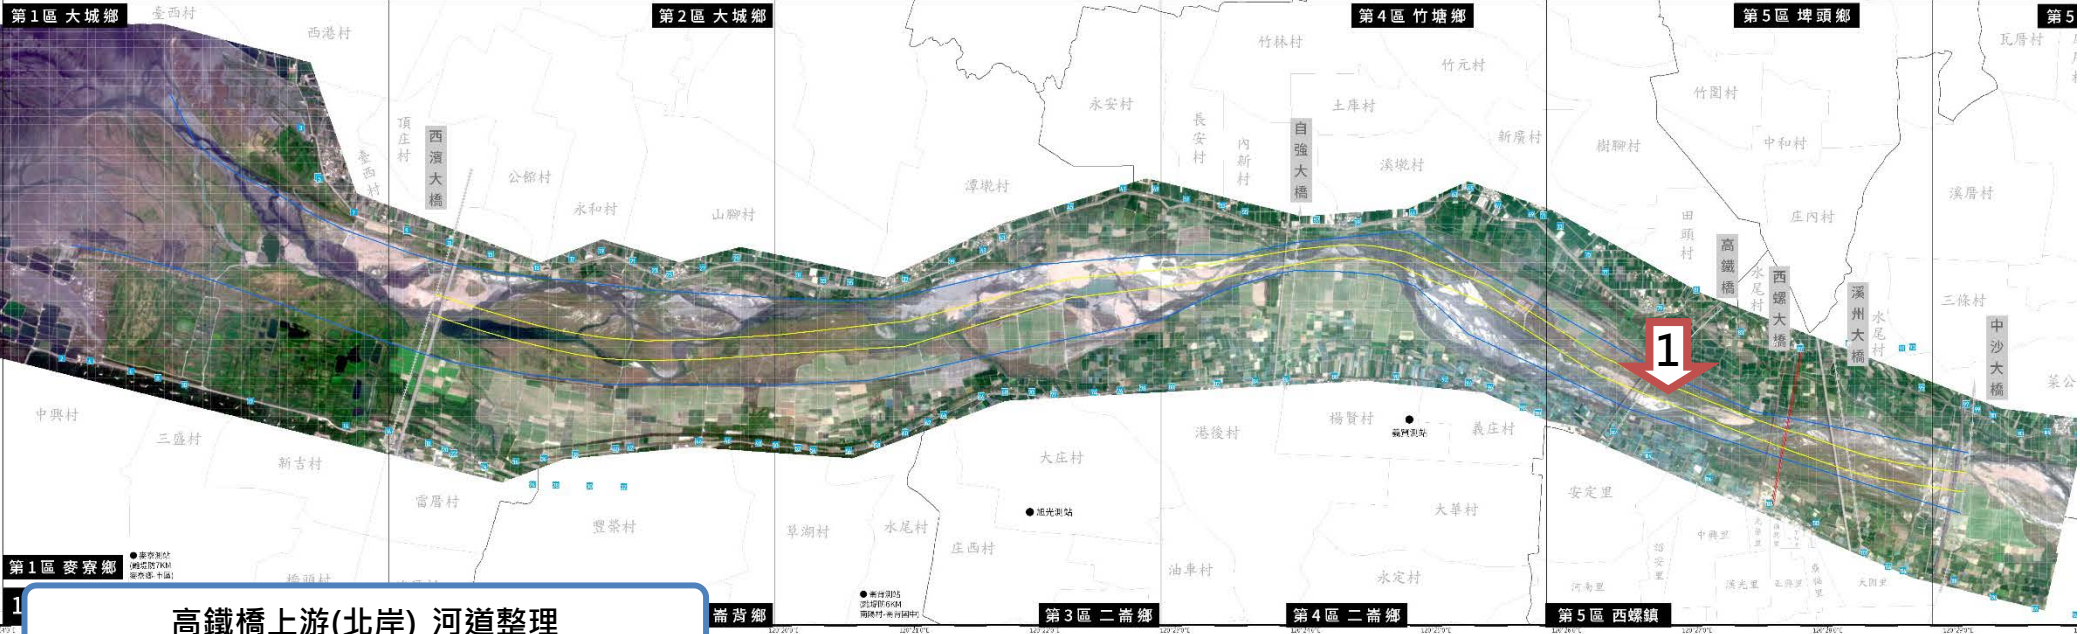

高鐵橋上游(北岸)_河道整理

1

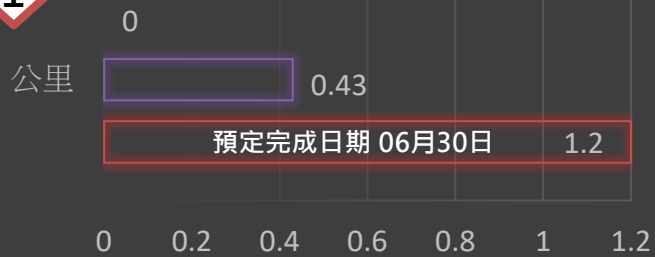

■ 本週進度
 ■ 累計進度
 ■ 預定進度



各區 空拍現況

第一區




出海口

第二區



西濱大橋 上下游

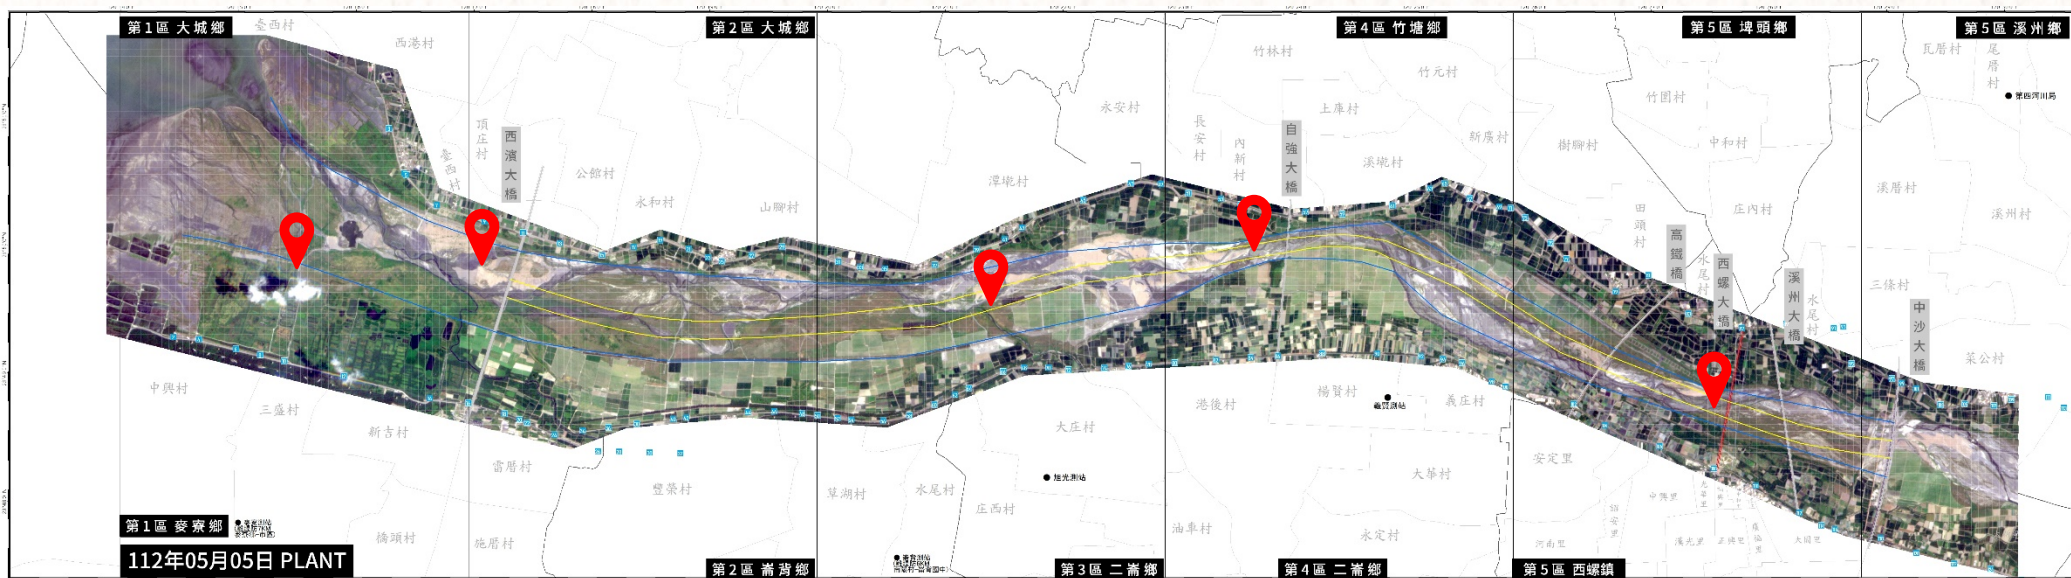

第三區



大義崙排水 上游

第四區



自強大橋 下游

第五區



西螺大橋 上下游

112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 1.17 公里
- 達成率 : 46.8 %



防洪植栽

- 目標值 : 6 公里
- 已完成 : 0 公里
- 達成率 : 0 %



綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	6.05	-	16.18



第1區 麥寮鄉

112年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0 km


達成率 / 0 %

- 1、自強大橋下游完成為1.2公里培厚作業；植栽作業預計於112年07月底完成。
- 2、高鐵橋下游北岸規劃1.6公里，將於6月底前進場施作施工便道，刻正辦理地磅站設施建置作業中。
- 3、高鐵橋上游北岸規劃1.2公里，已於5月中進場辦理土方培厚作業，本週因水位高漲無法施工；累計為0.43公里預計於112年6月底完成。



水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

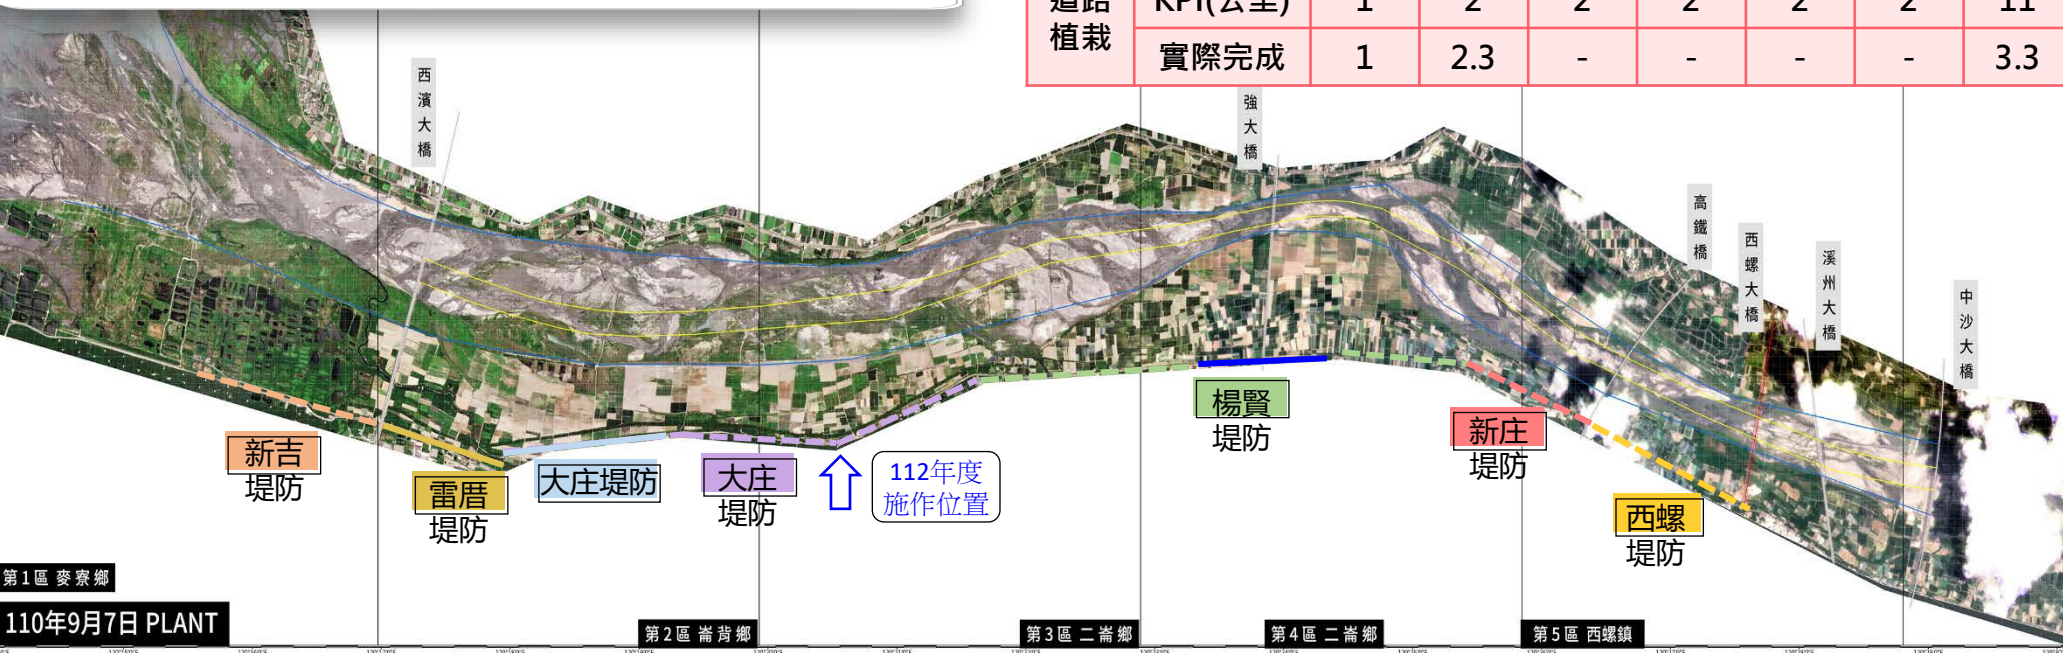


• 112年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

- 已完成 / 0公里 達成率/ 0%
- 1、大庄堤防規劃施作0.5公里，目前已進場施作堤防構造改善工程作業中，進度為 65%，預計112年8月底前完成(工務課案件)。
 - 2、後續1.5公里將滾動式檢討，並納入112年度揚塵改善案件辦理，預計於112年12月底施作完成。



揚塵抑制措施

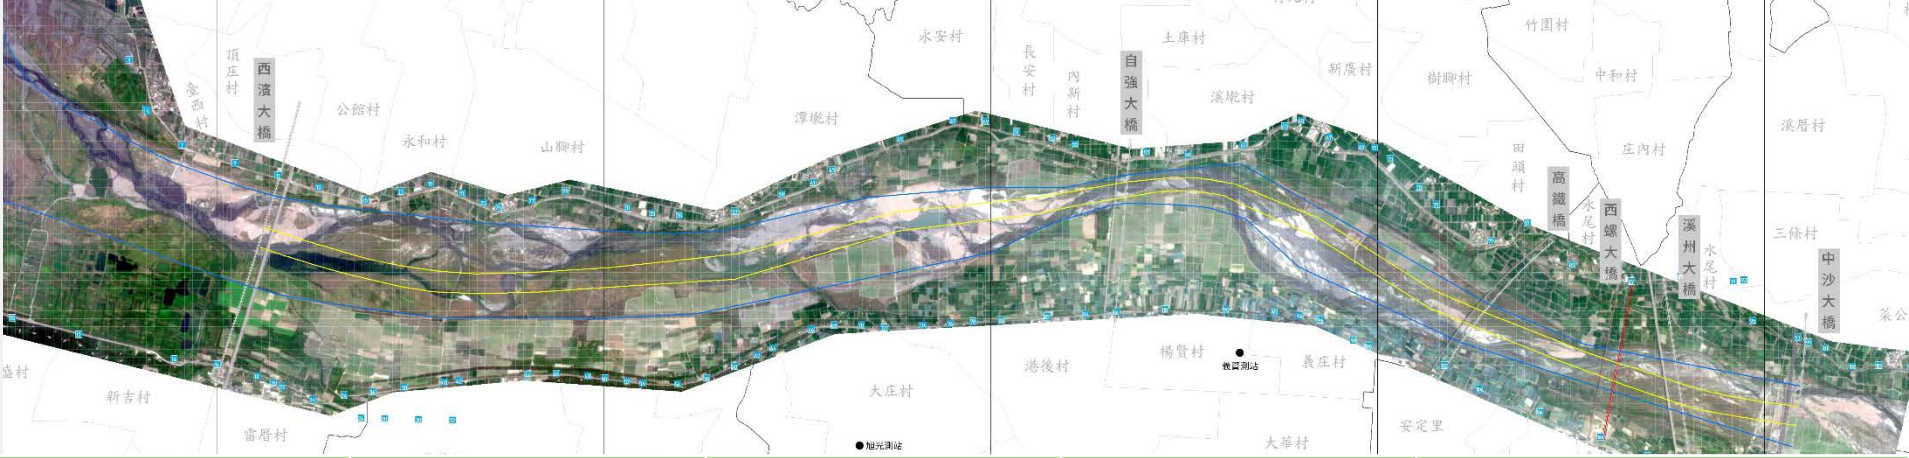

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
		1) 跨河電塔下游0.74公里		1) 高鐵橋上游(北岸)0.43公里
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
